

ANDRES RICARDO ARZAGA URIBE

RFC Emisor : AAUA520126HZ9

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle 28 No. Exterior 5622 Colonia DALE Localidad CHIHUAHUA Referencia
ENTRE P. MEOQUI Y HACIENDA DEL TORREON Municipio CHIHUAHUA
Estado Chihuahua MEXICO CP. 31050

Sucursal :

RFC Receptor : MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Calle MINA No. Exterior 408 Colonia CENTRO Localidad CHIHUAHUA
Municipio CHIHUAHUA MEXICO CP. 31000

Folio Fiscal:

A7E1F5BB-3D6C-48EC-BF83-6A068EAA6C3A

No de Serie del CSD:

00001000000301587334

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CHIHUAHUA 2016-05-03T12:43:42

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

787

Régimen Fiscal:

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		CONSTRUCCION DE CUARTOS ADOSADOS DE 4.0 X 4.0 MTS, EN GRANJAS FAMILIARES SACRAMETO ESTIMACION # 3 CONTRATO # 183/2015 ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 8,086.50 AMORTIZACION DE CONTRATO \$ 2,427.10	5659.40	5659.40
1	N/A		Sancion por retraso 1% 375.21	0.00	0.00
1	N/A		Retención del 0.2% D.I.F. 16.17	0.00	0.00
1	N/A		Retención del 0.2% I.C.I.C. 16.17	0.00	0.00
1	N/A		Retención del 0.2% C.M.I.C. 16.17	0.00	0.00
1	N/A		TOTAL DE RETENCIONES. \$ 423.72	0.00	0.00
1	N/A		Neto a Recibir. \$ 6141.18	0.00	0.00

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: TRANSFERENCIA

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal: \$ 5,659.40

Impuestos
Trasladados

IVA 16.00% \$ 905.50

TOTAL \$ 6,564.90

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ANDRES RICARDO ARZAGA URIBE

RFC Emisor : AAUA520126HZ9

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle 28 No. Exterior 5622 Colonia DALE Localidad CHIHUAHUA Referencia
ENTRE P. MEOQUI Y HACIENDA DEL TORREON Municipio CHIHUAHUA
Estado Chihuahua MEXICO CP. 31050

Sucursal :

RFC Receptor : MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Calle MINA No. Exterior 408 Colonia CENTRO Localidad CHIHUAHUA
Municipio CHIHUAHUA MEXICO CP. 31000

Folio Fiscal:

A7E1F5BB-3D6C-48EC-BF83-6A068EAA6C3A

No de Serie del CSD:

00001000000301587334

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CHIHUAHUA 2016-05-03T12:43:42

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

787

Régimen Fiscal:

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

Total con letra:

SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS, 90/100 MN

Sello digital del CFDI:

OjSSe+6F5JjBUBQmsr2Bhj0NEgJHd1SA+MgeVHp6XmrMQkGVyEuxKM1zdMNC9kHVmf45g2qKkBVko7H3JkXSLfeixgWdpje02V114ht6aLBma6a
+brAx6P0FCvZNJt8SmhvUTBelO1jnV/RLJSJEm8y6Y5ywQNv/NCRb/NM=

Sello del SAT:

mA6yKyBtUxj345gvRmHJfPSEki5Diz45DMMXRvVvAXXkmeFNN
+cJKJy2GHIHtYwJpPemikvdhGRnb8vGfJCSEO/OG1n74ZuFjXYXa8EmF4NeWvycoyVjXcBG5qYNaPgviFRFBT19gZ8IQ2X8chPDqaokGWiy3akyKeSpfMpxs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A7E1F5BB-3D6C-48EC-BF83-6A068EAA6C3A|2016-05-03T12:53:44|OjSSe+6F5JjBUBQmsr2Bhj0NEgJHd1SA
+MgeVHp6XmrMQkGVyEuxKM1zdMNC9kHVmf45g2qKkBVko7H3JkXSLfeixgWdpje02V114ht6aLBma6a
+brAx6P0FCvZNJt8SmhvUTBelO1jnV/RLJSJEm8y6Y5ywQNv/NCRb/NM=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000201748120

Fecha y hora de certificación:

2016-05-03T12:53:44



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 2 de 2

[Handwritten signature]



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal RFC Emisor RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
AAUA520126HZ9	ANDRES RICARDO ARZAGA URIBE	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
A7E1F5BB-3D6C-48EC-BF83-6A068EAA6C3A	2016-05-03T12:43:42	2016-05-03T12:53:44	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$6,564.90	ingreso	Vigente	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

CONTRATISTA: **ANDRES RICARDO ARZAGA URIBE**
OBRA: **CONSTRUCCION DE CUARTO ADOSADO DE 4.0 X 4.0 MT.**
EN GRANJAS FAMILIARES SACRAMENTO
CONTRATO: **183/2015**
FECHA DE TERMINO: **02-Oct-15**
CONTRATO
FECHA PRORROGA: **--**
TERMINACION REAL: **30-Ene-16**
DE OBRA
INTERES MENSUAL (I): **1.00%**
INTERES DIARIO (I): **0.0333%**

TIEMPO DE
SANCION (T) **120** DIAS

**CALCULO DE RETENCION/SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA
DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA TERCERA DEL CONTRATO**

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
1	ESTIMACION # 3				8,086.50
2					0.00
3					0.00
4					0.00
IMPORTE POR SANCIONAR (IMP)					8,086.50
IMPORTE DE SANCION (IMP) * (I) * (T)					323.46
16 % IVA					51.75
TOTAL DE SANCION					375.21



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL 2015	CONTRATO No. 183/2015	CONTRATADO
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO ADOSADO DE 4.0 X 4.0 MTS. EN GRANJAS FAMILIARES SACRAMENTO	ESTIMACIÓN No. 3	837.978.01
	PERÍODO EJEC. 03 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 30 DE ENERO DEL 2016	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 9,380.34 CON IVA
CONTRATISTA: ING. ANDRES RICARDO ARZAGA URIBE	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 828,597.67 CON IVA
RFC AAUA 520126 HZ9	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 837,978.01 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>EXTRAORDINARIOS</u>	\$ 8,086.50	
<u>0.00</u>	\$ -	
<u>0.00</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 8,086.50

--

DESCUENTOS

1% SANCION POR RETRASO	\$	375.21
0.2% I.C.I.C.	\$	16.17
0.2% D.I.F.	\$	16.17
0.2% I.C.I.C.	\$	16.17
SUMA DESCUENTOS	\$	423.72

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$	8,086.50
AMORT ANTICIPO	\$	2,427.10
SUB-TOTAL	\$	5,659.40
I.V.A.	\$	905.50
TOTAL	\$	<u>6,564.90</u>

(CON LETRA)

(SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
90/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	423.72
SALDO NETO A RECIBIR	\$	6,141.18

AUTORIZO

ELABORO

ING. EVER GARFIO PALMA
RESIDENTE D.O.P.M

Vo. Bo.

ING. ENRIQUE FLORES MARQUEZ
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Vo. Bo.

ARQ. JESUS ANTONIO PEÑA MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. ANDRES RICARDO ARZAGA URIBE
CONTRATISTA

REVISO

ING. EDMUNDO MELENDEZ LOPEZ
JEFE DEL DEPTO DE CONSERV. DE LA INFR. URBANA

CHIHUAHUA, CHIH.,

30 DE ENERO DEL 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 6,141.18
(SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 3 CONTRATO No. 183/2015 POR LA CANTIDAD DE : \$ 837,982.44 INCLUYE CONVENIO
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE CUARTO ADOSADO DE 4.0 X 4.0 MTS, EN GRANJAS FAMILIARES SACRAMENTO

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	8,086.50
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	2,427.10
	SUBTOTAL	\$	5,659.40
	IVA	\$	905.50
	TOTAL	\$	6,564.90
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
RETENCION POR RETRASO 1%	375.21		
D.I.F. DEL 0.2%	16.17		
I.C.I.C. DEL 0.2%	16.17		
CMIC. DEL 0.2%	16.17		
SUMA	423.73		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 837,982.44
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 828,597.66
ESTA ESTIMACION	\$ 9,380.34
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 837,978.01
POR EJERCER	\$ 4.43

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 251,394.74
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 248,579.30
ESTA ESTIMACION	\$ 2,815.44
ACUMULADO ACTUAL	\$ 251,394.74
POR AMORTIZAR	\$ 0.00

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% C.M.I.C.	0.2% I.C.I.C.	0.2% D.I.F.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 784.09	\$ 784.09	\$ 784.09
ESTA ESTIMACION	\$ 16.17	\$ 16.17	\$ 16.17
ACUMULADO ACTUAL	\$ 800.26	\$ 800.26	\$ 800.26

R E C I B I M O S


ING. ANDRÉS RICARDO ARZAGA URIBE
AAUA 520126 HZ9

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO ADOSADO DE 4.0 X 4.0 MTS, EN GRANJAS FAMILIARES SACRAMENTO

CONTRATISTA: ING. ANDRES RICARDO ARZAGA URIBE

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

ESTIMACIÓN No. 3

PERÍODO: DEL 03 DE OCTUBRE AL 30 DE ENERO DEL 2016

No. CONTRATO: 183/2015

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

EXTRAORDINARIOS 8,086.50

SUBTOTAL	8,086.50
I.V.A.	1,293.84
TOTAL	9,380.34

POR EL CONTRATISTA

ING. ANDRÉS R. ARZAGA URIBE

POR EL RESIDENTE DE D.O.P.M

ING. EVER GARFIO PALMA


GENERADOR DE ESTIMACION										
CONTRATO:										
OBRA : CONSTRUCCION DE CUARTO ADOSADO DE 4.0 X 4.0 MTS, EN GRANJAS FAMILIARES SACRAMENTO										
CONTRATISTA: ING. ANDRES RICARDO ARZAGA URIBE										
No DE ESTIMACION: 3 PERIODO : del 03 de Oct. 2015 al 30 de Enero del 2016										
Unidad										
CROQUIS										
VOLUMEN A PAGAR										
OPERACIONES ARITMETICAS										
altura cant.										
ancho										
Longitud										
CONCEPTO										
AMARRES A CONSTRUCCION EXISTENTE, INCLUYE: DEMOLICION PARA DESCUBRIR VARILLA Y AMARRARSE A CASTILLOS Y DALA DE CONSTRUCCION NUEVA										
96										
96.00										
AMARRES										
BOTAGUAS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X15 CMS.										
72										
72.00										
ML										
Botaguas										
PRETIL DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, SECCION DE 15X20 CMS, INCLUYE ARMADO, CIMBRA Y COLADO										
8										
8.00										
ML										
ml										

POR EL CONTRATISTA

 ING. ANDRÉS R. ARZAGA URIBE


 POR EL RESIDENTE
 ING. EVER GARFIO PALMA


AMARRES A CONSTRUCCION EXISTENTE, EN CASAS 1 A LA 18

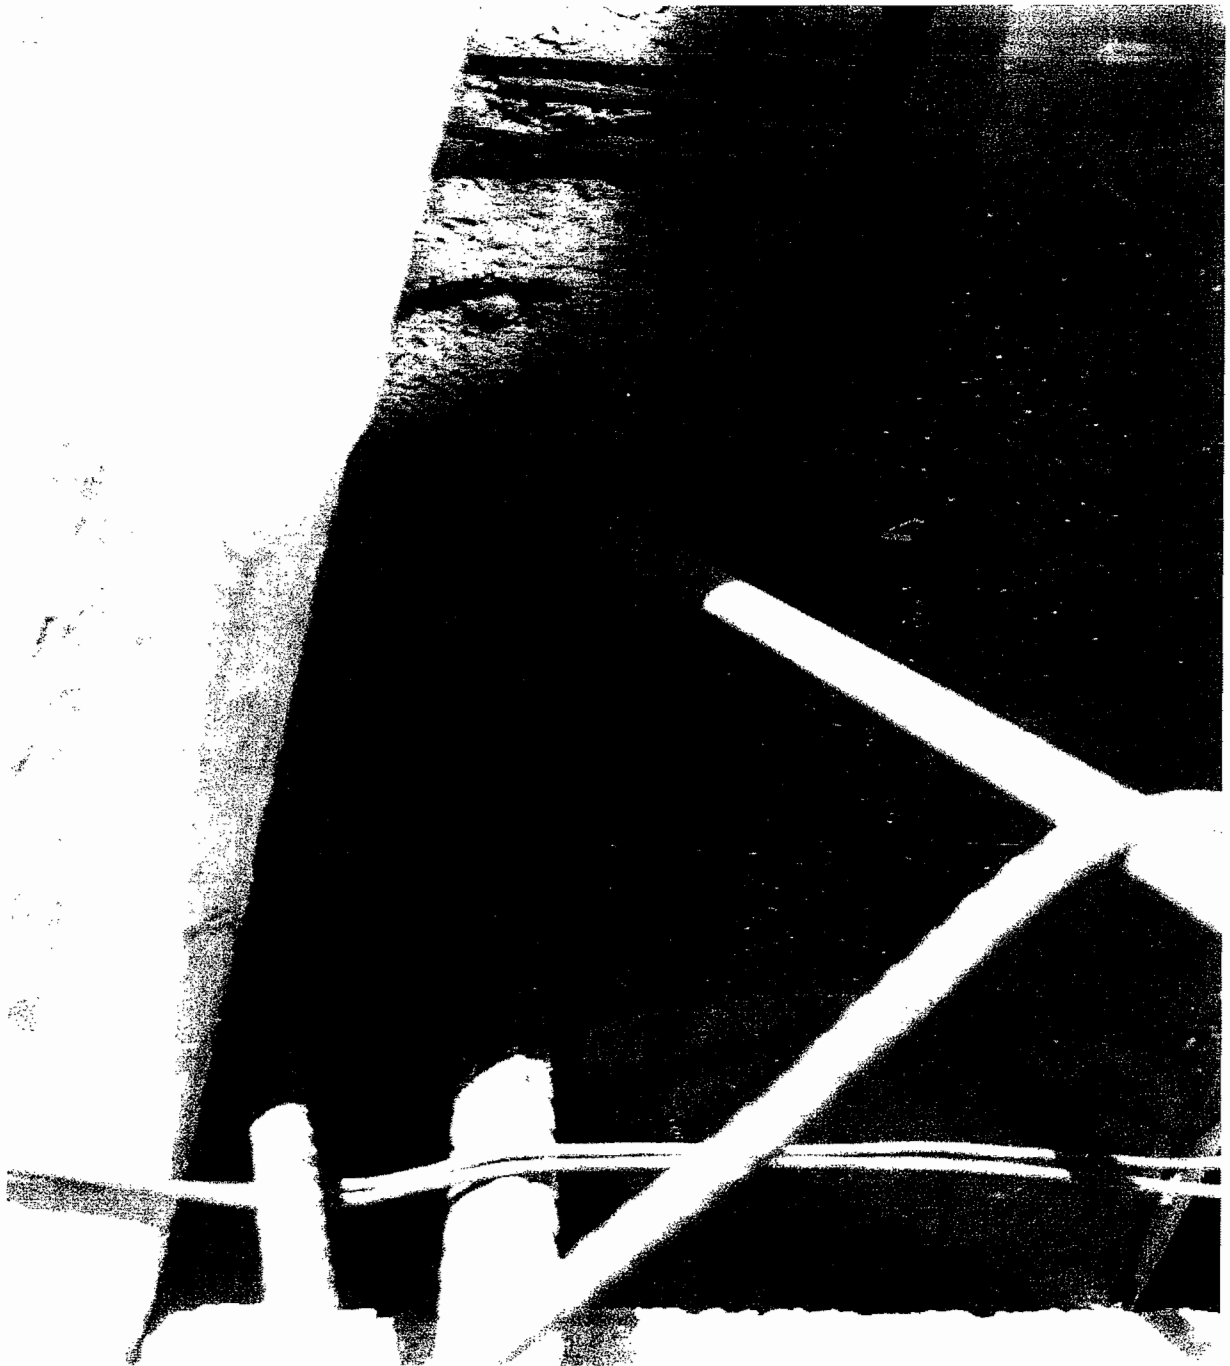

Every

Amurms



PRET

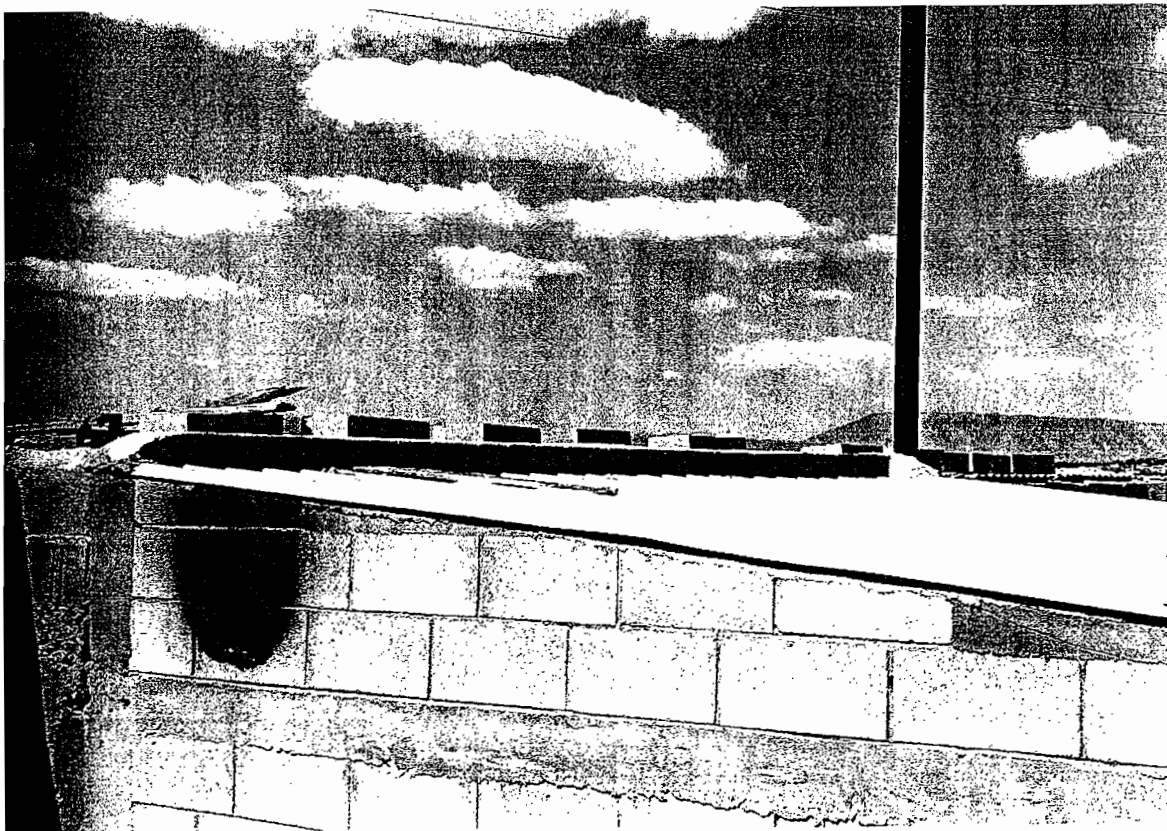

108


11111

BOT

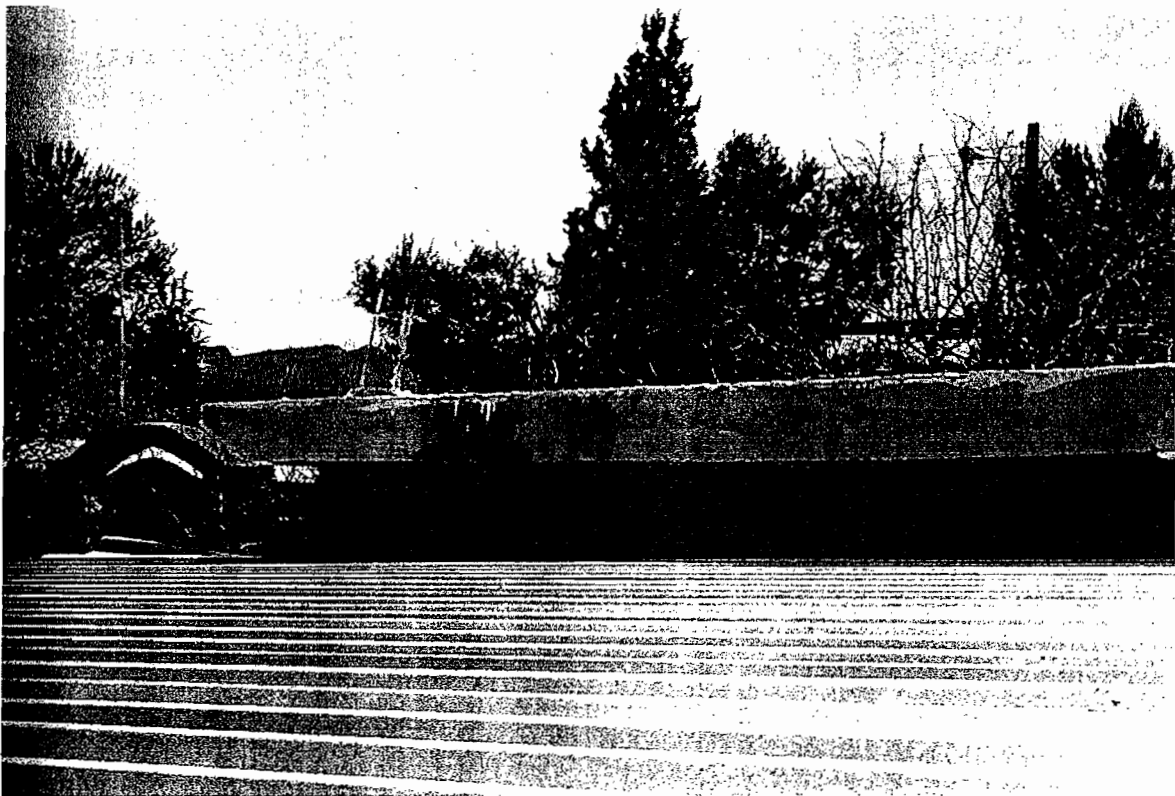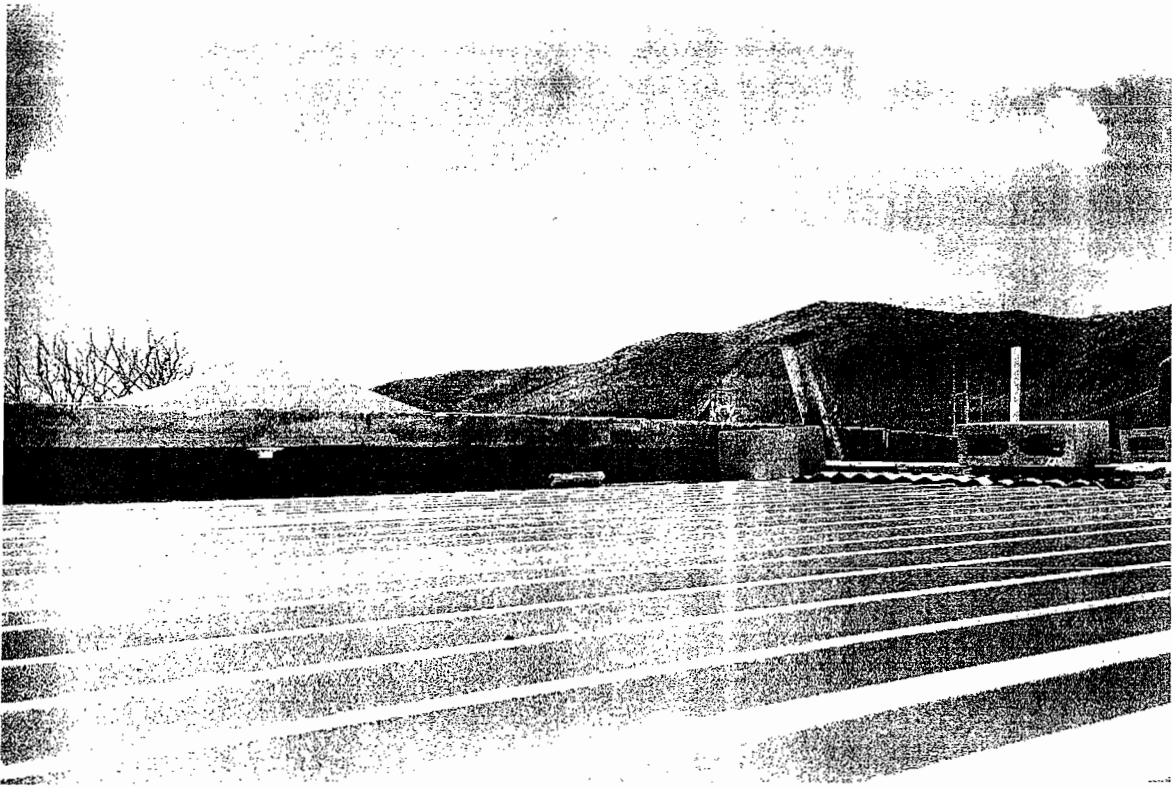


Final

to museum

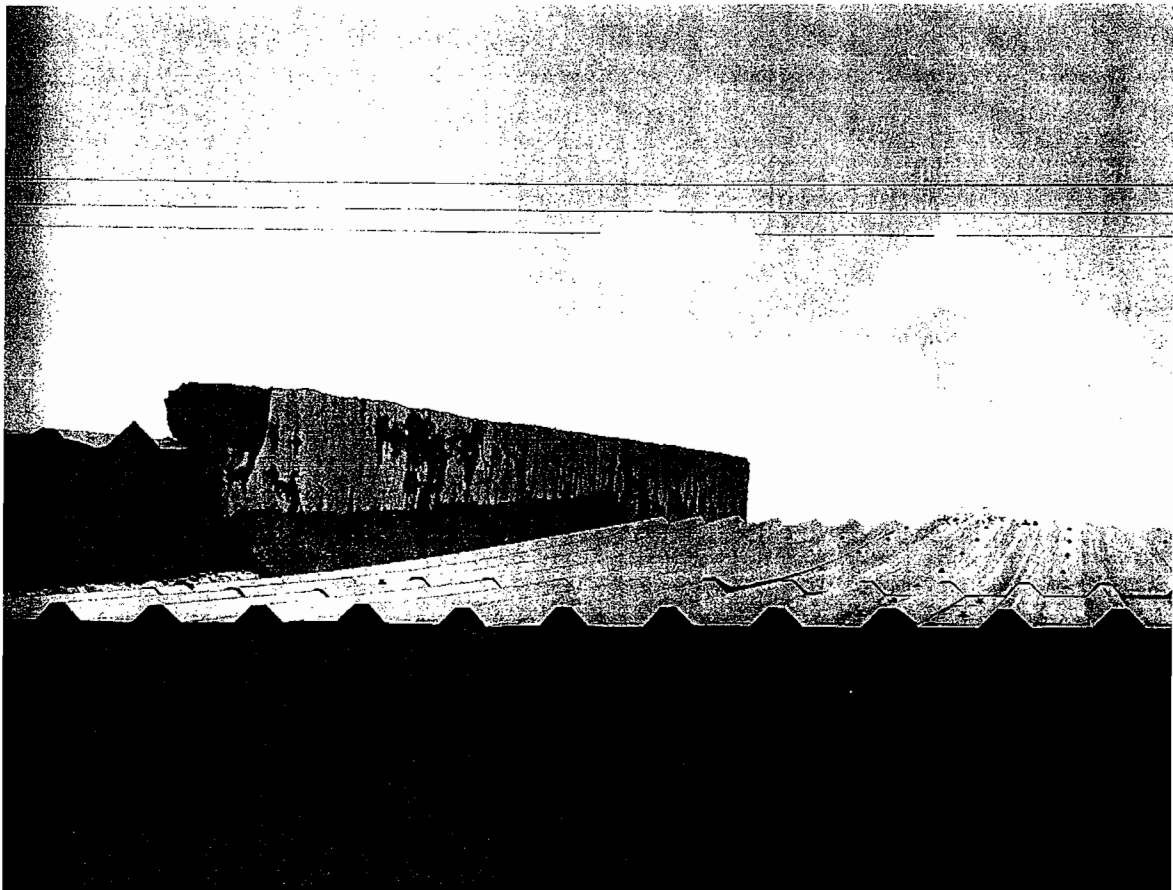

File

January 1968

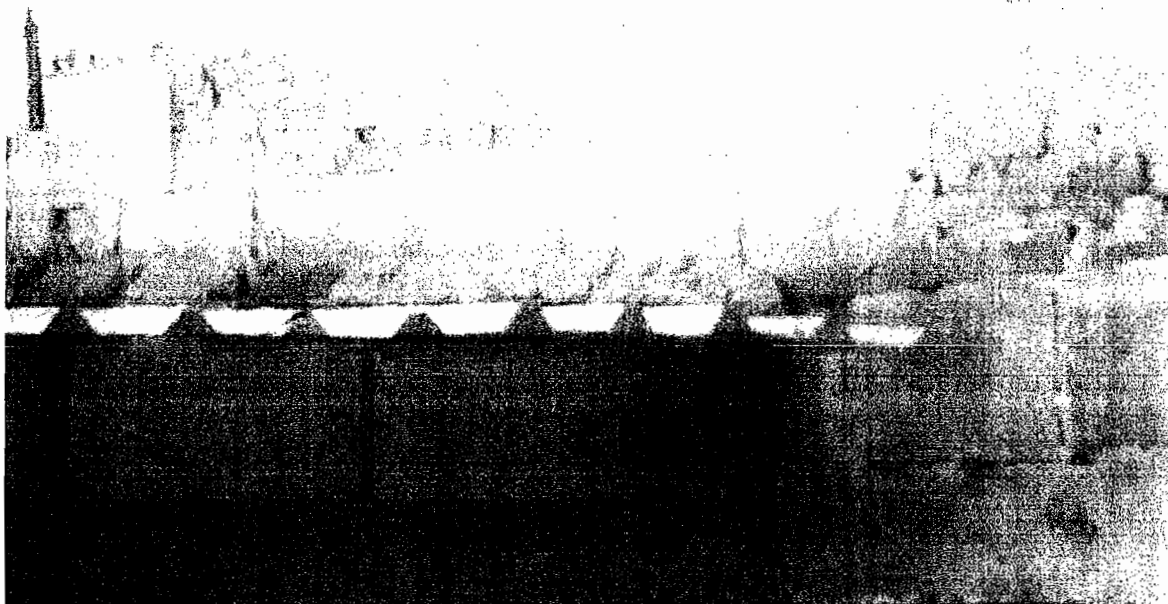

Good

10/11/11



Lowry

Sammons
