

92

ANDRES RICARDO ARZAGA URIBE

RFC Emisor : AAUA520126HZ9

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle 28 No. Exterior 5622 Colonia DALE Localidad CHIHUAHUA Referencia
ENTRE P. MEOQUI Y HACIENDA DEL TORREON Municipio CHIHUAHUA
Estado Chihuahua MEXICO CP. 31050

Sucursal :

RFC Receptor : MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Calle MINA No. Exterior 408 Colonia CENTRO Localidad CHIHUAHUA
Municipio CHIHUAHUA MEXICO CP. 31000

Folio Fiscal:

D6641011-65C3-429D-ACE7-EACCB1CFE4BB

No de Serie del CSD:

00001000000301587334

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CHIHUAHUA 2016-03-02T13:01:21

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

286

Régimen Fiscal:

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		CONSTRUCCION DE CUARTO ADOSADO DE 4.0 X 4.0 MTS. EN GRANJAS FAMILIARES SACRAMENTO ESTIMACION # 3 CONTRATO # 183/2015 AMORTIZACION DE CONTRATO \$ 2,427.10	5659.40	5659.40
1	N/A		Sancion por retraso 1% 375.21	0.00	0.00
1	N/A		Retencion del 0.2% D.I.F. 16.17	0.00	0.00
1	N/A		Retención del 0.2% I.C.I.C. 16.17	0.00	0.00
1	N/A		Retención del 0.2% C.M.I.C. 16.17	0.00	0.00
1	N/A		TOTAL DE RETENCIONES. 423.72	0.00	0.00
1	N/A		Neto a recibir \$ 6141.18	0.00	0.00

Motivo del Descuento:

Moneda:

Forma de Pago: UNA SOLA IDENTIFICACION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Tipo de cambio:

Subtotal: \$ 5,659.40

Impuestos Traslados

IVA 16.00% \$ 905.50

TOTAL \$ 6,564.90

ANDRES RICARDO ARZAGA URIBE

RFC Emisor : AAUA520126HZ9

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle 28 No. Exterior 5622 Colonia DALE Localidad CHIHUAHUA Referencia
ENTRE P. MEOQUI Y HACIENDA DEL TORREON Municipio CHIHUAHUA
Estado Chihuahua MEXICO CP. 31050

Sucursal :

RFC Receptor : MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Calle MINA No. Exterior 408 Colonia CENTRO Localidad CHIHUAHUA
Municipio CHIHUAHUA MEXICO CP. 31000

Folio Fiscal:

D6641011-65C3-429D-ACE7-EACCB1CFE4BB

No de Serie del CSD:

00001000000301587334

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CHIHUAHUA 2016-03-02T13:01:21

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

286

Régimen Fiscal:

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

Total con letra:

SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS, 90/100 MN

Sello digital del CFDI:

RCMX/au7vjPkrCoYqw0yv3wCmWGGtaA6AMGi4OAaP9Snq9T1UURK7Jucg5cKmc01NKAVsDPPhfC3zKyRtyY/mgiUpRFwRom4Q/cWhwNGnR62BG4k8GHhITJ6BReIZ4MEduUMTuB5
S0TUCIUxhZbcjnHlxOkUH7+88+oOZyItbuQ=

Sello del SAT:

CLOZL6f8/PLc5JvY88GM4irbq+U4hnfEEy8y1RLISYOU1zp1FGmYZX8SVVBM8WoE9udZ988BVobSw3wahMKGhMIAhHd0hZJDigYtL7JEMoS2euSiD5uCheQ2fi0XDpw
+vdtm8W3+UNJAIViOwdWUte/KLg4Ny+rTDivMDIRSMcs=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.0|D6641011-65C3-429D-ACE7-EACCB1CFE4BB|2016-03-02T13:11:25|
RCMX/au7vjPkrCoYqw0yv3wCmWGGtaA6AMGi4OAaP9Snq9T1UURK7Jucg5cKmc01NKAVsDPPhfC3zKyRtyY/mgiUpRFwRom4Q/cWhwNGnR62
BG4k8GHhITJ6BReIZ4MEduUMTuB5S0TUCIUxhZbcjnHlxOkUH7+88+oOZyItbuQ=|00001000000201748120|]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-03-02T13:11:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

AAUAS20126HZ9

ANDRES RICARDO ARZAGA URIBE

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

D6641011-65C3-429D-
ACE7-EACCB1CFE4BB

2016-03-02T13:01:21

2016-03-02T13:11:25

SAT970701NN3

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$6,564.90

ingreso

Vigente





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL 2015	CONTRATO No. 183/2015	CONTRATADO
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO ADOSADO DE 4.0 X 4.0 MTS. EN GRANJAS FAMILIARES SACRAMENTO	ESTIMACIÓN No. 3	837.978.01
	PERÍODO EJEC. 03 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 30 DE ENERO DEL 2016	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 9,380.34 CON IVA
CONTRATISTA: ING. ANDRES RICARDO ARZAGA URIBE	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 828,597.67 CON IVA
RFC AAUA 520126 HZ9	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 837,978.01 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>EXTRAORDINARIOS</u>	\$ 8,086.50	
<u>0.00</u>	\$ -	
<u>0.00</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 8,086.50

DESCUENTOS

1% SANCION POR RETRASO	\$	375.21
0.2% I.C.I.C.	\$	16.17
0.2% D.I.F.	\$	16.17
0.2% I.C.I.C.	\$	16.17
SUMA DESCUENTOS	\$	423.72

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$	8,086.50
AMORT ANTICIPO	\$	2,427.10
SUB-TOTAL	\$	5,659.40
I.V.A.	\$	905.50
TOTAL	\$	<u>6,564.90</u>

(CON LETRA)

(SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
90/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	423.72
SALDO NETO A RECIBIR	\$	6,141.18

AUTORIZO

ELABORO

ING. EVER GARCIA PALMA
RESIDENTE D.O.P.M

ING. ANDRES RICARDO ARZAGA URIBE
CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

ING. ENRIQUE FLORES MARQUEZ
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ING. EDMUNDO MELENDEZ LOPEZ
JEFE DEL DEPTO DE CONSERV. DE LA INFR. URBANA

Vo. Bo.

ARQ. JESUS ANTONIO PEÑA MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

CONTRATISTA:

OBRA:

CONTRATO:

FECHA DE TERMINO

CONTRATO

FECHA PRORROGA

TERMINACION REAL

DE OBRA

INTERES MENSUAL (I)

INTERES DIARIO (I)

ANDRES RICARDO ARZAGA URIBE

CONSTRUCCION DE CUARTO ADOSADO DE 4.0 X 4.0 MT.

EN GRANJAS FAMILIARES SACRAMENTO

183/2015

02-Oct-15

30-Ene-16

1.00%

0.0333%

TIEMPO DE
SANCION (T)

120

DIAS

**CALCULO DE RETENCION/SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA
DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA TERCERA DEL CONTRATO**

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
1	ESTIMACION # 3				8,086.50
2					0.00
3					0.00
4					0.00
IMPORTE POR SANCIONAR (IMP)					8,086.50
IMPORTE DE SANCION (IMP) * (I) * (T)					323.46
16 % IVA					51.75
TOTAL DE SANCION					375.21

CHIHUAHUA, CHIH.,

30 DE ENERO DEL 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 6,141.18
(SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 3 CONTRATO No. 183/2015 POR LA CANTIDAD DE : \$ 837,982.44 INCLUYE CONVENIO
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE CUARTO ADOSADO DE 4.0 X 4.0 MTS, EN GRANJAS FAMILIARES SACRAMENTO

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	8,086.50
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	2,427.10
	SUBTOTAL	\$	5,659.40
	IVA	\$	905.50
	TOTAL	\$	6,564.90
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
RETENCION POR RETRASO 1%	375.21		
D.I.F. DEL 0.2%	16.17		
I.C.I.C. DEL 0.2%	16.17		
CMIC. DEL 0.2%	16.17		
SUMA	423.73		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 837,982.44
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 828,597.66
ESTA ESTIMACION	\$ 9,380.34
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 837,978.01
POR EJERCER	\$ 4.43

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 251,394.74
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 248,579.30
ESTA ESTIMACION	\$ 2,815.44
ACUMULADO ACTUAL	\$ 251,394.74
POR AMORTIZAR	\$ 0.00

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% C.M.I.C.	0.2% I.C.I.C.	0.2% D.I.F.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 784.09	\$ 784.09	\$ 784.09
ESTA ESTIMACION	\$ 16.17	\$ 16.17	\$ 16.17
ACUMULADO ACTUAL	\$ 800.26	\$ 800.26	\$ 800.26

R E C I B I M O S


ING. ANDRES RICARDO ARZAGA URIBE
AAUA 520126 HZ9

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO ADOSADO DE 4.0 X 4.0 MTS, EN GRANJAS FAMILIARES SACRAMENTO

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

No. CONTRATO: 183/2015

ESTIMACIÓN No. 3

CONTRATISTA: ING. ANDRES RICARDO ARZAGA URIBE

PERÍODO: DEL 03 DE OCTUBRE AL 30 DE ENERO DEL 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

EXTRAORDINARIOS


8,086.50

SUBTOTAL	8,086.50
I.V.A.	1,293.84
TOTAL	9,380.34

POR EL CONTRATISTA


ING. ANDRES R. ARZAGA URIBE

POR EL REPRESENTANTE DE D.O.P.M


ING. EVER GARFIO PALMA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO ADOSADO DE 4.0 X 4.0 MTS. EN GRANJAS FAMILIARES SACRAMENTO

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

No. CONTRATO: 183/2015

CONTRATISTA:

ING. ANDRES RICARDO ARZAGA URIBE

ESTIMACIÓN No. 3

PERIODO: del 03 de Oct. 2015 al 30 de Enero del 2016


No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR		
OBRA EXTRAORDINARIA							
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS							
1.00	AMARRES A CONSTRUCCION EXISTENTE, INCLUYE: DEMOLICION PARA DESCUBRIR VARILLA Y AMARRARSE A CASTILLOS Y DALA Amarre DE CONSTRUCCION NUEVA		96.00	96.00	0.00	43.4890 \$	4,174.94
2.00	BOTAGUAS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X15 CMS.	ml	72.00	72.00	0.00	34.4500 \$	2,480.40
3.00	PRETIL DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2, SECCION DE 15X20 cms, INCLUYE ARMADO, CIMBRA Y COLADO	ml	8.00	8.00	0.00	178.8950 \$	1,431.16
							\$ 8,086.50
							8,086.50
							4,174.94
							2,480.40
							1,431.16
							\$ 8,086.50
							IVA \$ 1,293.84
							TOTAL \$ 9,380.34

POR EL CONTRATISTA



ING. ANDRES R. ARZAGA URIBE

POR EL REPRESENTANTE DE D.O.P.M




ING. EVER GARFIO PALMA

Pag 1 de 1

GENERADOR DE ESTIMACION


CONTRATO:									
OBRA : CONSTRUCCION DE CUARTO ADOSADO DE 4.0 X 4.0 MTS, EN GRANJAS FAMILIARES SACRAMENTO					CONTRATISTA: ING. ANDRES RICARDO ARZAGA URIBE				
No DE ESTIMACION: 3 PERIODO : del 03 de Oct. 2015 al 30 de Enero del 2016									
CLAVE	CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR	Unidad		
		Longitud	ancho	altura cant.					
1.-	AMARRES A CONSTRUCCION EXISTENTE, INCLUYE: DEMOLICION PARA DESCUBRIR VARILLA Y AMARRARSE A CASTILLOS Y DALA DE CONSTRUCCION NUEVA					96.00	AMARRES		
2.-	BOTAGUAS DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 15X15 CMS.					72.00	ML		
3.-	PRETIL DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, SECCION DE 15X20 CMS, INCLUYE ARMADO, CIMBRA Y COLADO					8.00	ML		
	Pretil			8		8.00	ml		

POR EL CONTRATISTA

 ING. ANDRES R. ARZAGA URIBE

POR EL RESIDENTE

 ING. EVER GARFIO PALMA


AMARRES A CONSTRUCCION EXISTENTE, EN CASAS 1 A LA 18



Lucy

Amurms



PRET

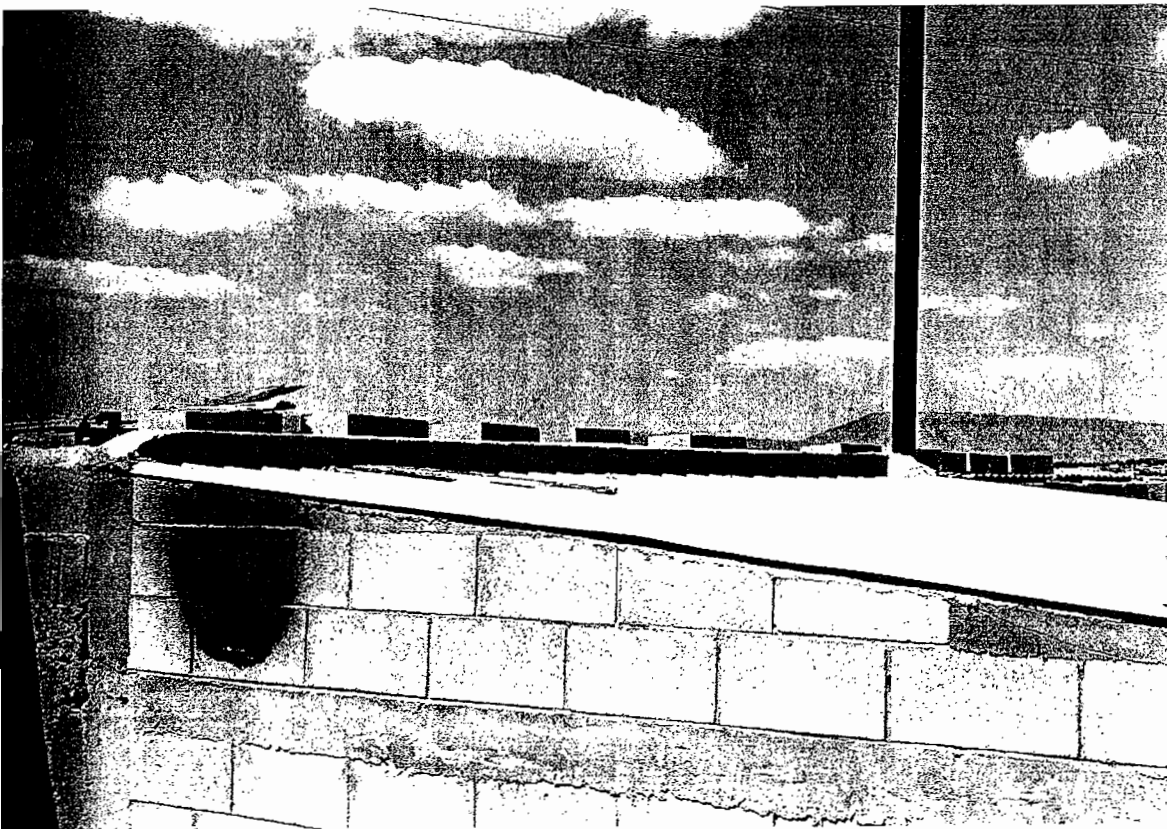

10/10/11


10/10/11

BOT

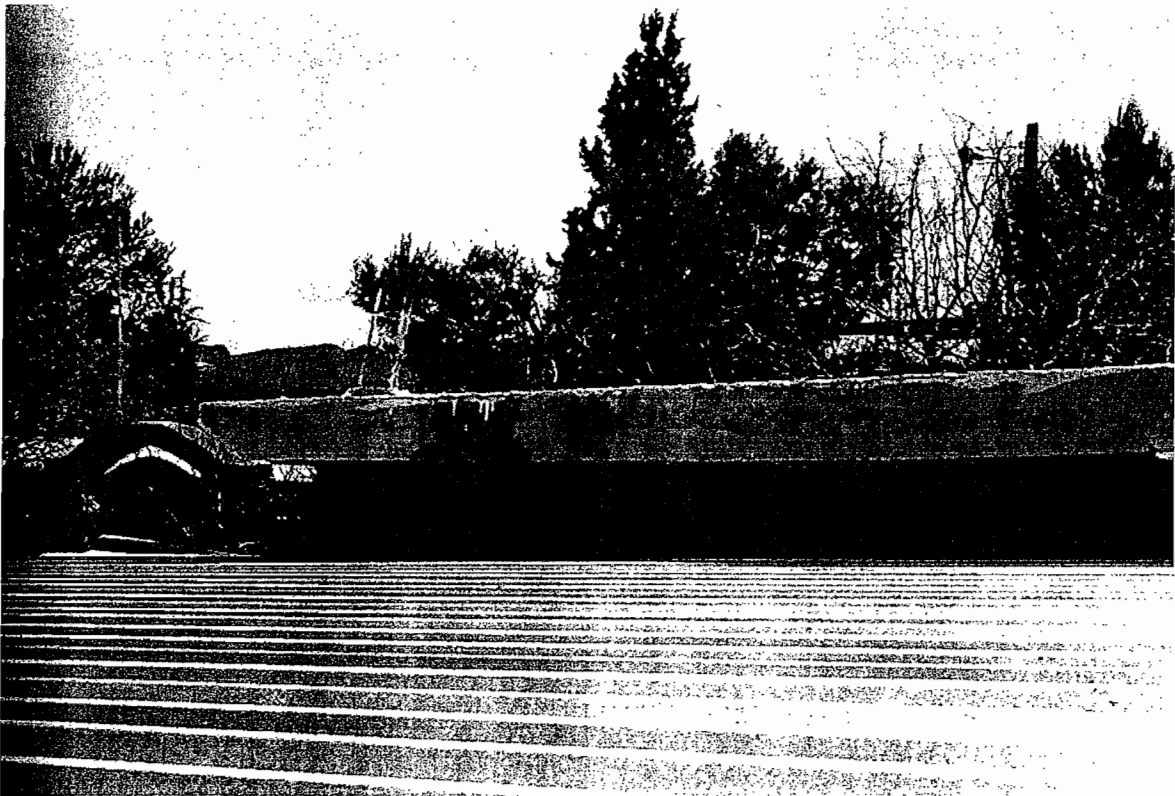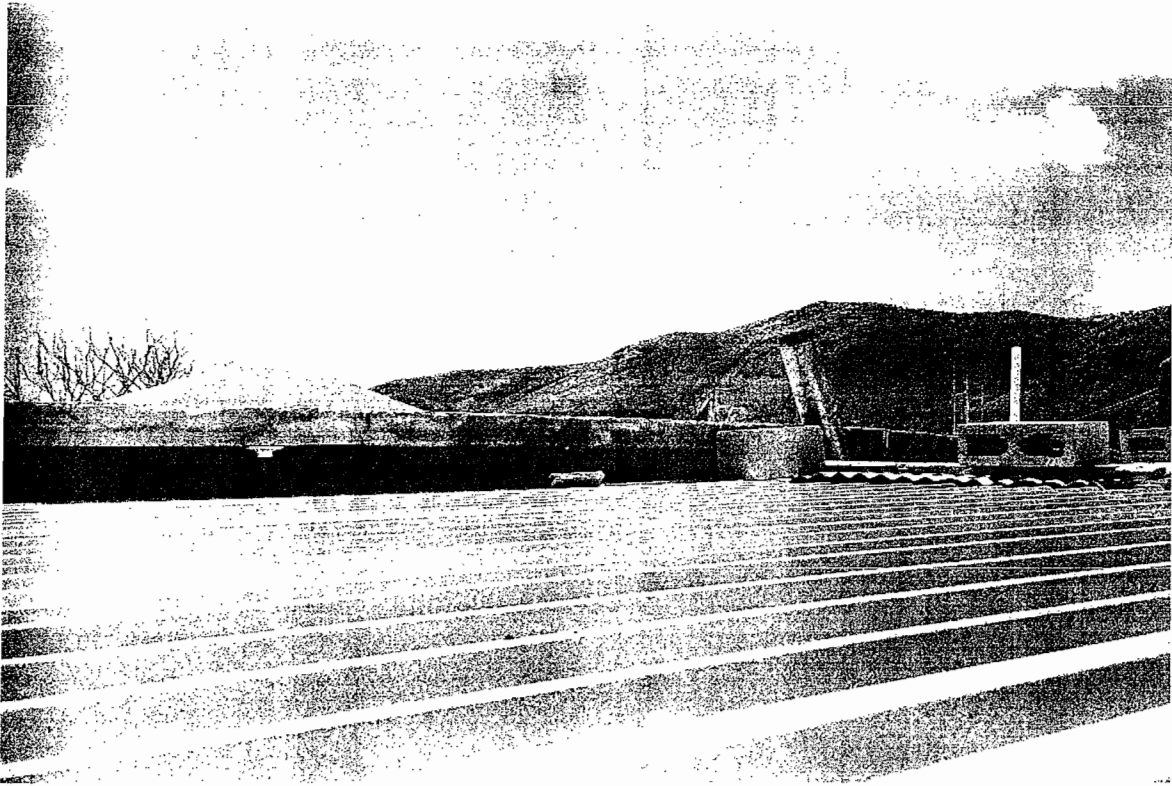


Chap

to museum

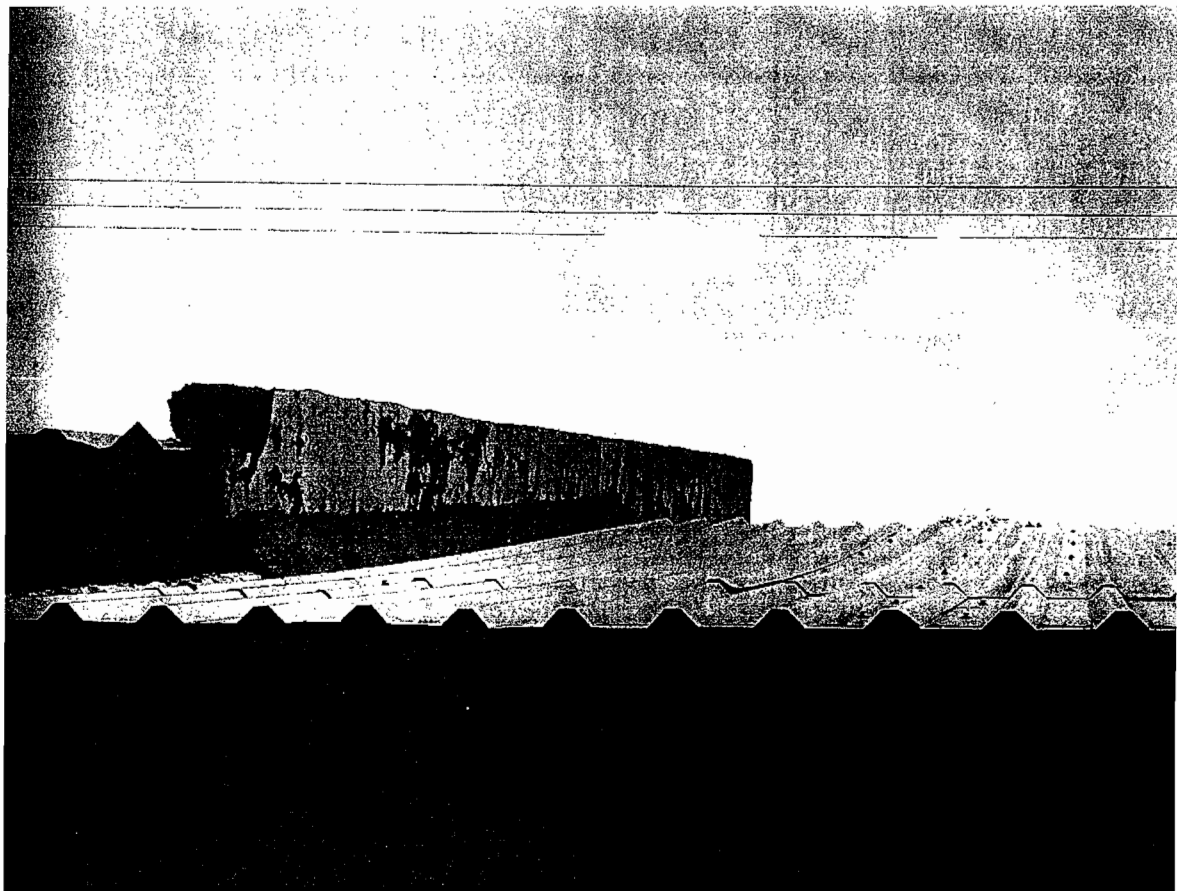


Fig

January 1968

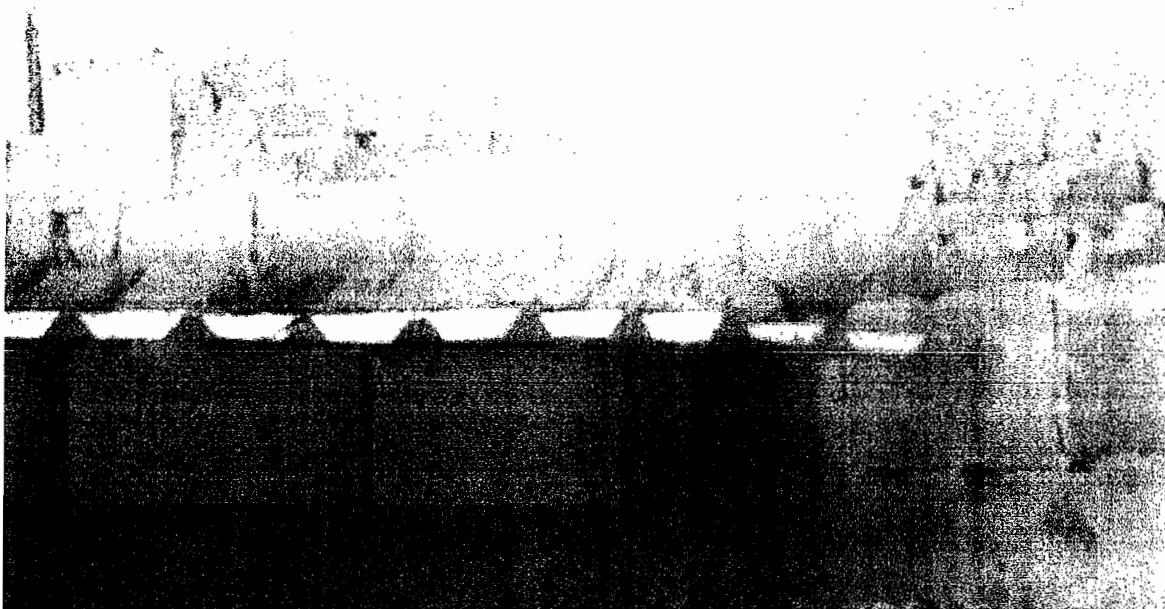

Good

11/11/11



Swartz

Sammons
