

CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
R.F.C. CIC040415AC0
LATERAL DEL PERIFERICO DE LA JUVENTUD No. 2901 LOMAS ALTAS, 31207
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México
Tel. y Fax (614) 4-233000 y 4-233033

Cliente:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Colonia:	CENTRO	C.P.:	31000
R.F.C.:	MCI651010V22	Estado:	CHIHUAHUA	País:	MEXICO
Domicilio:	MINA No. 408				
Teléfono:					
Ciudad:	CHIHUAHUA				

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	IVA	Importe
1.00	No aplica	ESTIMACION No UNO (UNICA) DE OBRA ELECTROMECANICA EN LINEA DE SUBESTACION DE 115 KV DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECA SEGUN CONTRATO No 190/2016	2,216,169.89	354,587.18	2,216,169.89
1.00	ANTICIPO	AMORTIZACION DE ANTICIPO	-940,883.61	-150,541.38	-940,883.61

Importe con letra:	SUBTOTAL	1,275,286.28
UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 08/100 M.N.	IVA	204,045.80
	TOTAL	1,479,332.08

Observaciones:

CMIC DE 0.2% \$4,432.34
ICIC DEL 0.2% \$4,432.34
DIF DEL 0.2% \$4,432.34
SUMA \$13,297.02
NETO A RECIBIR \$1,466,035.06



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000400292081
Folio fiscal:	6AB0552E-11A6-4877-9744-12176142D5C4
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 6 2016 - 15:56:48

Sello digital del CFDI

WNjBnI+2JrSVucQxAlZ9hfrN2VuR+501Cc8sTINNb4Jo4SJUTPveSFNZB3fm0B7a4oZFKIO/ITEbs+ZJUPd9rJHartXoURaWsf
iXdDd6eLGHhUkZrlyc8whUXMjteiBz/JAUt6DpAD53UJT03wqCQMhZQh/w2wcfPHK6Z4ldV2BtuRKJZ+BZXiHRnY7wwM94niVv5Q
vu+ha5uB7CrW9vPdO4QI2v9V026Xb63xAk00BJVawpQalJsvGps0zP5c3MtsR9cnxvAmWL84IK1jzUmVVK9uk3s2qPDMUZVwPn
X/SHdhbyBwDm3cJK3yAXGgw/WPpprqeSj2M7rNH8IQ==

Sello del SAT

WCpa5420JKKrQUdohW5vzOxViedzyIXlq7ZZs/HyX00nZ1YiwHXYKc1jD25pnTomogxEEpHVIWzgDSPA9Udgd3SUVQksUOcB8b
cykn1z3rk0JbeHemHCqPbMS8dxl13BTi51dLOIYvoYKf7IMZYA4ScJB4563nSSjK4Rzk01k=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6AB0552E-11A6-4877-9744-12176142D5C4|2016-12-06T15:56:48|WNjBnI+2JrSVucQxAlZ9hfrN2VuR+501Cc8s
TINNb4Jo4SJUTPveSFNZB3fm0B7a4oZFKIO/ITEbs+ZJUPd9rJHartXoURaWsf5FiXdDd6eLGHhUkZrlyc8whUXMjteiBz/JAUt6D
pAD53UJT03wqCQMhZQh/w2wcfPHK6Z4ldV2BtuRKJZ+BZXiHRnY7wwM94niVv5Qvu+ha5uB7CrW9vPdO4QI2v9V026Xb63xAk00
BJVawpQalJsvGps0zP5c3MtsR9cnxvAmWL84IK1jzUmVVK9uk3s2qPDMUZVwPnX/SHdhbyBwDm3cJK3yAXGgw/WPpprqeSj2M7r
NH8IQ==|00001000000202864883|

LUGAR DE EXPEDICIÓN

LATERAL DEL PERIFERICO DE LA JUVENTUD 2901, LOMAS ALTAS, 31207 Chihuahua,
Chihuahua, Chihuahua, México
99

METODO DE PAGO

NÚMERO DE CUENTA

PAGO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SANTANDER PESOS

Cuenta de 014150920000873981

pago

SCOTIABANK PESOS

Cuenta de 044150215043477061

pago

SANTANDER DÓLARES

Cuenta de 014150825002602598

pago

SCOTIABANK DÓLARES

Cuenta de

pago

[Handwritten signature]



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT


Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

CIC040415AC0

Folio Fiscal

6AB0552E-11A6-4877-9744-
12176142D5C4

Total del CFDI

\$1,479,332.08

Nombre o Razón Social del Emisor

CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y
COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

Fecha de Expedición

2016-12-06T14:56:43

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-12-06T15:56:48

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Soc'
Receptor

MUNICIPIO DE CHIH

PAC que Certi

MAS0810247C0

Imprimir



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA:	DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No.	190/2016	CONTRATADOS
OBRA:	OBRA ELECTROMECÁNICA EN LÍNEA DE SUBESTACIÓN DE 115 KV DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA	ESTIMACIÓN No.	1 (ÚNICA)	\$ 2,728,562.47 CON IVA
		PERÍODO EJEC.	23 SEPTIEMBRE AL 09 OCTUBRE	
UBICACIÓN:	DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA, CHIHUAHUA, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$	2,570,757.07 CON IVA
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$	-
RFC	CIC-040415-AC0	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$	2,570,757.07 CON IVA

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	<u>NORMALES</u>	\$ 170,087.36	
	<u>EXCEDENTES</u>	\$ 44,648.51	
	<u>EXTRAS</u>	\$ 2,001,434.02	
	IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 2,216,169.89	

DESCUENTOS

0.2% C.M.I.C.	\$	4,432.34
0.2% I.C.I.C.	\$	4,432.34
0.2% DIF	\$	4,432.34
SUMA DESCUENTOS	\$	13,297.02

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$	2,216,169.89
AMORT ANTICIPO	\$	940,883.61
SUB-TOTAL	\$	1,275,286.28
I.V.A.	\$	204,045.80
TOTAL	\$	1,479,332.08

(CON LETRA)

(UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 8/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	13,297.02
SALDO NETO A RECIBIR	\$	1,466,035.06

AUTORIZO

ELABORO

ING. ROBERTO ARMENDÁRIZ
RESIDENTE D.O.P.M

CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO
SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E
INFRAESTRUCTURA

ING. ENRIQUE TORREAL ALEMÁN
JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.

Vo. Bo.

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CHIHUAHUA, CHIH.,

9 de octubre de 2016

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD D \$ 1,466,035.06
(UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CINCO PESOS 6/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 (ÚNICA) CONTRATO No. 190/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 2,728,562.47
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 47/100 POR TRABAJOS EN LA OBRA:
OBRA ELECTROMECÁNICA EN LÍNEA DE SUBESTACIÓN DE 115 KV DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	2,216,169.89
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	940,883.61
	SUBTOTAL	\$	1,275,286.28
	IVA	\$	204,045.80
	TOTAL	\$	1,479,332.08
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
I.C.I.C. DEL 0.2%	4,432.34		
C.M.I.C. DEL 0.2%	4,432.34		
D.I.F. DEL 0.2%	4,432.34		
SUMA	13,297.02		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 2,728,562.47
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 2,570,757.07
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 2,570,757.07
POR EJERCER	\$ 157,805.40

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 1,091,424.99
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 1,091,424.99
ACUMULADO ACTUAL	\$ 1,091,424.99
POR AMORTIZAR	\$ 0.00

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% D.I.F.	0.2% I.C.I.C.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 4,432.34	\$ 4,432.34	\$ 4,432.34
ACUMULADO ACTUAL	\$ 4,432.34	\$ 4,432.34	\$ 4,432.34

R E C I B I M O S

CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
CIC-040415-AC0

CONTRATIST, CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y COMUNICACIONES, S./ PERÍODO: 23 SEPTIEMBRE AL 09 OCTUBRE

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
<u>NORMALES</u>		
1	OBRA ELECTROMECÁNICA	\$ 170,087.36
		170,087.36
<u>EXCEDENTES</u>		
		\$ 44,648.51
<u>EXTRAS</u>		
		\$ 2,001,434.02
SUBTOTAL		2,216,169.89
I.V.A.		354,587.18
TOTAL		2,570,757.07

POR EL CONTRATISTA
(RESPONSABLE)

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
(RESIDENTE)

No.	CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		

OBRA NORMAL

1	OBRA ELECTROMECÁNICA						\$	170,087.36
1.06	Tendido y tensionado de cable de guarda (uno o dos hilos), incluye: herrajes, cable de guarda y elementos de sujeción.	KM/L	0.41	0.41	0.00	0.41	\$ 35,216.49	\$ 14,438.76
1.07	Tendido y tensionado de cable conductor ACSR 477 3 fases (un hilo por fase), incluye: cables ACSR 477, herrajes, aislamiento y elementos de sujeción.	KM/L	0.41	0.41	0.00	0.41	\$ 308,223.62	\$ 126,371.68
1.08	Lectura y registro de valores de resistencia al pie de la estructura, incluye: electrodos bañados en cobre, conectores, cable bañado en cobre, pruebas.	estr.	5.00	4.00	0.00	4.00	\$ 4,717.96	\$ 18,871.84
1.09	Detallado de la línea y suministro e instalación de placas de identificación de estructuras.	estr.	5.00	4.00	0.00	4.00	\$ 2,601.27	\$ 10,405.08
								44,648.51

OBRA EXCEDENTE

1.06	Tendido y tensionado de cable de guarda (uno o dos hilos), incluye: herrajes, cable de guarda y elementos de sujeción.	KM/L	0.41	0.54	0.41	0.13	\$ 35,216.49	\$ 4,578.14
1.07	Tendido y tensionado de cable conductor ACSR 477 3 fases (un hilo por fase), incluye: cables ACSR 477, herrajes, aislamiento y elementos de sujeción.	KM/L	0.41	0.54	0.41	0.13	\$ 308,223.62	\$ 40,070.37

OBRA EXTRAORDINARIA

EXT-01	Suministro, montaje y vestido de estructura de acero troncocónico de remate tipo 1219 DMPL (tipo lindero), incluye: carga y acarreo de almacén, descarga de todas las piezas de al pie de la cimentación, el ensamble de la misma, el montaje con grúa de capacidad adecuada en la cimentación de concreto construida para ésta, así como la instalación de las cadenas de aislamiento y sistema anti caídas y el suministro e instalación de herrajes de sujeción.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 588,574.25	\$ 588,574.25
--------	---	-----	------	------	------	------	---------------	---------------

2,001,434.02

POR EL CONTRATISTA

ING. RAYMUNDO MEZA CUEVAS

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ.

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO	
EXT-02	Suministro, montaje y vestido de estructura de acero troncoconico de remate tipo 1211 DC, incluye: carga y acarreo de almacén, descarga de todas las piezas de al pie de la cimentación, el ensamble de la misma, el montaje con grúa de capacidad adecuada en la cimentación de concreto construida para ésta, así como la instalación de las cadenas de aislamiento y sistema anti caldas y el suministro e instalación de herrajes de sujeción.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00 \$ 229,090.17	229,090.17
EXT-03	Suministro, montaje y vestido de estructura de acero troncoconico de remate tipo 1216 DMPL (tipo linder), incluye: carga y acarreo de almacén, descarga de todas las piezas de al pie de la cimentación, el ensamble de la misma, el montaje con grúa de capacidad adecuada en la cimentación de concreto construida para ésta, así como la instalación de las cadenas de aislamiento y sistema anti caldas y el suministro e instalación de herrajes de sujeción.	pza	2.00	2.00	0.00	2.00 \$ 542,102.23	1,084,204.46
EXT-04	Retiro de estructura que quedara fuera de operación (estructura H de concreto).	lte.	1.00	1.00	0.00	1.00 \$ 99,565.14	99,565.14


ING. RAYMUNDO MEZA CUEVAS

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ.

HOJA 1 / 8

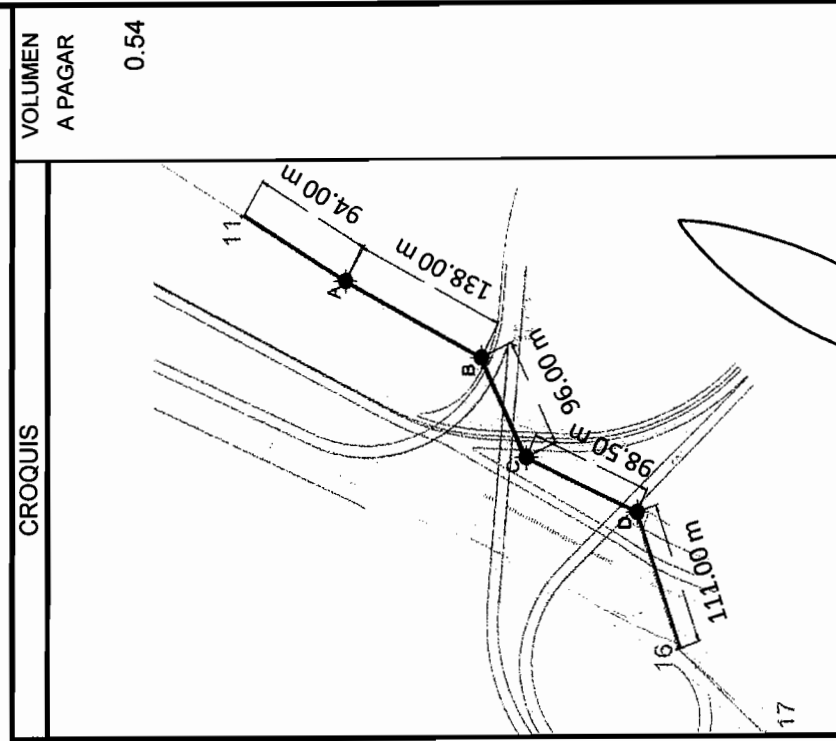[illegible]

~~RESIDENTE D.O.P.M.
ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ~~

CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y COMUNICACIONES,
S.A. DE C.V.




HOJA 218

No DE ESTIMACION: 1 PERIODO : 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
	0.54

CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y COMUNICACIONES,
S.A. DE C.V.

~~RESIDENTE D.O.P.M.
ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ~~

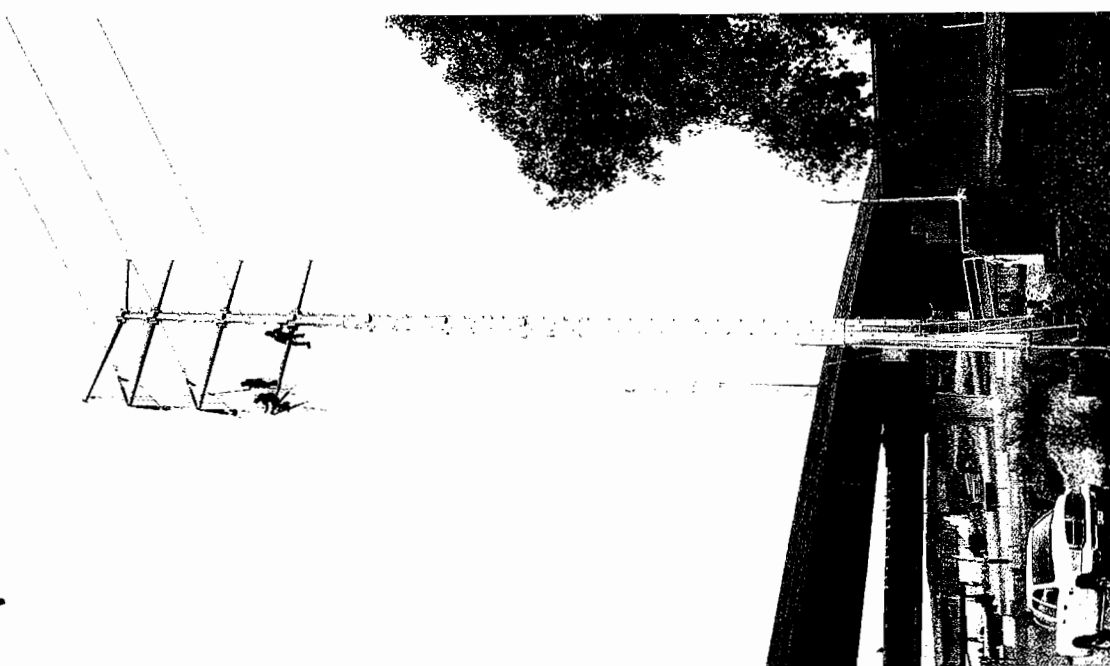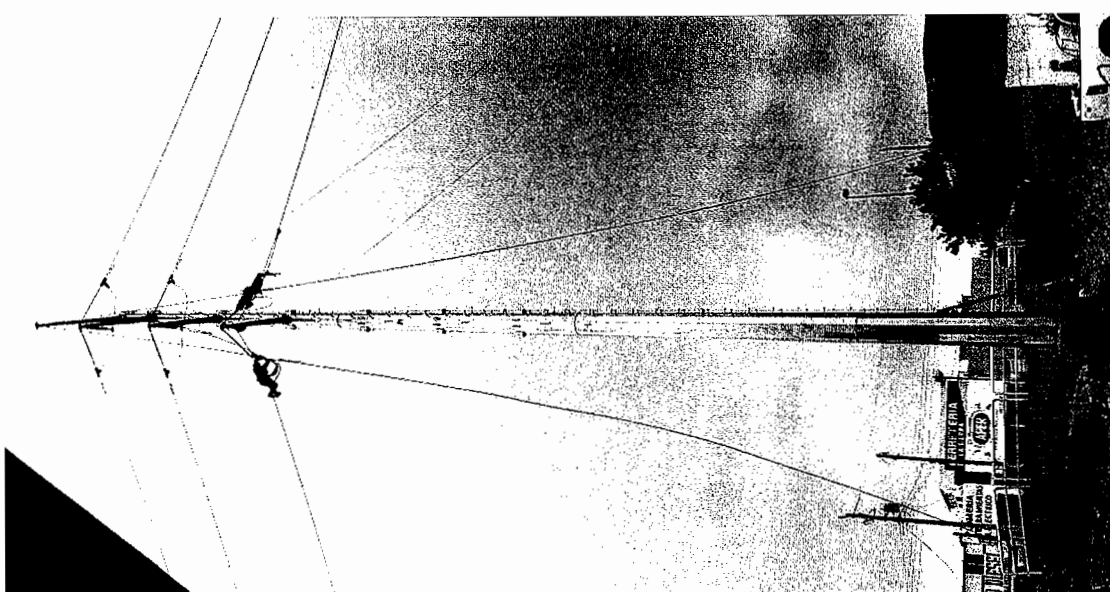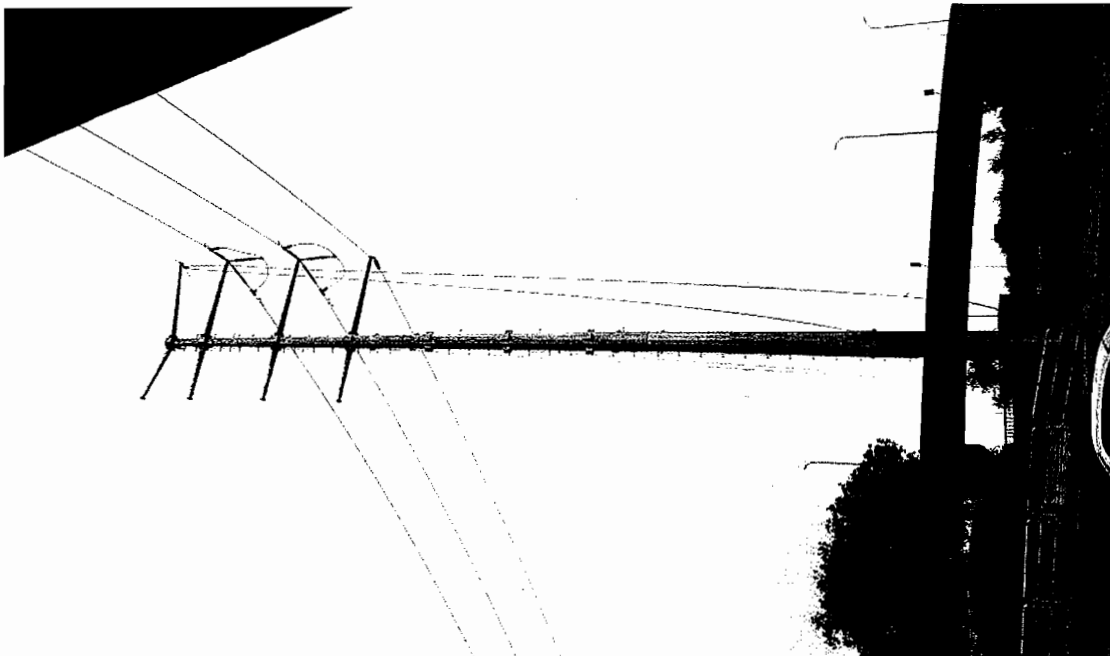

TENDIDO Y TENSIONADO DE HILO DE GUARDA Y CONDUCTOR.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

HOJA 3 / 8

TRAMO: TODOS

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.


**VOLUMEN
A PAGAR**

OPERACIONES ARITMETICAS

ESTR.


4.00

ESTR.

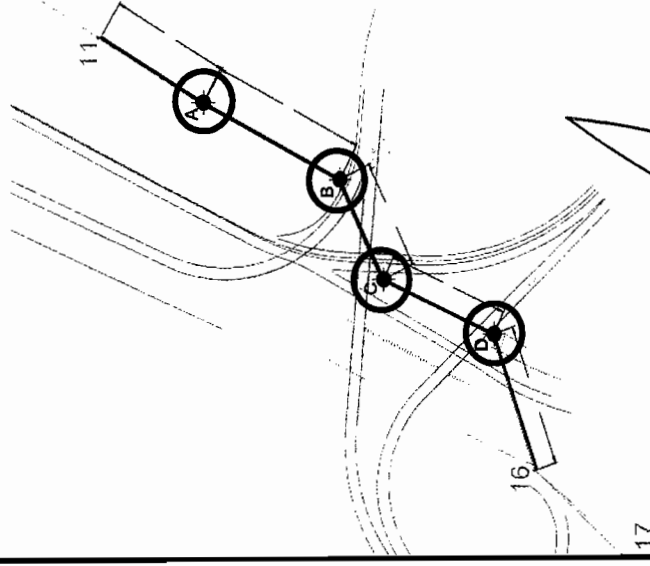


~~CONTRATISTA~~

**CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y COMUNICACIONES,
S.A. DE C.V.**



LECTURA RESISTENCIA A TIERRA POSTE 1211DC

Registro de Resistencia de Tierra Física		
Poste	Nomenclatura	Resistencia
A	1211 DC	2.31 Ω
B	1216 DMPL	1.77 Ω
C	1216 DMPL	0.42 Ω
D	1219 DMPL	0.85 Ω

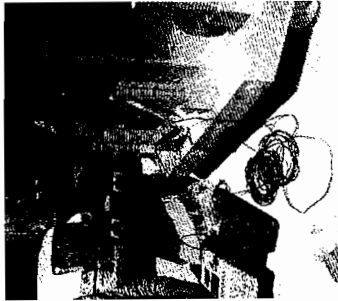


LECTURA RESISTENCIA A TIERRA POSTE 1219DMPL



LECTURA RESISTENCIA A
TIERRA POSTE 1216DMPL



LECTURA RESISTENCIA A TIERRA POSTE 1216 DMPL

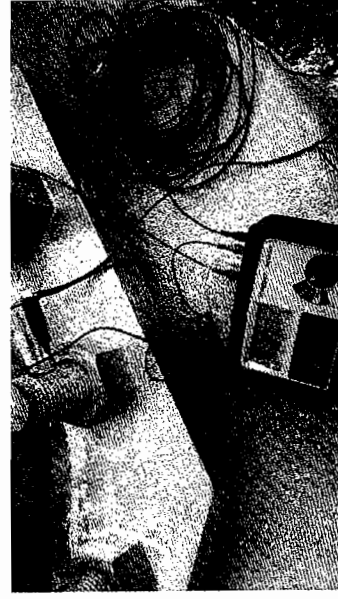


PRUEBAS DE RESISTENCIA A TIERRA SATISFACTORIAS.

HOJA 4 / 8

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y COMUNICACIONES,
S.A. DE C.V.

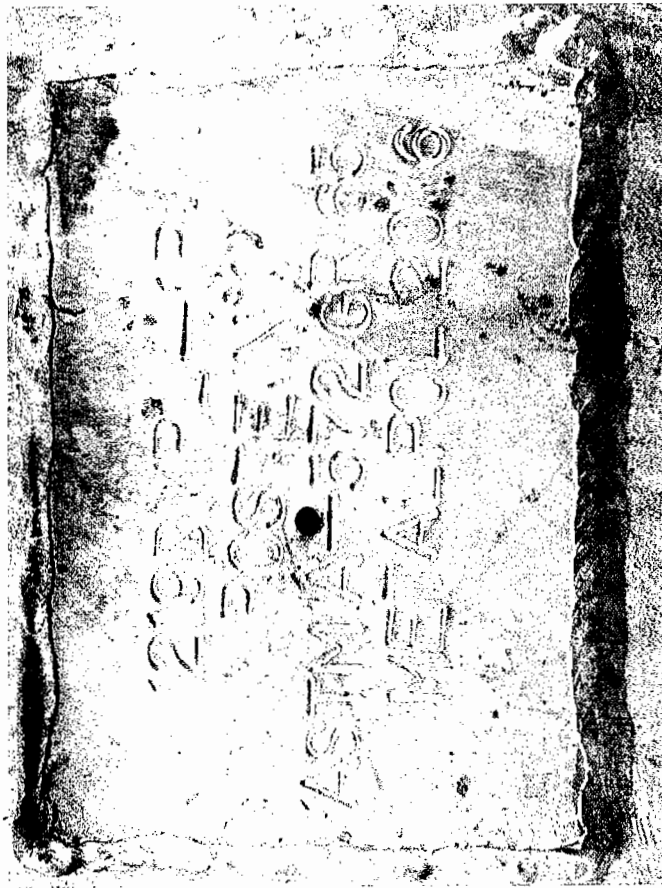


PLACAS DE IDENTIFICACION DE POSTES TRONCOCONICOS INSTALADOS

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 190/2016		TRAMO: TODOS	
OBRA : OBRA ELECTROMECÁNICA EN LÍNEA DE SUBESTACIÓN DE 115 KV		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	
DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA			

No DE ESTIMACION: 1	PERIODO : 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE
---------------------	---

CONCEPTO:	EXTRA-01	OPERACIONES ARITMETICAS
Suministro, montaje y vestido de estructura de acero troncocónico de remate tipo 1219 DMPL (tipo linderero), incluye: carga y acarreo de almacén, descarga de todas las piezas de al pie de la cimentación, el ensamble de la misma, el montaje con grúa de capacidad adecuada en la cimentación de concreto construida para ésta, así como la instalación de las cadenas de aislamiento y sistema anti caídas y el suministro e instalación de herrajes de sujeción.	1.00	PZA
		POSTE D

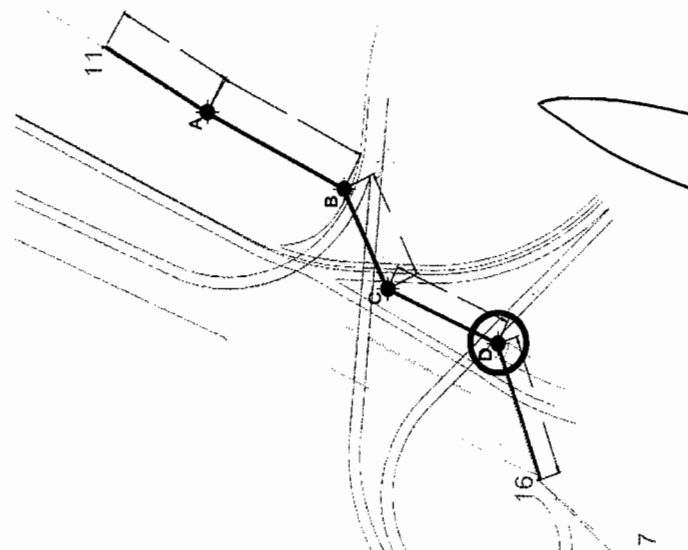CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
	1.00


RESIDENTE D.O.P.M.
ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ

CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y COMUNICACIONES,
S.A. DE C.V.

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 6 / 8

CONTRATO : 1901/2016	TRAMO: TODOS
OBRA : OBRA ELECTROMECÁNICA EN LÍNEA DE SUBESTACIÓN DE 115 KV DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

No DE ESTIMACION: 1	PERIODO : 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE
CONCEPTO: EXTRA-02	OPERACIONES ARITMETICAS
Suministro, montaje y vestido de estructura de acero troncocónico de remate tipo 1211 DC, incluye: carga y acarreo de almacén, descarga de todas las piezas de al pie de la cimentación, el ensamble de la misma, el montaje con grúa de capacidad adecuada en la cimentación de concreto construida para ésta, así como la instalación de las cadenas de aislamiento y sistema anti caídas y el suministro e instalación de herrajes de sujeción.	1.00 PZA
	POSTE A

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
	1.00

RESIDENTE P.O.P.M.

 ING. ROBERTO ARMENDÁRIZ

CONTRATISTA

 CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y COMUNICACIONES,


 S.A. DE C.V.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 190/2016		TRAMO: TODOS	
OBRA : OBRA ELECTROMECÁNICA EN LÍNEA DE SUBESTACIÓN DE 115 KV		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	
DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHIA			



No DE ESTIMACION:	1	PERIODO : 23 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE
-------------------	---	---

CONCEPTO:	EXTRA-03	OPERACIONES ARITMETICAS
Suministro, montaje y vestido de estructura de acero troncocónico de remate tipo 1216 DMPL (tipo linderó), incluye: carga y acarreo de almacén, descarga de todas las piezas de al pie de la cimentación, el ensamble de la misma, el montaje con grúa de capacidad adecuada en la cimentación de concreto construida para ésta, así como la instalación de las cadenas de aislamiento y sistema anti caídas y el suministro e instalación de herrajes de sujeción.	2.00	PZA
		POSTE B
		POSTE C

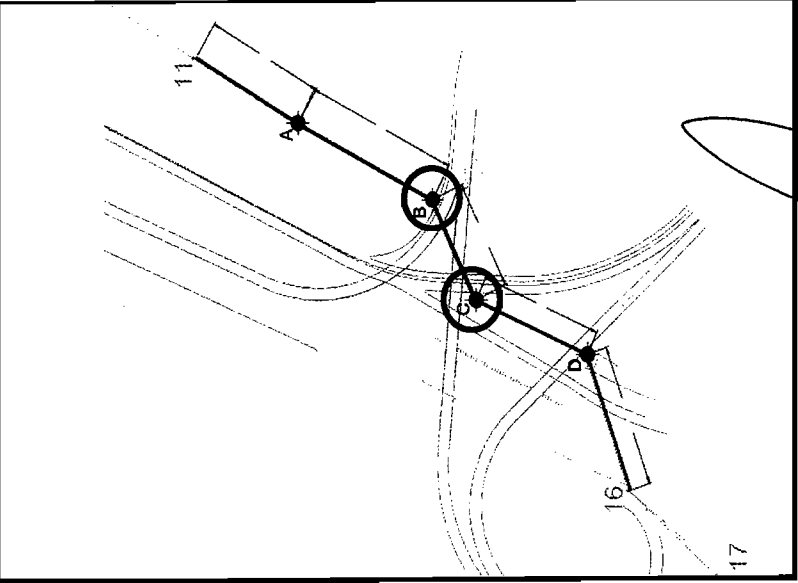CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
	2.00





RESIDENTE D.O.P.M.
ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ


CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y COMUNICACIONES,
S.A. DE C.V.

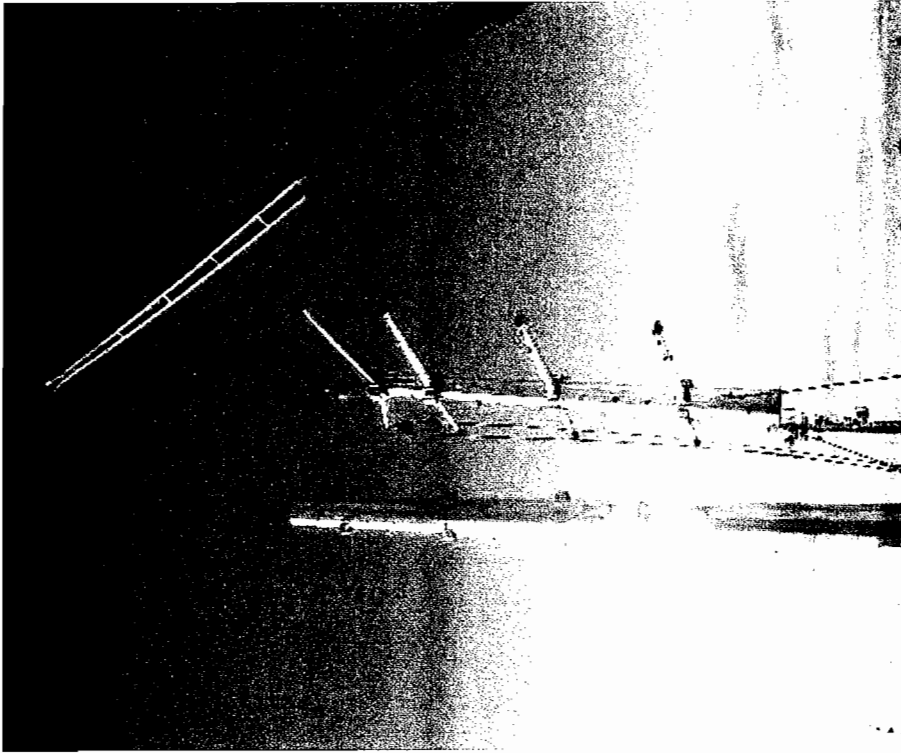



MONTAJE DE POSTES TRONCOCONICOS.



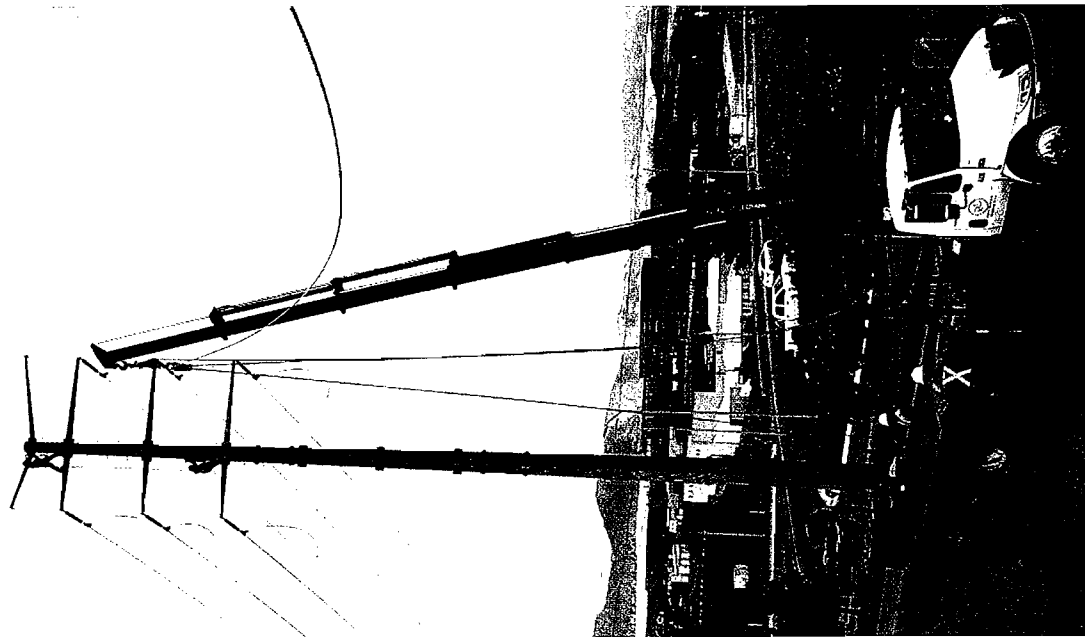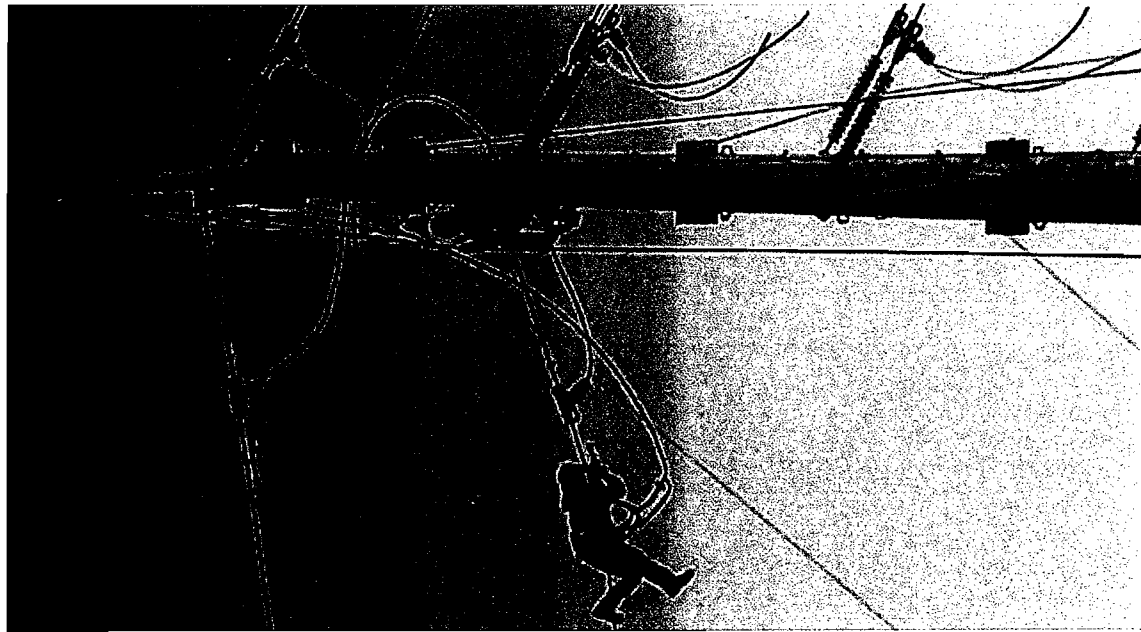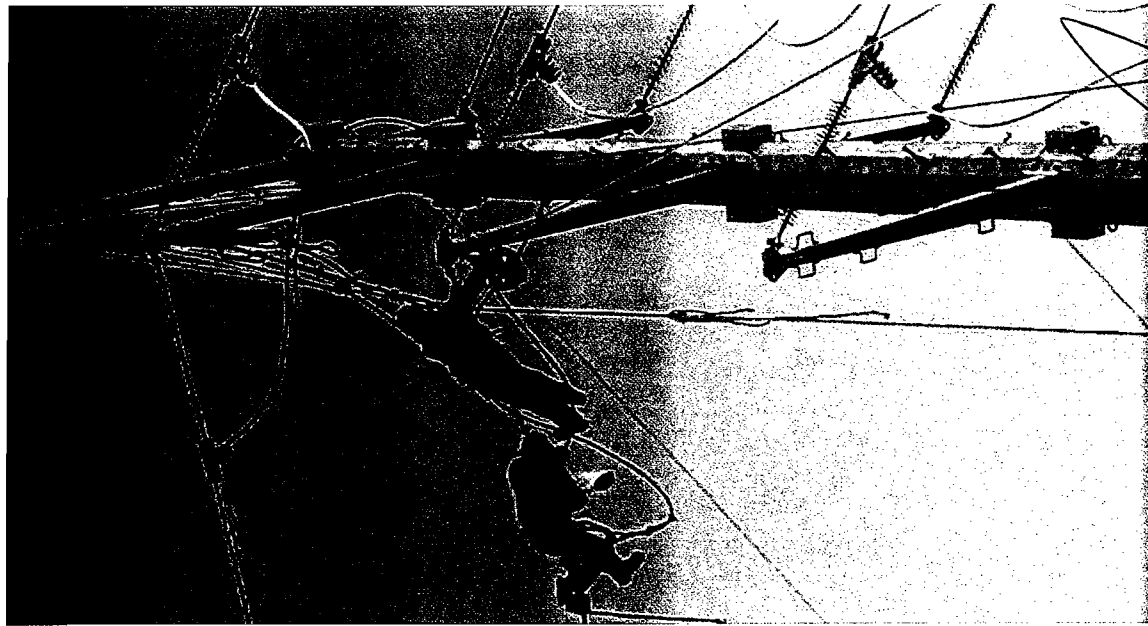

CONEXIONADO A TRONCOCONICOS EXISTENTES, COLOCACION DE AMORTIGUADORES Y PEINADO DE PUENTES.


[Handwritten signature]

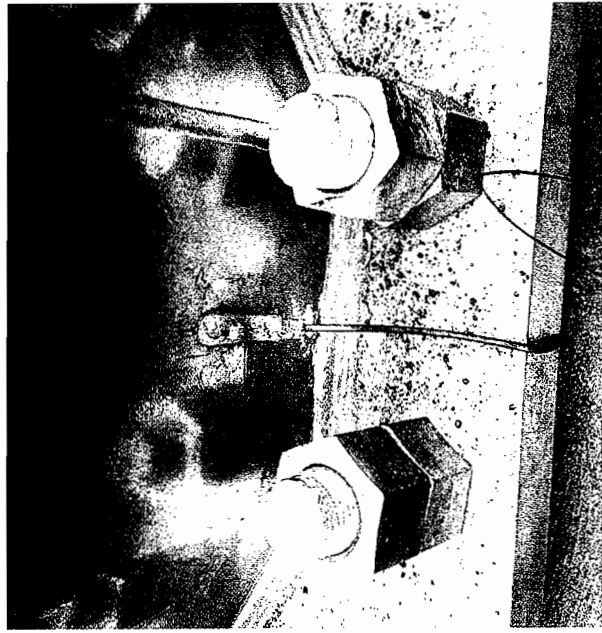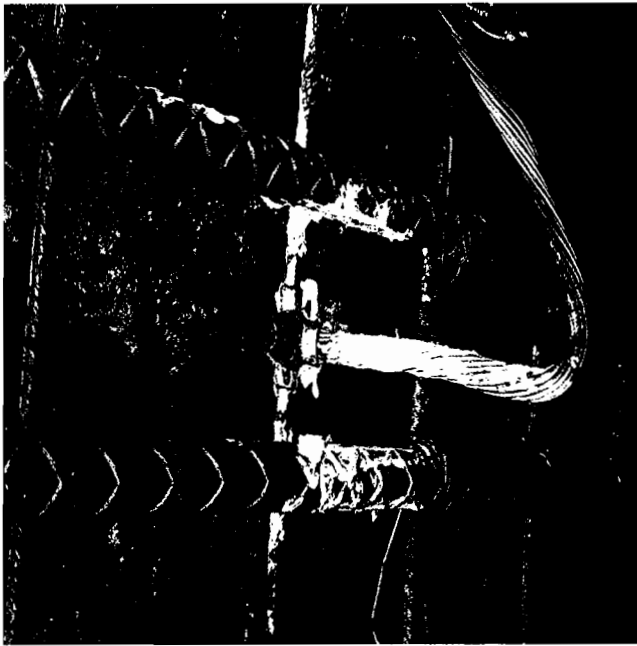

PUESTA A TIERRA DE ANCLAS, ARMADOS Y POSTES TRONCOCONICOS.


HOJA 8 / 8

CONTRATO : 190/2016	TRAMO: TODOS
OBRA : OBRA ELECTROMECÁNICA EN LÍNEA DE SUBESTACIÓN DE 115 KV DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA	
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	

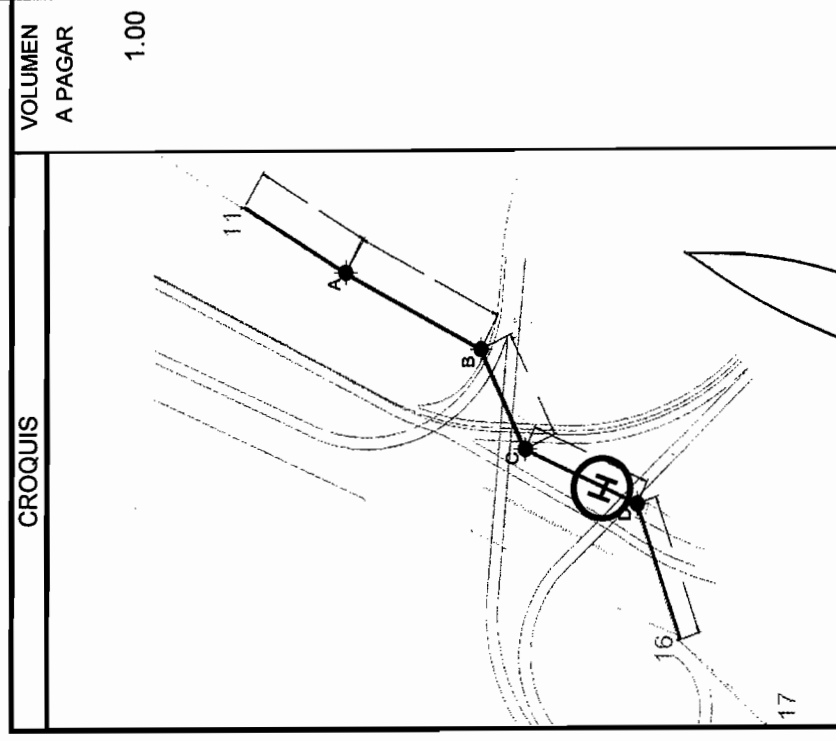
[illegible]


RESIDENTE D.O.P.M.
ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ

CONTRATISTA
**CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y COMUNICACIONES,
S.A. DE C.V.**

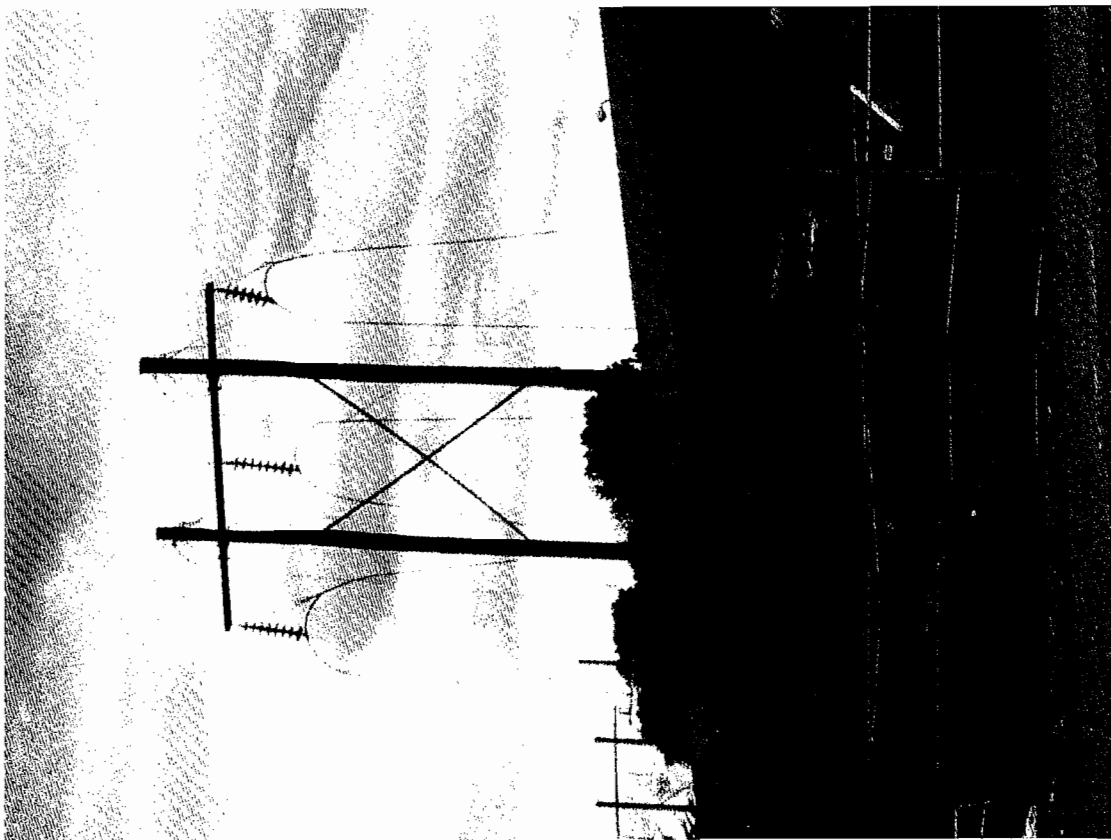

[Handwritten signature]

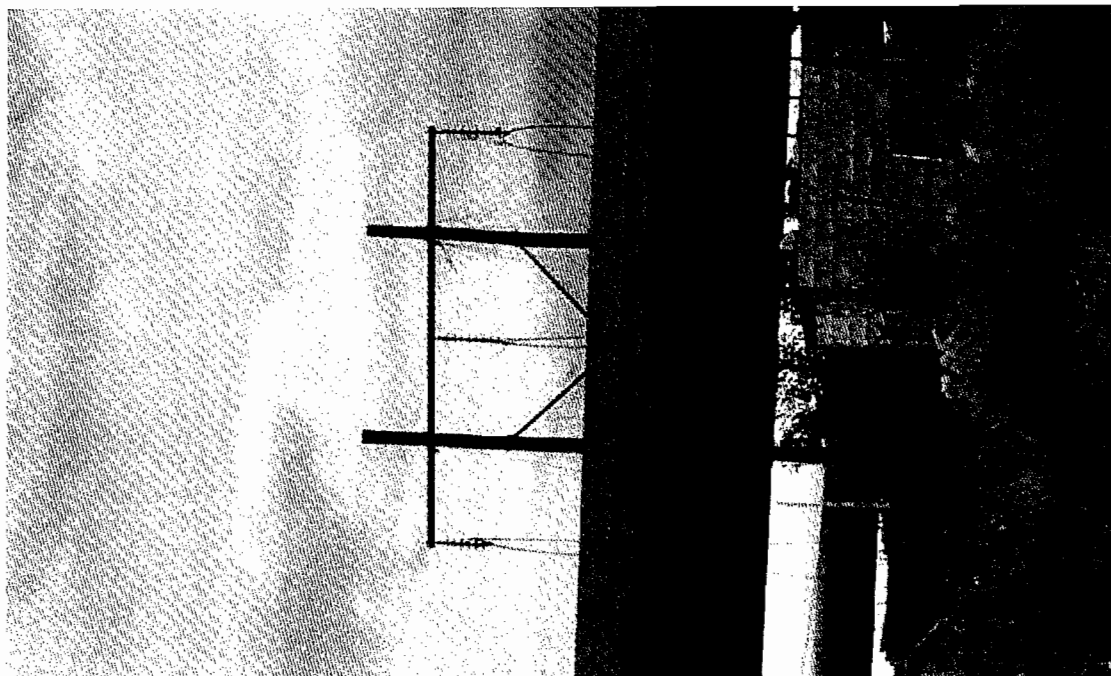

[Handwritten signature]

RETIRO DE ESTRUCTURA EN "H"

4182



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

ACUERDO DE DIFERIMIENTO DEL PLAZO
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 190/2016 POR
ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO

ACUERDO QUE EMITEN EL C. ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, SIENDO ASISTIDO POR LOS CC. INGENIEROS XÓCHITL PÉREZ BLANCO, SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA Y ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA, PARA HACER CONSTAR EL DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 190/2016, CONSISTENTE EN: "OBRA ELECTROMECÁNICA EN LÍNEA DE SUBESTACIÓN DE 115 KV DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA", EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.

En Chihuahua, Chih., siendo las 13:00 horas del día 26 de septiembre de 2016, el suscrito Director de Obras Públicas y Mantenimiento, asistido por la Subdirectora de Obra Pública e Infraestructura y el Jefe del Departamento de Construcción de la Subdirección de Obra Pública e Infraestructura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 62 fracción I de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua; y en el ejercicio de las facultades conferidas en el Artículo 71 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, emito el presente Acuerdo que autoriza el diferimiento del plazo de ejecución por motivo del atraso en la entrega del anticipo que se otorga en los trabajos de la obra arriba referida, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

- I.- Con fecha 02 de agosto de 2016, se celebró con la empresa Construcciones Integrales y Comunicaciones, S.A. de C.V., el Contrato de Obra Pública No. 190/2016, el cual tiene como objeto la: **"OBRA ELECTROMECÁNICA EN LÍNEA DE SUBESTACIÓN DE 115 KV DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA"**, por un monto de \$ 2'728,562.47 (dos millones setecientos veintiocho mil quinientos sesenta y dos pesos 47/100 M.N.) Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, estableciéndose un plazo de ejecución de 39 días naturales comprendidos dentro del periodo del 02 de agosto de 2016 al -

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx

Para uso exclusivo de Asuntos Oficiales

1
**CONSTRUIMOS
FUTURO**



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2015 - 2016

ACUERDO DE DIFERIMIENTO DEL PLAZO
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 190/2016 POR
ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO

09 de septiembre del 2016, pactándose un anticipo del 30%, para el inicio de la obra y la compra de materiales y equipos de instalación permanente en la misma.

II.- Que el cheque que ampara el importe del anticipo fue entregado a la empresa contratista hasta el día jueves 22 de septiembre de 2016, por lo que el importe del anticipo fue puesto efectivamente a su disposición hasta el viernes 23 de septiembre de 2016, por lo anteriormente expuesto, la empresa contratista no pudo llevar a cabo el inicio de los trabajos y la adquisición de equipos y materiales de instalación permanente en la obra en la fecha señalada en el contrato; aunado al hecho y como consta en el expediente del referido contrato 190/2016, el contratista exhibió de manera oportuna y de conformidad con el artículo 41 de la Ley en la materia, las garantías al anticipo y de cumplimiento a dicho contrato mediante las pólizas de fianza números 1725506 y 1725056, respectivamente, ambas emitidas por ACE Fianzas Monterrey, S.A., es procedente diferir el plazo de ejecución de la obra.

ACUERDO

PRIMERO. - Con base en los antecedentes y motivos antes expuestos y con fundamento en la fracción I del artículo 62 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, se difiere el plazo de ejecución del Contrato de Obra Pública No. 190/2016, estableciéndose como nuevas fechas de inicio y terminación de la obra, los días **23 de septiembre de 2016 y 31 de octubre de 2016.**, respectivamente.

SEGUNDO.- Notifíquese a la empresa Construcciones Integrales y Comunicaciones, S.A, de C.V., el contenido y alcance legal del presente acuerdo.

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx

Para uso exclusivo de Asuntos Oficiales

2
**CONSTRUIMOS
FUTURO**



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

ACUERDO DE DIFERIMIENTO DEL PLAZO
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 190/2016 POR
ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO

ACUERDO que se dicta y firma para constancia en la Ciudad de Chihuahua,
Chih., a los veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.

EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA

LA SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA


ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN


ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN


ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACUERDO DE DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°. 190/2016, RELATIVO A OBRA ELECTROMECÁNICA EN LÍNEA DE SUBESTACIÓN DE 115 KV DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA.

04182/2016.


Chihuahua, Chih., a 22 de Septiembre de 2016
Asunto: Diferimiento de periodo de los trabajos

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.-

Por este medio, y en relación al contrato No. 190/2016 relativo a la obra: *Obra Electromecánica en línea de subestación de 115 kv del Distribuidor vial Zootecnia*, le informo que hasta el día de hoy se recibió el anticipo, por lo que, con fundamento en el Art. 62 de la *Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma*, se solicita el diferimiento del periodo de ejecución de los trabajos, que está establecido en 39 días naturales según contrato, para iniciarlos el día 23 de Septiembre de 2016 y terminarlos a más tardar el día 31 de Octubre de 2016

Esperando contar con su apoyo y comprensión.

Agradeciendo las atenciones que se sirvan brindar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo




Atentamente,


ING. RAYMUNDO MEZA CUEVAS
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.




26-Sept-2016



BANCO/CLIENTE

```
22/09/2016 1:01:12 PM
Usuario:2086875
Folio ID de cliente:1065777381270923
Folio ID ITP:11067505257108297
Folio host:H461647 Sesión:Sin cliente
```

Plaza: CHIHUAHUA, CHIH.
Sucursal: Sol Azteca
Dirección: Av. Ocampo y Ramirez NO. 2601. COL
PACIFICO

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

Nombre del cliente:
CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y COMUNICACION
No. de cuenta: 21504347706
Moneda: MXN
Plaza cta.: CHIHUAHUA, CHIH.

Total de cheques otros bancos:	\$1,091,424.99
S.B.C. 24 hrs:	\$1,091,424.99
Total Cheques Otros Bancos:	\$1,091,424.99

Total depósito: 11.091.424,99


(un millon noventa y un mil cuatrocientos veinticuatro Pesos 99/100 MN)

Detalle documentos de chq. otros bancos:
detalles

Banco	Docto	Importe
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GR	0000390	\$1,091,424.99

El total de otros bancos se abona al primer día hábil, en caso de devolución del o de los documento(s) de otros bancos se cargara el importe del o los mismo(s) a su cuenta.

La recepción de documentos a cargo de otras instituciones, para abono en cuenta, se sujeta a que reúnan los requisitos para su presentación en la cámara de compensación electrónica.



Firma del c.

Firma(s) de autorización y sello del cajero

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2016/09/23	Fecha Final	2016/09/23	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHO-MXN-215-2154347706
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	CONSTRUCCIONE	Saldo	
Folio	15271081690				

#	<u>Fecha</u>	<u>Referencia Numérica</u>	<u>Importe</u>	<u>Tipo</u>	<u>Transacción</u>	<u>Saldo</u>	<u>Leyenda 1</u>	<u>Leyenda 2</u>
1	2016/09/23	1	1,091,424.99	ABONO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	1,742,331.73		





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y
MANTENIMIENTO
OFICIO No. D-4334/2016

06 de octubre de 2016

ING. RAYMUNDO MEZA CUEVAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Con relación a su Escrito S/N de fecha 29 de septiembre del presente, en el que solicita la revisión de los precios unitarios por conceptos de obra extraordinarios relativos a la obra: **"OBRA ELECTROMECÁNICA EN LINEA DE SUBESTACIÓN DE 115 KV DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA"**, que su representada ejecuta para esta Dependencia al amparo del contrato **No. 190/2016**, al respecto, me permito comunicar a Ud., la autorización de los mismos, quedando como a continuación se relacionan:

No.	CONCEPTO	VOL	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EXT-01	Suministro, montaje y vestido de estructura de acero troncocónico de remate tipo 1219 DMPL (tipo lindero), incluye; carga y acarreo de almacén, descarga de todas las piezas al pie de la cimentación, el ensamble de la misma, el montaje con gura de capacidad adecuada en la cimentación de concreto construida para ésta, así como la instalación de las cadenas de aislamiento y sistema anticaídas y el suministro e instalación de herrajes de sujeción.	1	pza	\$588,574.25
EXT-02	Suministro, montaje y vestido de estructura de acero troncocónico de remate tipo 1211 DC, incluye; carga y acarreo de almacén, descarga de todas las piezas al pie de la cimentación, el ensamble de la misma, el montaje con gura de capacidad adecuada en la cimentación de concreto construida para ésta, así como la instalación de las cadenas de aislamiento y sistema anticaídas y el suministro e instalación de herrajes de sujeción.	1	pza	\$229,090.17
EXT-03	Suministro, montaje y vestido de estructura de acero troncocónico de remate tipo 1216 DMPL (tipo lindero), incluye;	2	pza	\$542,102.23

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y
MANTENIMIENTO
OFICIO No. D-4334/2016

carga y acarreo de almacén, descarga de todas las piezas al pie de la cimentación, el ensamble de la misma, el montaje con gura de capacidad adecuada en la cimentación de concreto construida para ésta, así como la instalación de las cadenas de aislamiento y sistema anticaídas y el suministro e instalación de herrajes de sujeción.

EXT-04	Retiro de estructura que quedará fuera de operación (estructura H de concreto), Incluye: mano de obra, equipo y traslado a donde lo indique la Supervisión de la Dependencia.	1	pza	\$99,565.14
--------	---	---	-----	-------------

IMPORTE MÁXIMO AUTORIZADO \$ 2'001,434.02 SIN IVA

ATENTAMENTE

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

C.c.p.- Ing. Xóchitl Pérez Blanco.-Subdirectora de Obra Pública e Infraestructura.
C.c.p.-Ing. Enrique Villarreal Alemán.-Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.-Ing. Rodolfo Armerendariz Ronquillo.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

RDRA/XPB/EVA/gcn*

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx

