



Arturo Davila Dozal
DADA650730ERO
Domicilio Fiscal
Cerrada de Ciervo 3907
Col. Lomas del Sol 31114
Chihuahua Chihuahua México
Tel. 4403137,4197398

Factura No: 938
FOLIO FISCAL (UUID):
2A76BDB0-E1F3-4B18-827C-17D9886C7D2C
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000303547987
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-12-01T14:12:10
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-12-01T14:07:07

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: MINA 408
CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIHUAHUA Chihuahua
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: Chihuahua, Chihuahua
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 99-Otros
Fecha de Expedición: 01 diciembre 2016
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	ESTIMACION No. 4 (CUATRO) POR TRABAJOS DE: TECHUMBRE CANCHA ESCUELA MARTIN LOPEZ EN LA COLONIA VILLA VIEJA, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA. SEGUN CONTRATO No. 211/2016 ✓ ALCANCE DE LA ESTIMACION \$81,523.02 ✓ AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$0.00 RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO SANCION POR RETRASO DEL 0.1% \$0.00 D.I.F. DEL 0.2% \$163.05 I.C.I.C. DEL 0.2% \$163.05 C.M.I.C. DEL 0.2% \$163.05 I.S.P.V. DEL 0.5% \$407.62 SUMA \$896.77 FIRMA DEL CONTRATISTA NETO A RECIBIR \$93,669.93	\$ 81,523.02	\$ 81,523.02

IMPORTE CON LETRA: NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, 70/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 81,523.02
IVA(IVA 16.00%): \$ 13,043.68
TOTAL: \$ 94,566.70

SELLO DIGITAL DEL CFDI

rcJSRgYs008rDI+MOIKSNXslrSU6ySuHKIVLn0Fv5FATkgIMs8l1m75326QQVQRIARdAilzZhKNOBXHnQWClbmRuXWPgsSeBzw2Nw/p+9ZHGS7+a74Kx8Op0nOI56Y5d1eb81KW38xyfjctsyGGJyIBxg91/QaZueo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Y7XUdw+BwRXG4H4wES8JBVe0qQYp0AICXp7x6FH3uUqHe1wB5arwnkmODBocDS/6+XKGr1HkNI7dXwyPJTuN0bxdh0bP1Zy9sa/Qq2nSrOv7w552WILMnnH/V+m3EbQ6mzz4UmwB01ICHGbZf7DBz/Ao1hybpwMS+sSzz5/s=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|2A76BDB0-E1F3-4B18-827C-17D9886C7D2C|2016-12-01T14:12:10|rcJSRgYs008rDI+MOIKSNXslrSU6ySuHKIVLn0Fv5FATkgIMs8l1m75326QQVQRIARdAilzZhKNOBXHnQWClbmRuXWPgsSeBzw2Nw/p+9ZHGS7+a74Kx8Op0nOI56Y5d1eb81KW38xyfjctsyGGJyIBxg91/QaZueo=|0000100000203495276|



**"ESTE PROGRAMA ES
PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL
USO PARA FINES
DISTINTOS A
LOS ESTABLECIDOS
EN EL PROGRAMA"**

www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son
obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710





Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT


Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen


Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
DADA650730ERO	Arturo Davila Dozal	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
2A76BDB0-E1F3-4B18-827C-17D9886C7D2C	2016-12-01T14:07:07	2016-12-01T14:12:10	FMD100203JS7
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$94,566.70	ingreso	Vigente	

Imprimir

Am ft



**"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"**

**"ESTE PROGRAMA ES
PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO,
QUEDA PROHIBIDO EL
USO PARA FINES
DISTINTOS A
LOS ESTABLECIDOS
EN EL PROGRAMA"**



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 211/2016	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: TECHUMBRE CANCHA "ESCUELA MARTÍN LÓPEZ"	ESTIMACIÓN No. 4	\$ 800,000.00 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 01 DE NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016	
UBICACIÓN: COLONIA VILLA VIEJA, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 94,566.70 CON IVA
CONTRATISTA: ING. ARTURO DAVILA DOZAL	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 705,322.43 CON IVA
RFC DADA-650730-ER0	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 799,889.13 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 76,296.24	
<u>EXTRAORDINARIOS</u>	\$ 5,226.78	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 81,523.02	

--

DESCUENTOS		
0.1% SANCION POR RETRASO	\$	0.00
0.2% D.I.F	\$	163.05
0.2% I.C.I.C.	\$	163.05
0.2% C.M.I.C.	\$	163.05
0.5% I.S.P.V	\$	407.62
SUMA DESCUENTOS	\$	896.77
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	81,523.02
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	81,523.02
I.V.A.	\$	13,043.68
TOTAL	\$	94,566.70
(CON LETRA)		
(NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	896.77
SALDO NETO A RECIBIR	\$	93,669.93

AUTORIZO	ELABORO
ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA	ING. ARTURO DAVILA DOZAL
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. JAVIER VILLARREAL POSADA	ING. Ma. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	JEFE DE DEPTO. DE CONSTRUCCION SOCIAL
Vo. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

"ESTE PROGRAMA ES
PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLITICO.
QUEDA PROHIBIDO EL
USO PARA FINES
DISTINTOS A
LOS ESTABLECIDOS
EN EL PROGRAMA"

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

CHIHUAHUA, CHIH.,

24 DE NOVIEMBRE DE 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 93,669.93
(NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 4 CONTRATO No. 211/2011 POR LA CANTIDAD DE : \$ 800,000.00 INCLUYE CONVENIO
OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 MN POR TRABAJOS EN LA OBRA:

TECHUMBRE CANCHA "ESCUELA MARTÍN LÓPEZ"

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 81,523.02

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL	\$ 81,523.02
IVA	\$ 13,043.68
TOTAL	\$ 94,566.70

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

0.1% SANCION POR RETRASO	0.00
D.I.F. DEL 0.2%	163.05
I.C.I.C. DEL 0.2%	163.05
C.M.I.C. DEL 0.2%	163.05
I.S.F.P. DEL 0.5%	407.62
SUMA	896.77

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO	\$ 800,000.00
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 705,322.43
ESTA ESTIMACION	\$ 94,566.70
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 799,889.13
POR EJERCER	\$ 110.87

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% I.C.I.C.

0.2% D.I.F.

ACUMULADO ANTERIOR	\$ 1,216.07	\$ 1,216.07
ESTA ESTIMACION	\$ 163.05	\$ 163.05
ACUMULADO ACTUAL	\$ 1,379.12	\$ 1,379.12

0.2% C.M.I.C.

0.5% I.S.F.P.

\$ 1,216.07	\$ 3,040.19
\$ 163.05	\$ 407.62
\$ 1,379.12	\$ 3,447.81

"ESTE PROGRAMA ES
PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLITICO.
QUEDA PROHIBIDO EL
USO PARA FINES
DISTINTOS A
LOS ESTABLECIDOS
EN EL PROGRAMA"

RECIBIMOS

ING. ARTURO DAVILA DOZAL
DADA-650730-ERO

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

OBRA:TECHUMBRE CANCHA "ESCUELA MARTÍN LÓPEZ"

MUNICIPIO:CHIHUAHUA

No. CONTRATO:211/2016

ESTIMACIÓN No. 4

CONTRATISTA:ING. ARTURO DAVILA DOZAL

PERÍODO:01 DE NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

NORMALES

4	ALBAÑILERIA	\$ 2,374.92
5	PORTERIAS Y PINTURA DE CANCHA	\$ 73,921.32

EXTRAORDINARIOS

E	EXTRAORDINARIOS	\$ 5,226.78
---	-----------------	-------------

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES
PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLÍTICO,
QUEDA PROHIBIDO EL
USO PARA FINES
DISTINTOS A
LOS ESTABLECIDOS
EN EL PROGRAMA"

POR EL CONTRATISTA

ING. ARTURO DAVILA DOZAL

SUBTOTAL	81,523.02
I.V.A.	13,043.68
TOTAL	94,566.70

POR EL RESIDENTE DE D.O.P.M

ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA

OBRA: TECHUMBRE CANCHA "ESCUELA MARTÍN LÓPEZ"

MUNICIPIO: COLONIA VILLA VIEJA, No. CONTRATO: 211/2016
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA ESTIMACIÓN No. 4

CONTRATISTA:

ING. ARTURO DAVILA DOZAL

PERIODO:

01 DE NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIO		
OBRA NORMAL							
\$ 81,523.02							
	TECHUMBRE TIPO DOMO						\$ 76,296.24
4	ALBAÑILERÍA						\$ 2,374.92
4.3	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.	Lote	1.00	1.00	1.00	2374.92	2,374.92
5	PORTERÍAS Y PINTURA DE CANCHA						\$ 73,921.32
5.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANASTA PORTERÍA MODELO FTPCPS10 O SIMILAR EN CALIDAD, SECCIÓN DE 1.60 M DE LARGO POR 1.20 M DE ANCHO, A BASE DE PLACA CALIBRE 10, PTC DE 2" CALIBRE 14, PTR DE 1 1/2", ARO A BASE DE VARILLA REDONDA DE 3/4", ESTRUCTURA DE TUBO DE 3" CEDULA 30, TABLERO A BASE DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO, REFUERZO EN PORTERÍA A BASE DE SOLERA DE 1 1/2 X 1/8", CALADO DE LOGOTIPOS DE LA ADMINISTRACIÓN, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA POLIÉSTER HORNEADA RESISTENTE A LA INTEMPERIE, INCLUYE: ANCLAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00	2.00	2.00	34444.59	68,889.18
5.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LÍNEA DE JUEGO EN CANCHA DE BASQUETBOL, 5 CM DE ANCHO INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MARCA DE PINTURA COMEX TOP-DEPORTIVO.	m	275.00	216.25	216.25	23.27	5,032.14

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

POR EL CONTRATISTA

POR EL RESIDENTE DE D.O.P.M

ING. ARTURO DAVILA DOZAL

Pag 1 de 2

ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA

OBRA: TECHUMBRE CANCHA "ESCUELA MARTÍN LÓPEZ"

MUNICIPIO: COLONIA VILLA VIEJA, No. CONTRATO: 211/2016
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA ESTIMACIÓN No. 4

CONTRATISTA:

ING. ARTURO DAVILA DOZAL

PERIODO:

01 DE NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIOR		
OBRA EXTRAORDINARIA							\$ 5,226.78
E	EXTRAORDINARIOS						\$ 5,226.78
EXT-1	CORTE EN PISO DE ASFALTO CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: EL TRAZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO ARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	-	64.40		64.40	39.66 \$ 2,554.10
EXT-2	DEMOLICION DE PISO DE ASFALTO HASTA 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO EN LA OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO	m2	-	28.56		28.56	42.26 \$ 1,206.95
EXT-3	RETIRO DE PINTURA EN PISO DE CONCRETO, INCLUYE: BARRIDO DEL AREA DE TRABAJO, EQUIPO DE HIDROLAVADO, , REMOVEDOR DE PINTURA, TALLADO CON CEPILLO DE ALAMBRE EN AREA DONDE LO REQUIERA, LIMPIEZA FINAL DEL AREA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	-	17.89		17.89	81.93 \$ 1,465.73

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

POR EL CONTRATISTA

POR EL RESIDENTE DE D.O.P.M

ING. ARTURO DAVILA DOZAL


Pag 2 de 2

ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA

117

[illegible]

217

[illegible]


CONTRATISTA
ARTURO DAVILA DOZAL

317

[illegible]


GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA:

4 / 7

CONTRATO : No. 211/2016	TRAMO:	UBICADA EN COLONIA VILLA VIEJA, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OBRA : TECHUMBRE EN CANCHA "ESCUELA MARTÍN LOPEZ"	CONTRATISTA:	ARTURO DAVILA DOZAL

No DE ESTIMACION: CUATRO ` PERIODO: 01/11/2016 AL 23/11/2016									
CONCEPTO	EJE	TRAMO	PZA	LARGO	ANCHO	ALTO	U.	SUB-TOTAL	
EXTRAORDINARIOS	A	1	2	2.40			ML	4.80	
	A	1	2	1.20			ML	2.40	
	A	2	2	2.40			ML	4.80	
	A	2	2	1.20			ML	2.40	
	A	3	2	2.40			ML	4.80	
	A	3	2	1.20			ML	2.40	
	A	4	2	2.40			ML	4.80	
	A	4	2	1.20			ML	2.40	
	A	5	2	2.40			ML	4.80	
	A	5	2	1.20			ML	2.40	
	B	1	2	2.30			ML	4.60	
	B	1	1	1.20			ML	1.20	
	B	2	2	2.30			ML	4.60	
	B	3	2	2.40			ML	4.80	
	B	4	2	2.40			ML	4.80	
	B	4	1	1.20			ML	1.20	
	B	5	2	2.40			ML	4.80	
	B	5	2	1.20			ML	2.40	
TOTAL								64.40	

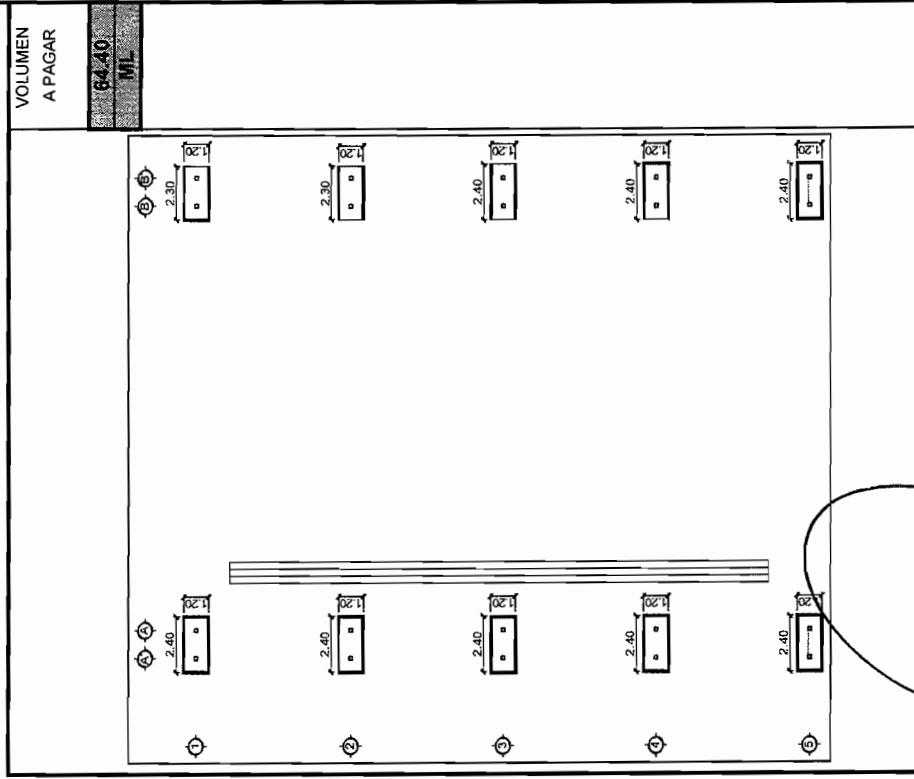

VOLUMEN
A PAGAR
64.40
ML

*ESTE PROGRAMA ES
PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLITICO.
QUEDA PROHIBIDO EL
USO PARA FINES
DISTINTOS A
LOS ESTABLECIDOS
EN EL PROGRAMA"

CONTRATISTA
ARTURO DAVILA DOZAL

RESIDENTE
ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON
RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

517


No DE ESTIMACION: CUATRO \ PERIODO: 01/11/2016 AL 23/11/2016

[illegible]

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"**

CONTRATISTA
ARTURO DAVILA DOZAL

619

[illegible]

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA:

7 17

CONTRATO :No. 211/2016

OBRA : TECHUMBRE EN CANCHA "ESCUELA MARTIN LOPEZ"




TRAMO:

UBICADA EN COLONIA VILLA VIEJA, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONTRATISTA: ARTURO DAVILA DOZAL

No DE ESTIMACION: CUATRO `PERIODO: 01/11/2016 AL 23/11/2016

FOTOS

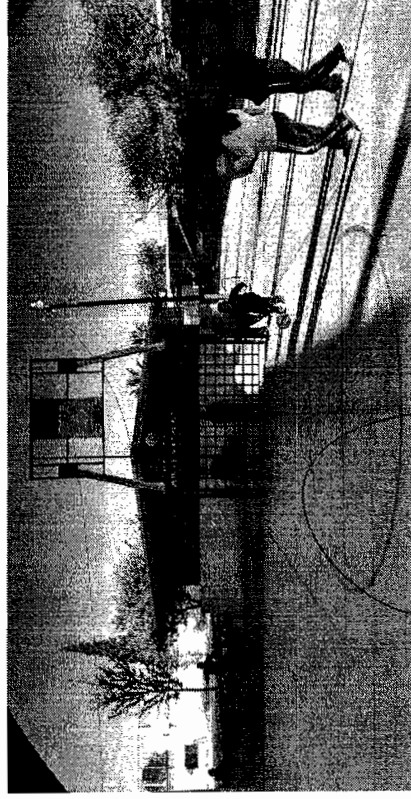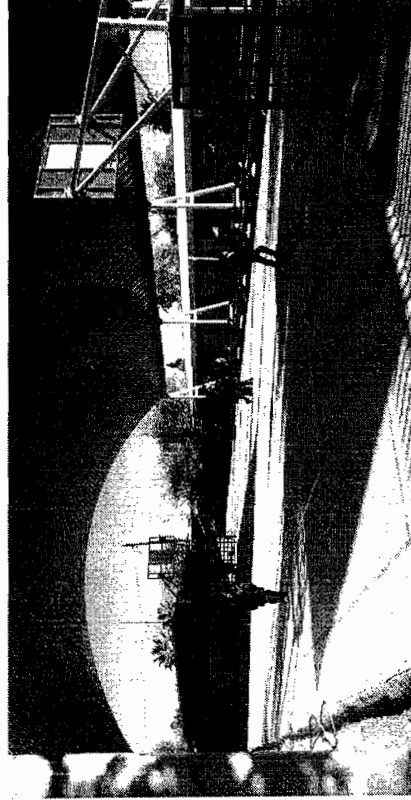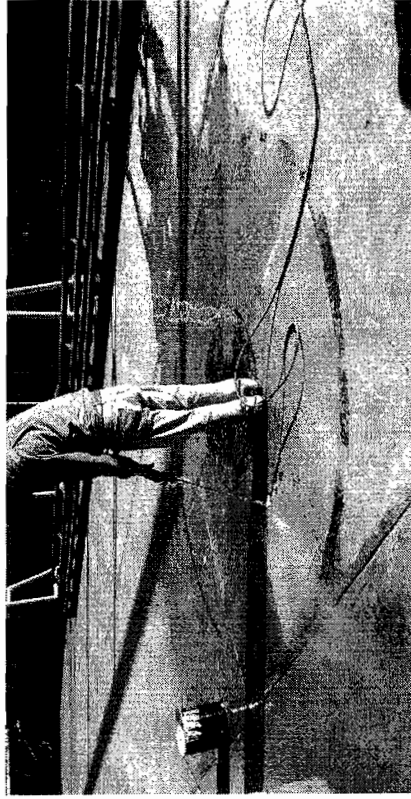

*ESTE PROGRAMA ES
PUBLICO, AJENO A CUALQUIER
PARTIDO POLITICO.
QUEDA PROHIBIDO EL
USO PARA FINES
DISTINTOS A
LOS ESTABLECIDOS
EN EL PROGRAMA*



RESIDENTE
ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA



CONTRATISTA
ARTURO DAVILA DOZAL

*ESTA OBRA FUE REALIZADA CON
RECURSOS PUBLICOS FEDERALES*
