



Cobra

Factura

SERIE:

FOLIO: 363

FECHA: 15/12/2016 16:22:34

Documento Válido

IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

SIOI671110T93 ARGENTINA No. 731 SAN ANDRES,
. 31110
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

Cliente: Municipio de Chihuahua

R.F.C.: MCI651010V22

Domicilio: Calle Mina No. 408

Teléfono:

Ciudad: Chihuahua

Colonia: Centro
Estado: Chihuahua

C.P.: 31000
País: México

Lugar de

Expedición:

ARGENTINA 731, SAN ANDRES, 31110, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Regimen: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	ESTIMACION Pago por concepto de Estimación 3 (Tres) del Contrato de Obra Pública No. 214/2016, Parque Los Arcos, en la calle Arco La Cantera y Calle Arco Catedral, Fraccionamiento Los Arcos. Firma del Contratista Alcance de la Estimación \$ 235,277.47 (Menos) Amortización del Anticipo \$ 94,971.08 Subtotal \$ 140,306.39 IVA 16% \$ 22,449.02 Total \$ 162,755.41 (Menos) Retenciones Pactadas en Contrato: I.C.I.C. del 0.2% \$ 470.55 D.I.F. del 0.2% \$ 470.55 C.M.I.C. del 0.2% \$ 470.55 Der. Insp. y Vig. del 0.5% \$ 1,176.39 Suma \$ 2,588.04 Neto a Recibir \$ 160,167.37	140,306.39	140,306.39

Importe con letra
CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
41/100 M.N.
Método de Pago
03 Transferencia Electrónica de Fondos

SUBTOTAL:	140,306.39
I.V.A.:	22,449.02
TOTAL:	162,755.41

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404545655
Folio fiscal:	9569657A-1C04-4475-898B-569FD5F123C9
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883


Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT


 Folio Fiscal x

 RFC Emisor

 RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

SIOI671110T93

Folio Fiscal

 9569657A-1C04-4475-898B-
569FD5F123C9

Total del CFDI

\$162,755.41

Nombre o Razón Social del Emisor

IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

Fecha de Expedición

2016-12-15T16:22:34

Efecto del Comprobante

Ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2016-12-16T17:17:35

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del Receptor

Municipio de Chihuahua

PAC que Certificó

MAS0810247C0

Imprimir



CHIHUAHUA, CHIH., DICIEMBRE 15 DEL 2016.

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS
RESIDENTE DE LA OBRA
PRESENTE.

ANEXO ESTIMACIÓN NO. 3 (ULTIMA) CON FACTURA 363 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA: **PARQUE LOS ARCOS, UBICADO EN CALLE ARCO LA CANTERA Y CALLE ARCO CATEDRAL, FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS, CHIHUAHUA, CHIH., SEGÚN CONTRATO NO. 214/2016.**

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DEL 08 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016, POR UN SALDO NETO FACTURADO **\$162,755.41 (SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N.), CON IVA INCLUIDO.**

ACOMPañADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN.

ATENTAMENTE,

ING. IVÁN NOÉ SIMENTAL ORTEGA

RECIBE

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL USO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 214/2016	CONTRATADOS
OBRA: PARQUE LOS ARCOS, CALLE ARCO LA CANTERA Y CALLE ARCO CATEDRAL, FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS.	ESTIMACIÓN No. 3 (ULTIMA)	\$ 1,991,338.34 CON IVA
	PERÍODO EJEC. DEL 08 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016	
UBICACIÓN: CALLE ARCO LA CANTERA Y CALLE ARCO CATEDRAL, FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 272,921.87 CON IVA
CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 1,624,116.81 CON IVA
RFC SIOI671110T93	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 1,897,038.68 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 141,207.80	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ 15,917.00	
<u>EXTRAS</u>	\$ 78,152.67	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 235,277.47	

--





DESCUENTOS	
0.2% DIF	\$ 470.55
0.2% CMIC	\$ 470.55
0.2% I.C.I.C.	\$ 470.55
0.5% INSP. CONTRATOS Y O.P.	\$ 1,176.39
SUMA DESCUENTOS	\$ 2,588.04

RESUMEN	
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 235,277.47
AMORT ANTICIPO	\$ 94,971.08
SUB-TOTAL	\$ 140,306.39
I.V.A.	\$ 22,449.02
TOTAL	\$ 162,755.41

(CON LETRA)

(CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 2,588.04
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 160,167.37

AUTORIZO  ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS RESIDENTE D.O.P.M Vo. Bo.  ARQ. CARLOS AGUILAR GARELA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Vo. Bo.  ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ELABORO  ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA CONTRATISTA REVISO  ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.
---	---

CHIHUAHUA, CHIH.,

15 DE DICIEMBRE DE 2016

RECIBIMOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO/SEC. COMS Y OBRAS PUBLICAS, LA CANTIDAD DE: \$ 160,167.37
(CIENTO SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 3 CONTRATO No. 214/2016 R LA CANTIDAD DE : \$ 1,991,338.34
UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
PARQUE LOS ARCOS

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	235,277.47
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	94,971.08

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		SUBTOTAL	\$	140,306.39
I.C.I.C. DEL 0.2%	470.55	IVA	\$	22,449.02
D.I.F DEL 0.2%	470.55	TOTAL	\$	162,755.41
C.M.I.C 0.2%	470.55			
DER. INSP. Y VIG. DEL 0.5%	1,176.39			
SUMA	2,588.04			

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 1,991,338.34
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 1,624,116.81
ESTA ESTIMACION	\$ 272,921.87
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 1,897,038.68
POR EJERCER	\$ 94,299.66

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 597,401.50
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 487,232.05
ESTA ESTIMACION	\$ 110,166.45
ACUMULADO ACTUAL	\$ 597,398.50
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.5% DER. INSP. Y VIG.	0.2% D.I.F.	0.2% C.M.I.C.	0.2% I.C.I.C
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 7,000.50	\$ 2,800.21	\$ 2,800.21	\$ 2,800.21
ESTA ESTIMACION	\$ 1,176.39	\$ 470.55	\$ 470.55	\$ 470.55
ACUMULADO ACTUAL	\$ 8,176.89	\$ 3,270.76	\$ 3,270.76	\$ 3,270.76

R E C I B I M O S

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
SIOI671110T93

OBRA: PARQUE LOS ARCOS, CALLE ARCO LA CANTERA Y CALLE ARCO
CATEDRAL, FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS.

UBICACIÓN CALLE ARCO LA CA No. CONTRATO: 214/2016

ESTIMACIÓN No. 3 (ULTIMA)

CONTRATIST, ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

PERÍODO: DEL 08 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
	<u>NORMALES</u>	141,207.80
	<u>EXCEDENTES</u>	15,917.00
	<u>EXTRAS</u>	78,152.67

SUBTOTAL 235,277.47

I.V.A. 37,644.40

TOTAL 272,921.87

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONTRATISTA:

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

PERIODO: DEL 08 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	UNITARIO	

OBRA NORMAL**1 PRELIMINARES**

1.5	Banqueta de concreto $f_c=150$ kg/cm ² de 8 cms. de espesor, acabado a vuelta de plana incluye afine, cimbra y membrana de curado	m ²	1.47	1.40	0.00	1.40	193.32	971.55
1.6	Corte en piso de concreto con cortadora de disco, incluye: el trazo	m ²	10.00	10.00	0.00	10.00	70.09	700.90

141,207.80

5 PERGOLA

5.1	Excavación en material "b" hasta 1.5 mts. a mano incluye acarreo dentro de obra	m ³	7.00	6.66	0.00	6.66	167.55	1,115.88
5.2	Plantilla de concreto $f_c=100$ kg/cm ² de 5 cms. de espesor	m ²	5.20	5.12	0.00	5.12	108.57	555.88
5.3	Zapata de concreto $f_c=200$ kg/cm ² de 0.80x0.80x0.20 armada con 6 varillas #3 en ambos sentidos. en doble patilla	pieza	8.00	8.00	0.00	8.00	883.39	7,067.12

137,615.67

5.4	Dado de concreto $f_c=200$ kg/cm ² de 35x35 cms. y 100 cms. de altura armado con 8 varillas #3 y estribos de 1/4 @ 15 cms. incluye cimbrado, armado y colado.	pieza	8.00	8.00	0.00	8.00	677.87	5,422.96
-----	--	-------	------	------	------	------	--------	----------

5.5	Suministro y colocación de placa metálica de 1/2" de espesor de 25 x 25 cms. inc. 4 anclas de 1/2" de varilla corrugada.	pieza	8.00	8.00	0.00	8.00	216.25	1,730.00
-----	--	-------	------	------	------	------	--------	----------

5.6	Suministro y colocación de pergola con malla sombra de 9x3 mts. y una altura de 3.00 mts. modelo fpepm10 o similar a base de lpr de 8" x 5 1/4" de 26.7 kg/m, ensambles con tornillería grado 5, mallasombra con 95% de protección solar y acabado con pintura electrostática poliéster horneada.	pieza	1.00	1.00	0.00	1.00	121,522.49	121,522.49
-----	---	-------	------	------	------	------	------------	------------

5.7	Afine y compactación del área de desplante al 90%	m ²	5.20	5.12	0.00	5.12	14.77	75.62
-----	---	----------------	------	------	------	------	-------	-------

POR EL CONTRATISTA

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIO	VOL. ESTIMADO		
5.8	Relleno y compactación al 90% de material producto de la excavación	m3	2.50	1.78	0.00	1.78	70.63	125.72

7 SISTEMA DE RIEGO

7.17	Válvula 1 1/2"	pza.	3.00	1.00	0.00	1.00	579.81	579.81
7.22	Excavación para instalar tuberías	ml	286.88	202.86	0.00	202.86	10.06	2,040.77

EXCEDENTES

1.6	Corte en piso de concreto con cortadora de disco, incluye: el trazo	m2	10.00	80.00	10.00	70.00	70.09	4,906.30
-----	---	----	-------	-------	-------	-------	-------	----------

4.7 Suministro y colocación de banca modelo metropolitana FTPBM16, medidas de: 1.60 mts. de largo, 0.60 MTS de ancho y 0.84 mts. de altura, elaborada con solera de 1/4" a 4", lamina cal. 12 y 14, perfil de 1 1/2" x 3" calibre 18, sujeción a concreto con barren anclas, acabado con pintura electrostática en polvo color chocolate, logotipos de la administración actual e instancias involucradas, banqueta de concreto f'c= 150kg/cm2 espesor de 10 cms. acabado escobillado, excavación, relleno, compactación en sección de 1.00 x 2.00 mts. incluye: anclaje, instalación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.

6.13	Suministro e Instalación de soldado de tapa en arbotante, incluye; pintura y mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	Pza	11.00	25.00	12.00	13.00	183.42	2,384.46
6.16	Suministro e Instalación de cable aluminio monopolar calibre 6 marca viakon o similar	MI	200.00	444.00	604.00	-160.00	6.12	-979.20

POR EL CONTRATISTA

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ARG. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONTRATISTA:

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

ESTIMACIÓN No. 3 (ULTIMA)

PERIODO: DEL 08 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR		
EXTRAS							
FC18	Suministro y colocacion de reflector de 400 watts de potencia Incluye: conexiones, pruebas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación por unidad de obra terminada.	pza	0.00	8.00	0.00	8.00	3,095.59
FC19	Suministro y colocación de poste metálico de 10 mts de altura de acuerdo a proyecto autorizado. Incluye: cruceta, soportes para dos reflectores, conexiones, materiales, mano de obra, herramiento, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución Retiro sin recuperación de árbol existente. Incluye traslado a sitio autorizado para su desecho, mano de obra, herramiento, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada.	pza	0.00	2.00	0.00	2.00	4,732.00
FC20		pza	0.00	1.00	0.00	1.00	1,017.00
FC21	Suministro e instalacion de hule negro en area de arenero, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo para su correcta instalacion por unidad de obra terminada.	M2	0.00	400.00	0.00	400.00	18.60
FC22	Instalacion y pintura de banca de concreto en forma de "U" rescatada de parque Plan de Ayala. Incluye: anclajes, banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 en el area que abarca la banca, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	0.00	7.00	0.00	7.00	778.46
FC23	Suministro y colocacion de asiento para columpio existente. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo para su correcta instalacion por unidad de obra terminada.	PZA	0.00	2.00	0.00	2.00	1,910.75
FC24	Suministro e Instalación de Registro subterráneo de 60x60 cm , incluye; tapa de registro de 60 x 60 cm, excavacion, grua, mano de obra, soldadura, maniobras con grua, equipo, herramienta y	PZA	0.00	3.00	0.00	3.00	2,500.00
FC25	Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltica de 5 cms de espesor compactos. Incluye: riego de liga, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	28.24	0.00	28.24	163.83
							78,152.67
							24,764.72
							9,464.00
							1,017.00
							7,440.00
							5,449.22
							3,821.50
							7,500.00
							4,626.56

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN


ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

Pag 3 de 4

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

No.	CONCEPTOS DESCRIPCION	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIO		
FC26	Suministro e instalación de cable de aluminio cal. 4. Incluye: todo lo necesario para su correcta instalación.	m	0.00	220.83	0.00	35.84	7,914.55
EXT.27	Demolición de concreto simple. Incluye: retiro de escombro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	0.00	4.14	0.00	433.99	1,796.70
EXT.28	Suministro e Instalación de cable monopolar de cobre cal 10 THW, incluye conectores, cinta de aislar vulcanizable y de vinil y todo lo necesario para su correcta instalacion	m	0.00	240.00	0.00	18.16	4,358.40


 POR EL CONTRATISTA
 ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA


 POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
 ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
OFICIO No. D-5244/2016

13 de Diciembre de 2016

ING. IVÁN NOÉ SIMENTAL ORTEGA
REPRESENTANTE LEGAL
P R E S E N T E.-

Con relación a su Escrito S/N de fecha 01 de Diciembre del presente, en el que solicita la revisión de los precios unitarios por conceptos de obra extraordinarios relativos a la obra: **PARQUE LOS ARCOS, UBICADO EN CALLE ARCO LA CANTERA Y CALLE ARCO CATEDRAL, FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS**, en esta Ciudad de Chihuahua., que su representada ejecuta para esta Dependencia al amparo del contrato **No. 214/2016**, al respecto, me permito comunicar a Ud., la autorización de los mismos, quedando como a continuación se relacionan:

No.	CONCEPTO	VOL	UNI	PRECIO AUTORIZADO
FC18	Suministro e instalación de Reflector tipo Estadio de 400 watts Aditivos metálicos 240v, Incluye: timer mecánico por cada 8 reflectores, soportería, limpieza en área de trabajo y todo lo necesario para su puesto en funcionamiento.	8	pza	\$ 3,095.59
FC19	Suministro y colocación de poste metálico de 10.00 mts de altura de acuerdo a proyecto autorizado, Incluye: cruceta, soportes para reflectores, conexiones, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	2	pza	\$ 4,732.00



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
OFICIO No. D-5244/2016

FC20	Retiro sin recuperación de árbol existente, Incluye: traslado a sitio autorizado para su desecho, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$ 1,017.00
FC21	Suministro e instalación de hule negro en área de arenero, Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.P.U.O.T	400	m2	\$ 18.60
FC22	Instalación y aplicación de pintura en banca de concreto en forma de "U", rescatada del Parque Plan de Ayala. Incluye: anclajes, banquetta de concreto $f_c=150\text{kg/cm}^2$, en el área que abarca la banca, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	8	pza	\$ 778.46
FC23	Suministro y Colocación de asiento metálico para columpio existente, Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	pza	\$ 1,910.75
FC24	Construcción de registro eléctrico de 60x60 cms, a base de adobón con juntas de mortero cemento arena 1:4, Incluye: excavaciones, rellenos, tapa de concreto con armado de parrilla de vs No.3 a cada 20 cms, manija para levantar tapa, marco y contramarco de ángulo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	3	pza	\$ 2,500.00
FC25	Suministro y Colocación de carpeta de concreto asfáltica de 5 cms de espesor compactados, Incluye: riego de liga, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	25	m2	\$ 163.83
FC26	Suministro e Instalación de cable de aluminio Cal. 4, Incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución.	301	ml	\$ 35.84
FC27	Demolición de concreto simple. Incluye: retiro de escombros fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	4.2	m3	\$ 433.99

IMPORTE MÁXIMO AUTORIZADO

\$ 75,030.50 SIN IVA

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.- Arq. Carlos Aguilar García.-Subdirectora de Obra Pública e Infraestructura Urbana.
C.c.p.-Ing. Edna Lizette Del Rio Sigala.-Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.-Arq. Jorge Palacios Ceballos.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

CHCG/CAG/ELDS/pam*


HOJA /

TRAMO:

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

OBRA :	PARQUE LOS ARCOS, CALLE ARCO LA CANTERA Y CALLE ARCO CATEDRA CONTRATISTA:
--------	---

Nº DE ESTIMACION:	3	PERIODO DEL 08 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016
-------------------	---	---

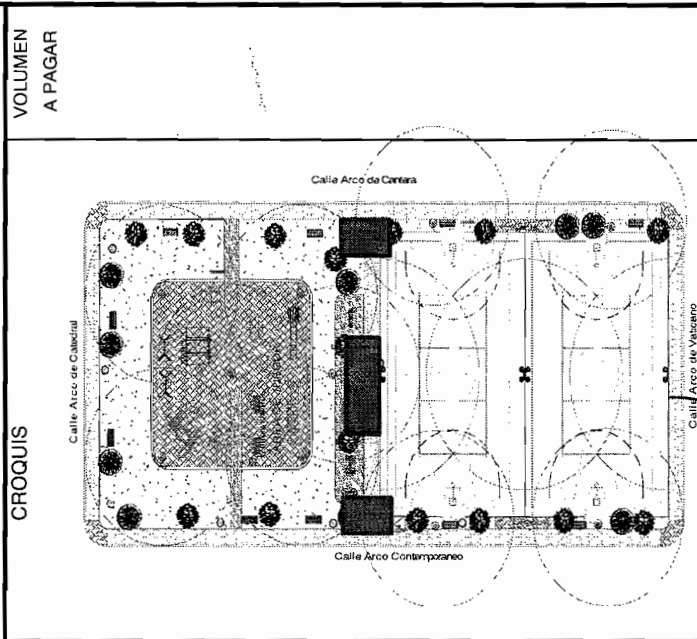[illegible]

RESIDENTE D.O.P.M
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

~~CONTRATISTA~~
~~ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA~~


ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

HOJA /

TRAMO:

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

CROQUIS

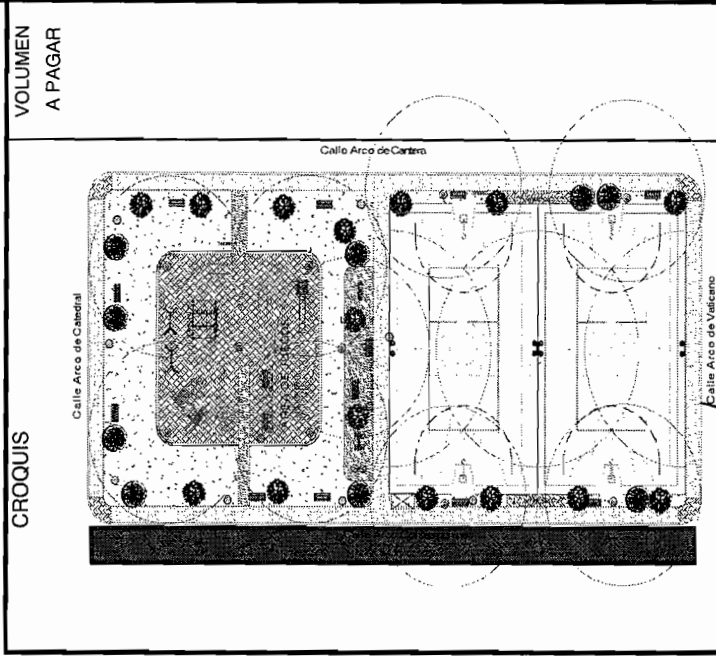[illegible]

~~CONTRATISTA~~
~~ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA~~

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

HOJA 1

TRAMO:

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

PERIODO:

OPERACIONES ARITMETICAS



~~CONTRATISTA~~
~~ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA~~

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA /

CONTRATO : 214/2016	TRAMO:
OBRA : PARQUE LOS ARCOS, CALLE ARCO LA CANTERA Y CALLE ARCO CATEDRA	ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

No DE ESTIMACION:	3	PERIODO DEL 08 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016
-------------------	---	---

CONCEPTO	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
Excavacion en material "b" hasta 1.5 mts. a mano incluye acarreo dentro de obra	0.80	0.80	1.30	0.83
	0.80	0.80	1.30	0.83
	0.80	0.80	1.30	0.83
	0.80	0.80	1.30	0.83
	0.80	0.80	1.30	0.83
	0.80	0.80	1.30	0.83
	0.80	0.80	1.30	0.83
	0.80	0.80	1.30	0.83
	0.80	0.80	1.30	0.83
	0.80	0.80	1.30	0.83
TOTAL =				6.66 M3

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
COLOR DESERT SAND 3 X 3 X 4.24 MTS INSTALADOS CON OJOS METALICOS A CADA 25 CMS Y CABLE DE ALUMINUM NO. 6 IPR DE 8"X5 1/4"X25.7kg/cm² ACABADO CON PINTURA ESMALTE COLOR OSEL SEALSKIN 5405N SATINADO ANCLA 1" ACERO A-36 DADO DE CONCRETO 35 CM X 35 CM ARMADO CON 8 VS. NO. 3 EST. 1#15 0.20 ZAPA A DE CONCRETO 80 CM X 80 CM ARMADA CON DOS PARRILLAS 6 VS. 1" AMBOS SENTIDOS EN LECHO INFERIOR Y SUPERIOR PLACA 1" PROFUNDIDAD MINIMA DE DADO 1.00 0.35 0.80	

CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

RESIDENTE D.O.P.M
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

GENERADOR DE ESTIMACION


HOJA /

CONTRATO : 214/2016
 OBRA : PARQUE LOS ARCOS, CALLE ARCO LA CANTERA Y CALLE ARCO CATEDRA CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

TRAMO:

No DE ESTIMACION: 3 PERIODO DEL 08 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			
	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
Plantilla de concreto $f_c=100$ kg/cm ² de 5 cms. de espesor	0.80	0.80		0.64
	0.80	0.80		0.64
	0.80	0.80		0.64
	0.80	0.80		0.64
	0.80	0.80		0.64
	0.80	0.80		0.64
	0.80	0.80		0.64
	0.80	0.80		0.64
	0.80	0.80		0.64
	0.80	0.80		0.64
TOTAL =				5.12 M2

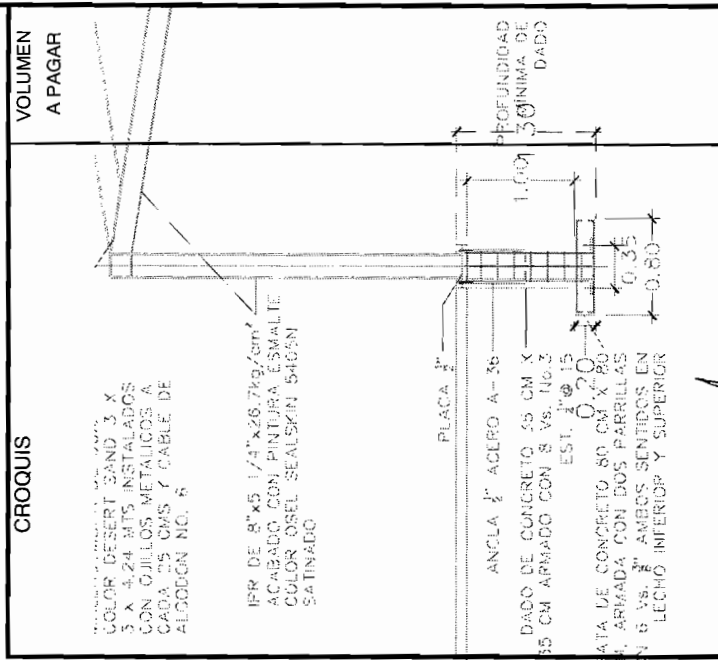

CONTRATISTA
 ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

RESIDENTE D.O.P.M
 ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

HOJA /

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

HOJA /

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA /

CONTRATO : 214/2016

TRAMO:

OBRA : PARQUE LOS ARCOS, CALLE ARCO LA CANTERA Y CALLE ARCO CATEDRA CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

No DE ESTIMACION: 3 PERIODO DEL 08 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			
	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
Suministro y colocacion de pergola con malla sombra de 9x3 mts. y una altura de 3.00 mts. modelo fipepm10 o similar a base de ipr de 8" x 5 1/4" de 26.7 kg/m, ensambles con tornilleria grado 5, mallasoma con 95% de proteccion solar y acabado con pintura electrostatica poliester homneada.				1.00
				1.00
TOTAL =				1.00 PZAS

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR

RESIDENTE D.O.P.M
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

HOJA /

TRAMO:

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

CROQUIS

CROQUIS

VOLUMEN A PAGAR

COLOR DESERT SAND 3 X 3 X 4.24 MTS. INSTALADOS CON DILLOS METALICOS A CADA 25 CMS Y CABLE DE ALUMINUM NO. 6

IPR DE 8"X5 1/4"X26.7kg/cm²
ACABADO CON PINTURA ESMALE
COLOR OSEL SEALSPAN 5405N
SATINADO

ANCLA 2" ACERO A-36
DADO DE CONCRETO 35 CM X 35 CM ARMADO CON 8 VS. NO.3
EST. 1" @ 15"
0.20
0.35
0.80

PLACA 2"

1.00

PROFUNDIDAD
MÍNIMA DE
DADO

PLATA DE CONCRETO 80 CM X 80 CM ARMADA CON DOS PARRILLAS
EN 6 VS. 3" AMBOS SENTIDOS EN
LECHO INFERIOR Y SUPERIOR


The drawing shows a cross-section of a concrete base. At the bottom is a 1.00m wide concrete slab (PLATA DE CONCRETO 80 CM X 80 CM) reinforced with two layers of bars (ARMADA CON DOS PARRILLAS EN 6 VS. 3"). Above this is a 0.80m high concrete wall (DADO DE CONCRETO 35 CM X 35 CM) reinforced with 8 bars (ARMADO CON 8 VS. NO.3) and stirrups (EST. 1" @ 15"). A 2-inch thick steel plate (PLACA 2") is attached to the top of the wall. An anchor bolt (ANCLA 2" ACERO A-36) is shown passing through the wall. Dimensions are given in meters: 1.00 for the slab width, 0.80 for the wall height, 0.35 for the wall thickness, and 0.20 for the plate thickness. Material specifications include 'COLOR DESERT SAND 3 X 3 X 4.24 MTS. INSTALADOS CON DILLOS METALICOS A CADA 25 CMS Y CABLE DE ALUMINUM NO. 6', 'IPR DE 8"X5 1/4"X26.7kg/cm²', 'ACABADO CON PINTURA ESMALE COLOR OSEL SEALSPAN 5405N SATINADO', and 'PLATA DE CONCRETO 80 CM X 80 CM ARMADA CON DOS PARRILLAS EN 6 VS. 3" AMBOS SENTIDOS EN LECHO INFERIOR Y SUPERIOR'.

~~CONTRATISTA~~
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, Queda PROHIBIDO EL USO PARA FINESES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

HOJA /

NO DE ESTIMACION: 3 PERIODO DEL 08 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016

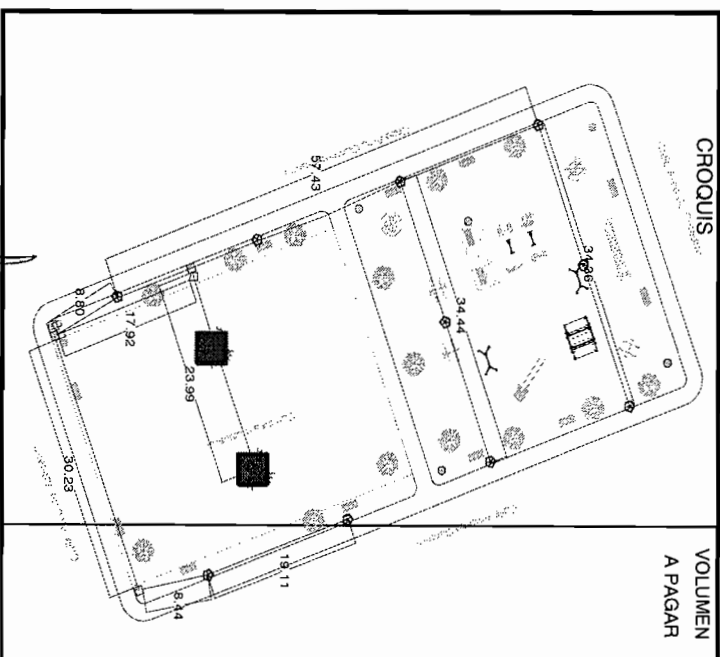[illegible]

CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

HOJA 1

TRAMO:

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

CROQUIS

**VOLUMEN
A PAGAR**

[illegible]

CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

HOJA /

[illegible]

GENERADOR DE ESTIMACION

HUJA /

CONTRATO : 214/2016 TRAMO: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

OBRA : PARQUE LOS ARCOS, CALLE ARCO LA CANTERA Y CALLE ARCO CATEDRA CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA


No DE ESTIMACION: 3 PERIODO DEL 08 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			
	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
Relleno y compactacion al 90% de material producto de la excavacion	5.08			
	0.45	0.45	1.10	0.22
	0.45	0.45	1.10	0.22
	0.45	0.45	1.10	0.22
	0.45	0.45	1.10	0.22
	0.45	0.45	1.10	0.22
	0.45	0.45	1.10	0.22
	0.45	0.45	1.10	0.22
	0.45	0.45	1.10	0.22
	0.45	0.45	1.10	0.22
TOTAL =				1.78 M3

RESIDENTE D.O.P.M.
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

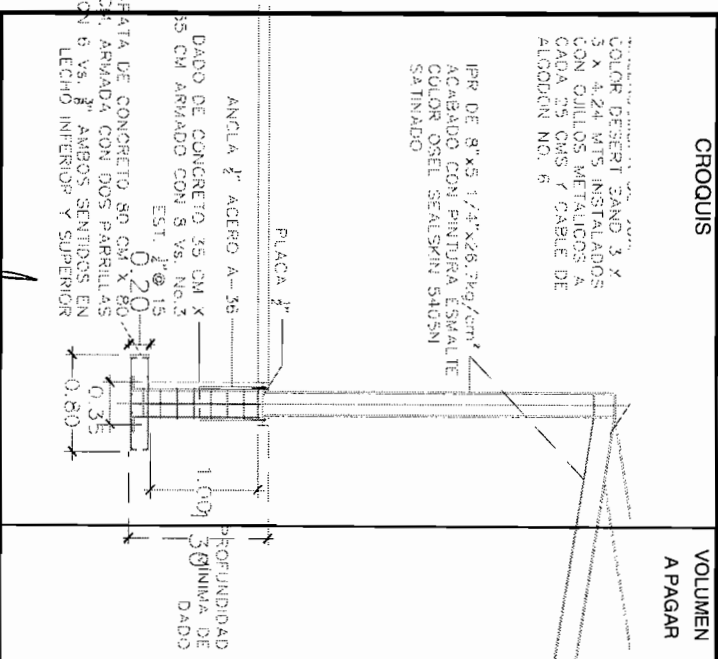

HOJA /

TRAMO:

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

CROQUIS

**VOLUMEN
A PAGAR**

~~CONTRATISTA~~
~~ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA~~

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA /

CONTRATO : 214/2016		TRAMO:	
OBRA : PARQUE LOS ARCOS		CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA	
No DE ESTIMACION: 3 PERIODO DEL 08 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016			
CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS		
7.17	LARGO	ANCHO	ALTO TOTAL
Valvula de 1 1/2"	TORRE		
	1.00		1.00
TOTAL = 1.00 PZA			
CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR	

RESIDENTE D.O.P.M
 ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS


CONTRATISTA
 ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUESEA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

HOJA /

[illegible]

HOJA /

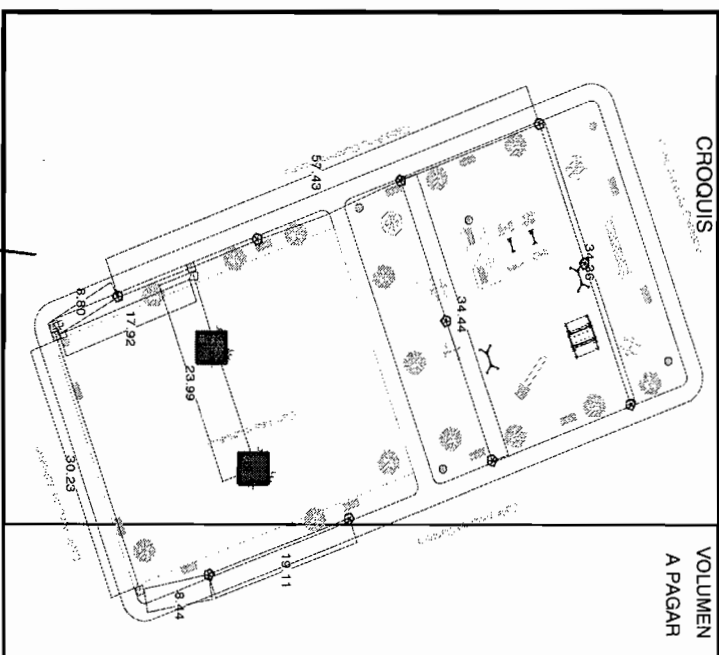[illegible]

RESIDENTE D.O.P.M
PALACIOS CEBALLOS

CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTA

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

2. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

HOJA /

[illegible]

HOJA /

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

PERIODO DEL 08 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016

[illegible]

CROQUIS

Calle Arco de Catedral

Calle Arco Contemporáneo

Calle Arco de Centro

0 10

VOLUMEN A PAGAR

PRESIDENTE D.O.P.M.
E PALACIOS CEBALLO

), AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUE DA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

HOJA /

CONTRATO : 214/2016						TRAMO:	
OBRA : PARQUE LOS ARCOS						ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA	
NO DE ESTIMACION: 3 PERIODO DEL 08 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016							
CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS						
EXT-23	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL			
Suministro y colocacion de asiento para columpio existente. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo para su correcta instalacion por unidad de obra terminada.	0.00	2.00		2.00			
				TOTAL =	2.00		

CROQUIS

Calle Arco de Catedral

Calle Arco de Gaitan

VOLUMEN A PAGAR

HOJA /

TRAMO:

CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

CROQUIS

~~CONTRATISTA~~
~~ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA~~

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

GENERADOR DE ESTIMACION

HOUA /

CONTRATO : 214/2016				TRAMO:	
OBRA : PARQUE LOS ARCOS				CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA	
No DE ESTIMACION: 3 PERIODO DEL 08 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016					
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMETICAS			
EXT.25	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL	
Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltica de 5 cms de espesor compactos. Incluye: riego de liga, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	~~0.32~~ 0.37	76.32		24.42 028.24	
TOTAL =		28.24 m ²			
CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR			

RESIDENTE D.O.P.M
 ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONTRATISTA
 ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

HOJA /

TRAMO:

CONTRATISTA:

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

Nº DE ESTIMACION: 3 PERIODO DEL 08 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016

RESIDENTE D.O.P.M
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

~~CONTRATISTA~~
~~ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA~~

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

HOJA /

CONTRATO: 214/2016
OBRA:

NO DE ESTIMACION: 3 PERIODO :

CONCEPTO		OPERACIONES ARITMETICAS		
EXT-28		PIEZAS	ALTO	CANT TOTAL
Suministro e instalación decable monopolar de cobre cal. 10 THW, Incluye: cinta de aislar vulcanizable y de vinil y todo lo necesario para su correcta instalación.	SUBIDAS			
	10.00	6.00	3.00	180.00
	2.00	10.00	3.00	60.00
TOTAL =		240.00	PZA	

This architectural site plan depicts a rectangular plaza area, labeled 'Plaza de los Niños' and 'Barrio de la Candelaria'. The plaza is bordered by 'Calle Arco de Candelaria' on the top and 'Calle Arco de Caribia' on the bottom. The plan shows a central open space with a large, shaded rectangular area in the center, possibly a stage or a large play structure. There are several smaller, shaded rectangular areas along the sides, which could be benches or smaller play structures. The plaza is surrounded by a sidewalk with a pattern of small dots, and there are several trees indicated by small circles with crosshairs. The plan also shows the surrounding streets and buildings, with labels for 'Calle Arco de Candelaria' and 'Calle Arco de Caribia'. The overall layout is symmetrical and designed for a community space.

RESIDENTE D.O.P.M
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS







~~CONTRATISTA~~
ING. IVAN MOE SIMENTAL ORTEGA

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

FOTOS

HOJA /

CONTRATO :	214/2016	TRAMO:
OBRA :	PARQUE LOS ARCOS, CALLE ARCO LA CANTERA Y CALLE ARCO CATEDRAL, FRACCIONAMIENTO	CONTRATISTA:
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA		
No DE ESTIMACION:	3	PERIODO:
DEL 08 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016		

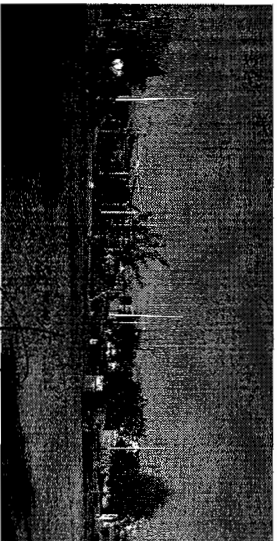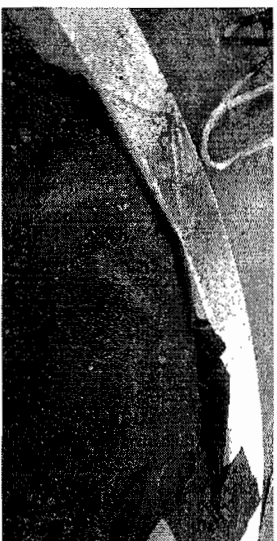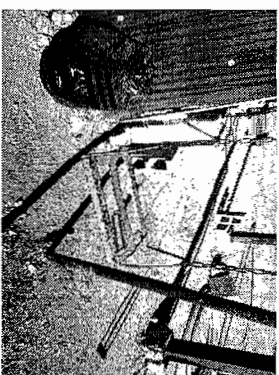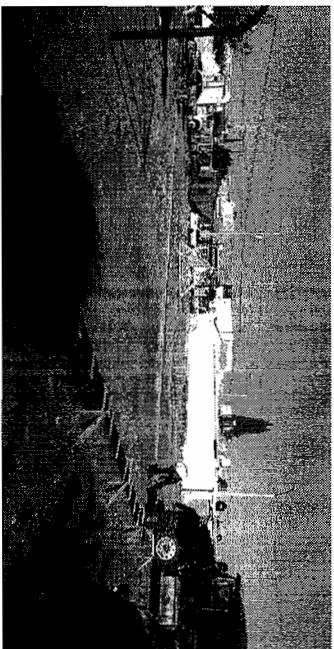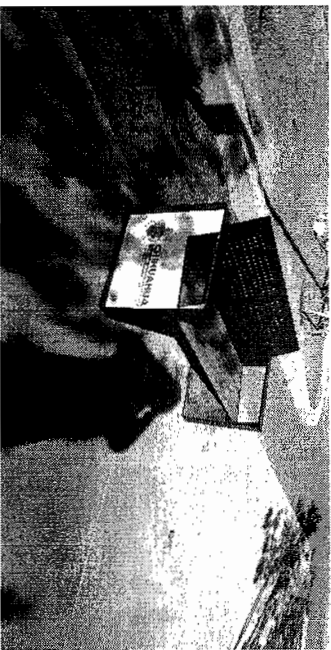

RESIDENTE D.O.P.M
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

SELO DIGITAL

FIRMA

PARA GARANTIZAR POR: OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V., EL EXACTO Y TOTAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. 239/2016 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2016, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, REPRESENTADO POR LOS CC. CC. MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN, LIC. CÉSAR GUSTAVO JÁUREGUI MORENO, C.P.AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ, ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL Y C. P. CARLOS DAVID ORDOZCO CHACÓN, EN SUS CARÁCTERES DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE REGIDORES DE HACIENDA Y PLANEACIÓN, RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA NUESTRO FIADO OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V., RELATIVO A TRABAJOS REFERENTES A LA REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS. COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MÁXIMO DE 3/8" Y ASFALTICO PG-76-22; INCLUYE RIEGO DE LIGA BASE DE ENULSION ASFALTICA ECR-60 EN : TOTAL. PACHECO ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. 20 NOVIEMBRE (TRAMOS PARCELES) DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CON UN IMPORTE TOTAL. CONTRATO DE \$1,697,080.00 (UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.); CANTIDAD QUE INCLUYE EL IVA.

POR LA SUMA DE: \$169,08.00 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.), CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO INCLUYENDO EL I.V.A.

los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye ahora hasta por la suma de:

Bld. Adolfo López Mateos No. 1941, Col. Los Alpes Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500		www.softmex.com.mx	
FIANZA	MOVIMIENTO	POLIZA DE FIANZA	
2048082	EMISION		
DOCUMENTO		LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	
1352143		CHIHUAHUA CHIHUAHUA, A 22 DE NOVIEMBRE DE 2016	
AGENTE	MONEDA	MONTO TOTAL DE LA FIANZA	MONTO DEL MOVIMIENTO
1510	PESOS	\$169,708.00	\$169,708.00
SUBRAMO		RAMO	
OBRA		ADMINISTRATIVAS	

www.solimex.com.mx

R.F.C. ASG-950531-1D1

Alianzas
SOFIMEX S.A.

