

CONSTRUCTORA RIO AROS,S.A. DE
C.V.
CRA850326UN6
LAZARO DE BAIGORRI No. 422
COL.SAN FELIPE, CP 31240
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO.

FACTURA

F 272

FECHA

2016-12-13
15:23:37

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22
CALLE MINA No. 408
COL.CENTRO, CP.31000
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO.

FOLIO FISCAL
011D30D3-6B51-4D92-96E6-BC8B37DE02A0

LUGAR DE EXPEDICION
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000404147641

FECHA DE CERTIFICACIÓN
2016-12-13T15:23:49

RÉGIMEN FISCAL
Regimen General de Ley
Personas Morales

CONDICIONES

FORMA DE PAGO
Una sola exhibición

METODO DE PAGO
02 Cheque nominativo

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	OBRA CIVIL EN ADECUACION DE CRUCEROS EN AV. LA CANTERA - AV. TOMAS VALLES Y AV. MISION DEL BOSQUE. ESTIMACION NUMERO 1 (UNO) SEGUN CONTRATO NUM. 237/2016 FIRMA DEL CONTRATISTA ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 370,280.60 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 0.00 RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO : D.I.F. DEL 0.2% \$ 740.56 CMIC DEL 0.2% \$ 740.56 SUMA \$ 1,481.12 NETO A RECIBIR ----- \$ 428,044.38	370,280.60	370,280.60

IMPORTE CON LETRA

***(Cuatrocientos Veintinueve Mil Quinientos Veinticinco Pesos 50/100
MXN Peso Mexicano)***

SUB TOTAL \$ 370,280.60
% 16 IVA \$ 59,244.90
TOTAL \$ 429,525.50




SELLO DIGITAL DEL CFDI:
[B]L8nMn4fWwGluZv1E1QZn259/ly5Q7Z9Zu-zShTQlP5qG9mdqKaDRYvZLPbPzPluRqWQDZ7HPI48gIF8Bd/VYusRW
8PP36vgtY1ylnb7XkMq+yVvure8bE+VMYk27mJKF06pQ8saHlnb8aQ98hS9MAkwb+ZNF5ZAMdF55Lyk2uWjy6Dk4tNZXC8t
Ryd35dE8zvu4S/ttuPOhtpIcCn/pT2BtZ5B59rvQq76GLVYVW50gMsoFXZ7MvMEkqT6LrX6XuMAoQI45rSsaQM/ogAlXn
c9TmSmPLCsej6MvYsRG097KW6YpcUZ8tQigotc4ZBLguE88cA==
SELLO DEL SAT:
UgeO0nXQeUyAT3bDJ7CcrK4RWdCdMxVGUv2KvOPDh78bN3/gY+ldpxj/fzRayh5IMt1ComnPSFdu28KaXwLX+45Lc9mnn
IOC(Hp8U0NueZJD7prRjQJtBumxX0p15xpJ56lbzvU0Y6RnerSyAsolHnURT00zUkxp-KGUwa
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
[1,0][11D30D3-6B51-4D92-96E6-BC8B37DE02A0]2016-12-13T15:23:49[3bL8nMn4fWwGluZv1E1QZn259/ly5
Q7Z9Zu-zShTQlP5qG9mdqKaDRYvZLPbPzPluRqWQDZ7HPI48gIF8Bd/VYusRW8PP36vgtY1ylnb7XkMq+yVvure8bE+VMYk
27mJKF06pQ8saHlnb8aQ98hS9MAkwb+ZNF5ZAMdF55Lyk2uWjy6Dk4tNZXC8tRyd35dE8zvu4S/ttuPOhtpIcCn/pT2Bt
Z5B59rvQq76GLVYVW50gMsoFXZ7MvMEkqT6LrX6XuMAoQI45rSsaQM/ogAlXn c9TmSmPLCsej6MvYsRG097KW6YpcUZ8tQ
igotc4ZBLguE88cA==][00001000000304339655]
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000304339655

Este documento es una representación impresa de un CFDI
pie de pagina

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"
sello="I3bL8nMNAf4WWeGIuzav1E1QZn259/iIySQ7Z9Zu+zShTQIlp5qG9mdqKaDRiYf2LPbPzPluRqWQDZ7HPt48gJF8Bd/VYU5RW8PP36vgtY1yInb7XkMq+yVvu/e8bE+VMyk27mJKF
certificado="MIIGMzCCBBugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQxNDc2NDExDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlCBTZXJ2aWNpbyBkZSBF
noCertificado="0000100000040147641" LugarExpedicion="CHIHUAHUA, CHIH." metodoDePago="02 Cheque nominativo" total="429525.50" Moneda="MXN" TipoCambio="1.0000"
descuento="0.00" subTotal="370280.60" formaDePago="Una sola exhibición" tipoDeComprobante="ingreso" fecha="2016-12-13T15:23:37" folio="272" serie="F" version="3.2"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor rfc="CRA850326UN6" nombre="CONSTRUCTORA RIO AROS,S.A. DE C.V.">
    <cfdi:DomicilioFiscal calle="LAZARO DE BAIGORRI" noExterior="422" colonia="COL.SAN FELIPE" municipio="CHIHUAHUA" estado="CHIHUAHUA" pais="MEXICO"
      codigoPostal="31240"/>
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Regimen General de Ley Personas Morales"/>
  </cfdi:Emisor>
  <cfdi:Receptor rfc="MCI651010V22" nombre="MUNICIPIO DE CHIHUAHUA">
    <cfdi:DomicilioFiscal calle="CALLE MINA" noExterior="408" colonia="COL.CENTRO" municipio="CHIHUAHUA" estado="CHIHUAHUA" pais="MEXICO" codigoPostal="31000"/>
  </cfdi:Receptor>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto importe="370280.60" valorUnitario="370280.60" descripcion="OBRA CIVIL EN ADECUACION DE CRUCEROS EN AV. LA CANTERA - AV. TOMAS VALLES Y
      AV. MISION DEL BOSQUE. ----- ESTIMACION NUMERO 1 (UNO) ----- SEGUN CONTRATO NUM. 237/2016 ----- FIRMA
      DEL CONTRATISTA ----- ALCANCE DE LA ESTIMACION ----- $ 370,280.60 ----- AMORTIZACION DEL ANTICIPO -----
      ----- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO : D.I.F. DEL 0.2% ----- $ 740.56 ----- CMIC DEL 0.2% ----- $ 740.56 ----- SU/MO
      ----- $ 1,481.12 ----- NETO A RECIBIR ----- $ 428,044.38" unidad="NO APLICA" cantidad="1"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="59244.90">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado importe="59244.90" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
      version="1.0"
      selloSAT="UgeO0nXQ6UyAT3bDJ7exRk4RWdCdeMxIVGuTv2KvOPDH7BbN3/gy+Idpxj/fzRayh5iMt1ComnPSFdu28KaXwLX+45Lc9mnniOCtHp8U0NueZJD7prRjIQtBui
      noCertificadoSAT="00001000000304339685"
      selloCFD="I3bL8nMNAf4WWeGIuzav1E1QZn259/iIySQ7Z9Zu+zShTQIlp5qG9mdqKaDRiYf2LPbPzPluRqWQDZ7HPt48gJF8Bd/VYU5RW8PP36vgtY1yInb7XkMq+yVvu/e8l
      FechaTimbrado="2016-12-13T15:23:49" UUID="011D30D3-6B51-4D92-96E6-BC8B37DE02A0" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```


 Edith Kaur




CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 237/2016	CONTRATADO
OBRA: OBRA CIVIL EN ADECUACION DE CRUCEROS EN AV LA CANTERA -AV TOMAS VALLES Y AV. MISION DEL BOSQUE.	ESTIMACIÓN No. 1(UNO)	\$ 1,245,040.16 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 23 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 429,525.50 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS S.A. de C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC CRA-850326-UN6	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 429,525.50 CON IVA





TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 345,626.18	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ 24,654.42	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 370,280.60	

DESCUENTOS	
0.2% D.I.F.	\$ 740.56
0.2% C.M.I.C.	\$ 740.56
SUMA DESCUENTOS	\$ 1,481.12
RESUMEN	
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 370,280.60
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 370,280.60
I.V.A.	\$ 59,244.90
TOTAL	\$ 429,525.50

(CON LETRA)

(CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS
VEINTICINCO PESOS 50/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 1,481.12
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 428,044.38

AUTORIZO	ELABORO
 ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS RESIDENTE D.O.P.M	 CONSTRUCTORA RIO AROS S.A. de C.V. CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
 ING. CARLOS AGUILAR GARCIA SUBDIRECTOR DE DE INFRAESTRUCTURA URBANA	 ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.
Vo. Bo.	
 ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

CHIHUAHUA, CHIH.,

30 de noviembre de 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA / DIR. OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO., LA CANTIDAD DE: \$ 428,044.38
(CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1(UNO) CONTRATO No. 237/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 1,245,040.16
UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS 16/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
OBRA CIVIL EN ADECUACION DE CRUCEROS EN AV LA CANTERA -AV TOMAS VALLES Y AV. MISION DEL BOSQUE.

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	370,280.60
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$	370,280.60
	IVA	\$	59,244.90
	TOTAL	\$	429,525.50
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
D.I.F. DEL 0.2%	740.56		
CMIC. DEL 0.2%	740.56		
SUMA	1,481.12		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 1,245,040.16
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 429,525.50
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 429,525.50
POR EJERCER	\$ 815,514.66


2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% C.M.I.C.	0.2% D.I.F.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 740.56	\$ 740.56
ACUMULADO ACTUAL	\$ 740.56	\$ 740.56

R E C I B I M O S


CONSTRUCTORA RIO AROS S.A. de C.V.
CRA-850326-UN6

OBRA: OBRA CIVIL EN ADECUACION DE CRUCEROS EN AV LA CANTERA -AV TOMAS VALLES Y AV. MISION DEL BOSQUE.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS S.A. de C.V.

CHIHUAHUA

MUNICIPIO:

PERÍODO: 23 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

No. CONTRATO: 237/2016

ESTIMACIÓN No. 1(UNO)

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS			
	NORMALES		345,626.18
	EXCEDENTES		24,654.42

SUBTOTAL \$	370,280.60
I.V.A. \$	59,244.90
TOTAL \$	429,525.50



RESIDENTE



CONTRATISTA

No.	CONCEPTOS DESCRIPCION	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR		
	TOTAL DE LA ESTIMACION						370,280.60
	OBRA NORMAL					\$	345,626.18
	PRELIMINARES					\$	9,720.00
1	Demoliciones, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico simple. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta, carga y acarreo fuera de la obra de los desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	25.00	25.00	0.00	\$388.80	9,720.00
	TERRACERIAS						206,375.14
3	Excavaciones en cortes y adicionales abajo de la subrasante en área de rampas de acceso y vialidad cuando el material se desperdicia, en cualquier tipo de material a cualquier profundidad. Incluye: corte, extracción, remoción y carga del material excavado, limpieza, acarreo del material de desperdicio fuera de la obra, así como la estabilización de taludes en caso de ser necesario. P.U.O.T.	m3	1,340.00	1203.67	0.00	\$84.78	102,047.14
4	Compactación del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes, para noventa por ciento (90%), incluye escarificado, incorporación del agua, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	400.00	400.00	0.00	\$29.16	11,664.00
5	Suministro, mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado de banco, por unidad de obra terminada con TMA de 3" y un VRS mínimo de 30, de la elevación de la subrasante en cortes y/o terraplenes existentes, para una compactación del noventa y cinco por ciento (95%). Incluye: material, acarreo, acamellonado, formación, agua para la compactación, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Se pagará medido compacto. P.U.O.T.	m3	600.00	600.00	0.00	\$154.44	92,664.00
	PAVIMENTOS						129,531.04
10	Suministro, formación y compactación de Base hidráulica, por unidad de obra terminada, compactada al cien por ciento (100%), del banco que elija el Contratista, con material triturado total. Incluye: materiales, acarreo, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación.	m3	400.00	400.00	0.00	\$204.12	81,648.00
11	Suministro y colocación de riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento medio tipo RL-2K, por unidad de obra terminada, a razón de 1.50 l/m2. Incluye: material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, operación de calentamiento o recalentamiento, aplicación, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3,000.00	2259.70	0.00	\$21.19	47,883.04

[Firma]

RESIDENTE

[Firma]
CONTRATISTA

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR		
	OBRA EXCEDENTE						
	PRELIMINALES						
1	Demoliciones, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico simple: Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta, carga y acarreo fuera de la obra de los desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	25.00	26.30	25.00	1.30 \$388.80	505.44
	TERRACERIAS						
4	Compactación del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes, para noventa por ciento (90%), incluye escarificado, incorporación del agua, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	400.00	451.94	400.00	51.94 \$29.16	1,514.57
5	Suministro, mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado de banco, por unidad de obra terminada con TMA de 3" y un VRS mínimo de 30, de la elevación de la subrasante en cortes y/o terraplenes existentes, para una compactación del noventa y cinco por ciento (95%). Incluye: material, acarreo, acamellonado, formación, agua para la compactación, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Se pagará medido compacto. P.U.O.T.	m3	600.00	677.91	600.00	77.91 \$154.44	12,032.42
	PAVIMENTOS						
10	Suministro, formación y compactación de Base hidráulica, por unidad de obra terminada, compactada al cien por ciento (100%), del banco que elija el Contratista, con material triturado total. Incluye: materiales, acarreo, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación.	m3	400.00	451.94	400.00	51.94 \$204.12	10,601.99

Juarez A.
RESIDENTE

[Signature]
CONTRATISTA

GENERADOR DE ESTIMACION																																																																																																																																																																																			
CONTRATO : 237/2016																																																																																																																																																																																			
OBRA CIVIL EN ADECUACION DE CRUCEROS EN AV LA CANTERA -AV TOMAS VALLES																																																																																																																																																																																			
OBRA : Y AV. MISION DEL BOSQUE.																																																																																																																																																																																			
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS S.A. de C.V.																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">CROQUIS</td> <td colspan="2">VOLUMEN A PAGAR</td> <td colspan="2">UNIDAD</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1</td> <td colspan="2">26.30</td> <td colspan="2">M3</td> </tr> </table>										CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR		UNIDAD		1		26.30		M3																																																																																																																																																															
CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR		UNIDAD																																																																																																																																																																															
1		26.30		M3																																																																																																																																																																															
<table border="1"> <tr> <td colspan="10">ANEXO</td> </tr> <tr> <td colspan="10">CROQUIS 1</td> </tr> <tr> <td colspan="10">CROQUIS 2</td> </tr> </table>										ANEXO										CROQUIS 1										CROQUIS 2																																																																																																																																																					
ANEXO																																																																																																																																																																																			
CROQUIS 1																																																																																																																																																																																			
CROQUIS 2																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">No DE ESTIMACION:</td> <td colspan="2">1(UNO)</td> <td colspan="2">PERIODO :</td> <td colspan="2">23 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="10">CONCEPTO</td> </tr> <tr> <td colspan="10">PRELIMINARES</td> </tr> <tr> <td colspan="10">OPERACIONES ARITMETICAS</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Demoliciones, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico simple: Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta, carga y acarreo fuera de la obra de los desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.</td> </tr> <tr> <td colspan="10">1 TRAMO</td> </tr> <tr> <td colspan="10">1 LADO</td> </tr> <tr> <td colspan="10">2 LADO</td> </tr> <tr> <td colspan="10">2 TRAMO</td> </tr> <tr> <td colspan="10">1 LADO</td> </tr> <tr> <td colspan="10">2 LADO</td> </tr> <tr> <td colspan="10">LONGITUD TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="10">SECCION DE GUARNICION</td> </tr> <tr> <td colspan="10">VOLUMEN TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="10">ANEXO</td> </tr> <tr> <td colspan="10">CROQUIS 1</td> </tr> <tr> <td colspan="10">CROQUIS 2</td> </tr> </table>										No DE ESTIMACION:		1(UNO)		PERIODO :		23 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016				CONCEPTO										PRELIMINARES										OPERACIONES ARITMETICAS										Demoliciones, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico simple: Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta, carga y acarreo fuera de la obra de los desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.										1 TRAMO										1 LADO										2 LADO										2 TRAMO										1 LADO										2 LADO										LONGITUD TOTAL										SECCION DE GUARNICION										VOLUMEN TOTAL										ANEXO										CROQUIS 1										CROQUIS 2									
No DE ESTIMACION:		1(UNO)		PERIODO :		23 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016																																																																																																																																																																													
CONCEPTO																																																																																																																																																																																			
PRELIMINARES																																																																																																																																																																																			
OPERACIONES ARITMETICAS																																																																																																																																																																																			
Demoliciones, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico simple: Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta, carga y acarreo fuera de la obra de los desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.																																																																																																																																																																																			
1 TRAMO																																																																																																																																																																																			
1 LADO																																																																																																																																																																																			
2 LADO																																																																																																																																																																																			
2 TRAMO																																																																																																																																																																																			
1 LADO																																																																																																																																																																																			
2 LADO																																																																																																																																																																																			
LONGITUD TOTAL																																																																																																																																																																																			
SECCION DE GUARNICION																																																																																																																																																																																			
VOLUMEN TOTAL																																																																																																																																																																																			
ANEXO																																																																																																																																																																																			
CROQUIS 1																																																																																																																																																																																			
CROQUIS 2																																																																																																																																																																																			

OBRA : OBRA CIVIL EN ADECUACION DE CRUCEROS EN AV LA CANTERA -AV TOMAS VALLES Y AV. MISION DEL BOSQUE.

1

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR	UNIDAD
---------	-----------------	--------

[illegible]

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR	UNIDAD
1	26.30	M3

ANEXO
CROQUIS 1
CROQUIS 2

CONTRATISTA

ANEXO CROQUIS 1

CONTRATO: 237/2016

OBRA: OBRA CIVIL EN ADECUACION DE CRUCEROS EN AV LA CANTERA -AV TOMAS VALLES Y AV. MISION DEL BOSQUE.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS S.A. de C.V.


No DE ESTIMACION: 1(UNO)

PERIODO: 23 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016


CONCEPTO

1


Demoliciones, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico simple; Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta, carga y acarreo fuera de la obra de los desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.



SECCION GUARNICION

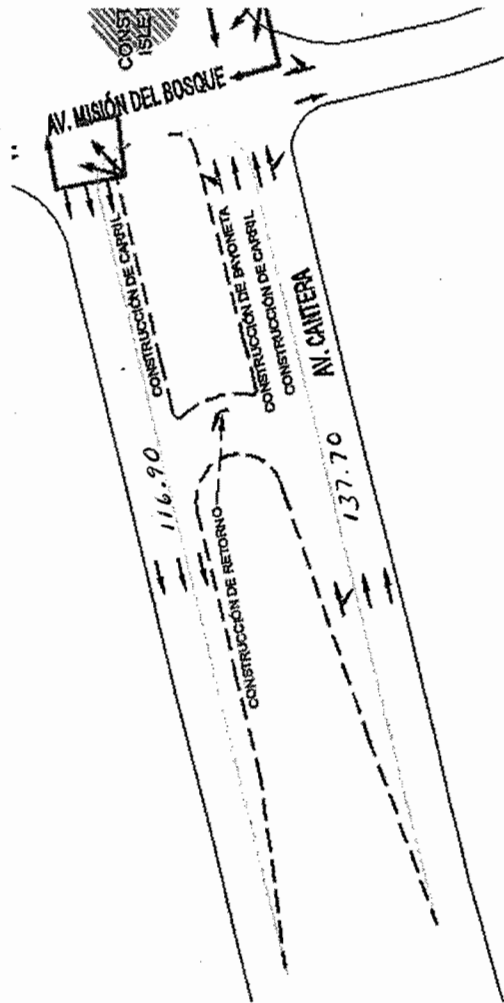

TRAMO 1 DEMOLICION

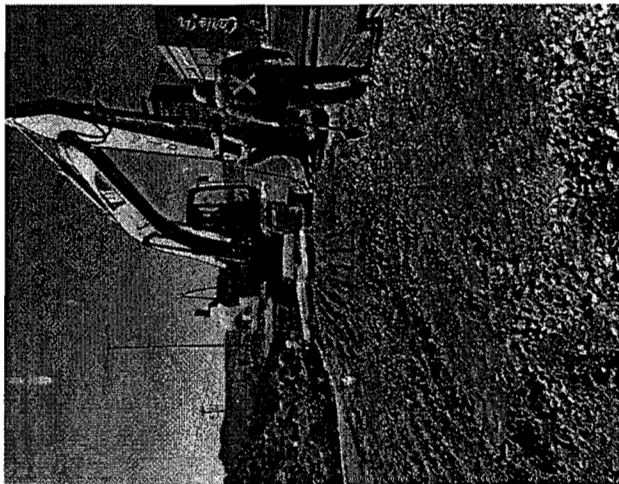

[Firma]
RESIDENTE

[Firma]
CONTRATISTA

ANEXO CROQUIS 2

CONTRATO : 237/2016

OBRA : OBRA CIVIL EN ADECUACION DE CRUCEROS EN AV LA CANTERA -AV TOMAS VALLES Y AV. MISION DEL BOSQUE.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS S.A. de C.V.



Nº DE ESTIMACION: 1(UNO)

PERIODO : 23 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

CONCEPTO

1

Demoliciones, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico simple: Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta, carga y acarreo fuera de la obra de los desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.

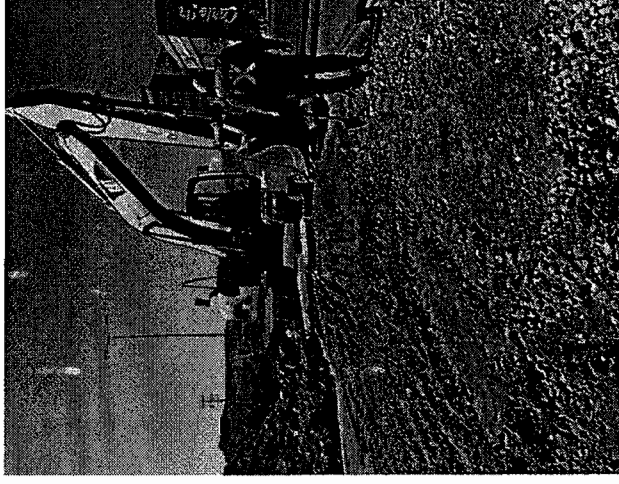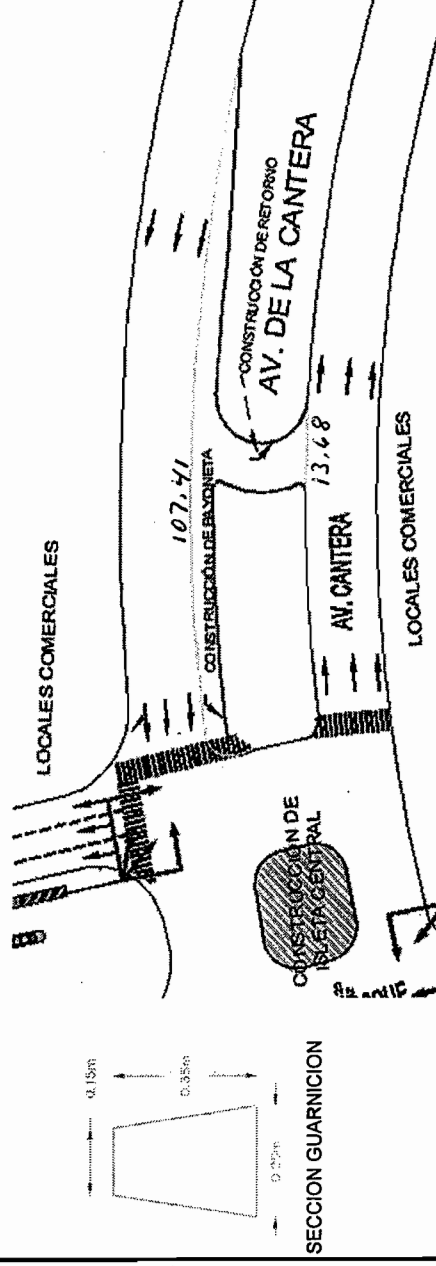

TRAMO 2 DEMOLICION

[Signature]
RESIDENTE

[Signature]
CONTRATISTA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 237/2016

OBRA : OBRA CIVIL EN ADECUACION DE CRUCEROS EN AV LA CANTERA -AV
TOMAS VALLES Y AV. MISION DEL BOSQUE.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS S.A. de C.V.

No DE ESTIMACION: 1(UNO) PERIODO 23 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

CONCEPTO

PRELIMINARES

OPERACIONES ARITMETICAS

3 Excavaciones en cortes y adicionales abajo de la subrasante en area de rampas de acceso y vialidad cuando el material se desperdicie, en cualquier tipo de material y a cualquier profundidad. Incluye: corte, extracción, remoción y carga del material excavado, limpieza, acarreo del material de desperdicio fuera de la obra, así como la estabilización de taludes en caso de ser necesario. P.U.O.T.

1 TRAMO	1347.346	*.58=	781.46	M3
2 TRAMO	314.26	*.30=	94.28	M3
3 TRAMO	145.86	*.45=	65.64	M3
4 TRAMO	182.431	*.58=	105.81	M3
	269.801	*.58=	156.48	M3

TOTAL 1203.67

TOTAL 1203.67 M3

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR	UNIDAD
3	1203.67	M3

ANEXO
CROQUIS 3
CROQUIS 4

[Signature]
RESIDENTE

[Signature]
CONTRATISTA

ANEXO CROQUIS 3

CONTRATO : 237/2016

OBRA : OBRA CIVIL EN ADECUACION DE CRUCEROS EN AV LA CANTERA -AV TOMAS VALLES
Y AV. MISION DEL BOSQUE.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS S.A. de C.V.

No DE ESTIMACION: 1(UNO)




PERIODO : 23 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

CONCEPTO

3

Excavaciones en cortes y adicionales abajo de la subrasante en area de rampas de acceso y viabilidad cuando el material se desperdice, en cualquier tipo de material y a cualquier profundidad. Incluye: corte, extracción, remoción y carga del material excavado, limpieza, acarreo del material de desperdicio fuera de la obra, así como la estabilización de taludes en caso de ser necesario. P.U.O.T.

TRAMO 1

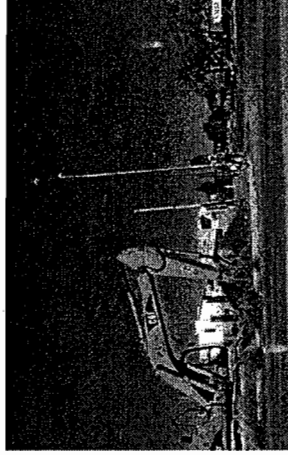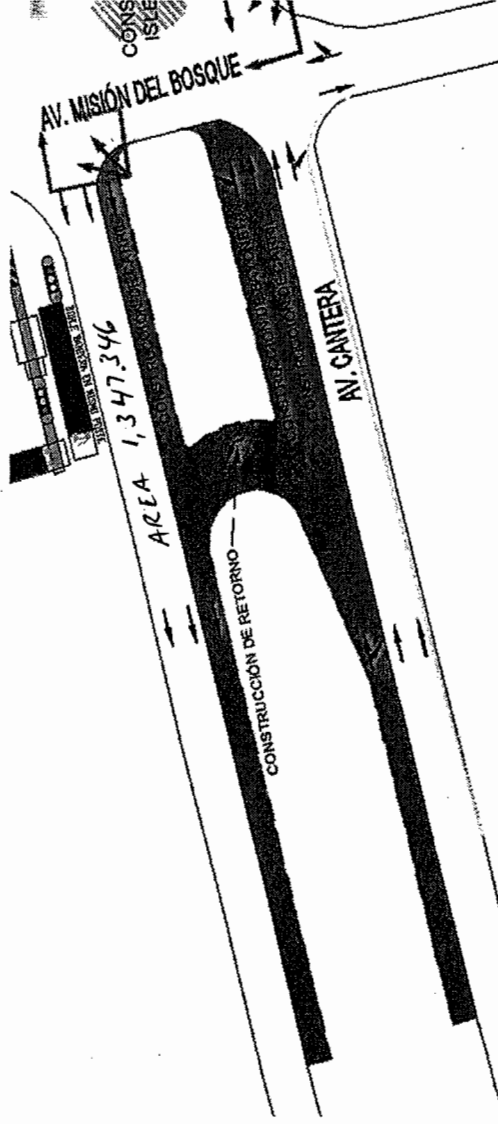

[Signature]
RESIDENTE

[Signature]
CONTRATISTA

ANEXO CROQUIS 4

CONTRATO : 237/2016

OBRA : OBRA CIVIL EN ADECUACION DE CRUCEROS EN AV LA CANTERA -AV TOMAS VALLES Y AV. MISION DEL BOSQUE.


CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS S.A. de C.V.

No DE ESTIMACION: 1(UNO) PERIODO : 23 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016


CONCEPTO

- Excavaciones en cortes y adicionales abajo de la subrasante en area de rampas de acceso y vialidad cuando el material se desperdicie, en cualquier tipo de material y a cualquier profundidad. Incluye: corte, extracción, remoción y carga del material excavado, limpieza, acarreo del material de desperdicio fuera de la obra, así como la estabilización de taludes en caso de ser necesario. P.U.O.T.

TRAMO 2

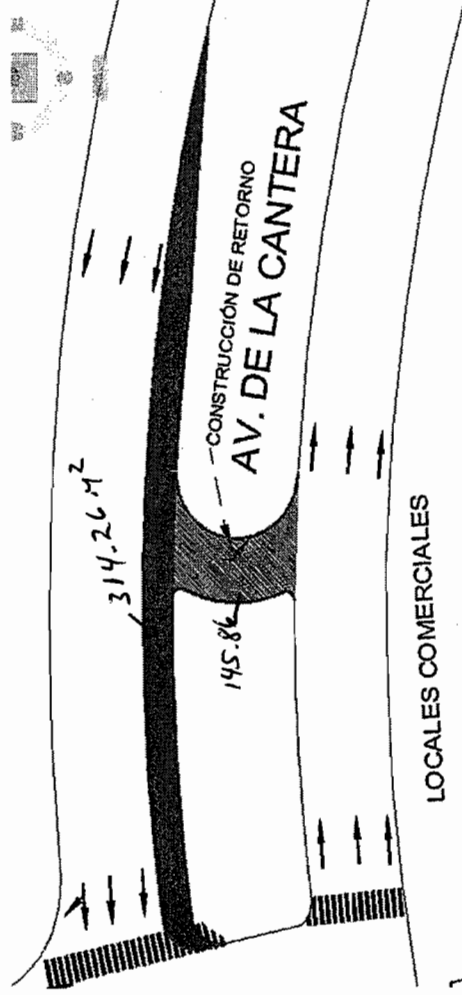

314.26	AREA
145.86	AREA

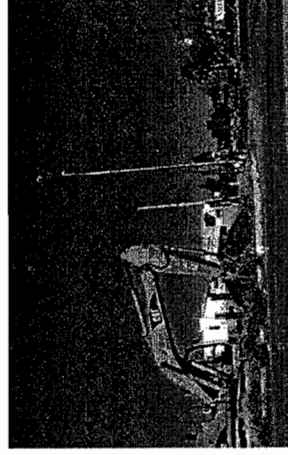



[Signature]
RESIDENTE

[Signature]
CONTRATISTA

ANEXO CROQUIS 3	
CONTRATO : 237/2016	
OBRA : OBRA CIVIL EN ADECUACION DE CRUCEROS EN AV LA CANTERA -AV TOMAS VALLES Y AV. MISION DEL BOSQUE.	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS S.A. de C.V.
No DE ESTIMACION: 1(UNO)	PERIODO : 23 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

CONCEPTO

- 3 Excavaciones en cortes y adicionales abajo de la subrasante en area de rampas de acceso y vialidad cuando el material se desperdicie, en cualquier tipo de material y a cualquier profundidad. Incluye: corte, extracción, remoción y carga del material excavado, limpieza, acarreo del material de desperdicio fuera de la obra, así como la estabilización de taludes en caso de ser necesario. P.U.O.T.

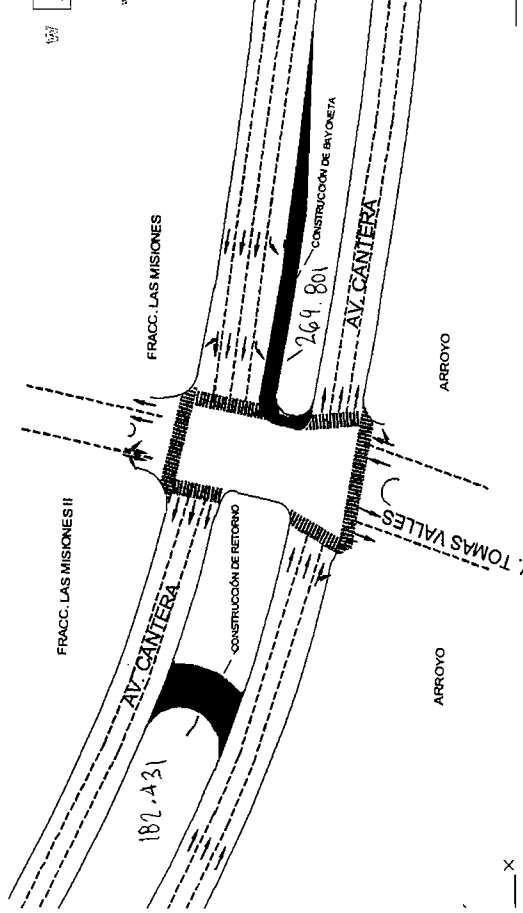

TRAMO 3
TRAMO 4

[Signature]

RESIDENTE

[Signature]
CONTRATISTA

[illegible]

CONTRATISTA

ANEXO CROQUIS 5

CONTRATO : 237/2016

OBRA : OBRA CIVIL EN ADECUACION DE CRUCEROS EN AV LA CANTERA -AV TOMAS VALLES
Y AV. MISION DEL BOSQUE.


CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS S.A. de C.V.

No DE ESTIMACION: 1(UNO) PERIODO : 23 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

CONCEPTO

- 4 Compactación del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes, para noventa por ciento (90%), incluye escarificado, incorporación del agua, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.

TRAMO 1
TRAMO 2

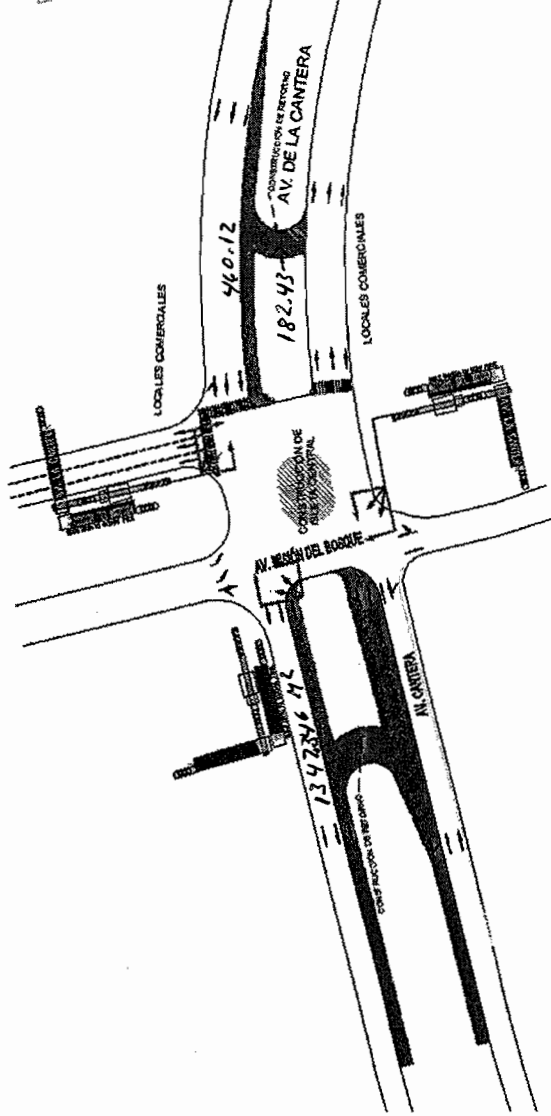

[Signature]
RESIDENTE

[Signature]
CONTRATISTA

ANEXO CROQUIS 6

CONTRATO : 237/2016

OBRA : OBRA CIVIL EN ADECUACION DE CRUCEROS EN AV LA CANTERA -AV TOMAS VALLES Y AV. MISION DEL BOSQUE.


CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS S.A. de C.V.

No DE ESTIMACION: 1(UNO) PERIODO : 23 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

CONCEPTO

- 4 Compactación del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes, para noventa por ciento (90%), incluye escarificado, incorporación del agua, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.

TRAMO 3
TRAMO 4

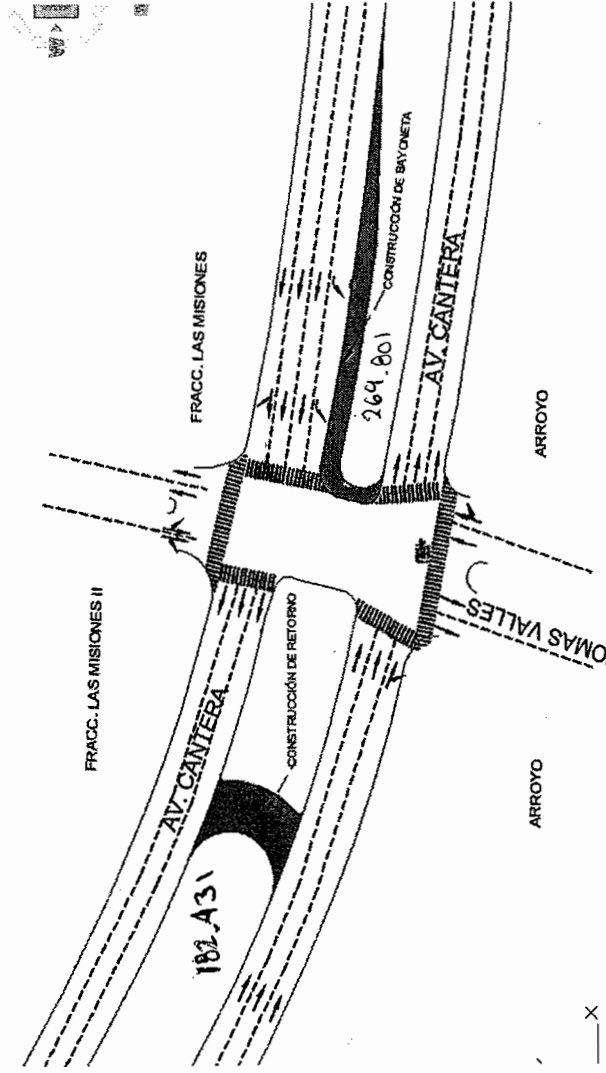

[Signature]
RESIDENTE

[Signature]
CONTRATISTA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 237/2016

OBRA : OBRA CIVIL EN ADECUACION DE CRUCEROS EN AV LA CANTERA -AV TOMAS VALLES Y AV. MISION DEL BOSQUE.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS S.A. de C.V.

No DE ESTIMACION: 1(UNO) PERIODO : 23 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

CONCEPTO

PRELIMINARES

OPERACIONES ARITMETICAS

5 Suministro, mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado de banco, por unidad de obra terminada con TMA de 3" y un VRS mínimo de 30, de la elevación de la subrasante en cortes y/o terraplenes existentes, para una compactación del noventa y cinco por ciento (95%). Incluye: material, acarreo, acamellonado, formación, agua para la compactación, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Se pagará medido compacto. P.U.O.T.

1 TRAMO	1347.346	*.30=	404.20	M3
2 TRAMO	460.12	*.30=	138.04	M3
3 TRAMO	182.431	*.30=	54.73	M3
4 TRAMO	269.801	*.30=	80.94	M3

TOTAL 677.91

CROQUIS	5	VOLUMEN A PAGAR	677.91	UNIDAD	M3
---------	---	-----------------	--------	--------	----

ANEXO
CROQUIS 7
(CROQUIS 8

RESIDENTE

CONTRATISTA

ANEXO CROQUIS 7

CONTRATO : 237/2016

OBRA : OBRA CIVIL EN ADECUACION DE CRUCEROS EN AV LA CANTERA -AV TOMAS VALLES
Y AV. MISION DEL BOSQUE.


CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS S.A. de C.V.

No DE ESTIMACION: 1(UNO) PERIODO : 23 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

CONCEPTO

- 5 Suministro, mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado de banco, por unidad de obra terminada con TMA de 3" y un VRS mínimo de 30, de la elevación de la subrasante en cortes y/o terraplenes existentes, para una compactación del noventa y cinco por ciento (95%). Incluye: material, acarreos, acamellonado, formación, agua para la compactación, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Se pagará medido compacto. P.U.O.T.

TRAMO 1
TRAMO 2

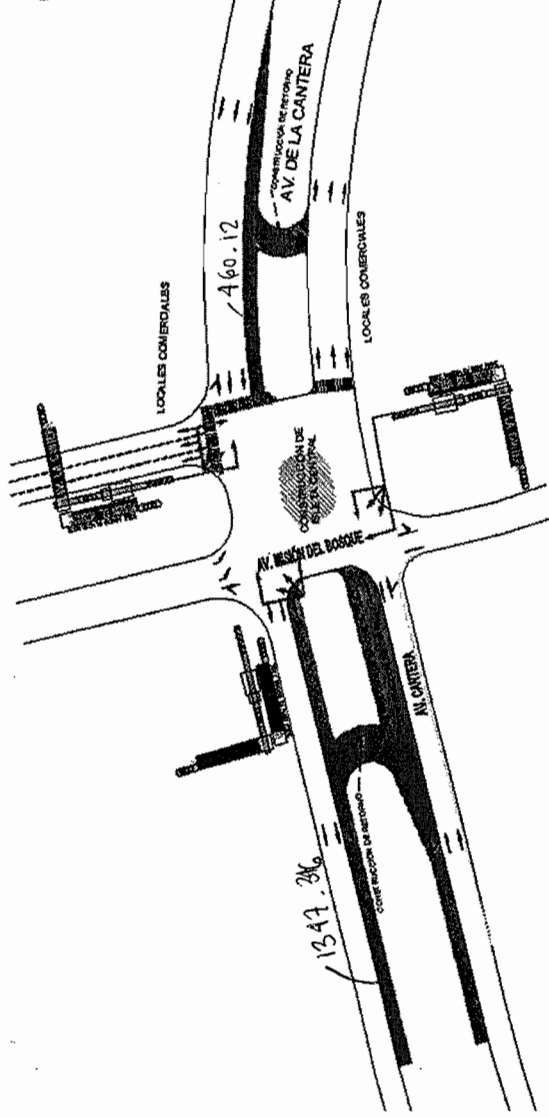

[Signature]
RESIDENTE

[Signature]
CONTRATISTA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 237/2016

OBRA : OBRA CIVIL EN ADECUACION DE CRUCEROS EN AV LA CANTERA -AV TOMAS VALLES Y AV. MISION DEL BOSQUE.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS S.A. de C.V.

No DE ESTIMACION: 1(UNO) PERIODO : 23 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

CONCEPTO

PRELIMINARES

OPERACIONES ARITMETICAS

10 Suministro, formaci3n y compactaci3n de Base hidr3ulica, por unidad de obra terminada, compactada al cien por ciento (100%), del banco que elija el Contratista, con material triturado total. Incluye: materiales, acarreos, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporaci3n del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocaci3n.

1 TRAMO 1347.346 * .20= 269.47 M3
2 TRAMO 460.12 * .20= 92.02 M3
3 TRAMO 182.431 * .20= 36.49 M3
4 TRAMO 269.801 * .20= 53.96 M3

TOTAL 451.94

ANEXO

CROQUIS 9
CROQUIS 10

CROQUIS 10 VOLUMEN A PAGAR 451.94 UNIDAD M3

Residente

Contratista

ANEXO CROQUIS 9

CONTRATO : 237/2016

OBRA CIVIL EN ADECUACION DE CRUCEROS EN AV LA CANTERA -AV TOMAS VALLES
Y AV. MISION DEL BOSQUE.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS S.A. de C.V.


No DE ESTIMACION: 1(UNO)

PERIODO : 23 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

CONCEPTO

10 Suministro, formación y compactación de Base hidráulica, por unidad de obra terminada, compactada al cien por ciento (100%), del banco que elija el Contratista, con material triturado total. Incluye: materiales, acarreos, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación.

TRAMO 1
TRAMO 2

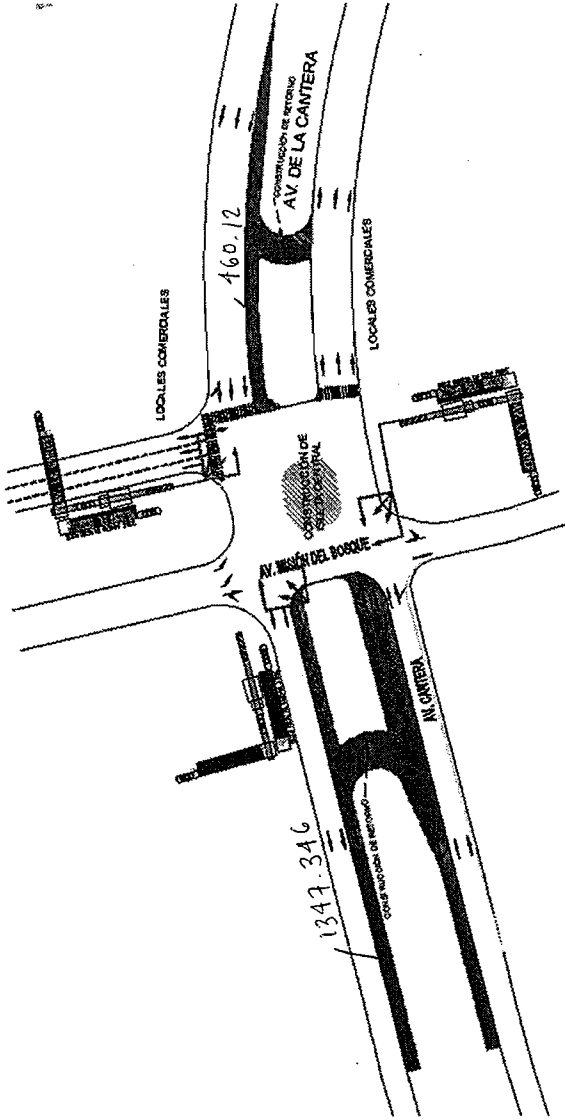

[Signature]
RESIDENTE

[Signature]
CONTRATISTA



ANEXO CROQUIS 9

CONTRATO : 237/2016	
OBRA : OBRA CIVIL EN ADECUACION DE CRUCEROS EN AV LA CANTERA -AV TOMAS VALLES Y AV. MISION DEL BOSQUE	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS S.A. de C.V.
No DE ESTIMACION: 1(UNO)	PERIODO : 23 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

CONCEPTO

- 10 Suministro, formación y compactación de Base hidráulica, por unidad de obra terminada, compactada al cien por ciento (100%), del banco que cede el Contratista, con material triturado total. Incluye: materiales, acarreo, carga y descarga, mezcla, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación.

TRAMO 3
TRAMO 4

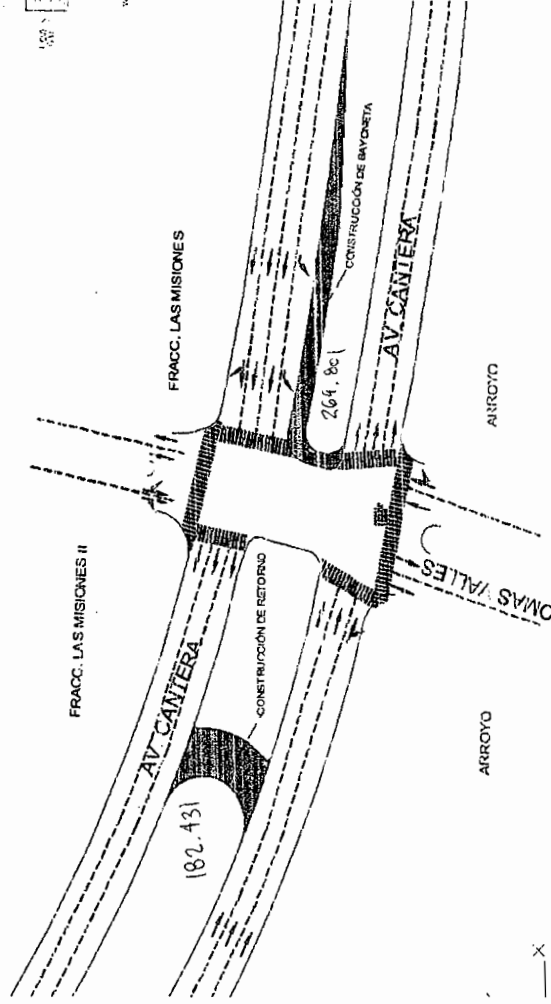

[Signature]
RESIDENTE

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 237/2016

OBRA : OBRA CIVIL EN ADECUACION DE CRUCEROS EN AV LA CANTERA -AV TOMAS VALLES Y AV. MISION DEL BOSQUE.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS S.A. de C.V.

No DE ESTIMACION: 1(UNO) PERIODO : 23 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

CONCEPTO

PRELIMINARES

OPERACIONES ARITMETICAS

11 Suministro y colocación de riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento medio tipo RL-2K, por unidad de obra terminada, a razón de 1.50 lt/m2. Incluye: material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, operación de calentamiento o recalentamiento, aplicación, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.

1 TRAMO 1347.346 M2
2 TRAMO 460.12 M2
3 TRAMO 182.431 M2
4 TRAMO 269.801 M2

TOTAL 2259.698

CROQUIS 11

VOLUMEN A PAGAR 2259.70

UNIDAD M2

ANEXO CROQUIS 11

[Firma]
RESIDENTE


[Firma]
CONTRATISTA

ANEXO CROQUIS 11	
CONTRATO : 237/2016	
OBRA : OBRA CIVIL EN ADECUACION DE ORUCEROS EN AV LA CANTERA -AV TOMAS VALLES Y AV. MISION DEL BOSQUE	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS S.A. de C.V.
PERIODO : 23 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016	
No DE ESTIMACION: 1(UNO)	

CONCEPTO

- 11 Suministro y colocación de riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompiemiento medio tipo PL-2K por unidad de obra terminada, a razón de 1.50 l/m². Incluye: material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, operación de calentamiento o recalentamiento, aplicación, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.

TRAMO 1
TRAMO 2

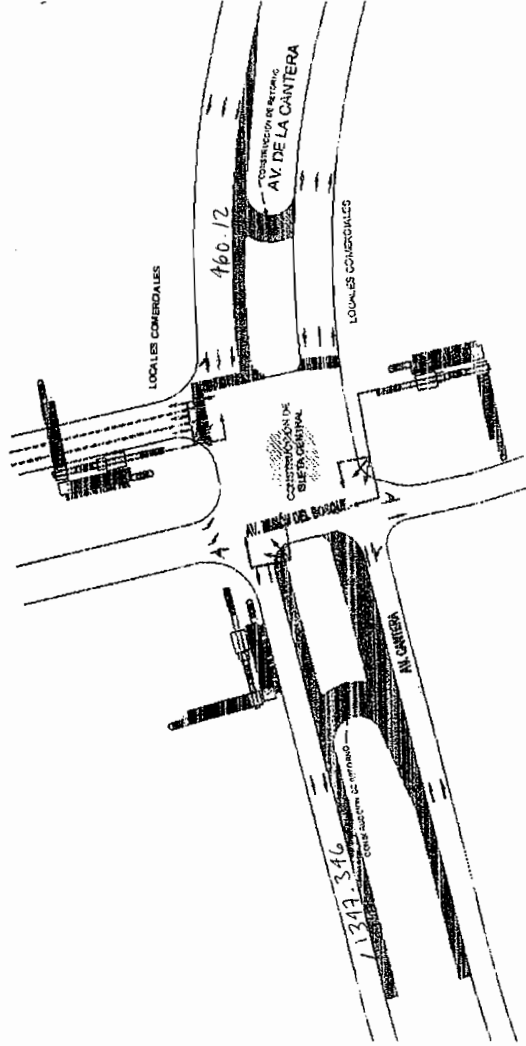

[Signature]
RESIDENTE


[Signature]
CONTRATISTA

ANEXO CROQUIS 11	
CONTRATO : 237/2016	
OBRA : MISION DEL BOSQUE	CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS S.A. de C.V.
No DE ESTIMACION: 1(UNO) PERIODO : 23 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016	

CONCEPTO

11 Suministro y colocación de riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompiendo medio tipo B1-24 por unidad de obra terminada, a razón de 1.50 ltr/m². Incluye: material, almacenamiento, preparación de la Superficie, protección de estructuras existentes, operación de calentamiento o recalentamiento, aplicación, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.

TRAMO 3
TRAMO 4

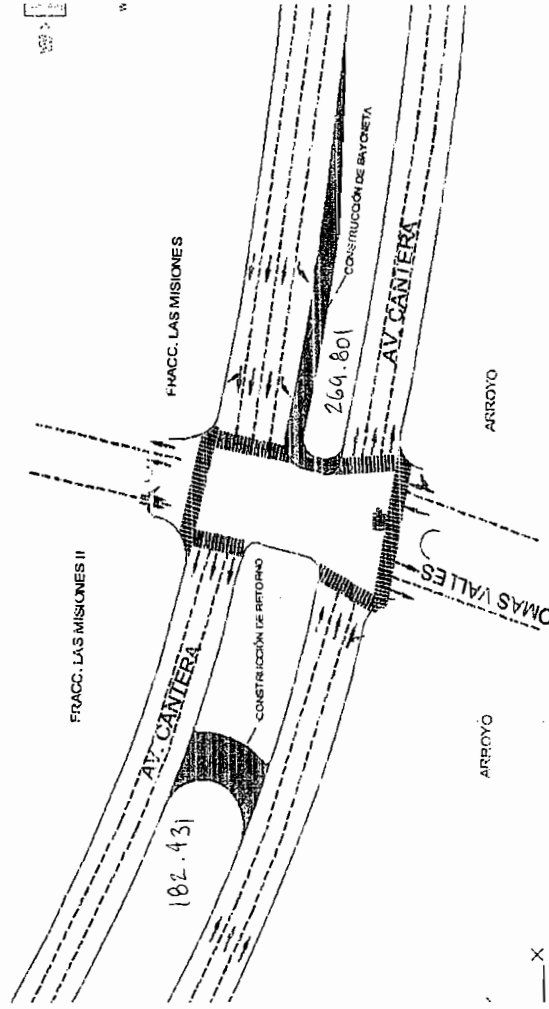

[Signature]
RESIDENTE

[Signature]
CONTRATISTA



Liberty Fianzas



Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 R.F.C. PFI9712228W1

AUTORIZADA POR LA S.H.C.P.

Lugar: CHIHUAHUA CHIHUAHUA A 22 DE NOVIEMBRE DE 2016

POLIZA DE FIANZA

Fianza No. 1783277-0000

Inicio de Vigencia: 22 DE NOVIEMBRE DE 2016

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA CUMPLIMIENTO

Fiado: CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V. *****

Domicilio: LAZARO DE BAIGORRI 422, COL. SAN FELIPE I, C.P. 31203, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Beneficiario: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH.

Domicilio: AVE. INDEPENDENCIA NO. 209 DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de: \$124,504.02

Ciento Veinticuatro Mil Quinientos Cuatro Pesos 02/100 M.N.

POR LA SUMA DE: \$124,504.02 (CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 01/100 M.N.), CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO INCLUYENDO EL I.V.A.

ANTE: TESORERIA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

PARA GARANTIZAR POR: CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V., EL EXACTO Y TOTAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. 237/2016 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, REPRESENTADO POR LOS CC. CC. MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN, LIC. CÉSAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO, C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ, ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL Y C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE REGIDORES DE HACIENDA Y PLANEACIÓN. RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA NUESTRO FIADO CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V., RELATIVO A TRABAJOS REFERENTES A "OBRA CIVIL EN ADECUACION DE CRUCEROS EN AV. LA CANTERA - AV. TOMAS VALLES Y AV. MISION DEL BOSQUE", CON UN IMPORTE TOTAL CONTRATADO DE \$1,245,040.16 (UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS 16/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE EL IVA.

ESTA INSTITUCIÓN DECLARA EXPRESAMENTE: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y ESTARÁ EN VIGOR HASTA QUE LA OBRA HAYA SIDO RECIBIDA EN SU TOTALIDAD POR EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, ASI COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES, MEDIOS DE DEFENSA O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONAN POR LAS PARTES CONTRATANTES Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUÉDE FIRME. B) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO A QUE SE REFIERE LA FIANZA O EXISTE ESPERA, LA VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, MANIFESTANDO EN ESTE ACTO PARA ELLO, SU EXPRESA CONFORMIDAD, HACIENDO RENUNCIA EXPRESA AL BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, POR EL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS; C) QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO, AUN CUANDO UNA PARTE DE ELLA SE SUBCONTRATE CON AUTORIZACIÓN DE EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; D) QUE EL EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA Y LA EJECUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LA OBRA GARANTIZADA, CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN DE CARÁCTER INDIVISIBLE; E) SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS, HACE RENUNCIA EXPRESA AL BENEFICIO DE PROPORCIONALIDAD QUE PUDIERA CORRESPONDERLE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2842 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA QUE PUDIESE REALIZAR EL FIADO; F) QUE ESTA FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN DEL CONTRATO, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR

EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ

Director Comercial Div. Nte

LÍNEA DE VALIDACIÓN
14WdNNX8D



LEONEL LUNA SANCHEZ

Gte. Regional

Autorizado Bajo el Oficio No. 366-III-0978/14 de la SHCP

Página 1/2



Liberty Fianzas



Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 R.F.C. PFI9712228W1

AUTORIZADA POR LA S.H.C.P.

Lugar: CHIHUAHUA CHIHUAHUA A 22 DE NOVIEMBRE DE 2016

POLIZA DE FIANZA

Fianza No. 1783277-0000

Inicio de Vigencia: 22 DE NOVIEMBRE DE 2016

Ramo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA CUMPLIMIENTO

PARTE DEL FIADO, SE PAGARÁ EL MONTO TOTAL GARANTIZADO EN ESTA PÓLIZA; G) QUE LA OBLIGACIÓN A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE ACTUALIZA CON EL INCUMPLIMIENTO DEL FIADO, Y SERÁ EXIGIBLE A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SE RESCINDA EL CONTRATO DE OBRA GARANTIZADO; H) QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; I) QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA SOMETERSE EXPRESAMENTE A LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 178, 282, 283, 289 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS; J) QUE EN CASO DE NO CUBRIR EL MONTO DE ESTA FIANZA EN EL PLAZO QUE SE ESTABLECE EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PAGARÁ POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UN INTERÉS CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 2104, 2108, 2109 Y 2110 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL; K) QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE ESTA PÓLIZA REPRESENTA, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ESTATALES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO; L) QUE LA AFIANZADORA RECONOCE EL CARÁCTER DE LOS FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES QUE COMPARECIERON POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA; M) QUE LA AFIANZADORA ES CONFORME EN QUE LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO LE SEAN FORMULADOS POR CONDUCTO DE SUS AGENTES AUTORIZADOS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., N) QUE AFIANZADORA LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO NO. 909-1 EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.; O) TODA ESTIPULACIÓN QUE APAREZCA IMPRESA POR FORMATO POR PARTE DE AFIANZADORA LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. QUE CONTRAVENGA LAS ESTIPULACIONES AQUÍ ASENTADAS, LAS CUALES COMPRENDEN EL PROEMIO Y LOS INCISOS DEL A) AL O), SE CONSIDERAN NO PUESTAS.***FIN DE TEXTO***

EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ

Director Comercial Div. Nte

LÍNEA DE VALIDACIÓN
14WdNNX8D



LEONEL LUNA SANCHEZ

Gte. Regional

Autorizado Bajo el Oficio No. 366-III-0978/14 de la SHCP

Página 2/2
