

CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.
CRA850326UN6
LAZARO DE BAIGORRI No. 422
COL.SAN FELIPE, CP 31240
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO.

FACTURA

F 319

FECHA

2017-04-04
13:34:27

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22
CALLE MINA No. 408
COL.CENTRO, CP.31000
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO.

FOLIO FISCAL
0B8CA9E4-52EE-450A-93FB-C895D2FF0F28
LUGAR DE EXPEDICION
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000404147641

FECHA DE CERTIFICACIÓN	RÉGIMEN FISCAL	CONDICIONES	FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO
2017-04-04T13:39:05	Regimen General de Ley Personas Morales		Una sola exhibición	02 Cheque nominativo

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	OBRA CIVIL EN ADECUACION DE CRUCEROS EN AV. LA CANTERA - AV. TOMAS VALLES Y AV. MISION DEL BOSQUE - - - - - - - - - - ESTIMACION NUMERO 3 (TRES) ULTIMA - - - - - - - SEGUN CONTRATO NUM. 237/2016- - - - - - - - - - FIRMA DEL CONTRATISTA - - - - - - - - - - ALCANCE DE LA ESTIMACION - - - - - \$ 581,449.45 - - - - - - - - - - AMORTIZACION DE ANTICIPO - - - - - - - - - - RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO: - - - - - - - - - - D.I.F. DEL 0.2% - - - - - \$ 1,162.90 - - - - - - - - - - C.M.I.C. DEL 0.2% - - - - - \$ 1,162.90 - - - - - - - - - - SUMA - - - - - \$ 2,325.80 - - - - - - - - - - NETO A RECIBIR -- \$ 672,155.56	581,449.45	581,449.45

IMPORTE CON LETRA

*** (Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Un pesos 36/100 M.N.) ***

SUB TOTAL	\$ 581,449.45
% 16 IVA	\$ 93,031.91
TOTAL	\$ 674,481.36



SELLO DIGITAL DEL CFDI:
db+lw2KMPWFFHtNY1/NeZPVEjK1k1k1KhaaCMD4e9w4CIN0tVubSFFJXVtyQ8pV5MwvC/Jb11hYd2y/Q+PE38e?+
aEPUPy1/yw/1FBN4uHh1XrSgS++UNq1Ew71XaChUD9vJX02-MF1DaUGNANNCuHq28QV2eYfPk1SArJC+1UuQeByRn/e
Y2B4uenQw32Nv6tr+k79caA1Mhnr7VGe9ZF/-0p5CNLqLJF23Rt1kEDP/Q221xbFQbT1deL2JF5QbWd0th1zJ4YFde1VQ
Hq21xy2d1A5K16/GMD31bVF+QNYKw0q4un48XTwKXEGW09e==
SELLO DEL SAT:
Vhknj06cuFXKCH1+kn3Fz380d+EM/791pca0U9Fz0F9e5eYtyb1R91/40aEwT/X20EJDFn1+uZNYZNSpy3KNOBFA7b5+
b7CYNQ8-LUw7rElLqgK8VWwCUNLauH2f6YK35yhw7egIdaIprch1r5R04F2ysSpA-JaGGJ4=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
111.0108CA9E4-52EE-450A-93FB-C895D2FF0F28/2017-04-04T13:39:05|db+lw2KMPWFFHtNY1/NeZPVEjK1k1k1KhaaCMD4e9w4CIN0tVubSFFJXVtyQ8pV5MwvC/Jb11hYd2y/Q+PE38e?+aEPUPy1/yw/1FBN4uHh1XrSgS++UNq1Ew71XaChUD9vJX02-MF1DaUGNANNCuHq28QV2eYfPk1SArJC+1UuQeByRn/eY2B4uenQw32Nv6tr+k79caA1Mhnr7VGe9ZF/-0p5CNLqLJF23Rt1kEDP/Q221xbFQbT1deL2JF5QbWd0th1zJ4YFde1VQHq21xy2d1A5K16/GMD31bVF+QNYKw0q4un48XTwKXEGW09e||0000100000030404147641
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
0000100000030404147641

Este documento es una representación impresa de un CFDI
pie de pagina

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"
sello="db+1w2fkNPvWPFHtNYl/MsZFVRjkf41kt7kHqaCMD4ogW4C2N0TVuB8RFJXVTyQUgPv6MvwwC/Jbl3ihYd2y/Q+PPf38e7+if7UFuyi/ywc/IFBW4uHhiXrSgd++UVJzIEu7lXAtHl
certificado="MIIGMzCBBugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQxNDc2NDExNDQyYjkoZlhcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBF
noCertificado="00001000000404147641" LugarExpedicion="CHIHUAHUA, CHIH." metodoDePago="02 Cheque nominativo" total="674481.36" Moneda="MXN" TipoCambio="1.0000"
descuento="0.00" subTotal="581449.45" formaDePago="Una sola exhibición" tipoDeComprobante="ingreso" fecha="2017-04-04T13:34:27" folio="319" serie="F" version="3.2"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor rfc="CRA850326UN6" nombre="CONSTRUCTORA RIO AROS,S.A. DE C.V.">
    <cfdi:DomicilioFiscal calle="LAZARO DE BAIGORRI" noExterior="422" colonia="COL.SAN FELIPE" municipio="CHIHUAHUA" estado="CHIHUAHUA" pais="MEXICO"
      codigoPostal="31240"/>
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Regimen General de Ley Personas Morales"/>
  </cfdi:Emisor>
  <cfdi:Receptor rfc="MCI651010V22" nombre="MUNICIPIO DE CHIHUAHUA">
    <cfdi:Domicilio calle="CALLE MINA" noExterior="408" colonia="COL.CENTRO" municipio="CHIHUAHUA" estado="CHIHUAHUA" pais="MEXICO" codigoPostal="31000"/>
  </cfdi:Receptor>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto importe="581449.45" valorUnitario="581449.45" descripcion="OBRA CIVIL EN ADECUACION DE CRUCEROS EN AV. LA CANTERA - AV. TOMAS VALLES Y
      AV. MISION DEL BOSQUE ----- ESTIMACION NUMERO 3 (TRES) ULTIMA ----- SEGUN CONTRATO NUM. 237/2016 -----
      --- FIRMA DEL CONTRATISTA ----- ALCANCE DE LA ESTIMACION --- $ 581,449.45 ----- AMORTIZACION DE ANTICIPO ----
      ----- RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO: ----- D.I.F. DEL 0.2% ----- $ 1,162.90 ----- C.M.I.C. DEL 0.2% ----- $
      1,162.90 ----- SUMA ----- $ 2,325.80 ----- NETO A RECIBIR -- $ 672,155.56" unidad="NO APLICA" cantidad="1"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="93031.91">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado importe="93031.91" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
      version="1.0"
      selloSAT="VhKunjc6zJP3XCHj+bz3FxGSQdxEMl/J9ipra0U9Kb2FKuE5nYUyeBIK8IjOaEWwT/K2QfJDFnI+mZNjZH6qy3NN0bVX7bB+b7CYbQ6+2U+VrDiLgqHoKVdwi
      noCertificadoSAT="00001000000304339685"
      selloCFD="db+1w2fkNPvWPFHtNYl/MsZFVRjkf41kt7kHqaCMD4ogW4C2N0TVuB8RFJXVTyQUgPv6MvwwC/Jbl3ihYd2y/Q+PPf38e7+if7UFuyi/ywc/IFBW4uHhiXrSgd+
      FechaTimbrado="2017-04-04T13:39:05" UUID="0B8CA9E4-52EE-450A-93FB-C895D2FF0F28" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

x

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

CRA850326UN6

Folio Fiscal

0B8CA9E4-52EE-450A-93FB-
C895D2FF0F28

Total del CFDI

\$674,481.36

Nombre o Razón Social del Emisor

CONSTRUCTORA RIO AROS,S.A. DE
C.V.

Fecha de Expedición

2017-04-04T13:34:27

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2017-04-04T13:39:05

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

FAC130626CP7

Imprimir



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 237/2016	CONTRATADO
OBRA: OBRA CIVIL EN ADECUACION DE CRUCEROS EN AV LA CANTERA -AV TOMAS VALLES Y AV. MISION DEL BOSQUE.	ESTIMACIÓN No. 3(TRES) ULTIMA	\$ 1,245,040.16 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 674,481.36 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS S.A. de C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 567,655.55 CON IVA
RFC CRA-850326-UN6	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 1,242,136.91 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 482,542.98	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ 62,029.52	
<u>EXTRAORDINARIOS</u>	\$ 36,876.95	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 581,449.45	

DESCUENTOS	
0.2% D.I.F.	\$ 1,162.90
0.2% C.M.I.C.	\$ 1,162.90
SUMA DESCUENTOS	\$ 2,325.80

RESUMEN	
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 581,449.45
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 581,449.45
I.V.A.	\$ 93,031.91
TOTAL	\$ 674,481.36

(CON LETRA)

(SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 2,325.80
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 672,155.56

AUTORIZO

ELABORO

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
RESIDENTE D.O.P.M

CONSTRUCTORA RIO AROS S.A. de C.V.
CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. EDNA LINETTE DEL RIO SIGALA
JEFE DEL DEPTO. DE
CONSTRUCCION.

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH.,

15 de enero de 2017

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA / DIR. OBRAS PUBLICAS, LA CANTIDAD DE: \$ **672,155.56**
(SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 3(TRES) ULTIMA CONTRATO No. 237/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 1,245,040.16
UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA 16/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
OBRA CIVIL EN ADECUACION DE CRUCEROS EN AV LA CANTERA -AV TOMAS VALLES Y AV. MISION DEL BOSQUE.

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	581,449.45
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$	581,449.45
	IVA	\$	93,031.91
	TOTAL	\$	674,481.36
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
D.I.F. DEL 0.2%	1,162.90		
CMIC. DEL 0.2%	1,162.90		
SUMA	2,325.80		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 1,245,040.16
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 567,655.55
ESTA ESTIMACION	\$ 674,481.36
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 1,242,136.91
POR EJERCER	\$ 2,903.25

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% C.M.I.C.	0.2% D.I.F.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 978.72	\$ 978.72
ESTA ESTIMACION	\$ 1,162.90	\$ 1,162.90
ACUMULADO ACTUAL	\$ 2,141.62	\$ 2,141.62

R E C I B I M O S


CONSTRUCTORA RIO AROS S.A. de C.V.
CRA-850326-UN6

OBRA: OBRA CIVIL EN ADECUACION DE CRUCEROS EN AV LA CANTERA -AV TOMAS VALLES Y AV. MISION DEL BOSQUE. MUNICIPIO: CHIHUAHUA No. CONTRATO: 237/2016
ESTIMACIÓN No. 3(TRES) ULTIMA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS S.A. de C.V. PERÍODO: 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS			
	<u>NORMALES</u>	\$	482,542.98
	<u>EXCEDENTES</u>	\$	62,029.52
	<u>EXTRAORDINARIOS</u>	\$	36,876.95

SUBTOTAL \$	581,449.45
I.V.A. \$	93,031.91
TOTAL \$	674,481.36

J. Lopez
RESIDENTE

[Signature]
CONTRATISTA

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO		IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO	UNITARIO	
	OBRA EXCEDENTE							
	PAVIMENTOS							\$ 62,029.52
	Suministro y colocación de riego de liga con emulsión asfáltica tipo RR-2K superestable, por unidad de obra terminada, a razón de 0.50 lt/m2. Incluye: material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, operación de calentamiento o recalentamiento, aplicación, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.							62,029.52
12		m2	1,000.41	2658.71	1000.41	1,658.30	\$7.34	12,171.92
13	Suministro, tendido y compactado de carpeta asfáltica (Mezcla caliente), por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%), del banco que elija el contratista de 2 cm de espesor compacto, con TMA 3/4". Incluye: materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreo locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chafalanes en onllas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1,980.00	2187.74	1980.00	207.74	\$240.00	49,857.60
	EXTRAORDINARIOS							36,876.95
EXT. 1.-	Suministro, tendido y compactado de mortero asfáltico (Mezcla caliente), por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%), del banco que elija el contratista de 2 cm de espesor compacto, con TMA 3/8". Incluye: materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreo locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chafalanes en onllas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	470.97	0.00	470.97	\$78.30	36,876.95


 RESIDENTE


 CONTRATISTA


GENERADOR DE ESTIMACION									
CONTRATO : 237/2016									
OBRA : OBRA CIVIL EN ADECUACION DE CRUCEROS EN AV LA CANTERA -AV TOMAS VALLES Y AV. MISION DEL BOSQUE.									
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS S.A. de C.V.									
CROQUIS									
VOLUMEN A PAGAR									
UNIDAD									
No DE ESTIMACION: 3(TRES) ULTIMA									
PERIODO : 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017									
CONCEPTO									
OPERACIONES ARITMETICAS									
Suministro, tendido y compactado de carpetas de concreto asfáltico (Mezcla caliente), por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%), del banco que elija el contratista de 8 cm de espesor compacto, con TMA 3/4". Incluye: materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreos locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chafianes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y todo lo necesario para su correcta ejecución									
13									
LADO NORTE 463.57									
RETORNO 140.04									
LADO SUR 703.78									
LADO ESTE 465.97									
CRUCERO TOMAS VALLES									
RETORNO 178.07									
AMPL OESTE 3.57									
AMPL OESTE 14.93									
AMPL ESTE 126.73									
AMPL ESTE 91.08									
2,187.74									
EXT. 1.-									
Suministro, tendido y compactado de mortero asfáltico (Mezcla caliente), por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%), del banco que elija el contratista de 2 cm de espesor compacto, con TMA 3/8". Incluye: materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreos locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chafianes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y todo lo necesario para su correcta ejecución									
long									
ancho									
area									
42.5									
4.77									
202.58									
28.80									
8.00									
230.40									
3.80									
0.30									
1.14									
3.46									
10.65									
36.85									
470.97									
470.97									
m2									

2 de 2

Edith Mary
CONTRATISTA

12.- RIEGO DE LIGA

TOMAS VALLES




$S=178.07m^2$

$S=3.57m^2$




$S=14.93m^2$

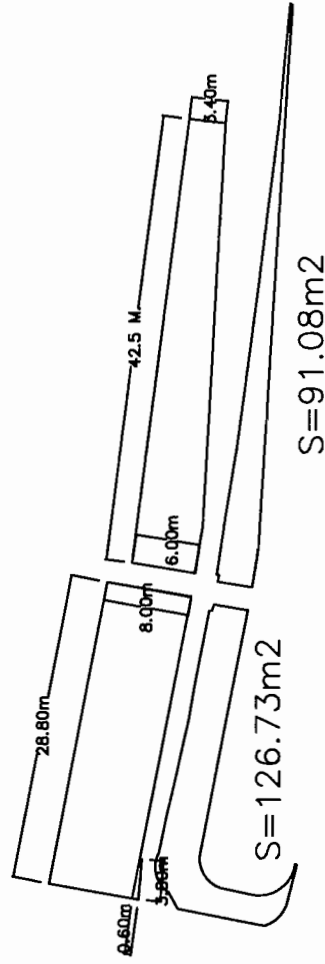

Jadys

- 12.- RIEGO DE LIGA
13.- CARPETA ASFALTICA
MISION DEL BOSQUE

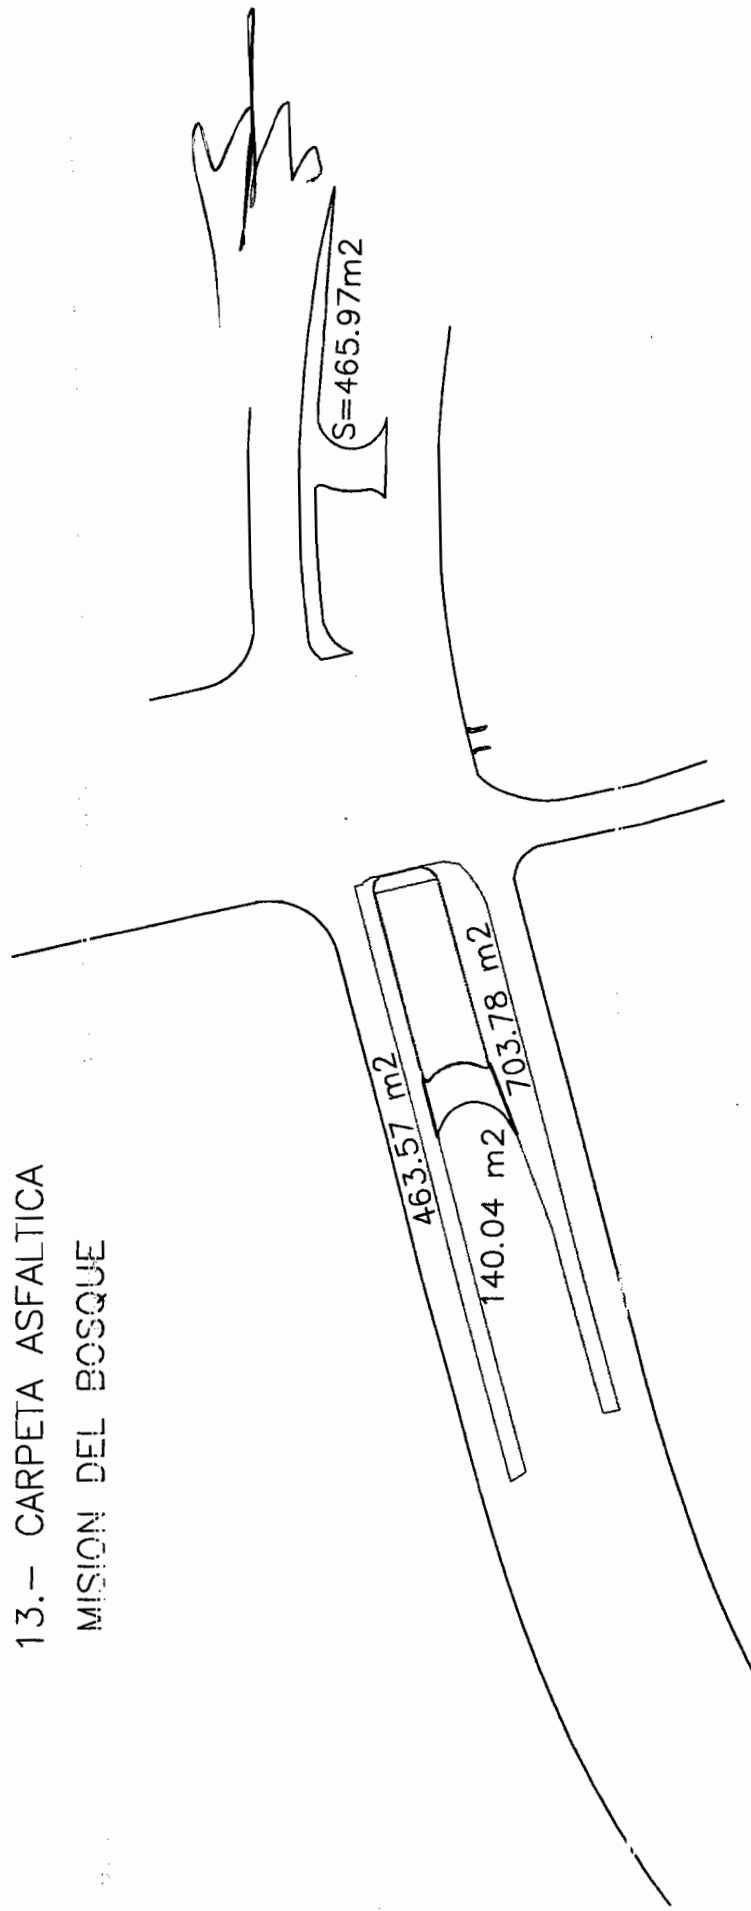


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

13.- CARPETA ASFALTICA

TOMAS VALLES




$$S=178.07m^2$$

$$S=3.57m^2$$



$$S=14.93m^2$$



$$S=126.73m^2$$




$$S=91.08m^2$$

Jadys 

EXT. 1.- CARPETA ASFALTICA 2 cm

TOMAS VALLES

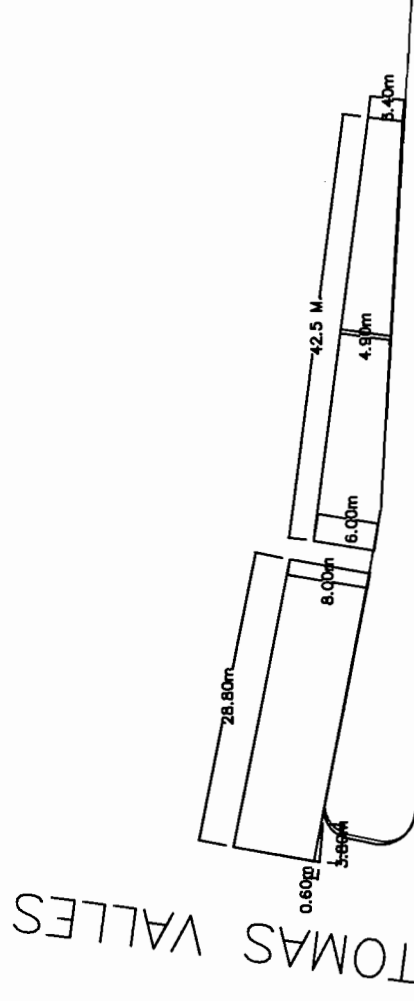

C. AV. LA CANTERA

factos.
J
