

**CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.**

MANUEL OJINAGA Y PRIV. DE COLOSIO S/N
TORIBIO ORTEGA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP:31060
RFC: CTC051025D83
(614) 446-44-44

Folio

CHI4357

Fecha

25/may./2017 08:31:24

Vendido a:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA 408

CENTRO

CHIHUAHUA, CHIH, MEX CP: 31000

RFC: MCI651010V22

Orden de compra**Ntro Pedido**

2686

Condiciones

CREDITO 30 DIAS

Vendedor

ING. ANA MA. QUINTANA Q.

Artículo**Nombre****U.med.****Unidades****Precio****Desccto.****Importe**

SV-ENU-002

ESTIMACION No. 1
SEGUN CONTRATO N. 240/2016

PIEZA

1

523,862.19

523,862.19

SEÑALIZACION DE ADECUACIONES DE CRUCEROS EN AV. L
A CANTERA - AV. TOMAS VALLES Y AV. MISION DEL BOSQU
E.

ALCANCE DE LA ESTIMACION.....\$523,862.19

RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.20% D.I.F.....\$1,047.72

0.20% C.M.I.C.....\$1,047.72

SUMA.....\$2,095.44

IMPORTE NETO A RECIBIR.....\$605,584.70

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|02FCF5AA-5AC8-014B-86A1-7B0FEC851E29|2017-05-25T09:33:28|Lubnli3PizLubRx3NA6tXhPOG2LZpV7Fnfz0VPQhclpSJ0TdAK9LedQetRKFrI2tt5O6XVgInGZBgqIRHxYUqGpxDA
rPOxXI38h1oicpVo7A5rB2MvgNGvPSYCTflpgxkB7H+FWfyLOmOd71ZXA1liD4uaPqFzeuQAM+6mWfDbIPPEvtjqOkLqA6wtFH+kSNXOnoWBUEq9nc4qg+I1jyA5/InIe5shHv/yunGiSL5KLg

Sello digital del CFDI:

Lubnli3PizLubRx3NA6tXhPOG2LZpV7Fnfz0VPQhclpSJ0TdAK9LedQetRKFrI2tt5O6XVgInGZBgqIRHxYUqGpxDArPOxXI38h1oicpVo7A5rB2MvgNGvPSYCTflpgxkB7H+FWfyLOmOd71ZXA1li
D4uaPqFzeuQAM+6mWfDbIPPEvtjqOkLqA6wtFH+kSNXOnoWBUEq9nc4qg+I1jyA5/InIe5shHv/yunGiSL5KLgIN2CczvX5+Hi5IxMupjqIQCYIXWPMXCWn3SUCplpID1ej9Bvxc8d3CS72nZ0

Sello digital del SAT:

QuVsVSwFXOSmbr+f8dZ3utyHNH9nnjZRF3YZ6kkCG8/HmBFzPJ3VcqhIyXJuQpfmh26xp/p0qRznLr/eX1W6jlaupenZuLU0edN6+vAxLCQULXN0u9t1UA+FgTYNmHVEZfH9aLLGFOoTvm
ujNdUH7wulfbec2dx4WBhxDYUcIYgI92tgIE1V69R6QYCo2egeeRIO8Nj03rBIIn+zRLY9mx9qzyUvbuVcArfBNHpwzbqNzsgRunmx8+2ZFTjKZfC6FdxQvHtu27kRfWwGTJ0d006pvVX+/6q



(Seiscientos siete mil seiscientos ochenta pesos 14/100 m.n.)

UBICACION: CANTERA, AV. TOMAS VALLES Y MISION DEL BOSQUE.

Método de pago: 99-99 OTROS**Pago en una sola exhibición****Lugar de expedición: Chihuahua, Chih.****NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS:**

BANCOMER: 012150001852136140 - SANTANDER: 014150655027831158

CONFIRMAR SU PAGO AL CORREO cxc@cactustraffic.com.mxSubtotal
IVA 16%523,862.19
83,817.95

Total

607,680.14

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales

Folio del SAT: 02FCF5AA-5AC8-014B-86A1-7B0FEC851E29 Fecha de certificación: 25/may./2017 09:33:28

Certificado del emisor: 00001000000402865972 Certificado del SAT: 00001000000401041203

PAGARE

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A: 25 de mayo del 2017

BUENO POR \$ 607,680.14

No. CHI4357

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE, A LA ORDEN DE CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.

EL DIA DE 24-jun.-17 LA CANTIDAD DE (Seiscientos siete mil seiscientos ochenta pesos 14/100 m.n.)

POR BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCIÓN EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME (NOS) REQUIERA,

QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE FALTA DE PAGO CAUSARÁ UN INTERÉS MORATORIO DEL ____% MENSUAL HASTA SU LIQUIDACIÓN.

ACEPTO DE CONFORMIDAD



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet


A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor


RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen [Verificar CFDI](#)



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
CTC051025D83	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
02FCF5AA-5AC8-014B-86A1-7B0FEC851E29	2017-05-25T08:31:24	2017-05-25T09:33:28	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$607,680.14	ingreso	Vigente	

[Imprimir](#)



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 240/2016	CONTRATADOS
OBRA: SEÑALIZACION EN ADECUACIONES DE CRUCEROS EN AV. LA CANTERA - AV. TOMAS VALLES Y AV. MISIÓN DEL BOSQUE.	ESTIMACIÓN No. 1	\$ 1,006,485.08 CON IVA
UBICACIÓN: AV. LA CANTERA - AV. TOMAS VALLES Y AV. MISIÓN DEL BOSQUE.	PERÍODO EJEC. 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	
CONTRATISTA: CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 607,680.14 CON IVA
RFC CTC-051025-D83	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	
	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 607,680.14 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 412,347.35	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ 111,514.84	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 523,862.19	

DESCUENTOS

0.20% D.I.F. \$ 1,047.72
0.20 %C.M.I.C. \$ 1,047.72

SUMA DESCUENTOS \$ 2,095.44

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION \$ 523,862.19
AMORT ANTICIPO \$ 0.00
SUB-TOTAL \$ 523,862.19
I.V.A. \$ 83,817.95
TOTAL \$ 607,680.14

(CON LETRA)

(SEISCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS
14/100 M.N.)

DESCUENTOS \$ 2,095.44
SALDO NETO A RECIBIR \$ 605,584.70

AUTORIZO

ELABORO

ING. JUAN ARTURO LOPEZ RIOS
RESIDENTE D.O.P.M

CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

ING. EDNA DEL RIO SIGALA
JEFE DEL DEPTO. DE
CONSTRUCCIÓN

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR
DE INFRAESTRUCTURA URBANA

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH.,

30/NOVIEMBRE/2016.

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS. LA CANTIDAD DE:
(SEISCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.)
ESTIMACIÓN NUM. 1 CONTRATO No. 240/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 1,006,485.08
UN MILLON SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.
SEÑALIZACION EN ADECUACIONES DE CRUCEROS EN AV. LA CANTERA - AV. TOMAS VALLES Y AV. MISIÓN DEL BOSQUE.

\$ 605,584.70
COMO PAGO A LA

POR TRABAJOS EN LA OBRA:

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	523,862.19
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
SUBTOTAL	\$	523,862.19
IVA	\$	83,817.95
TOTAL	\$	607,680.14

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO	
0.20% D.I.F.	1,047.72
0.20 %C.M.I.C.	1,047.72
	0.00
	0.00
SUMA	2,095.44

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

		CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$	1,006,485.08
CONVENIO MODIFICATORIO	\$	-
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$	-
ESTA ESTIMACION	\$	607,680.14
ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION	\$	607,680.14
POR EJERCER	\$	398,804.94

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO


		CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$	-
ACUMULADO ANTERIOR	\$	-
ESTA ESTIMACION	\$	-
ACUMULADO ACTUAL	\$	-
POR AMORTIZAR	\$	-

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.20% D.I.F.	0.20 %C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 1,047.72	\$ 1,047.72
ACUMULADO ACTUAL	\$ 1,047.72	\$ 1,047.72

R E C I B I M O S

CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
CTC-051025-D83



OBRA:	SEÑALIZACIÓN EN ADECUACIONES DE CRUCEROS EN AV. LA CANTERA - AV. TOMAS VALLES Y AV. MISIÓN DEL BOSQUE.				
MUNICIPIO:	AV. LA CANTERA - AV. TOMAS VALLES Y AV. MISIÓN DEL BOSQUE.				
CONTRATISTA:	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.				
PERIODO:	23 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016				
ESTIMACIÓN No.	1				
No. CONTRATO:	240/2016				


CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR		
TOTAL DE OBRA							
OBRA NORMAL							
SEÑALAMIENTO VERTICAL Y DISPOSITIVOS DE CONTROL							


1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES RESTRICTIVAS REFLEJANTES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SR-6 DE 30 CM POR LADO (ALTO), CON POSTE GALVANIZADO DE 2" X 2" X 3.50 M. INCLUYE: MATERIALES, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.	PZA	8.00	8.00	-	8.00	1,677.87	\$	13,422.96
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES RESTRICTIVAS REFLEJANTES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SR-7 DE 85 CM POR LADO (CEDA EL PASO), CON POSTE GALVANIZADO DE 2" X 2" X 3.50 M. INCLUYE: MATERIALES, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.	PZA	3.00	3.00	-	3.00	1,503.75	\$	4,511.25
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINO (SID), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SID-14 DE 76 X 366 CM, DOBLE BANDERA, (ACABADO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD), ACABADO GALVANIZADO, CON PREPARACIÓN PARA SEMÁFOROS.	PZA	1.00	1.00	-	1.00	45,946.97	\$	45,946.97
1.7	SEMÁFORO PRINCIPAL DE 3 LUCES DE 30 CMS. DE DIAMETRO (R-LED, A-LED, V-LED) EN MATERIAL POLICARBONATO.	PZA	6.00	6.00	-	6.00	9,810.45	\$	58,862.70
1.8	SEMÁFORO AUXILIAR DE 3 LUCES DE 30 CMS. DE DIAMETRO (R-LED, A-LED, V-LED) EN MATERIAL POLICARBONATO.	PZA	6.00	6.00	-	6.00	9,810.45	\$	58,862.70

POR EL CONTRATISTA:

[Signature]

[Signature]
POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN.




									
OBRA:	SEÑALIZACION EN ADECUACIONES DE CRUCEROS EN AV. LA CANTERA - AV. TOMAS VALLES Y AV. MISIÓN DEL BOSQUE.								
MUNICIPIO:	AV. LA CANTERA - AV. TOMAS VALLES Y AV. MISIÓN DEL BOSQUE.								
CONTRATISTA:	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.								
PERIODO:	23 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016								
ESTIMACIÓN No.	1								
No. CONTRATO:	240/2016								
CONCEPTOS		PROYECTO			VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO			
1.9	BASE DE CONCRETO DE 70 X 70 X 150 CM. CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON JUEGO DE ANCLAS 4 PUNTAS DE 1" DE DIAM.	PZA	7.00	3.00	-	3.00	\$	4,878.81 \$	
1.10	REGISTRO ELÉCTRICO	PZA	8.00	5.00	-	5.00	\$	1,675.00 \$	
1.11	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE CONTROL 170-E, INCLUYE BASE.	PZA	2.00	1.00	-	1.00	\$	145,224.99 \$	
1.12	CANALIZACIÓN EN CONCRETO	ML	158.00	52.00	-	52.00	\$	322.31 \$	
1.13	CABLE 5 X 14 CONTROL	ML	443.00	354.10	-	354.10	\$	94.82 \$	
1.14	ACOMETIDA ELÉCTRICA COMPLETA	PZA	2.00	1.00	-	1.00	\$	3,011.37 \$	
1.15	CABLE 1 + 1	ML	100.00	100.00	-	100.00	\$	29.81 \$	
1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES REFLEJANTES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, OD-5 DE 61 X 122 CM. (INDICADORES DE OBSTACULOS). INCLUYE: MATERIALES, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.	PZA	6.00	6.00	-	6.00	\$	1,029.35 \$	
							\$	6,176.1 \$	
							\$	111,514.8 \$	
EXCEDENTES									
SEÑALAMIENTO VERTICAL Y DISPOSITIVOS DE CONTROL									
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINO (SID); POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SID-14 DE 76 X 366 CM, DOBLE BANDERA, (ACABADO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD), ACABADO GALVANIZADO, CON PREPARACIÓN PARA SEMÁFOROS.	PZA	1.00	3.00	1.00	2.00	\$	45,946.97 \$	
1.7	SEMÁFORO PRINCIPAL DE 3 LUCES DE 30 CMS. DE DIAMETRO (R-LED, A-LED, V-LED) EN MATERIAL POLICARBONATO.	PZA	6.00	7.00	6.00	1.00	\$	9,810.45 \$	
1.8	SEMÁFORO AUXILIAR DE 3 LUCES DE 30 CMS. DE DIAMETRO (R-LED, A-LED, V-LED) EN MATERIAL POLICARBONATO.	PZA	6.00	7.00	6.00	1.00	\$	9,810.45 \$	

POR EL CONTRATISTA:

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN.


... y ... E INICIAL CON DE SENALIZ RESTRICTIVAS (ALTOS)

CIRCUITO 2

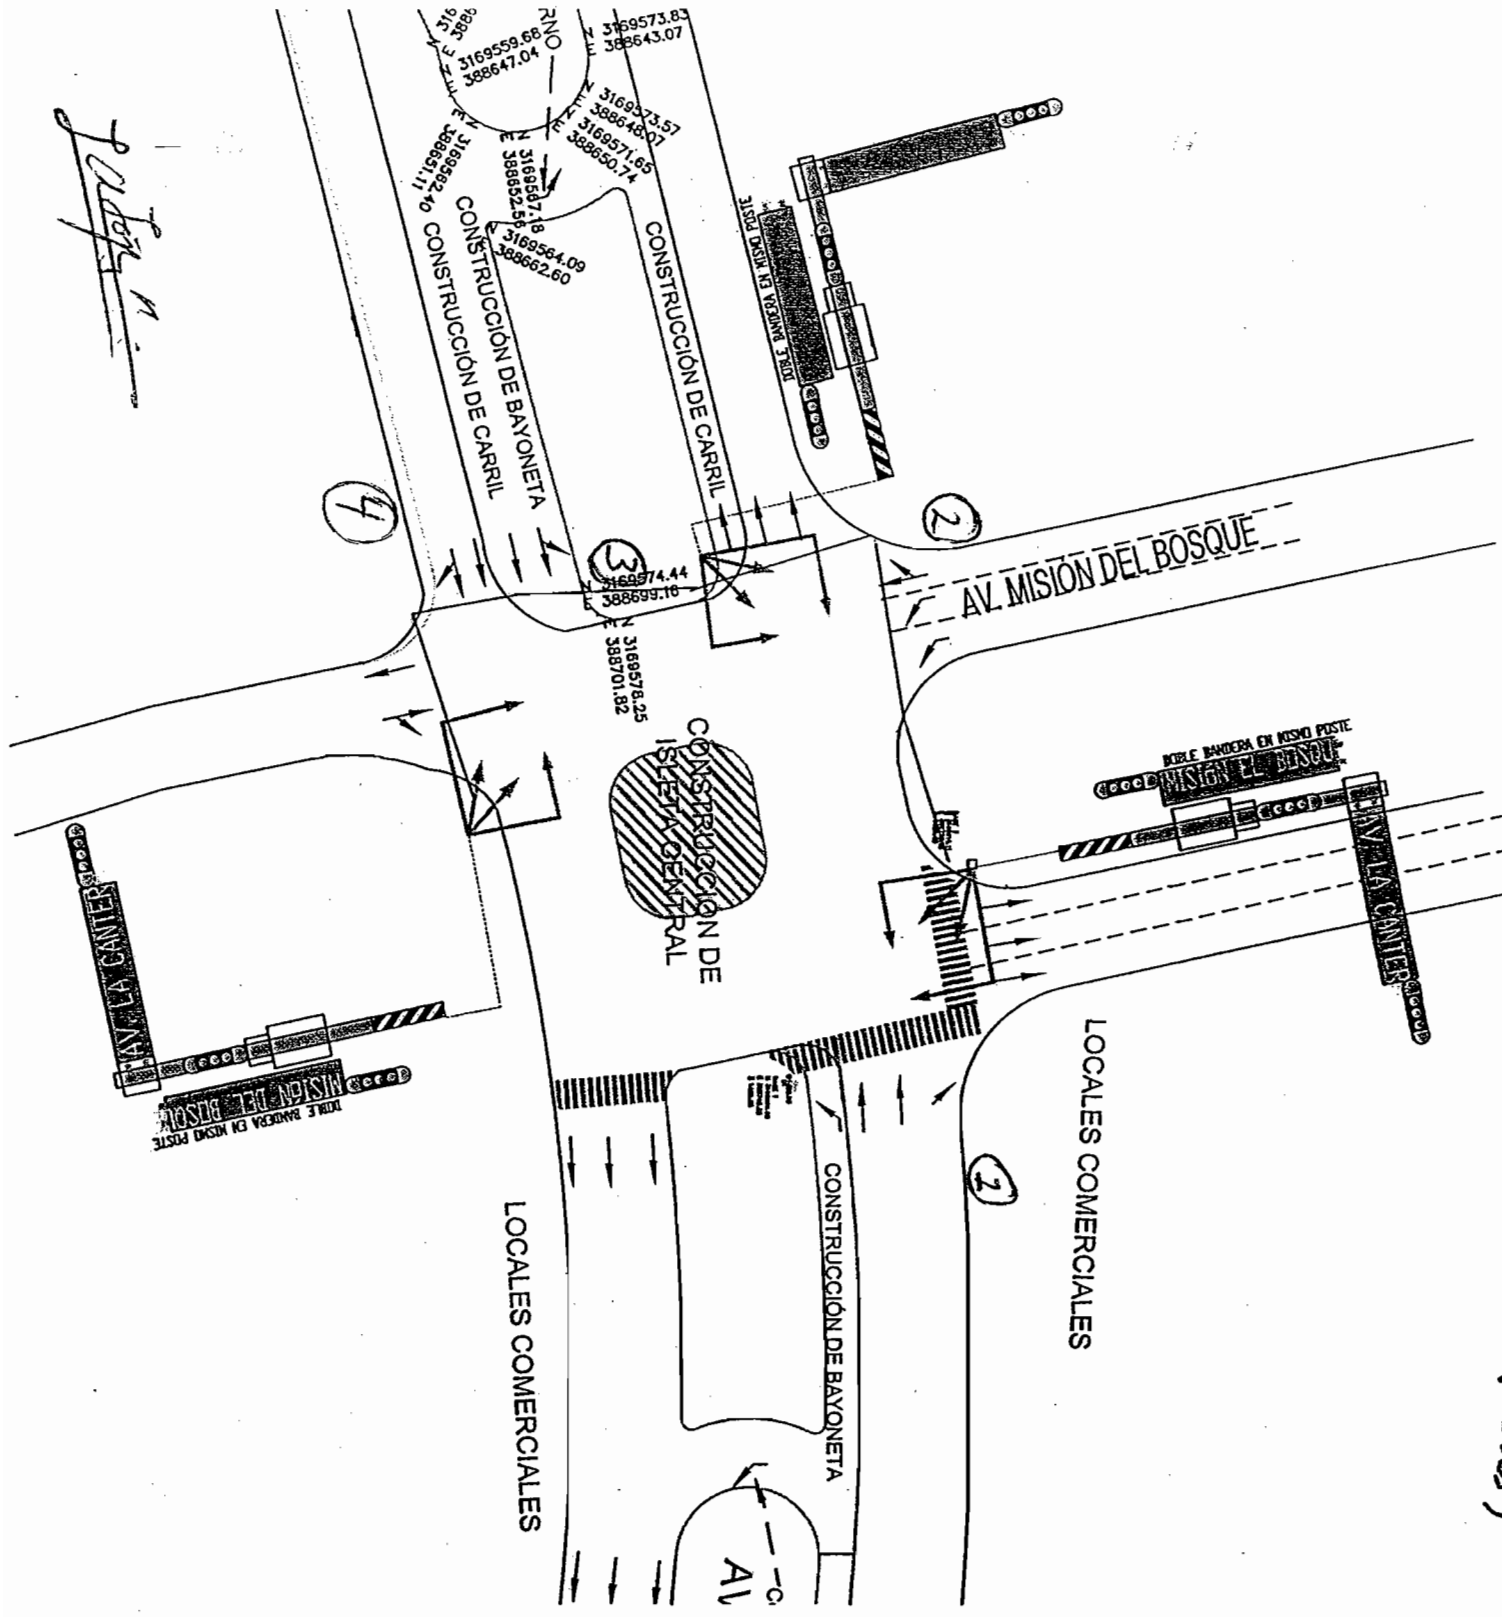

Adolfo M.

1/2

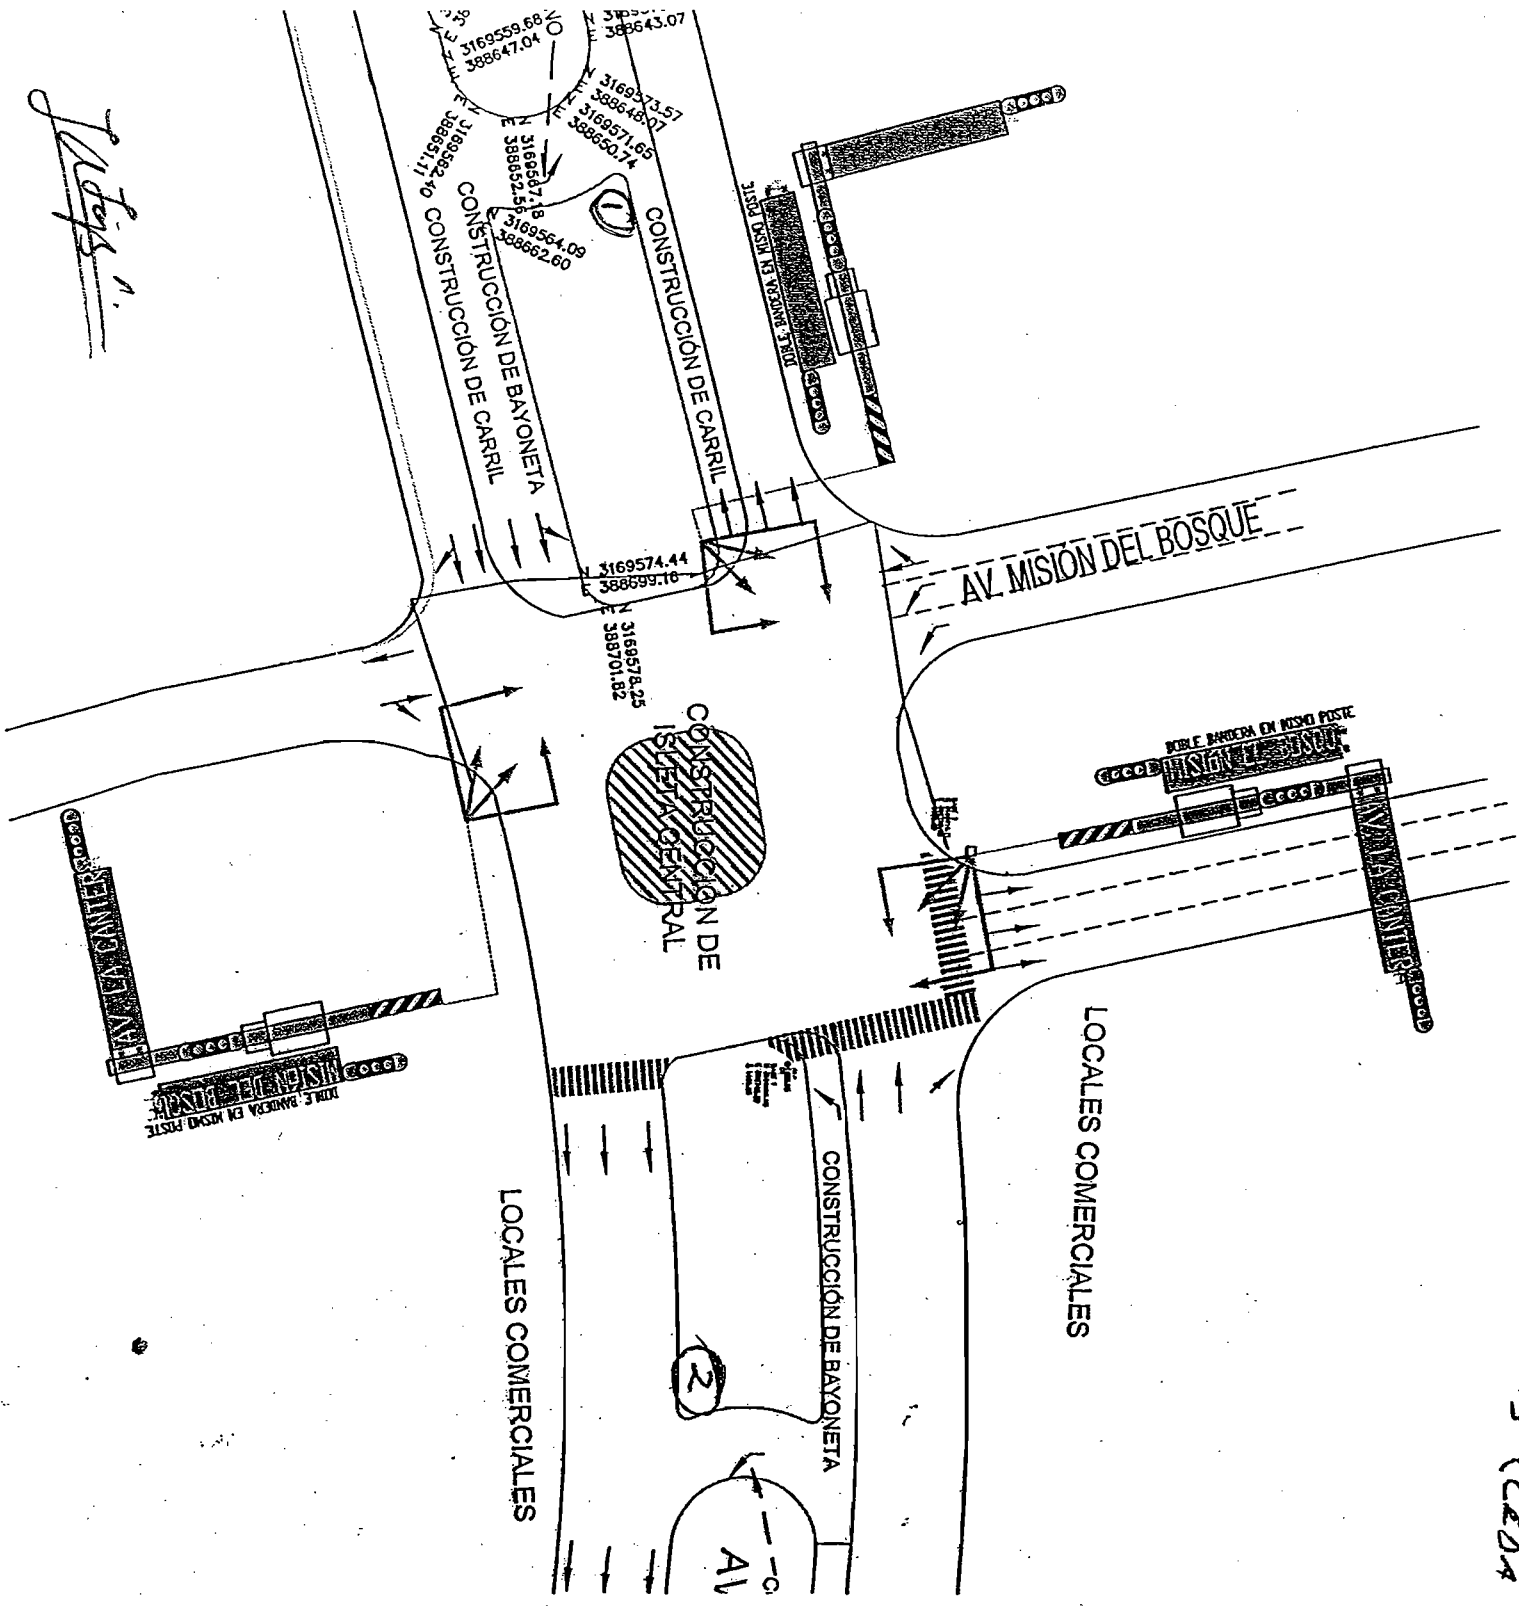

Handwritten signature or mark at the bottom left.

FRACC. LAS MISIONES II

AV. CANTERA

CONSTRUCCIÓN DE RETORNO

ARROYO

S VALLES

FRACC. LAS MISIONES


CONSTRUCCIÓN DE BAYONETA

AV. CANTERA


ARROYO

Handwritten signature

Handwritten signature

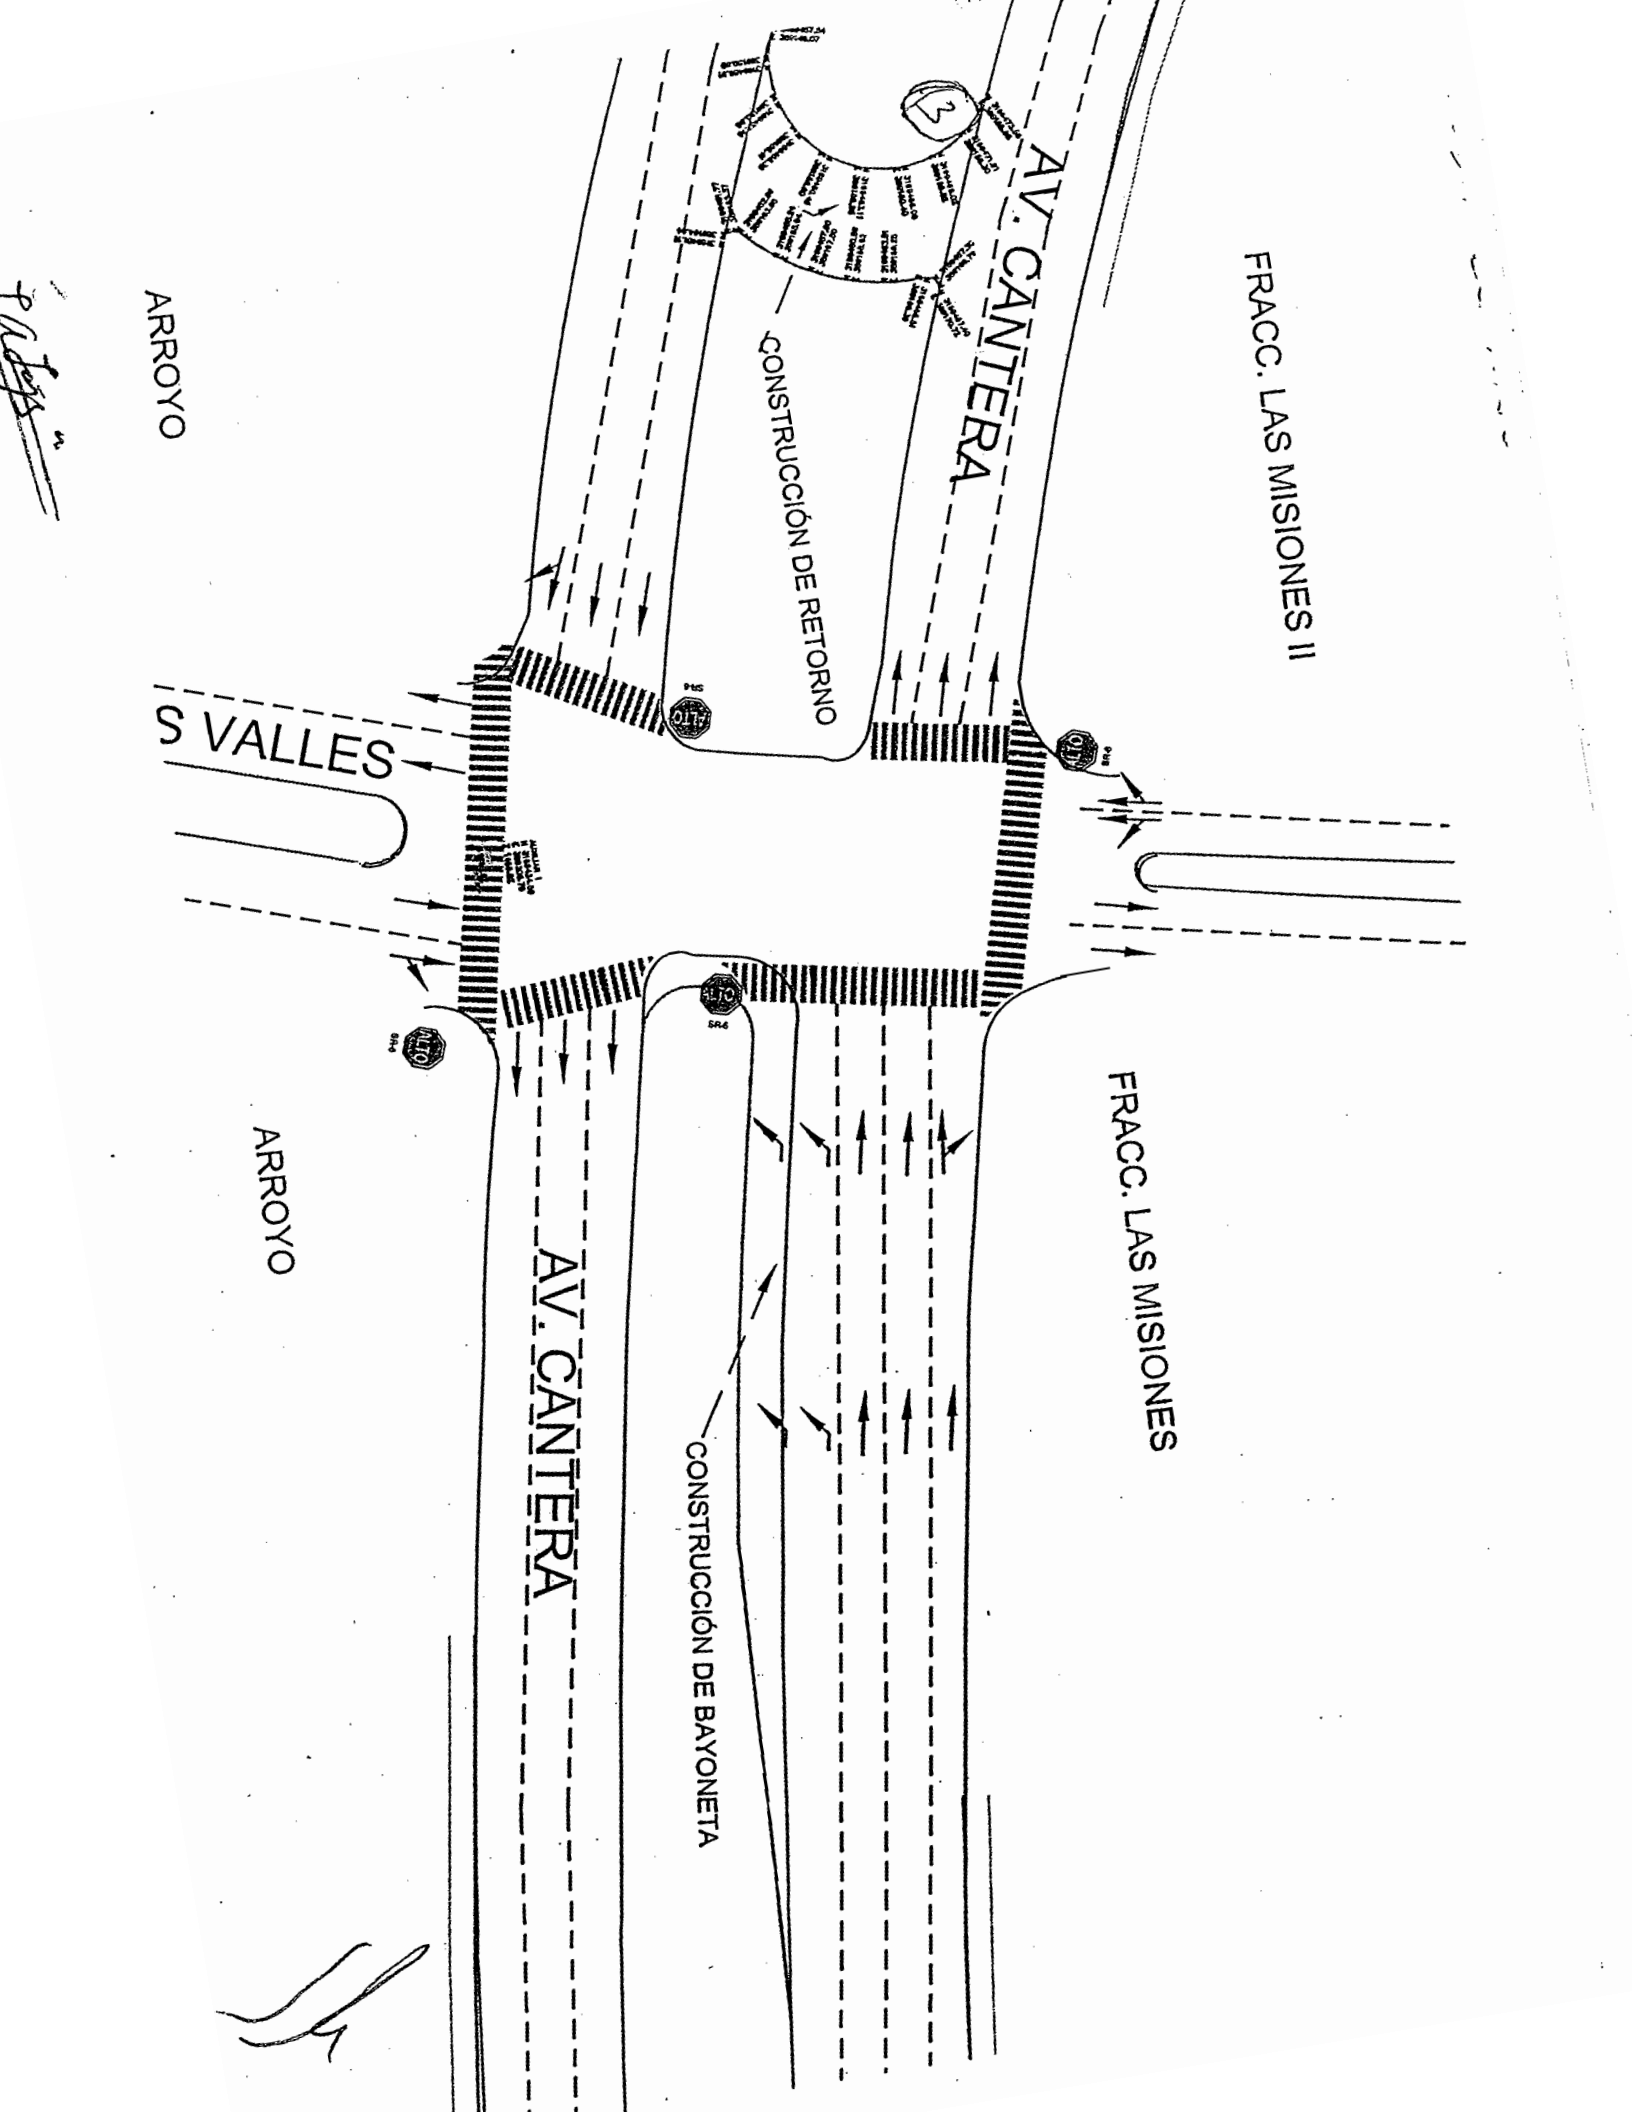


C1209415 5



1.8 SEMAFORO
AXILIAN AL 3 LUCAS

ENCUENTRO 6

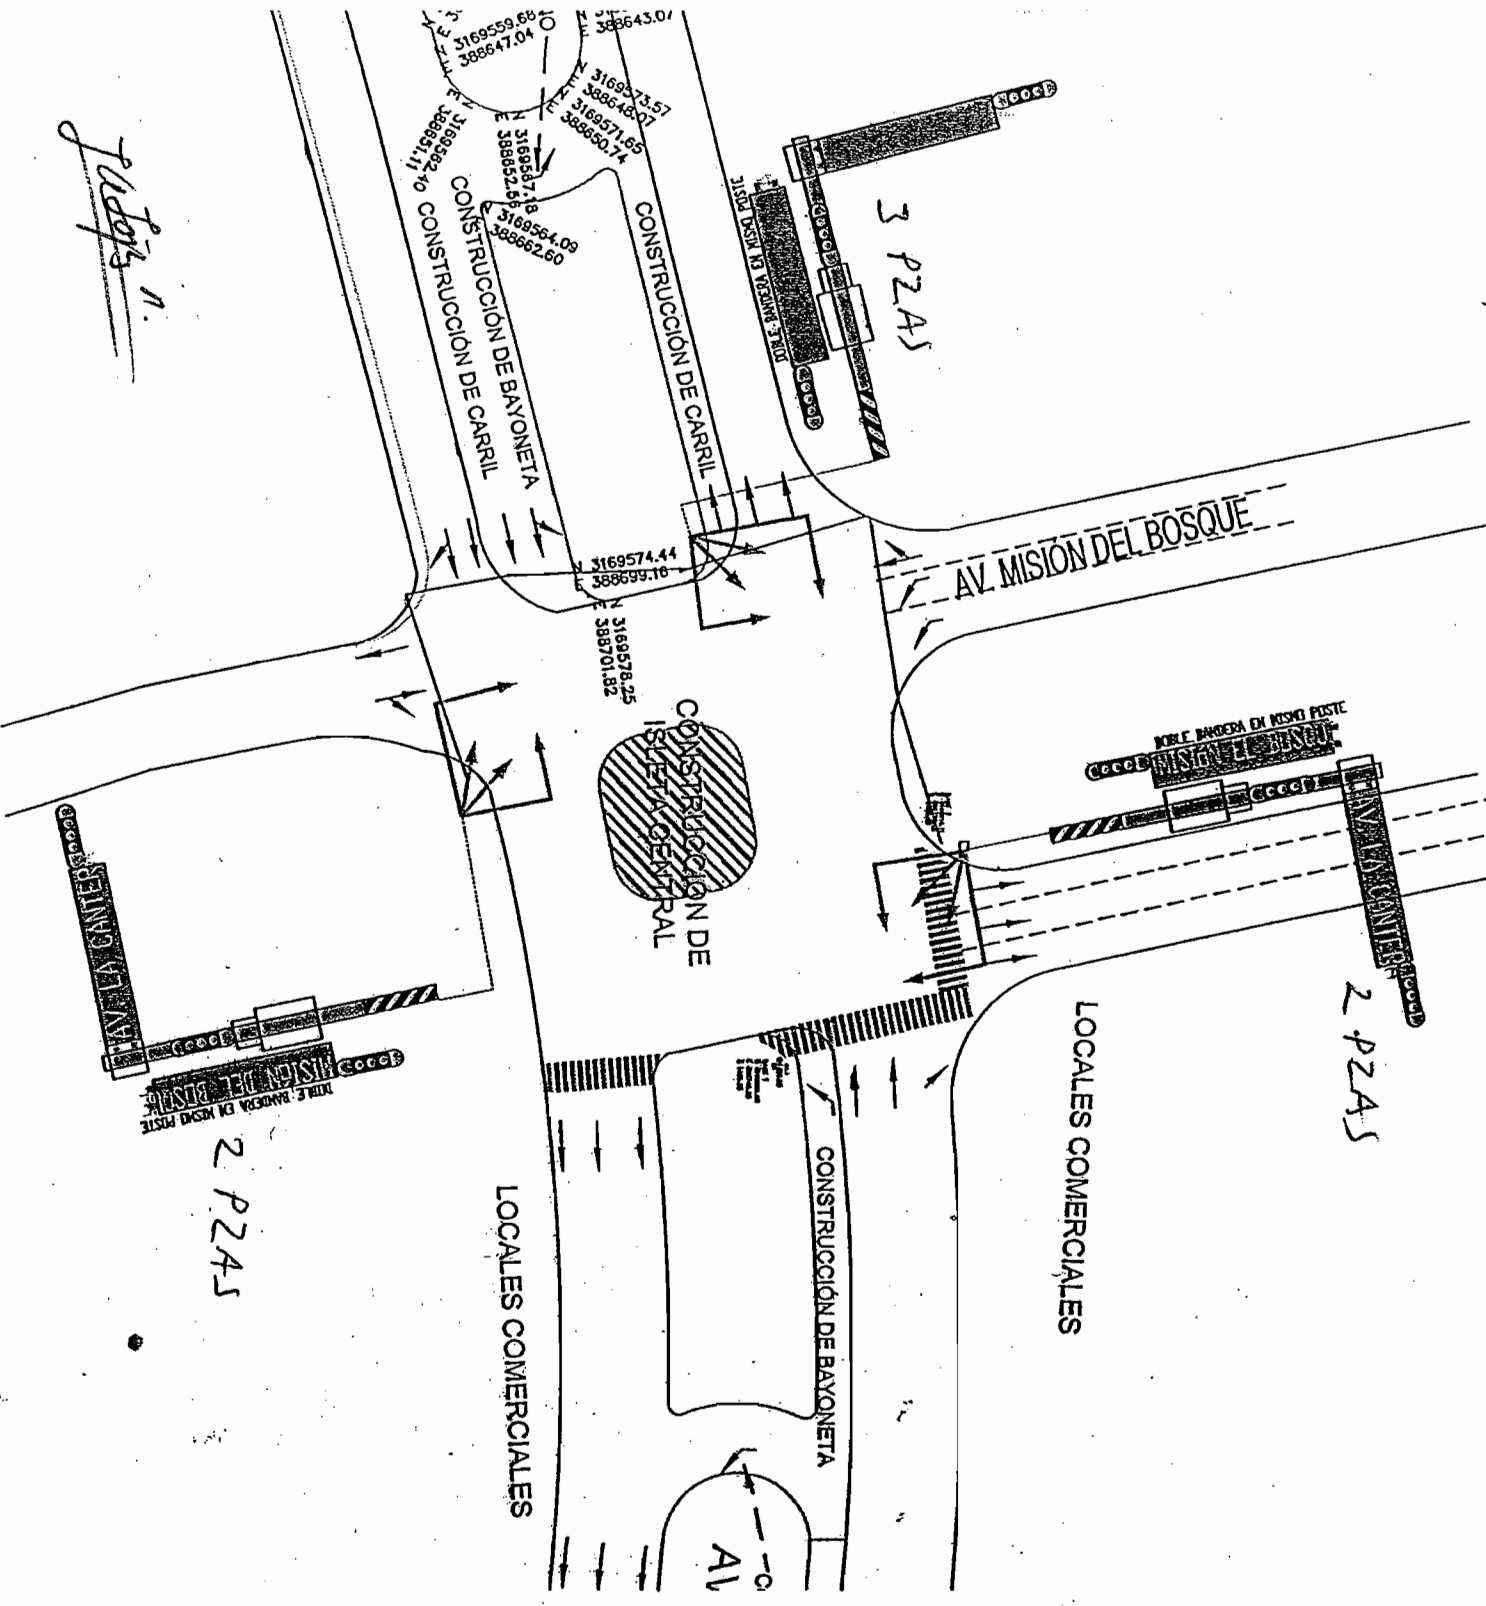

Judep's

Handwritten signature or mark at the bottom left.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 240/2016

OBRA : TOMAS VALLES Y AV. MISION DEL BOSQUE.

CONTRATISTA:

CACTUS TRAFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

NO DE ESTIMACION:	1	PERIODO :	23 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
1.9	BASE DE CONCRETO DE 70 X 70 X 150 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON JUEGO DE ANCLAS 4 PUNTAS DE 1" DE DIAM.		
	crucero cantera con mision del bosque	piezas	3
1.10	REGISTRO ELÉCTRICO		
	crucero cantera con mision del bosque	piezas	5
1.11	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE CONTROL 170-E, INCLUYE BASE.		
	crucero cantera con mision del bosque	piezas	1
1.12	CANALIZACIÓN EN CONCRETO		
	canalizacion		
	jardin	15.50	
	concreto	17.70	1
	concreto	12.30	1
	jardin	3.70	
	jardin	3.40	
	jardin	18.00	
	carp	8.20	
	concreto	2.50	1
	concreto	19.50	1
	concreto		52.00
1.13	CABLE 5 X 14 CONTROL		
	sem 1	m	12.00
	sem 1	cables	2.00
	sem 1	m	24.00
	al reg. y coca	2.00	2.00
	canal jardin	15.50	2.00
	canal conc	17.70	2.00
	reg. Coca	1.00	2.00
	canal conc	12.30	2.00
	canal jardin	3.70	2.00
	canal jardin	3.40	2.00
	reg al controlador	3.00	7.00
	reg al sem	2.50	3.00
	sem 2	12.00	3.00
	sem 2	4.00	3.00

PAJOS 11.

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR	UNIDAD
---------	-----------------	--------

8 3.00 pzas

9 5.00 pzas


10 1.00 pza

11 52.00 m

12 354.10 m

[Signature]


809095

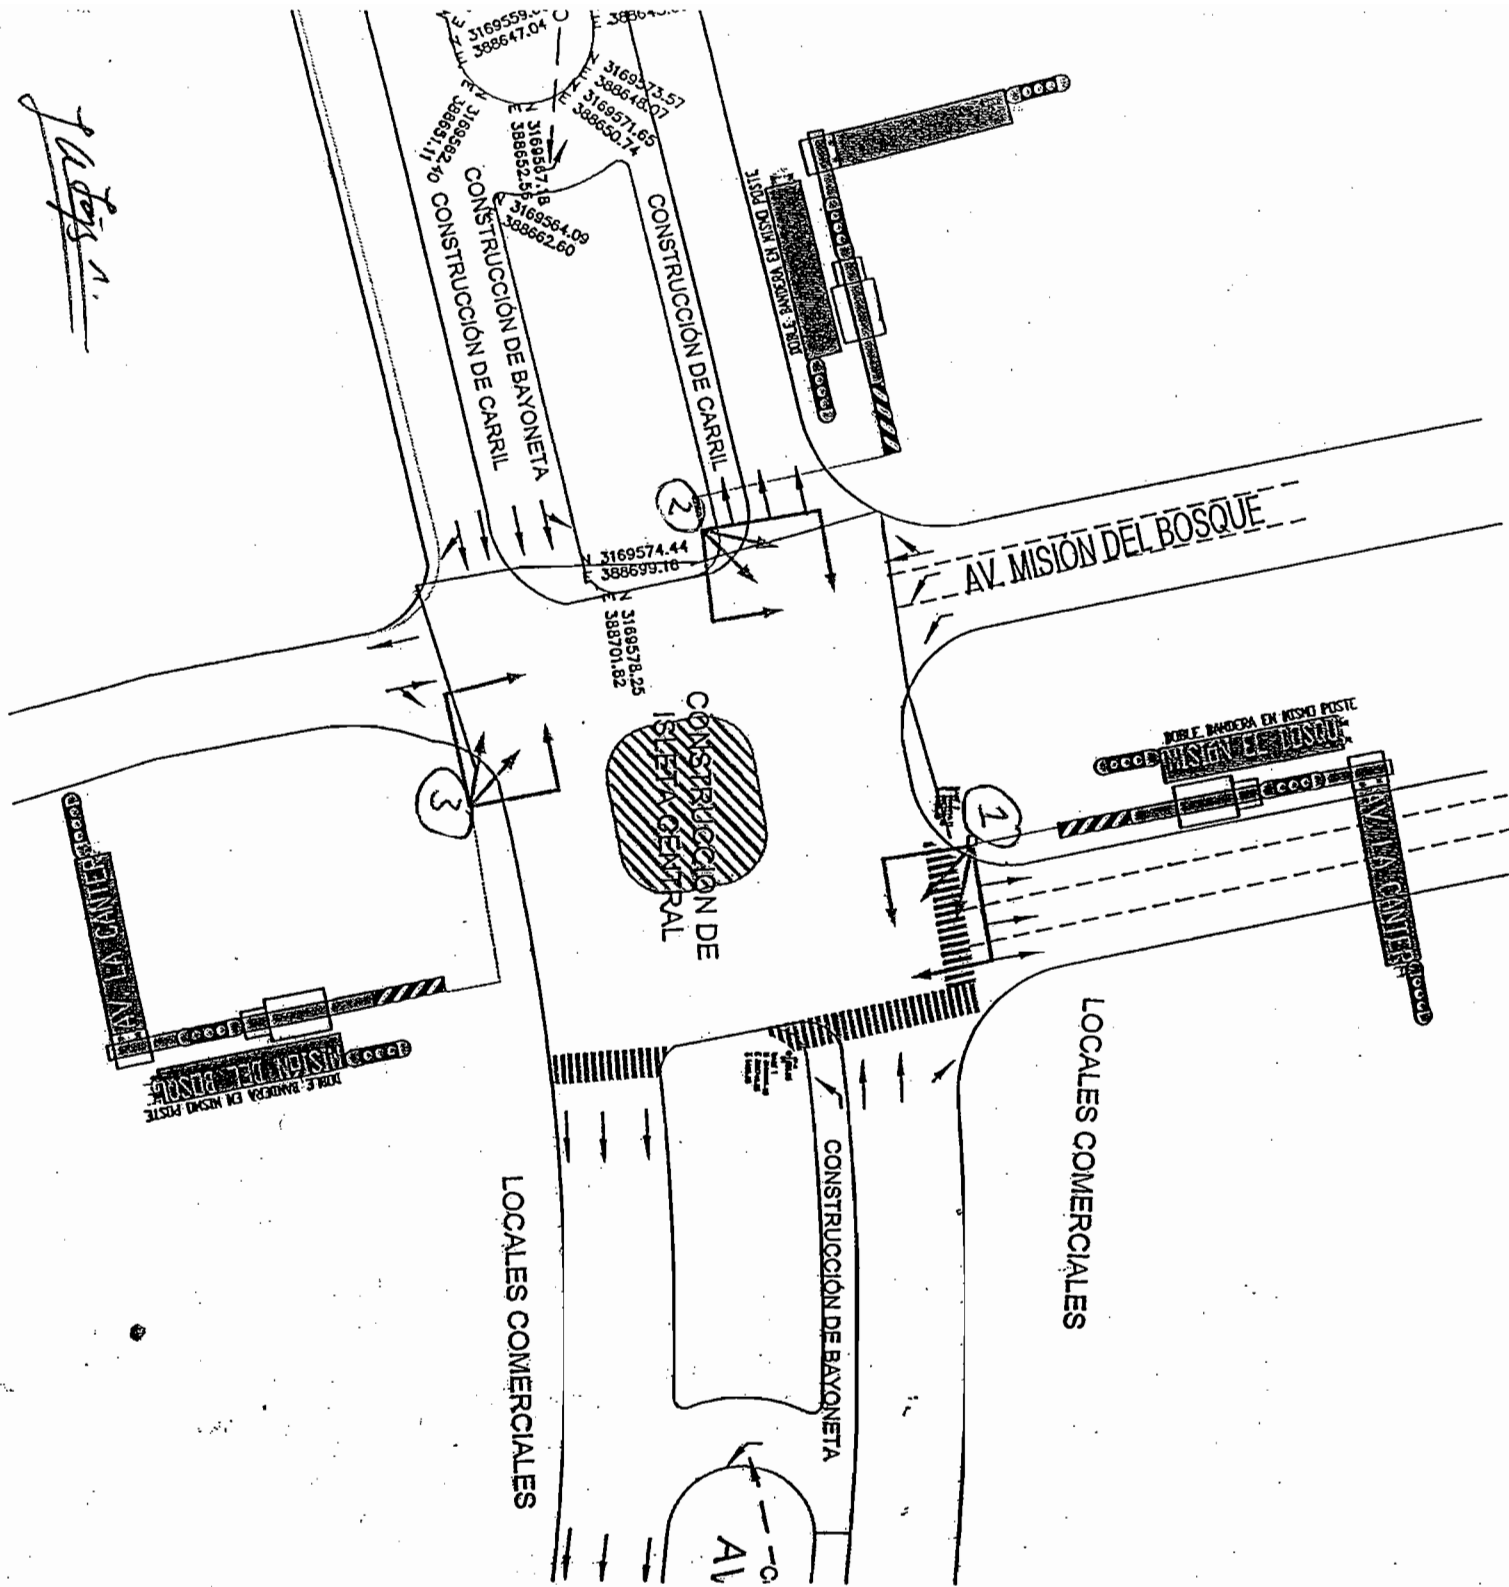

Factors:




Padres

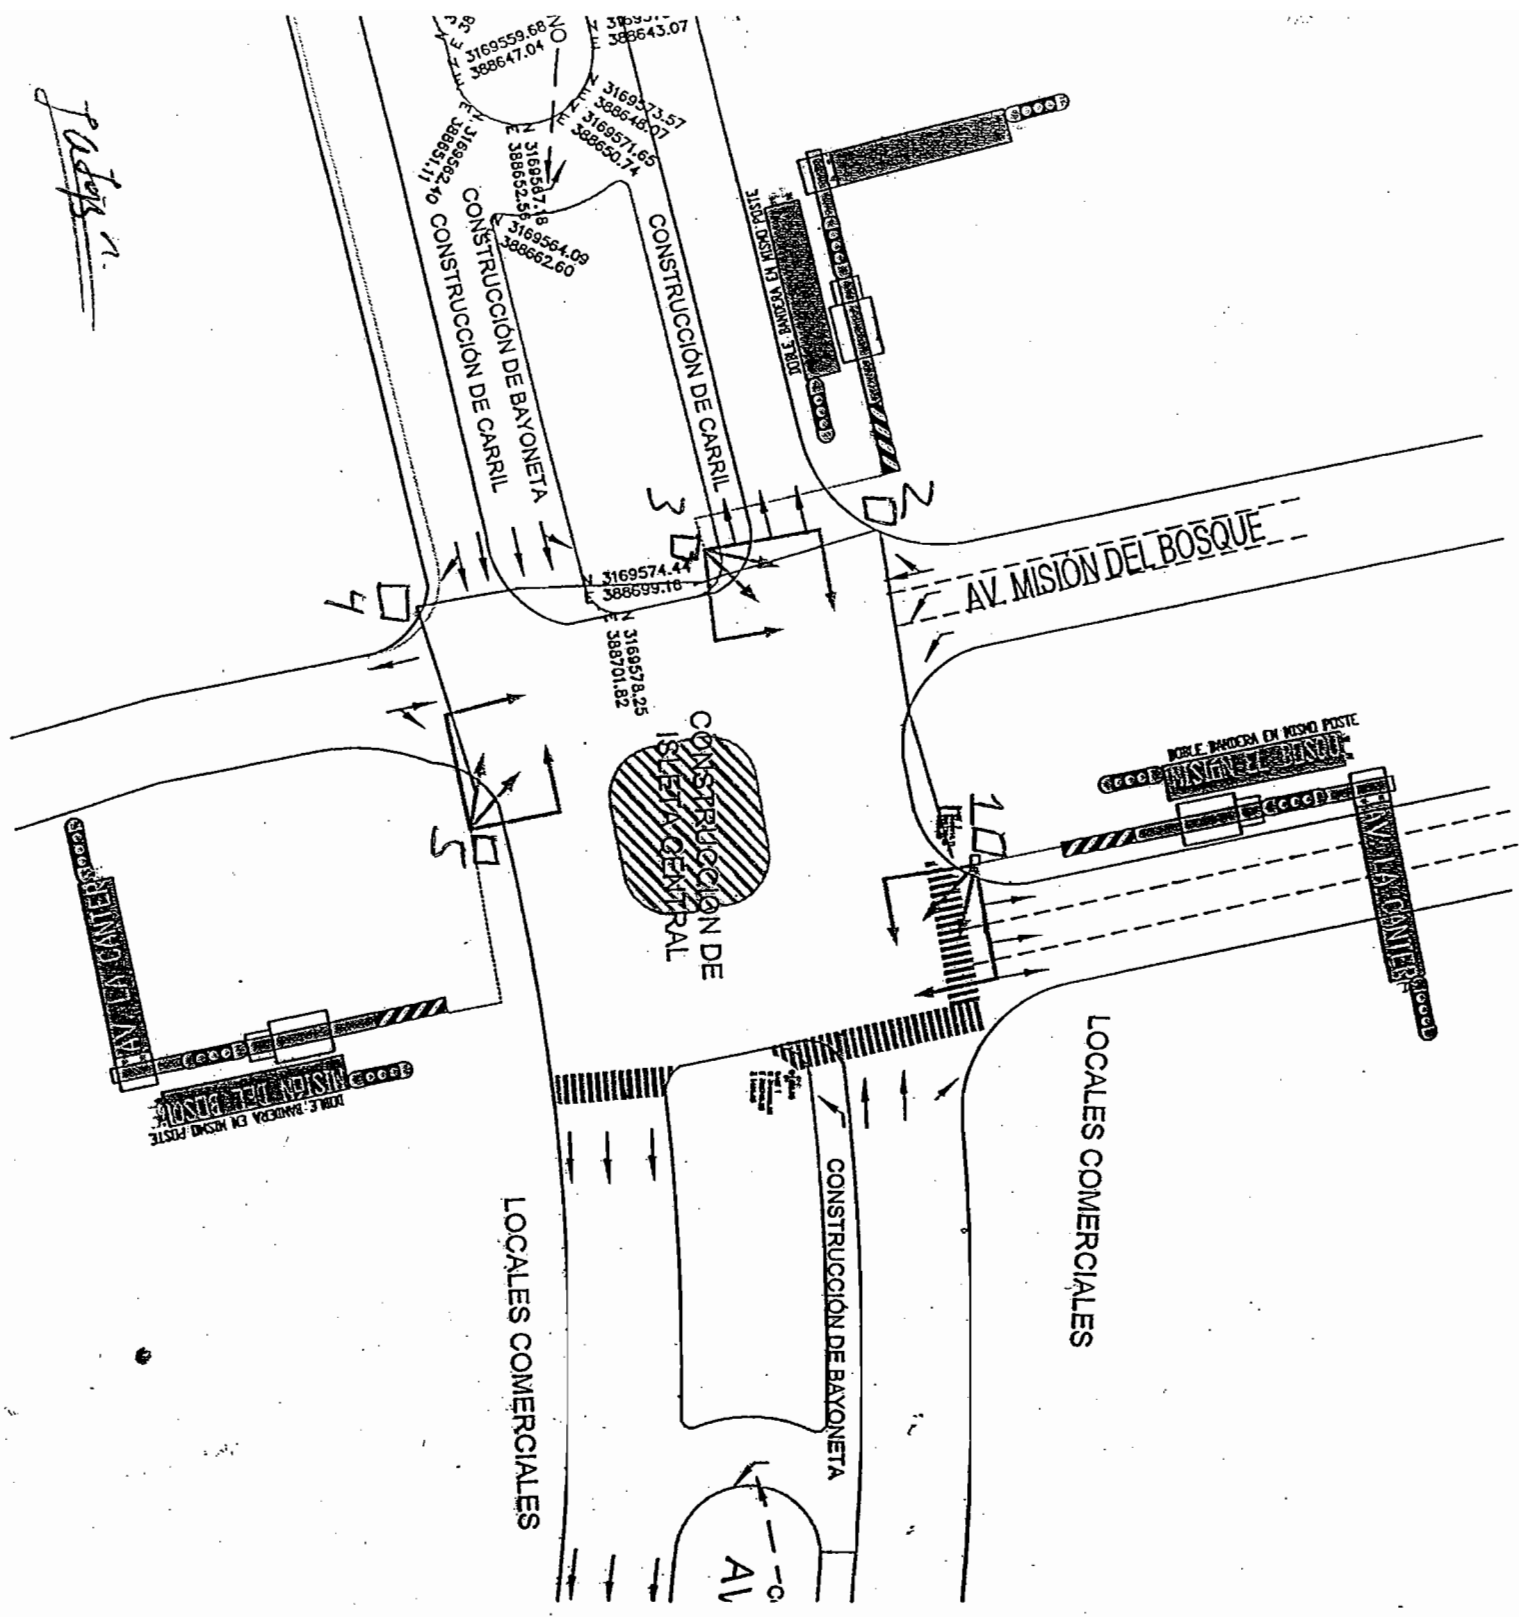


[Handwritten signature]

Top 1.

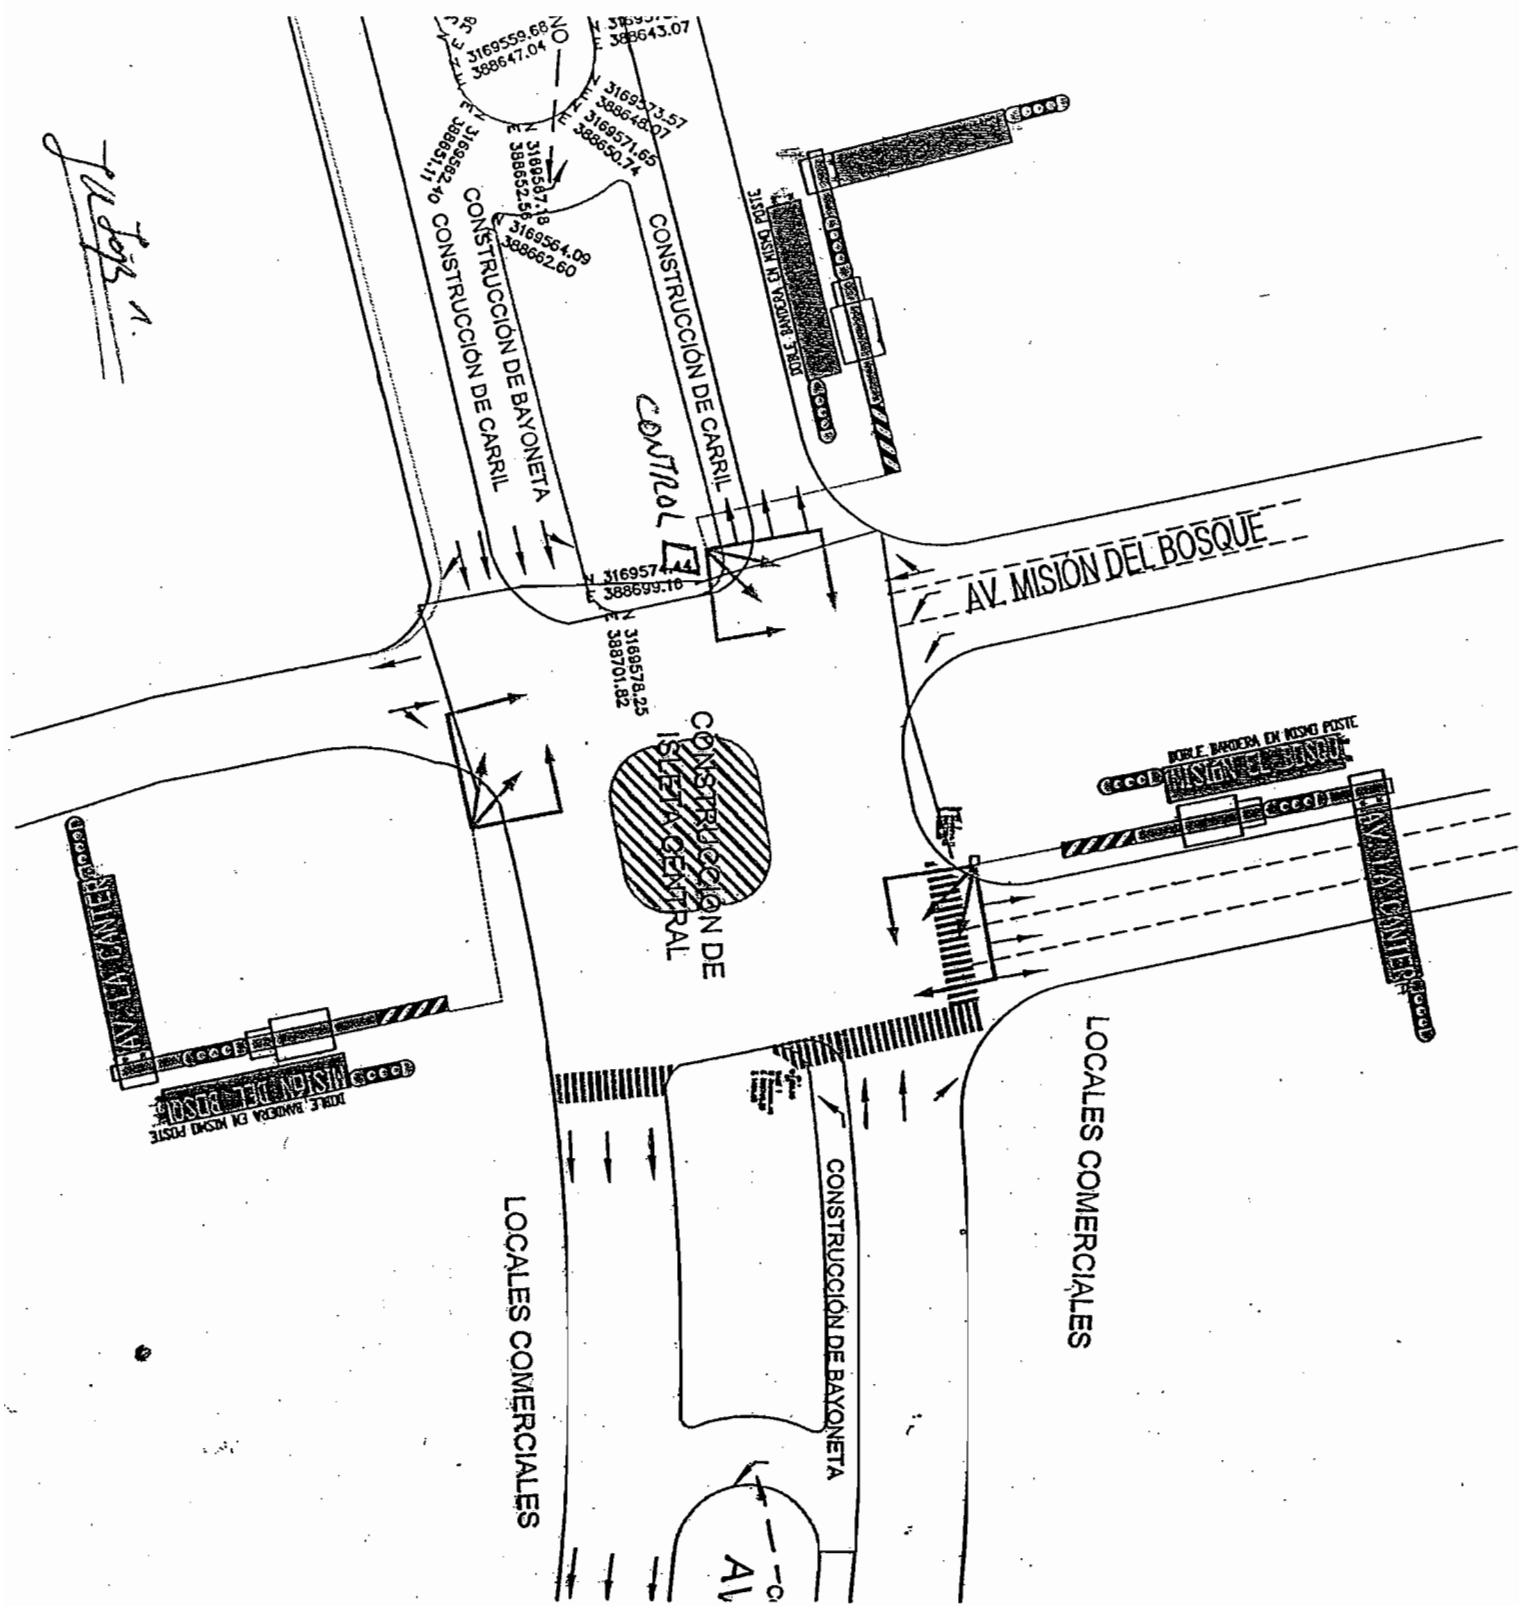


Edo 11

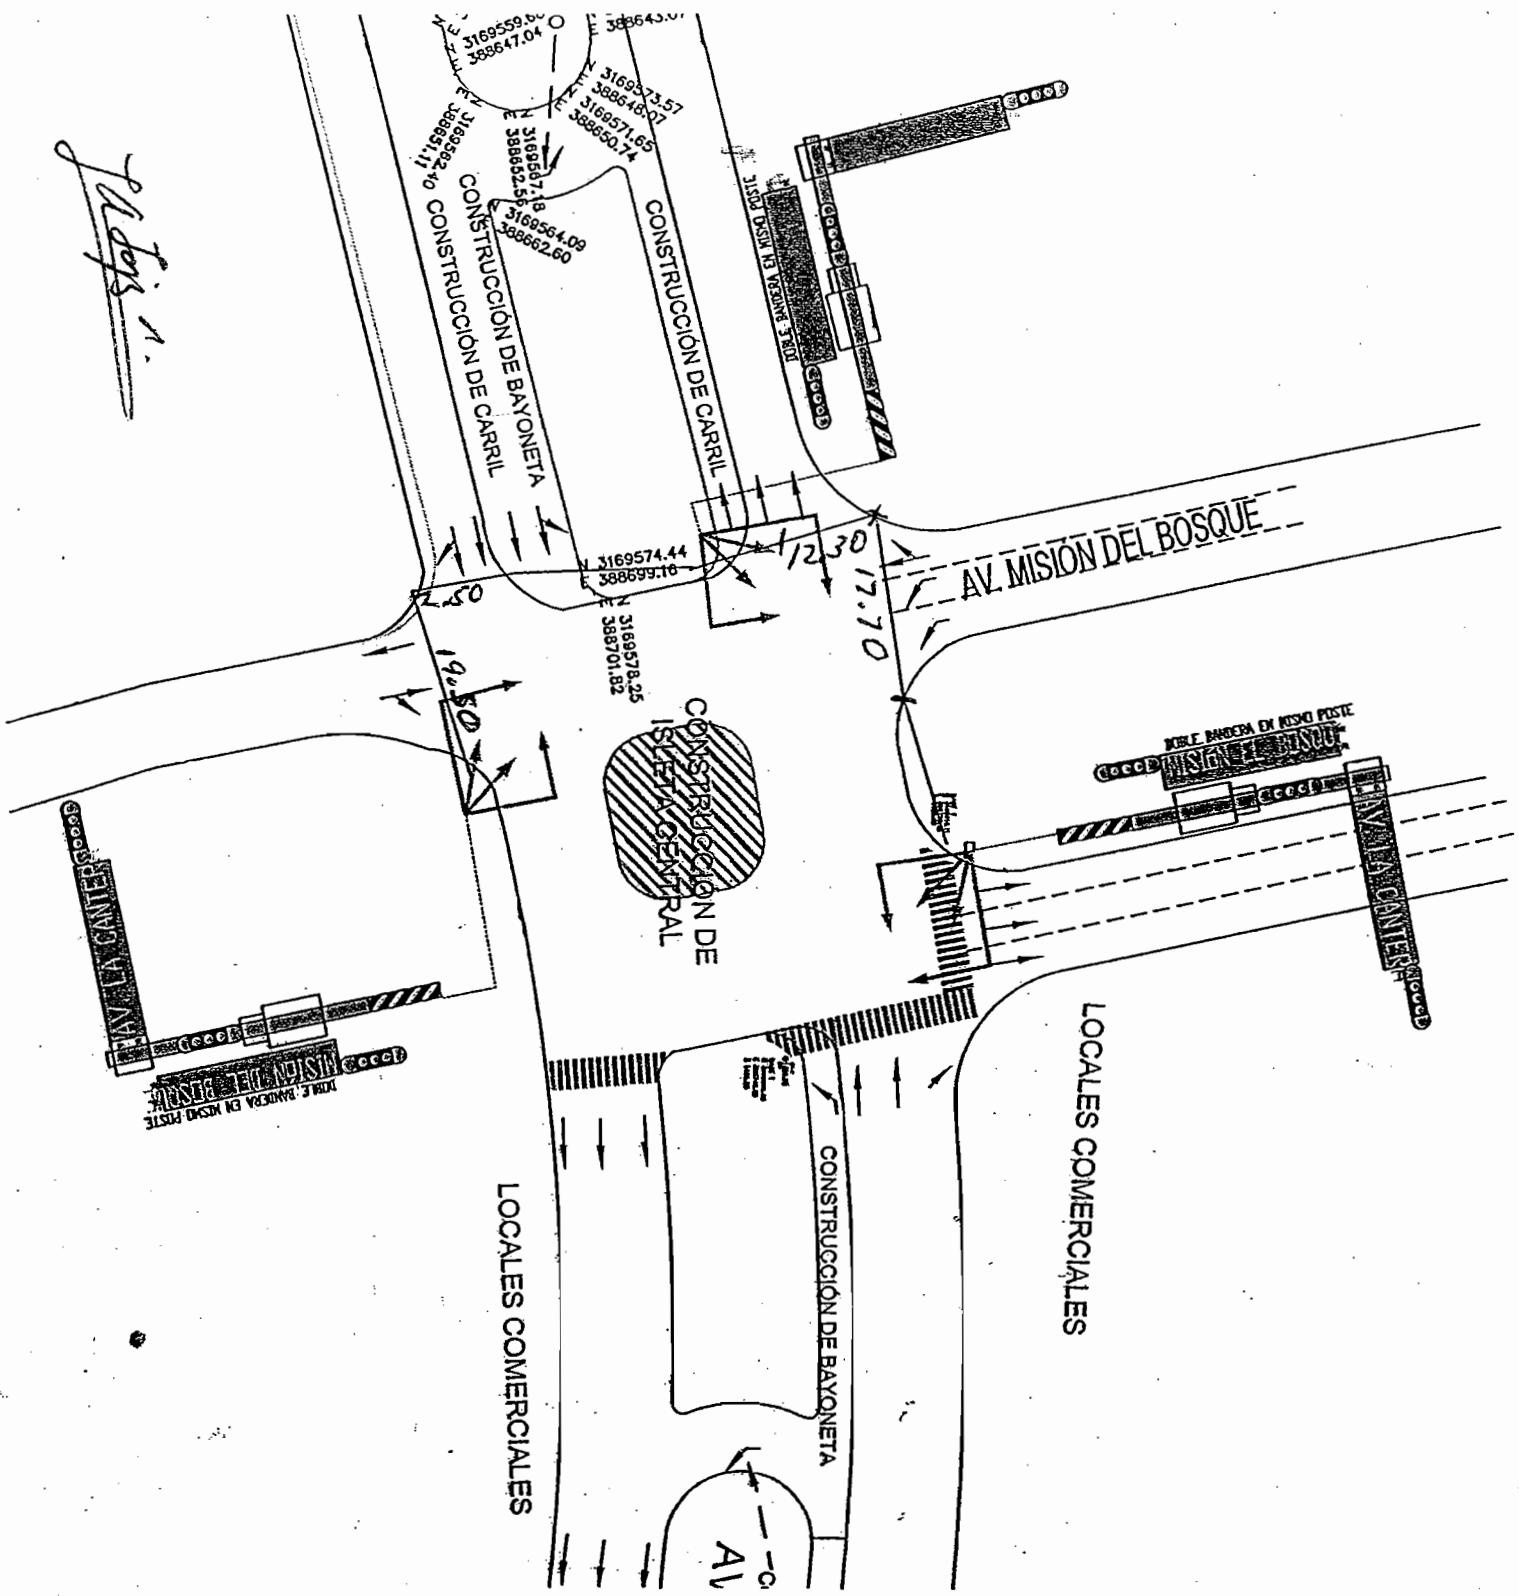

... LAND IV

CROQUIS 11

Edo 11

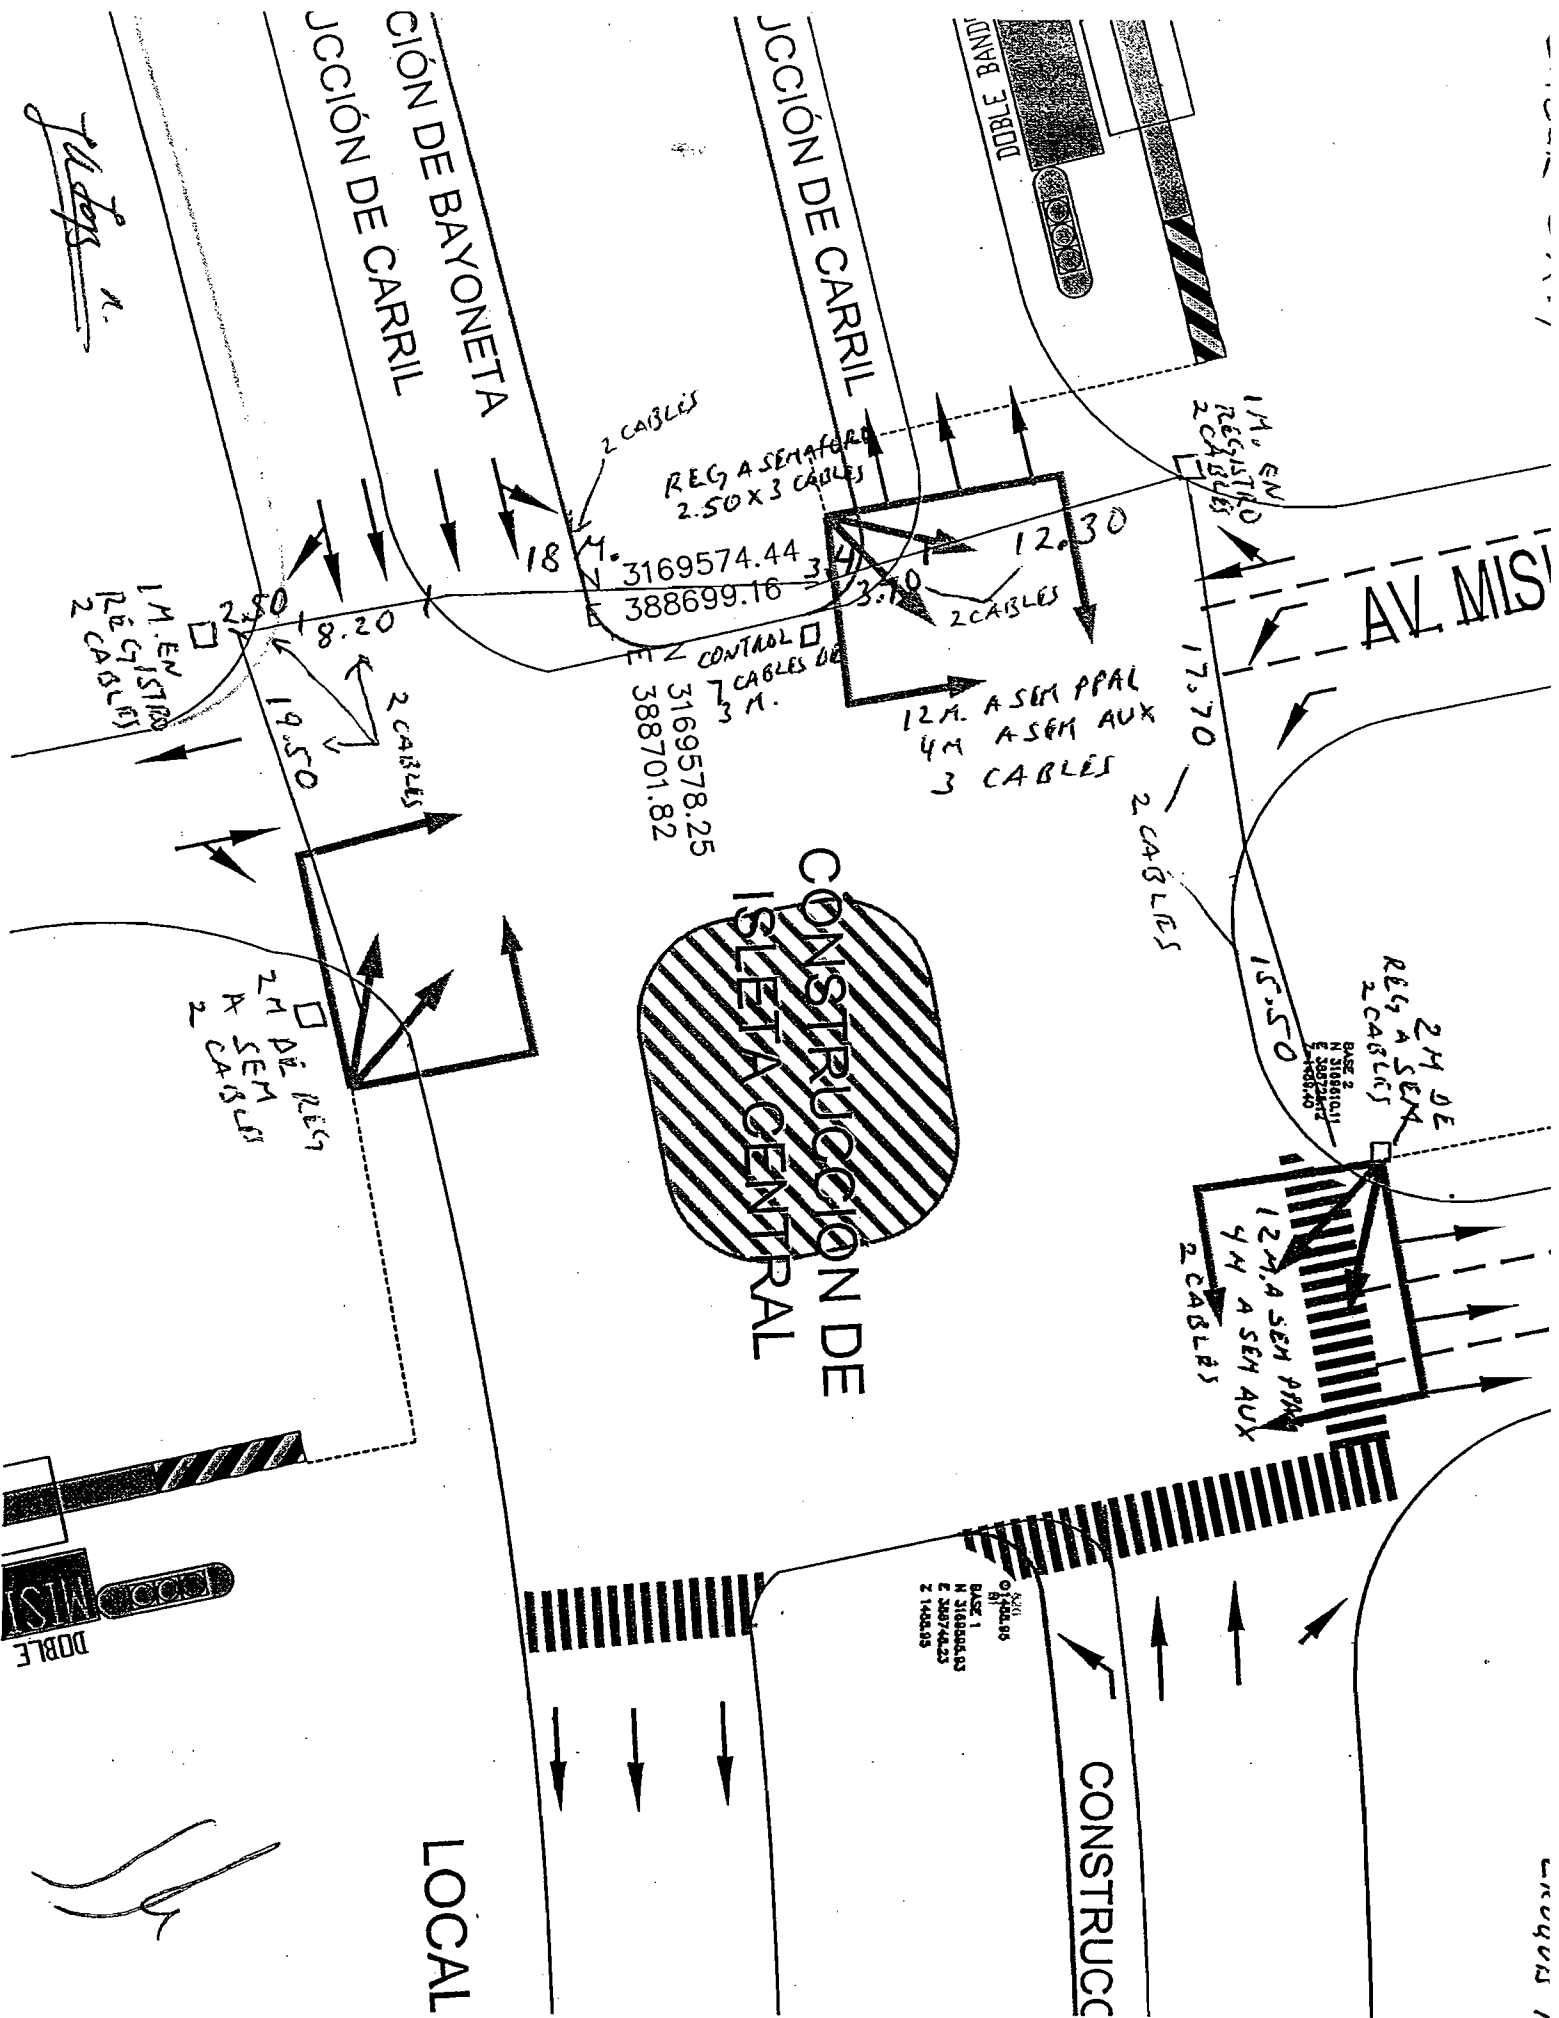

21 5104025


CONTRATO: 240/2016

CONTRATISTA:

CACTUS TRAFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

[illegible]

FOTOS ESTIM 1

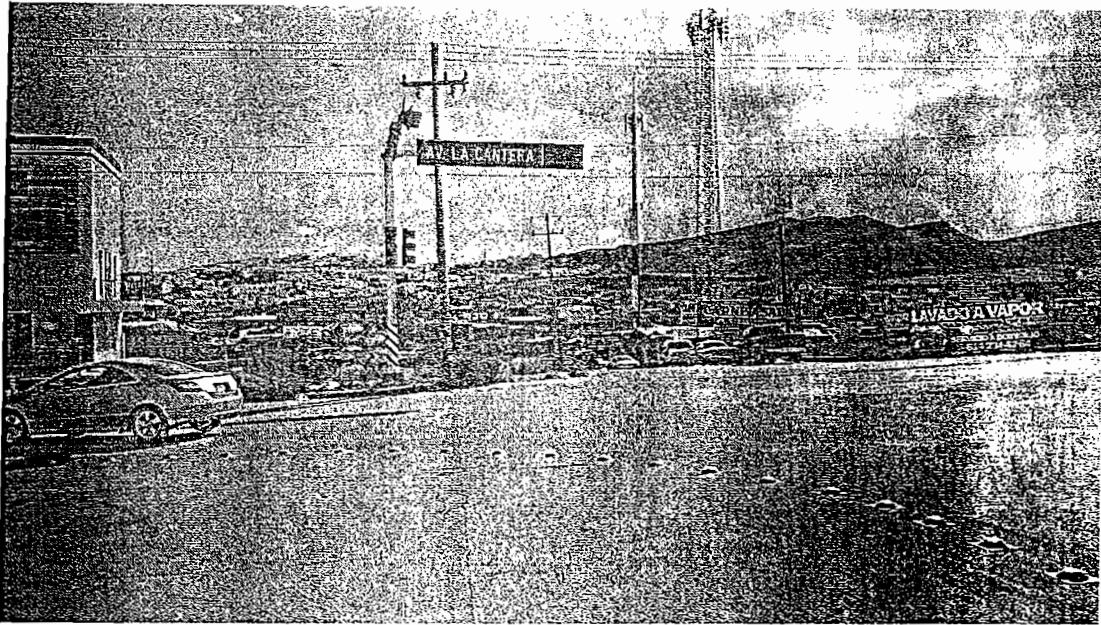


SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEMAFOROS, SID-14, COLADO DE BASE Y OD-5




SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEMAFOROS, SID-14, COLADO DE BASE Y OD-5

Jadep

FOTOS ESTIM 1

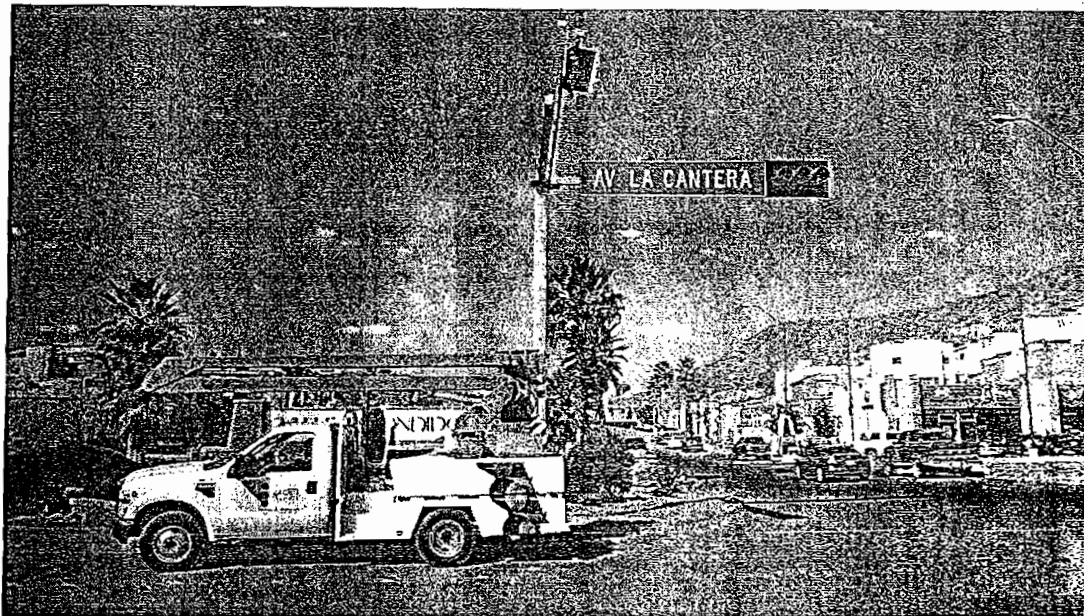


SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEMAFOROS, SID-14, COLADO DE BASE Y OD-5

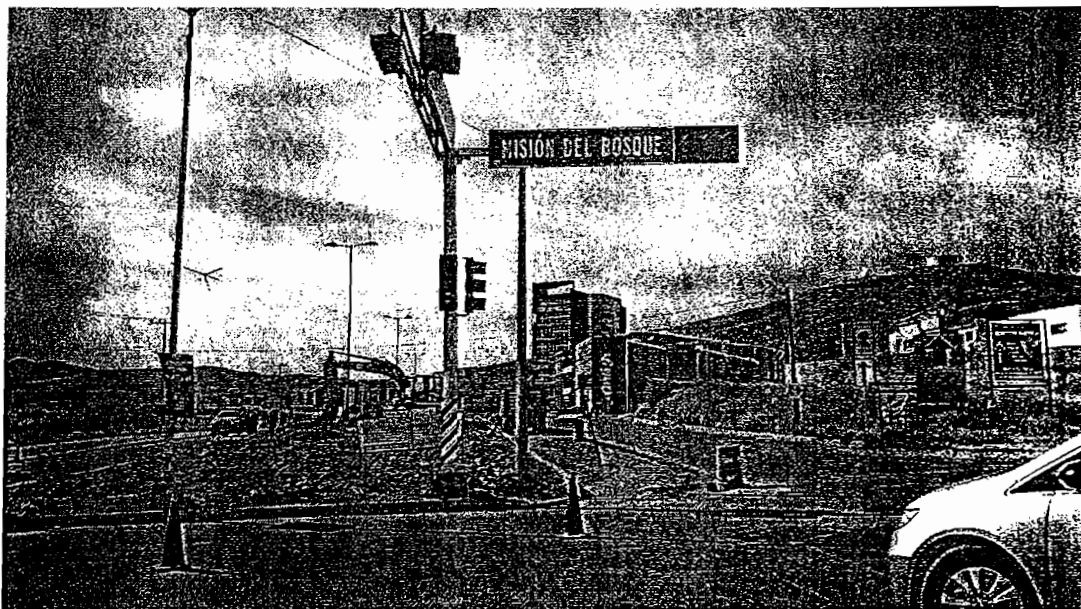

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEMAFOROS, SID-14, COLADO DE BASE Y OD-5

Jadoys

FOTOS ESTIM 1

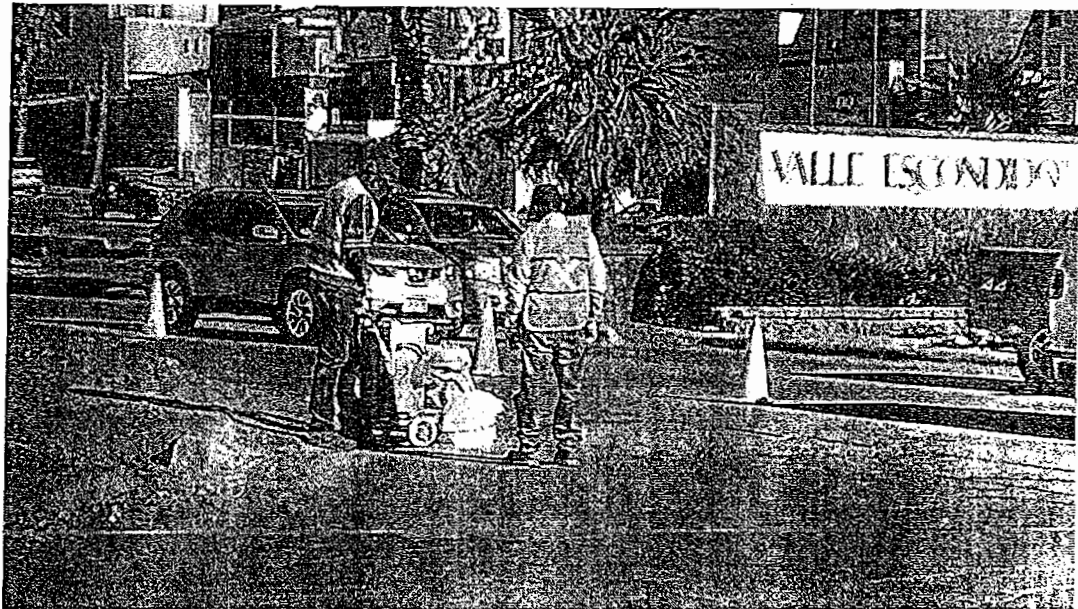


CORTE PARA CANALIZACION DEL CABLE




CANALIZACION DE CABLE

Ja Top

FOTOS ESTIM 1

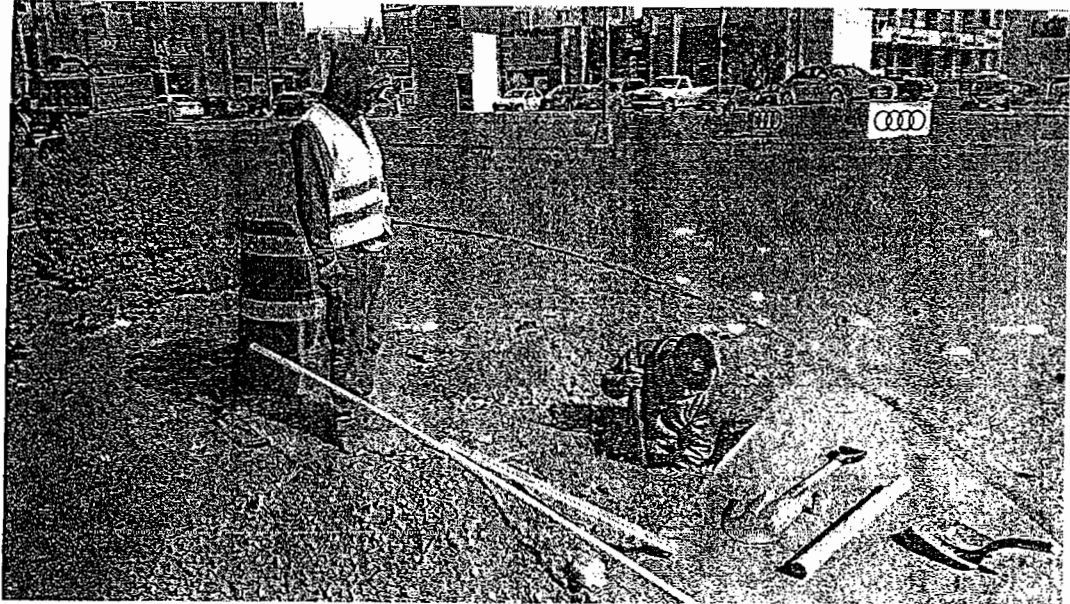


EXCAVACION PARA COLADO DE BASES

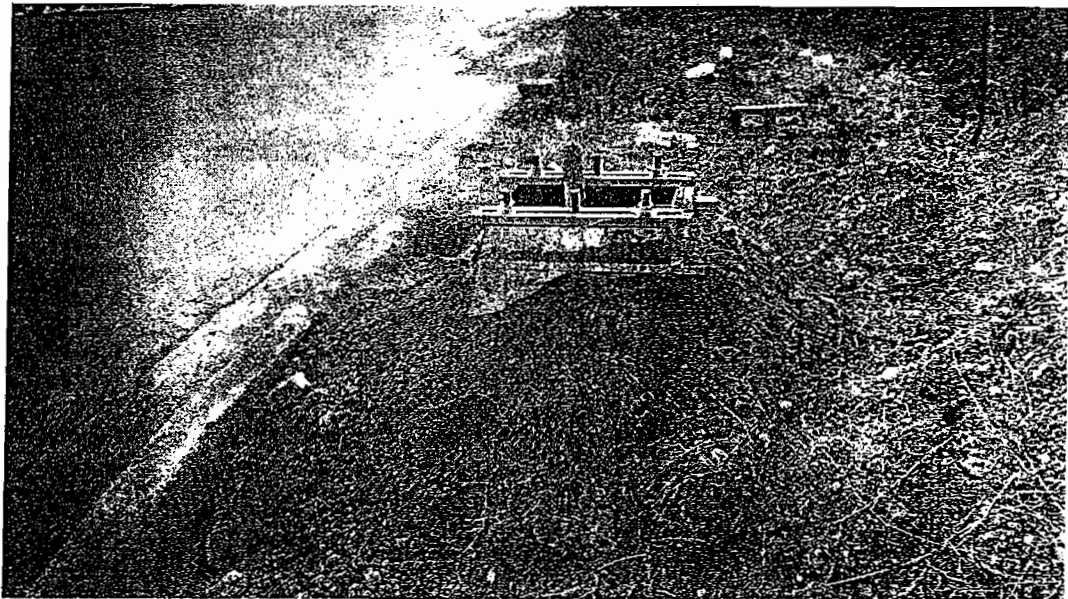

CIMBRADO PARA COLADO DE BASES

Jaques

FOTOS ESTIM 1

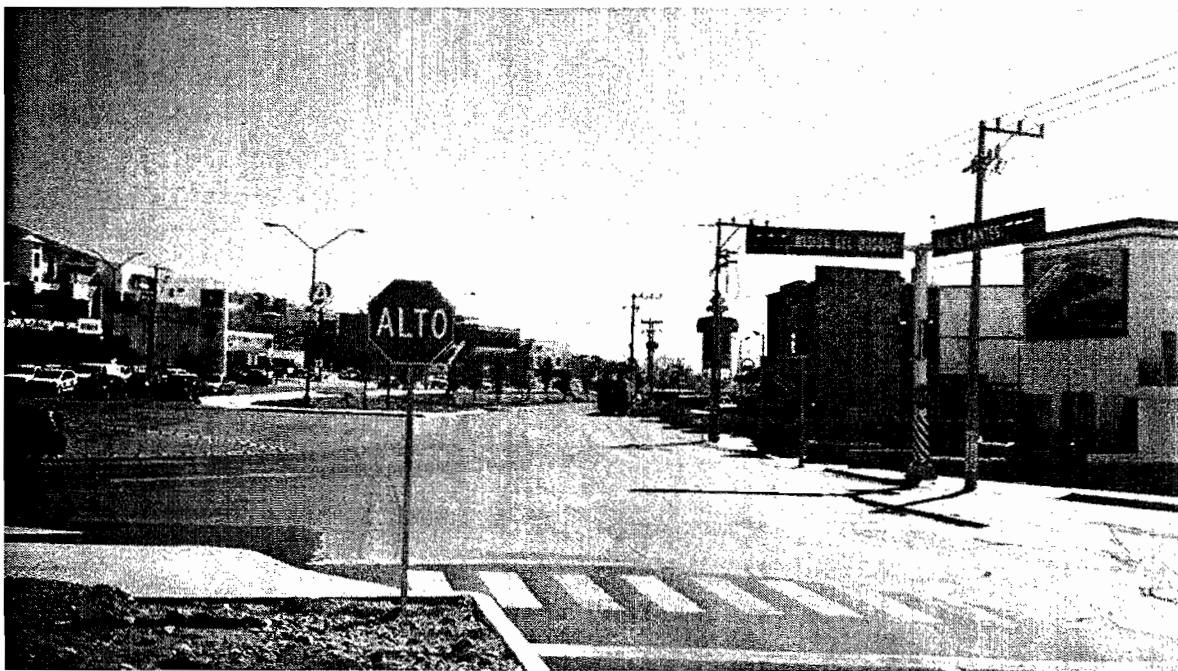

SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES RESTRINGIDAS




REGISTRO ELECTRICO

Ja Esp. 01.



FOTOS ESTIM 1

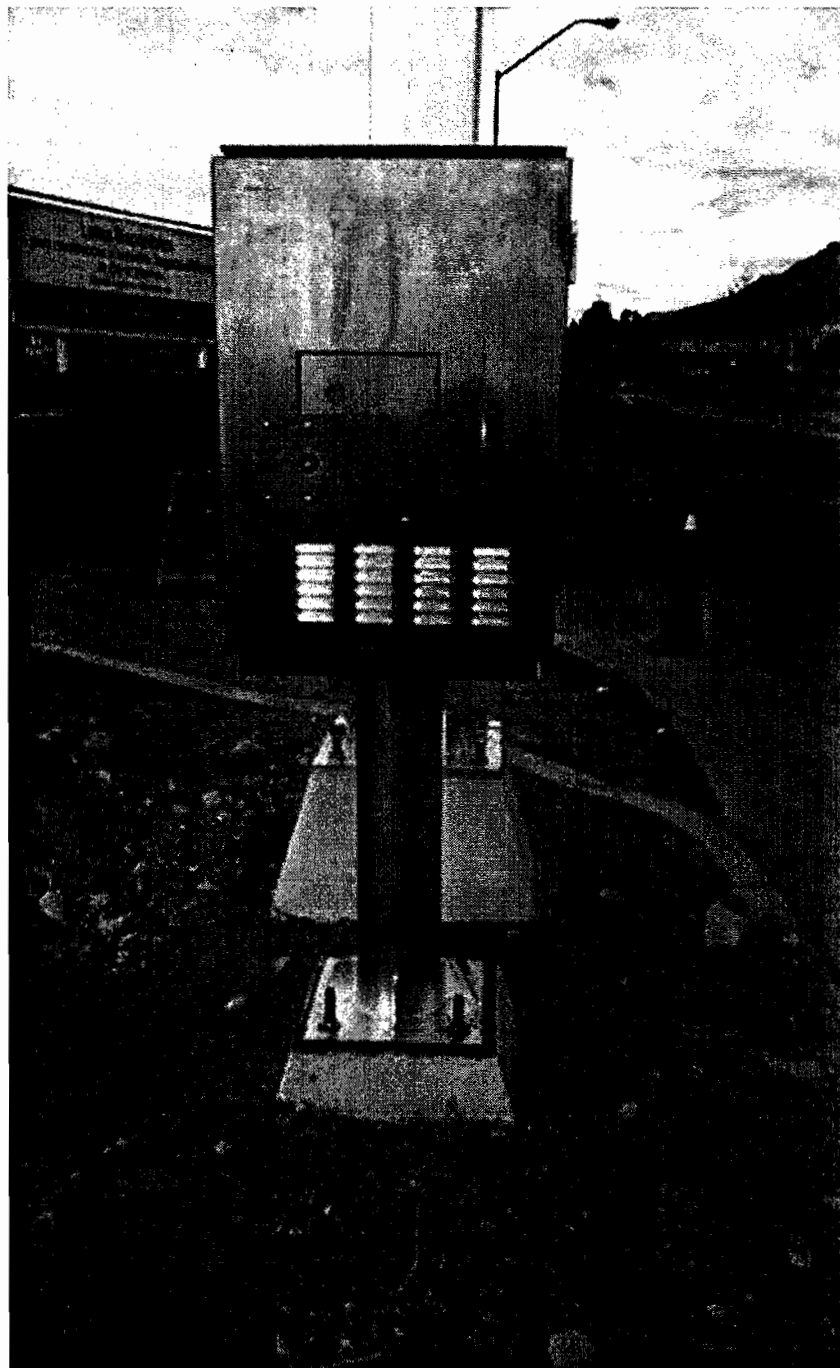

CONTROL 170-E


JA Top



FOTOS ESTIM 1



ACOMETIDA ELECTRICA

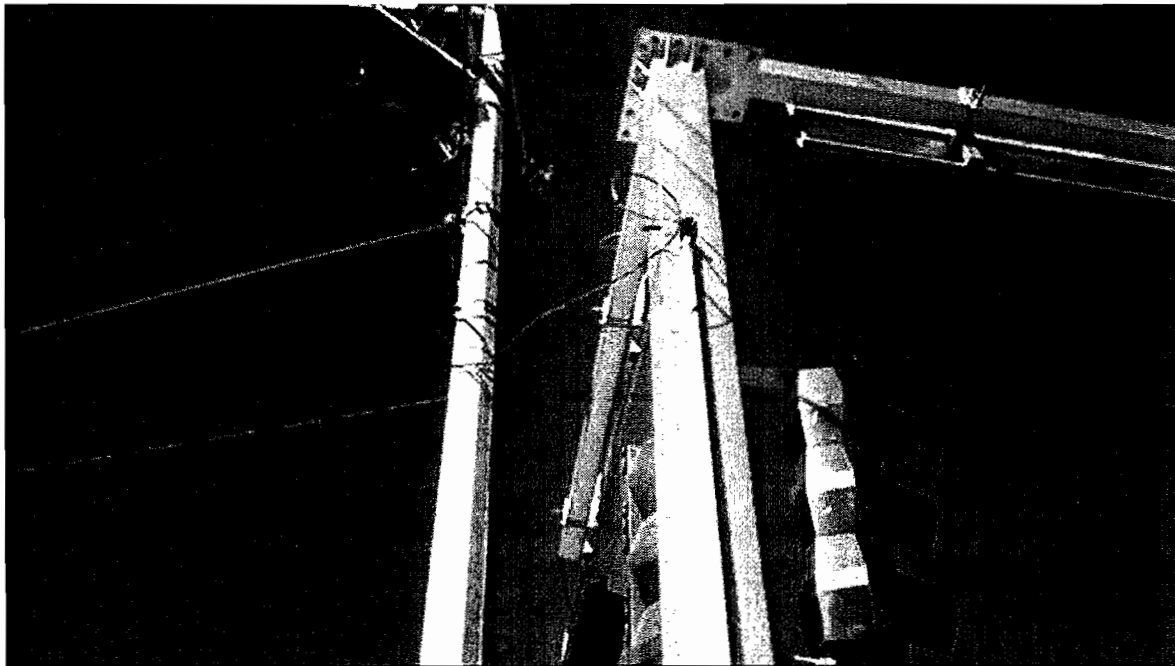

CABLE 1 + 1

Ja Top

