



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 241/2015**

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LOS ARTICULOS 90, 172 Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PÚBLICA

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO.

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL EJE DIEZ DEL DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECHNIA, UBICADO EN EL ENTRONQUE DEL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA Y CARR. A CD. CUAUHTÉMOC, COLONIA ESPERANZA Y ZOOTECHNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA. LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA OBRAS Y PAVIMENTOS FERHEC, S.A. DE C.V. REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL ING. HÉCTOR SIFUENTES GARZA, Y QUE SE RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO, EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCION DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LOS CC. ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA EN SU CALIDAD DE JEFA DEL DEPTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO, EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA EL ING. HÉCTOR SIFUENTES GARZA, EN SU CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA. QUIEN ENTREGA.

DATOS BASICOS: CONTRATO NÚMERO: 241/2015 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2015.

MONTO CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: \$50,431,333.68 (CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 241/2015**

**CONVENIO
ADICIONAL:**

CONVENIO ADICIONAL MONTO Y PLAZO: \$3,766,905.81 (TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 81/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

**OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:
MUNICIPAL:**

2015-PDM-EST-OP-012
2016-PDM-33FM-OP-054
2016-PDM-33FM-OP-114
2016-PDM-33FM-OP-164
2017-PDM-33FMREF/16-OP-025

03 DE SEPTIEMBRE DE 2015
25 DE FEBRERO DE 2016
16 DE MAYO DE 2016
18 DE JULIO DE 2016
17 DE FEBRERO DE 2017

ESTATAL

2015-PRODEM15-A-0127
2016-PRODEM16-A-0055

02 DE SEPTIEMBRE DE 2015
15 DE FEBRERO DE 2016

**PERIODO DE
EJECUCION:**

CONTRATO ORIGINAL 03 DE OCTUBRE DE 2015 A 03 DE JULIO DE 2016.

**ACUERDO DE
DIFERIMIENTO:**

05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 AL 05 DE AGOSTO DEL 2016.

**CONVENIO
ADICIONAL:**

FECHA DE TERMINO 20 DE AGOSTO DE 2016.

**FECHA REAL DE
TERMINACIÓN:**

19 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

BITACORA

FECHA DE INICIO 05/10/2015 FECHA DE CIERRE 19/09/2016.

GARANTIA CUMPLIMIENTO, DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS:	DE	AFIANZADORA	NO. FIANZA	FECHA	IMPORTE
		ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.	1784982	19 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$4,990,813.53

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 241/2015

RELACION DE PAGOS DE ESTIMACIONES: CONTRATO ORIGINAL

No. de Est.	Periodo		Monto de estimación (S/IVA)	Amort. (s/IVA)	Factor de Amort.	Retenido	Alcance Liquido
Anticipo			\$9,310,344.83				\$10,800,000.00
Anticipo			\$3,107,388.88				\$3,604,571.10
Estimación 1	nov 5 del 2015	nov 15 del 2015	\$9,468,744.65	\$2,840,623.40	30%	\$56,812.47	\$7,631,808.18
Estimación 2	nov 16 del 2015	nov 20 del 2015	\$5,435,062.38	\$1,630,518.71	30%	\$32,610.36	\$4,380,660.30
Estimación 3	nov 21 del 2015	nov 30 del 2015	\$987,654.00	\$296,296.20	30%	\$5,925.93	\$796,049.12
Estimación 4	dic 1 del 2015	dic 31 del 2015	\$1,446,866.55	\$434,059.97	30%	\$8,681.19	\$1,166,174.44
Estimación 5	ene 1 del 2016	ene 31 del 2016	\$1,081,894.35	\$324,568.31	30%	\$6,491.37	\$872,006.84
Estimación 6	feb 1 del 2016	feb 29 del 2016	\$1,418,057.55	\$425,417.27	30%	\$8,508.36	\$1,142,954.36
Estimación 7	mar 1 del 2016	mar 15 del 2016	\$259,688.40	\$77,906.52	30%	\$1,558.14	\$209,308.84
Estimación 8	mar 16 del 2016	mar 31 del 2016	\$3,057,721.96	\$917,316.59	30%	\$18,346.32	\$2,464,523.91
Estimación 9	abr 1 del 2016	abr 15 del 2016	\$854,441.84	\$256,332.55	30%	\$5,126.64	\$688,680.14
Estimación 10	abr 16 del 2016	abr 30 del 2016	\$3,809,218.78	\$1,142,765.63	30%	\$22,855.32	\$3,070,230.33
Estimación 11	may 1 del 2016	may 15 del 2016	\$4,357,611.70	\$1,307,283.51	30%	\$26,145.66	\$3,512,235.04
Estimación 12	may 16 del 2016	may 31 del 2016	\$4,576,213.11	\$1,372,863.93	30%	\$27,457.29	\$3,688,427.76
Estimación 13	jun 1 del 2016	jun 30 del 2016	\$847,277.36	\$254,183.20	30%	\$5,083.65	\$682,905.58
Estimación 14	jul 1 del 2016	jul 31 del 2016	\$921,212.06	\$552,727.23	30%	\$5,527.26	\$421,915.14
Estimación 15	ago 1 del 2016	ago 5 del 2016	\$587,911.62	\$584,870.70	30%	\$3,527.46	\$0.00
Estimación 16	ago 6 del 2016	ago 20 del 2016	\$1,024,639.38			\$6,147.84	\$1,148,909.39
Estimación 17 Ultima	ago 21 del 2016	sep 19 del 2016	\$2,890,038.91			\$17,340.24	\$3,301,580.45
TOTAL			43,024,254.60	\$12,417,733.72		\$258,145.50	\$49,582,940.92

COSTO DE OBRA: \$49,908,135.32 (CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.) CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EN RELACION AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE \$8,592,211.73 C/IVA.

"2017. Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 241/2015**


EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO DE LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS.

ASÍ COMO TAMBIÉN SE HACE CONSTAR QUE EL CONTRATISTA EL **ING. HÉCTOR SIFUENTES GARZA**, HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AL RESIDENTE DE OBRA **ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO**.


LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD.

POR LA "DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS"




ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
RESIDENTE DE OBRA

POR LA "EMPRESA CONTRATISTA"

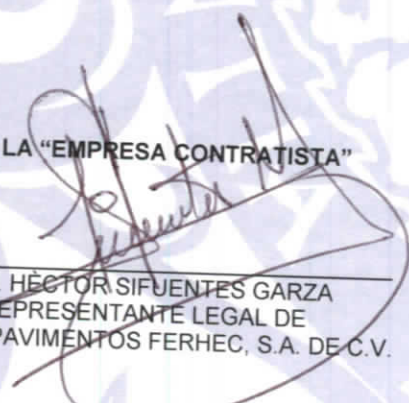

ING. HÉCTOR SIFUENTES GARZA
REPRESENTANTE LEGAL DE
OBRA Y PAVIMENTOS FERHEC, S.A. DE C.V.

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
