

SCO091026IP0

STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV

Folio Fiscal

BAED1C1D-5294-B10F-195D-A355DF087514

Serie

Folio

205

Fecha y Hora

21 / 03 / 2017 14:05:28

BLVD ANTONIO ORTIZ MENA, No. Ext 1605
CAMPESTRE RESIDENCIAL, C.P. 31213
CHIHUAHUA CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO

Datos Fiscales del Cliente

RFC: MCI651010V22

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Domicilio: MINA, No. Ext 408, Col. CENTRO, C.P. 31000

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEXICO

Tipo de Comprobante:

Factura

Moneda:

MXP

Tasa de Cambio:

1

Forma de Pago:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago:

03 - Transferencia electrónica de fondos, No. Cta. NO IDENTIFICADO

Certificado del Emisor:

00001000000403852726

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	ESTIMACION No.3 (TRES) POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN CALLE HACIENDA DE CHINAMECA Y HACIENDA PALO ALTO SEGUN CONTRATO No. 250/2016 ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 34,892.92 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ - RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO D.I.F. DEL 0.2% \$ 69.78 C.M.I.C. 0.2% \$ 69.78 SUMA \$ 139.56 NETO A RECIBIR \$ 40,336.22	\$ 34,892.91	\$ 34,892.91
			Subtotal	\$ 34,892.91
			IVA TASA 16%	\$ 5,582.87
			Total	\$ 40,475.78

Cuarenta mil cuatrocientos setenta y cinco pesos, 78/100 MXN

Expedido en: BLVD ANTONIO ORTIZ MENA 1605 CAMPESTRE RESIDENCIAL C.P. 31213 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO.

Lugar de Expedición: CHIHUAHUA

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|BAED1C1D-5294-B10F-195D-A355DF087514|2017-03-

21T14:05:29|gYfMA/qUSSHG5shq+h71COz/tofQxFrGTMKuse8oks/zvHuPrh7IcKpCt7OkR6DAQpOQqGaJf0NVAgiZQ95I24mxUGpNB6IG5I+ZvbsVe0RuDeIsb6DhRSJ75/lhsX70H3CP2GudZ36KTIwdr4+TkT179xxiM Zk9yG/2HNPqh9ITyXAigqs6sJ+rzEPl4MIZIKI5X0qXk7M4wcbVExH4Autb5eDILehyx0jnvBh9q9Tb8+qe6N18bURajD5U5rleXPpL1DaR2Q641+MSd/BtAKbVM+7779BEsYih1B2cipin20huVEToyltM7QXs+UAJbqd3Sxlc 16nkQgy4DlVn34A==|00001000000402636111|

Sello Digital del Emisor

gYfMA/qUSSHG5shq+h71COz/tofQxFrGTMKuse8oks/zvHuPrh7IcKpCt7OkR6DAQpOQqGaJf0NVAgiZQ95I24mxUGpNB6IG5I+ZvbsVe0RuDeIsb6DhRSJ75/lhsX70H3CP2GudZ36KTIwdr4+TkT179xxiM Zk9yG/2HNPqh9ITyXAigqs6sJ+rzEPl4MIZIKI5X0qXk7M4wcbVExH4Autb5eDILehyx0jnvBh9q9Tb8+qe6N18bURajD5U5rleXPpL1DaR2Q641+MSd/BtAKbVM+7779BEsYih1B2cipin20huVEToyltM7QXs+UAJbqd3Sxlc 16nkQgy4DlVn34A==

Número de Cuenta: NO IDENTIFICADO

Expedido En: Calle BLVD ANTONIO ORTIZ MENA, No. Ext 1605 Col. CAMPESTRE RESIDENCIAL, C.P. 31213 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Estado CHIHUAHUA, MEXICO



Folio Fiscal: BAED1C1D-5294-B10F-195D-A355DF087514

Certificado SAT: 00001000000402636111

Fecha y Hora de

2017-03-21T14:05:29

Sello Digital SAT

Z8ir1UHxUKUwIWhovoSlGgKtgrG2Yo9oJlTf4j4xDFW2Zs1jGTPo4YaXj/Q+JLM/lqeVj60Ej6JYUyyXKGL+hXQecxOalYGmwMnjZWiej3INcMyt4TGx3A+4w6m1m +PVbJgEuw6NmYvLwiyXYyEiOXZ6guhIV5ULJzH6jQv9s59cK/oy1UgAueakMkueEMnoLWNA10Vfq82Y3xgpkH35XaKdVu9zKzZi1dXhED5aUG0CuM0K1yQHeb SH0LnNrKig2tzCcXRhs+M7kaqkK+6W0NnWbluvHOAutf4bSTMkvzszXMOdgiw0IWzSxs6wt6qmXITLmRCXqmsFS/CZXuWQ==



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal RFC Emisor RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
SCO091026IPO	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
BAED1C1D-5294-B10F-195D-A355DF087514	2017-03-21T14:05:28	2017-03-21T14:05:29	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$40,475.78	ingreso	Vigente	

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: 0	CONTRATO No. 250/2016	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: PUENTE VEHICULAR UBICADO EN CALLE HACIENDA DE CHINAMECA Y HACIENDA PALO ALTO.	ESTIMACIÓN No. 3	\$ 960,326.01 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 28 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2017	
UBICACIÓN: COLONIA AMPLIACION NUEVO TRIUNFO	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 40,475.78 CON IVA
CONTRATISTA: STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 918,932.84 CON IVA
RFC SCO 091026-IP0	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 959,408.62 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 34,892.92	
<u>0.00</u>	\$ -	
<u>0.00</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 34,892.92	

DESCUENTOS

0.2%D.I.F.	\$	69.78
0.2% C.M.I.C	\$	69.78
SUMA DESCUENTOS	\$	139.56

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$	34,892.92
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	34,892.92
I.V.A.	\$	5,582.86
TOTAL	\$	40,475.78

(CON LETRA)

(CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	139.56
SALDO NETO A RECIBIR	\$	40,336.22

AUTORIZO

ELABORO

Jesús m. Franco
 ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
 RESIDENTE D.O.P.M

Stahl Construcciones SA de CV
 STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV
 CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

Javier Villarreal Posada
 ING. JAVIER VILLARREAL POSADA

Ma. del Carmen Mendoza Rugel
 ING. Ma DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO

SUBDIRECTOR DE
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL

JEFE DEL DEPTO. CONSTRUCCION
 SOCIAL

Vo. Bo.

Carlos Humberto Cabello Gil
 ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH.,

15 DE FEBRERO

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/ DIR. DE OBRAS PUBLICAS, LA CANTIDAD DE: \$ 40,336.22
(CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 3 CONTRATO No. 250/2011 POR LA CANTIDAD DE : \$ 960,326.01 INCLUYE CONVENIO
NOVECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL 01/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
PUENTE VEHICULAR UBICADO EN CALLE HACIENDA DE CHINAMECA Y HACIENDA PALO ALTO.

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	34,892.92
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$	34,892.92
	IVA	\$	5,582.86
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO	TOTAL	\$	40,475.78
C.M.I.C. DEL 0.2%	69.78		
DIF DE 0.2 %	69.78		
SUMA	139.56		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 960,326.01
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 918,932.84
ESTA ESTIMACION	\$ 40,475.78
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 959,408.62
POR EJERCER	\$ 917.39


2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% DIF	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 69.78	\$ 69.78
ACUMULADO ACTUAL	\$ 69.78	\$ 69.78

R E C I B I M O S



STAHN CONSTRUCCIONES SA DE CV
SCO 091026-IP0

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
NORMALES		
16	PARAPETO A BASE DE TUBO NEGRO C-30 DE 2" DE DIAMETRO CON ALTURA DE 1 MT. CON POSTE A CADA 1.5 Y TUBO HORIZONTAL ARRIBA Y EN MEDIO INC. CODOS, SOLDADURA, BONDO, PULIDO, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE. PLACA 15X15CMS DE 1/4" DE ESPESOR CON ANCLAS AHOGADAS EN PISO PARA RECIBIR PARAPETO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	18,005.00
18	DENTELLON DE CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA BOLA Y CONCRETO FC=150 KG/CM2 CON 60% DE CONCRETO.	13,916.00
21	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA	2,971.92
SUBTOTAL		34,892.92
I.V.A.		5,582.86
TOTAL		40,475.78


POR EL CONTRATISTA


STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN


ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ

CONTRATISTA: STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV ESTIMACION No. 3 PERIODO: 28 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2017


No.	CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO			
OBRA NORMAL									
1	TRAZOS Y NIVELES	M2	260.00		238.00	0.00	\$10.00	\$34,892.92	
2	LIMPIEZA Y DESHIERBE DE TERRENO IN. RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA	M2	260.00		238.00	0.00	\$12.00	0.00	
3	EXCAVACION EN MATERIAL "B2 PROFUNDIDAD HASTA 1.5 MTS. CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA.	M3	186.00		409.60	0.00	\$96.00	0.00	
4	DESIVIO DE CAUCE INCLUYE EXCAVACIONES, ACOMODO DE MATERIAL PARA FORMACION DE BORDO Y RELLENO COMPACTADO AL FINALIZAR	M3	73.00		0.00	0.00	\$250.00	0.00	
5	AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90%	M2	260.00		133.19	0.00	\$35.00	0.00	
6	PLATILLA DE CONCRETO FC=100KG/CM2 DE 5 CMS, DE ESPESOR	M2	96.00		133.19	0.00	\$180.00	0.00	
7	PROPORCIONAR Y OPERAR LA BOMBA DE 75MM(3"), INCLUYENDO EL PERSONAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, EL SUMINISTRO DE TODO LOS MATERIALES DE CONSUMO, LA DISPOSICION DEL EQUIPO. TODO LOS MATERIALES DE CONSUMO, LA DISPOSICION DEL EQUIPO TODO LOS ACCESORIOS NECESARIOS DURANTE SU OPERACION, LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LOS CARCAMOS BOMBEO Y OBRA FALSA O DE SUSTENTACION.	HR	60.00		0	0	\$350.00	0.00	
8	MAMPOSTERIA DE 3 CLASE A BASE DE PIEDRA DE CORTE ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE DE RESISTENCIA FC=60 KG/CM2.	M3	220.00		316.04	0.00	\$1,825.00	0.00	
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENEOS EN MUERO DE MAMPOSTERIA A BASE DE TUBO DE PVC DE 4"	ML	24.00		14.00	0.00	\$550.00	0.00	
10	PISO DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR EN FRANJAS NO MAYORES A 4 MTS . INCLUYE: AFINE DE SUPERFICIE, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6X10/10 MEMBRANA DE CURADO Y ACABADO A VUELTA DE PLANA.	M2	240.00		238.36	0.00	\$280.00	0.00	
11	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	M3	150.00		56.38	0	\$250.00	0.00	
12	RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	160.00		0	0	\$110.00	0.00	
13	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	M3	42.00		14	0	\$185.00	0.00	
14	LOSA DE CONCRETO MR-40 CON ESPESOR DE 40 CM ARMADA SEGÚN PLANO INC. GANCHOS, BASTONES, TRASLAPES, BOMBEO DEL CONCRETO, VIBRADO, MEMBRANA DE CUADRO CIMBRA Y DESIMBRA.	M2	82.00		60.34	0.00	\$751.00	0.00	


 POR EL CONTRATISTA
 ING. JAIME JAVIER SOLIS GARCIA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

 ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ


No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
15	BANQUETA ARMADA EN VOLADIZO CONCRETO MR-40 CON ESPESOR DE 10 CMS. A 20 CMS ARMADA CON VARILLA DE 5/8 @ 30 CMS Y 5 VAR. 3/8 LONGITUDINAL INC.CIMBRADO, ARMADO, COLADO, BOMBEO DEL CONCRETO Y MEMBRANA DE CURADO.	M2	27.00		14.81	0.00	\$390.00	0.00
16	PARAPETO A BASE DE TUBO NEGRO C-30 DE 2" DE DIAMETRO CON ALTURA DE 1 MT. CON POSTE A CADA 1.5 Y TUBO HORIZONTAL ARRIBA Y EN MEDIO INC. CODOS, SOLDAURA, BONDO, PULIDO, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE. PLACA 15X15CMS DE 1/4" DE ESPESOR CON ANCLAS AHOGADAS EN PISO PARA RECIBIR PARAPETO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	ML	18.00		0.00	13.85	\$1,300.00	18,005.00
18	DENTELLON DE CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA BOLA Y CONCRETO FC=150 KG/CM2 CON 60% DE CONCRETO.	M3	22.40		0	4.97	\$2,800.00	13,916.00
19	LAVADERO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 7 CMS. DE ESPESOR EN AREA DE ESCURRIMIENTO ACABADO PULIDO INCLUYE AFINE, CIMBRA, MEMBRANA DE CURADO Y MEMBRANA DE CURADO.	M2	64.00		0.00	0.00	\$280.00	0.00
20	SUMINISTROS Y COLOCACION DE DEFENSA METALICA IN. POSTE VIGA IPR DE 1.5 MTS GALV. SEPARADOR GALVANIZADO, REFLEJANTE Y TORNILLERIA DE 5/8"x1 1/2" GALVANIZADO.	PIEZA	4.00		0.00	0.00	\$3,580.00	0.00
21	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBREPANTE FUERA DE LA OBRA	M2	260.00		0.00	247.66	\$12.00	2,971.92



POR EL CONTRATISTA


ING. JAIME SOLIS GARCIA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ

Generadores Ordinarios de Obra

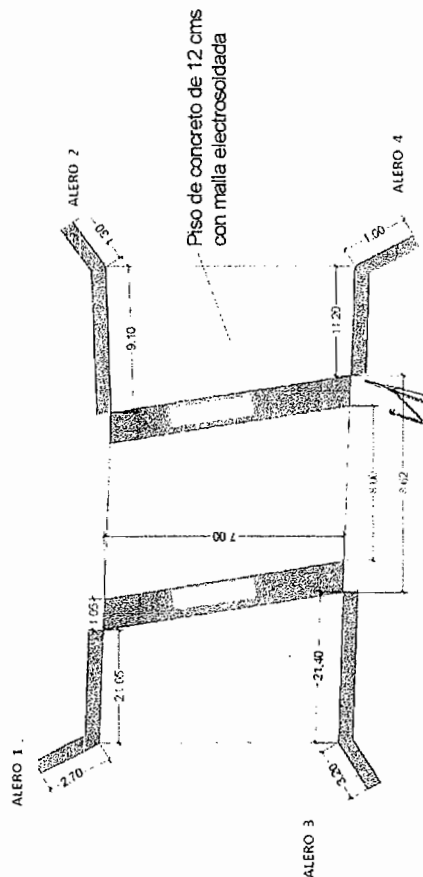[illegible]

~~CONTRABANDISTA~~

ING IRIS SIOMARA SINECIO TRUJILLO

SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JESUS ~~MATU~~EL FRANCO MARTINEZ

