

CONTROL DE TRAMITE DE ESTIMACIONES

DATOS GENERALES			
FOLIO	NUMERO DE ESTIMACION	FACTURA	SALDO NETO
	6		1,296,605.14
OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)			
CONTRATISTA:	ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA		UBICACIÓN EN VARIAS COLONIAS AL SUR D
RESIDENTE	ING. SERGIO GARCIA CARDENAS		CONTRATO No. 259/2016

RESUMEN DE AUTORIZACIONES				
AUTORIZACION DE:	FECHA Y FIRMA RECIBIDO	FECHA Y FIRMA ENTREGA	CONTROL DE OBRA	
			FECHA Y FIRMA RECIBIDO	FIRMA Y FECHA ENTREGA
☒ RESIDENTE				
☐ JEFE DE OFICINA				
☐ JEFE DEPARTAMENTO				
☒ DIRECTOR				
☐ DEP. SERV. ADM.				

EN CASO DE 1ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	

EN CASO DE 2ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	

EN CASO DE 3ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	



Dirección de Obras Públicas
Subdirección de Infraestructura Urbana
Departamento de Construcción

NOMBRE Y FECHA DE ENTREGA EN CONTROL DE OBRA



Factura

SERIE:

FOLIO: 396

FECHA 13/7/2017 12:47:25

Documento Válido

IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

SIOI671110T93 ARGENTINA No. 731 SAN ANDRES,
31110
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

Cliente: Municipio de Chihuahua
R.F.C.: MCI651010V22
Dirección: Calle Mina No. 408
Teléfono:
Ciudad: Chihuahua

Colonia: Centro
Estado: Chihuahua

C.P.: 31000
País: México

Lugar de Expedición: ARGENTINA 731, SAN ANDRES, 31110, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
Regimen: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL


Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	ESTIMACION Pago por concepto de Estimación 6 (Seis) del Contrato de Obra Pública No. 259/2016, que ampara los trabajos referentes a la obra denominada: "Construcción de Colector en varias colonias al sur de la ciudad (2a. Etapa)". Firma del Contratista Alcance de la Estimación \$ 1,117,763.05 (Menos) Amortización del Anticipo \$ 0.00 Subtotal \$ 1,117,763.05 IVA 16% \$ 178,842.09 Total \$ 1,296,605.14 (Menos) Retenciones Pactadas en Contrato: D.I.F. del 0.2% \$ 2,235.53 C.M.I.C. del 0.2% \$ 2,235.53 Suma \$ 4,471.06 Neto a Recibir \$ 1,292,134.08	1,117,763.05	1,117,763.05

Importe con letra
UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 14/100 M.N.
Método de Pago
03 Transferencia Electrónica de Fondos

SUBTOTAL:	1,117,763.05
I.V.A.:	178,842.09
TOTAL:	1,296,605.14

Este documento es una representación impresa de un CFDI
"Efectos fiscales al pago"
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404545855
Folio fiscal:	630DE501-FE12-46A1-B376-21989C1FAA34
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404496074

[illegible][illegible][illegible]

2



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal *

RFC emisor *

RFC receptor *

Proporcione los dígitos de la imagen *



Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SIOI671110T93	IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA	MCI651010V22	Municipio de Chihuahua
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
630DE501-FE12-46A1-B276-21989C1FAE4F	2017-07-13T12:47:25	2017-07-13T13:47:32	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$1,296,605.14	ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- [Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

- [English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)
- [Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)
- [Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información

gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)


Mantente informado. Suscríbete.

[Suscríbete en Empujón](https://www.gob.mx/empujon)



Síguenos en

<https://www.facebook.com/gobmx> <https://twitter.com/gobmx>



IMPRIMIR EN HOJA MEMBRETADA Y SOLO 2 HOJAS (ORIGINAL Y ACUSE)

CHIHUAHUA, CHIH. 17 MAYO DE 2017

ING. SERGIO GARCIA CARDENAS
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No. 6 CON FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO
POR UN SALDO NETO FACTURADO L \$1,296,605.14 CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y
AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

RÉCIBE



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 259/2016	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)	ESTIMACIÓN No. 6	\$ 33,356,540.64 CON IVA
	PERÍODO EJEC. DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2017	
UBICACIÓN: EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 1,296,605.14 CON IVA
CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 19,840,885.88 CON IVA
RFC SIOI671110T93	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 21,137,491.02 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 40,088.64	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ 1,670.36	
<u>EXTRAS</u>	\$ 1,076,004.05	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 1,117,763.05	

--

DESCUENTOS		
0.2% C.M.I.C.	\$	2,235.53
0.2% D.I.F	\$	2,235.53
SUMA DESCUENTOS	\$	4,471.06
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	1,117,763.05
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	1,117,763.05
I.V.A.	\$	178,842.09
TOTAL	\$	1,296,605.14
(CON LETRA)		
(UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 14/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	4,471.06
SALDO NETO A RECIBIR	\$	1,292,134.08

AUTORIZO	ELABORO
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS	ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA	ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.
Vo. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

CHIHUAHUA, CHIH.,

17 MAYO DE 2017

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Y OBRAS PUBLICAS, LA CANTIDAD DE: \$ 1,292,134.08
(UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 8/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACION NUM. 6 CONTRATO No. 259/2011 POR LA CANTIDAD DE : \$ 33,356,540.64
TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 64/100 M N POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 1,117,763.05

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 1,117,763.05
IVA \$ 178,842.09
TOTAL \$ 1,296,605.14

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

D.I.F DEL 0.2% 2,235.53
C.M.I.C DEL 0.2% 2,235.53
SUMA 4,471.06

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO	\$ 33,356,540.64
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 19,840,885.88
ESTA ESTIMACION	\$ 1,296,605.14
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 21,137,491.02
POR EJERCER	\$ 12,219,049.62

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% D.I.F

0.2% C.M.I.C.

ACUMULADO ANTERIOR	\$ 34,208.41	\$ 34,208.41
ESTA ESTIMACION	\$ 2,235.53	\$ 2,235.53
ACUMULADO ACTUAL	\$ 36,443.94	\$ 36,443.94

R E C I B I M O S

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
SIOI671110T93

OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)

UBICACIÓN EN VARIAS COLONI No. CONTRATO: 259/2016

ESTIMACIÓN No. 6

CONTRATIST ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA


PERÍODO: DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

<u>NORMALES</u>	40,088.64
<u>EXCEDENTES</u>	1,670.36
<u>EXTRAS</u>	1,076,004.05

SUBTOTAL	1,117,763.05
I.V.A.	178,842.09
TOTAL	1,296,605.14

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"



POR EL CONTRATISTA




POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR		
<u>OBRA NORMAL</u>							
5	SUMINISTRO DE TUBERIA, EMPAQUES DE HULE, BROCALES, ETC.						40,088.64
5.4	Suministro de Anillo de Hule para unir Tubería de Fibrocemento de 30" (750mm) de diámetro clase B-9 con pozo de visita; L.A.B. Obra, detalle en croquis anexo.	pieza	48	48.00	0	48.00	835.18
<u>EXCEDENTES</u>							
5	SUMINISTRO DE TUBERIA, EMPAQUES DE HULE, BROCALES, ETC.						1,670.36
5.4	Suministro de Anillo de Hule para unir Tubería de Fibrocemento de 30" (750mm) de diámetro clase B-9 con pozo de visita; L.A.B. Obra, detalle en croquis anexo.	pieza	0	50.00	48	2.00	835.18
<u>EXTRAS</u>							
EXT-03	Suministro de tubería de PVC Novafort de 30" (762mm) de diámetro, junta hermética con campana y junta hermética (NOM-001-CONAGUA-2011); L.A.B. en Obra	m3	0.00	471.20	0.00	471.20	2,283.54
							1,076,004.05
							1,076,004.05

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA

TOTAL 1,117,763.05

POR EL CONTRATISTA

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. SERGIO CARDENAS


HOJA /

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA."

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION

CONTRATO : 2011 P.D. 259/2016	TRAMO:
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS	CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
Nº DE ESTIMACION: 6	PERIODO: DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2017

CONCEPTO FC3 TUBERIA DE 30" DE DIAM

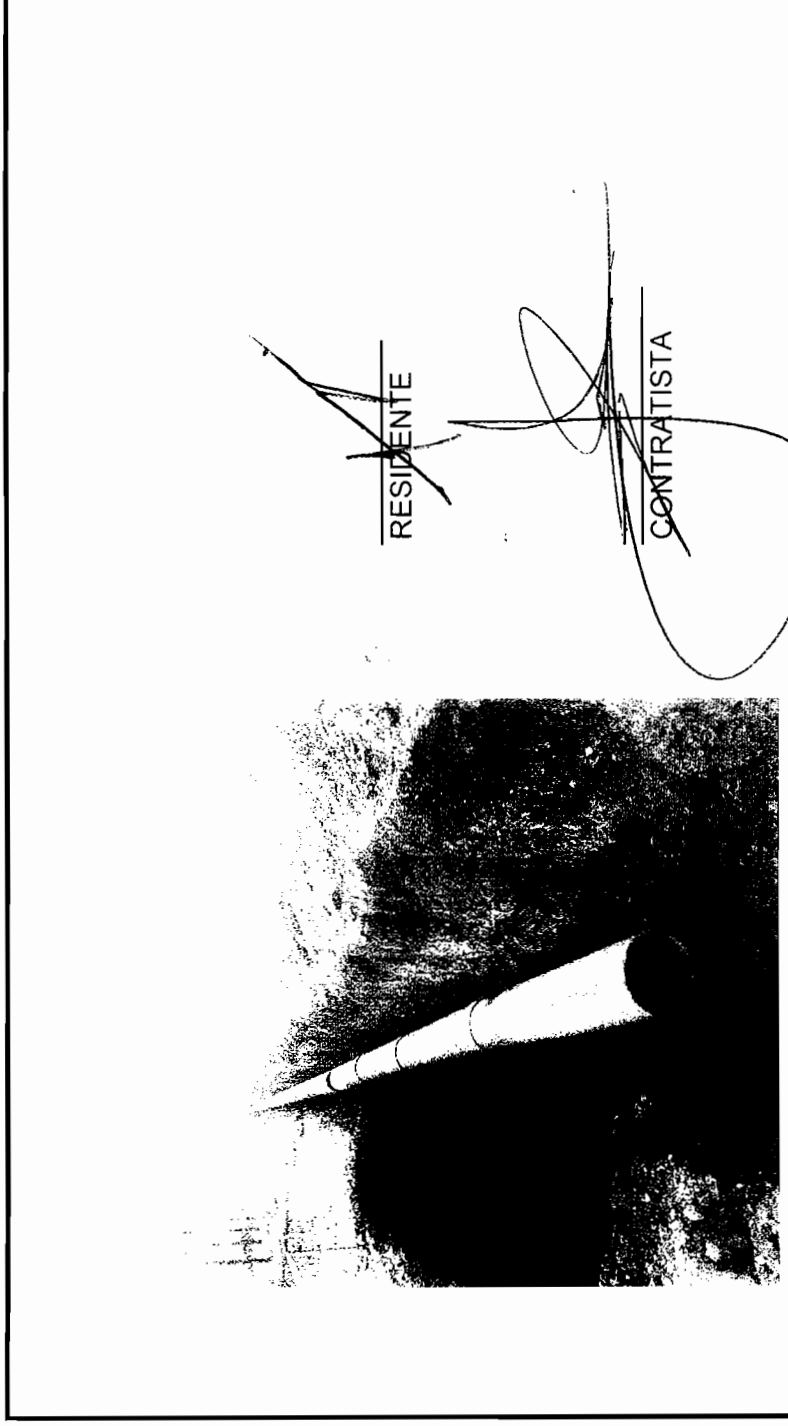

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION

CONTRATO : /2011 P.D. 259/2016	TRAMO:
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS	CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
No DE ESTIMACION: 6	PERIODO: 0

CONCEPTO FC3 TUBERIA DE 30" DE DIAM



RESIDENTE

CONTRATISTA

CONTRATO :	259/2016	TRAMO:	
OBRA :	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)	CONTRATISTA:	ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

Nº DE ESTIMACION:	6	PERIODO:	DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2017
-------------------	---	----------	---------------------------------------

[illegible]

13 CMS					
24	30-31	17.40	2.95	2.75	2.98
24	31-32	67.90	2.75	2.70	2.86
24	32-33	10.00	2.70	2.65	2.81
24	33-34	40.30	2.65	2.80	2.86
24	34-35	60.20	2.80	2.60	2.83
SUMA		195.80		189.80	-
					17.95
					18.50

~~RESIDENTE~~
~~ING. SERGIO GARCIA CARDENAS~~

CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"
