

Folio Fiscal	
9df75d28-a3f8-4bfb-ad19-8bcc5b3d88e1	
Serie:	Folio: 188
Número de Certificado del Emisor	
00001000000300574680	
Lugar y Fecha de Emisión	
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, 2017-04-05T14:36:28	

HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES
EAAH430625GA5
PRIVADA LUIS PASTEUR 411
CUAHUTEMOC CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31240
Rég. Fiscal: ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

FACTURA
Lugar y Fecha de certificación
México Distrito Federal, 2017-04-05T14:36:42
Proveedor de Certificación de CFDI
AURORIAN S.A. DE C.V.
www.konesh.com.mx
Número Certificado del SAT: 00001000000404624465

Nombre del Cliente
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC del Cliente
MCI651010V22

Dirección del Cliente
CALLE MINA 408
CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO C.P. 31000

CANT./UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00 No Aplica		REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00 No Aplica		ESTIMACION NUMERO 3	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00 No Aplica		SEGUN CONTRATO NUM. 265/2016	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00 No Aplica		ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$ 139,704.42	\$ 139,704.42
1.00 No Aplica		RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00 No Aplica		C.M.I.C DEL 0.2% \$ 279.41	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00 No Aplica		D.I.F. 0.2% \$ 279.41	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00 No Aplica		SUMA \$ 558.82	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00 No Aplica		NETO RECIBIR \$ 161,498.31	\$ 0.00	\$ 0.00

IMPORTE EN LETRAS

CIENTO SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Js4vT9/U84ioGPaoQOx4aCHZ/mFggB33PhTmYfff8LqElyZRYvYk1oZ5KaO6l8qO6jcytJBBaq9eYQk0JX7lhUEZZVMuIRGBzRLSzQtQxjgCua+mug97FOWVULDWlxv5DE0yXPELJzq3yn9BXXcKeV+IOusWEYso3UbNyJCKqdaY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

sMjZi6SRGsFjyZ6W+E9lxxlL68VMVe5OKflzOCb8uDEdAhp1FimPB6hSwSSMX+ScU8B5WUSIQOD8bU8EeQa+3VhGSNidrt1skY+UXVfSoHFwi890k4ktS22Qc6DZi6NKqx8zLmvl/lvGlqxIf4CbKwNuW29VRq3RlxNad7rUuv+BNidHJU01ba8R1SK1uCEZAA/aQnl+TU3x7IL1+JxegHVJh03oKHZM+U+dr3kGf6y55ReQtIlKYN0jZ2+DRbjzwfDU

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|9df75d28-a3f8-4bfb-ad19-8bcc5b3d88e1|2017-04-05T14:36:42|Js4vT9/U84ioGPaoQOx4aCHZ/mFggB33PhTmYfff8LqElyZRYvYk1oZ5KaO6l8qO6jcytJBBaq9eYQk0JX7lhUEZZVMuIRGBzRLSzQtQxjgCua+mug97FOWVULDWlxv5DE0yXPELJzq3yn9BXXcKeV+IOusWEYso3UbNyJCKqdaY=|00001000000404624465|

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Contado



SUB-TOTAL	\$ 139,704.42
Total de Impuestos Traslados	\$ 22,352.71
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
IVA 16.00 %	\$ 22,352.71
TOTAL	\$ 162,057.13

Este documento es una representación impresa de un CFDI



gob.mx


Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal	
RFC Emisor	
RFC Receptor	

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
EAAH430625GA5	HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
9DF75D28-A3F8-4BFB-AD19-8BCC5B3D88E1	2017-04-05T14:36:28	2017-04-05T14:36:42	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$162,057.13	ingreso	Vigente	

Imprimir

HECTOR M. ESTRADA A.

a r q u i t e c t o

CHIHUAHUA, CHIH. 05 DE ABRIL DE 2017

ING. OSCAR REYES LOPEZ
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No. **3** CON FACTURA **188** CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES,
SENTIDO NORTE SUR.

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 16 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017
POR UN SALDO NETO FACTURADO [**\$162,057.13** CON IVA INCLUIDO


ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE
ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE



ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES

RECIBE



ING. OSCAR REYES LOPEZ



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA:	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL	CONTRATO No.	265/2016	CONTRATADOS
OBRA:	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR.	ESTIMACIÓN No.	3	\$ 2,177,556.79 CON IVA
PERÍODO EJEC. 16 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017				
REFERENCIA:	LATITUD	LONGITUD		
	28.635772	-105.981893		
UBICACIÓN:	PERIFERICO LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$	162,057.13 CON IVA
CONTRATISTA:	ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$	104,776.95 CON IVA
RFC	EAAH430625-GA5	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$	266,834.08 CON IVA

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	<u>NORMALES</u>	\$ 139,704.42	
	<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
	<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 139,704.42	

DESCUENTOS

0.2% C.M.I.C.	\$	279.41
0.2% DIF	\$	279.41
SUMA DESCUENTOS	\$	558.82

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$	139,704.42
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	139,704.42
I.V.A.	\$	22,352.71
TOTAL	\$	162,057.13

(CON LETRA)

(CIENTO SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS
13/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	558.82
SALDO NETO A RECIBIR	\$	161,498.31

AUTORIZO

ELABORO

ING. OSCAR REYES LOPEZ
RESIDENTE D.O.P.M

Vo. Bo.

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA URBANA

ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES
CONTRATISTA

REVISO

ING. EDNA LIZE DEL RIO SIGALA
JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH.,

31 DE ENERO DE 2017

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE: \$ 161,498.31
 (CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N.) ✓ COMO PAGO A LA
 ESTIMACIÓN NUM. 3 CONTRATO No. 265/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 2,177,556.79
 DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 79/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
 REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO
 NORTE SUR.

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	139,704.42
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-

SUBTOTAL	\$	139,704.42
IVA	\$	22,352.71
TOTAL	\$	162,057.13

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

C.M.I.C. DEL 0.2%	279.41
D.I.F. DEL 0.2%	279.41
SUMA	558.82 ✓

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO	\$	2,177,556.79
CONVENIO MODIFICATORIO	\$	-
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$	104,776.95
ESTA ESTIMACION	\$	162,057.13
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$	266,834.08
POR EJERCER	\$	1,910,722.71

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO	\$	-
ACUMULADO ANTERIOR	\$	-
ESTA ESTIMACION	\$	-
ACUMULADO ACTUAL	\$	-
POR AMORTIZAR	\$	-

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% D.I.F.	0.2% I.C.I.C.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 180.65		\$ 180.65
ESTA ESTIMACION	\$ 279.41	\$ -	\$ 279.41
ACUMULADO ACTUAL	\$ 460.06	\$ -	\$ 460.06

R E C I B I M O S


 ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES
 EAAH430625-GA5

OBRA: REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR. UBICACIÓN PERIFERICO LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES No. CONTRATO: 265/2016

CONTRATIST ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES ESTIMACIÓN No. 3 PERÍODO: 16 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

NORMALES 139,704.42

EXCEDENTES 0.00

EXTRAS

SUBTOTAL	139,704.42
I.V.A.	22,352.71
TOTAL	162,057.13


 POR EL CONTRATISTA
 ARQ. HECTOR M. ESTRADA ARAGONES

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

 ING. OSCAR REYES LOPEZ

OBRA: REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO
VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS
NOGALES, SENTIDO NORTE SUR.

UBICACIÓN PERIFERICO LOMBARDO
TOLEDANO Y ARROYO LOS
NOGALES

Nº CONTRATO 265/2016

ESTIMACIÓN Nº. 3

PERIODO: 16 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017

ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES

CONTRATISTA:

CONCEPTOS Nº.	DESCRIPCIÓN	PROYECTO UNIDAD	VOLUMENES		VOL. ESTIMADO		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL.		

OBRA NORMAL

E.P-12	EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 3.0 MTS. CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	m3	515.40	51.50	0.00	51.50	\$157.82	8,127.73
E.P-7.	MAMPOSTERIA DE 3 CLASE A BASE DE PIEDRA DE CORTE ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE DE RESISTENCIA F'C=60 KG/CM2	m3	201.16	16.00	0.00	16.00	\$2,770.04	44,320.64
E.P-7	ZAMPEADO A BASE DE MAMPOSTERIA DE 30 CMS. DE ESPESOR, UTILIZANDO MORTERO CEMENTO- ARENA DE RESISTENCIA DE 60 KG/CM2	m2	583.68	105.00	0.00	105.00	\$831.01	87,256.05

\$139,704.42

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ARQ. HECTOR M. ESTRADA ARAGONES

Pag 1 de 1

ING. OSCAR REYES LOPEZ

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO 265/2016		REFERENCIA: LATITUD 28.635772, LONGITUD -105.981893	
OBRA :	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR.		
	CONTRATISTA:	ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES	
No DE ESTIMACION: 3	PERIODO : 16 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017	CROQUIS Y FOTO	VOLUMEN A PAGAR
			51.50 M3
CONCEPTO			
		OPERACIONES ARITMETICAS	
	Largo	Ancho	Profundidad
EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 3.0 MTS. CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	8.00	2.50	1.00
Excavacion para ciclopeo	20		
Excavacion para zampeado aguas abajo	10.50	10.00	0.30
31.5			

 PRESIDENTE
ING. OSCAR REYES LOPEZ



CONTRATISTA
ARQ. HECTOR M. ESTRADA ARAGONES

GENERADOR DE ESTIMACION

ARQ. HECTOR M. ESTRADA ARAGONES

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 3 / 3

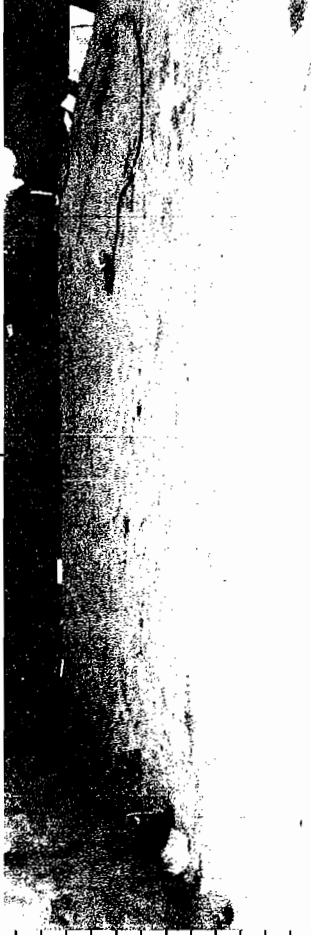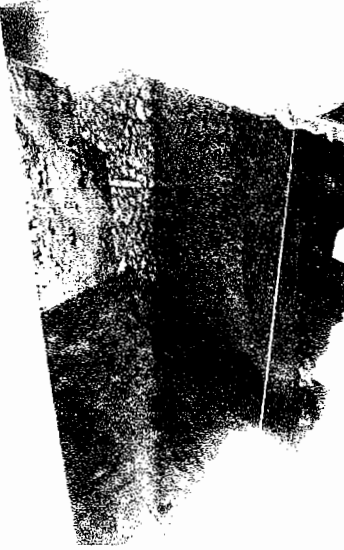CONTRATO 266/2016		REFERENCIA: LATITUD 28.635772, LONGITUD -105.981893																	
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR.		CONTRATISTA: ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES																	
No DE ESTIMACION: 3 PERIODO : 16 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017		CROQUIS Y FOTO																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONCEPTO</th> <th colspan="2">OPERACIONES ARITMETICAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">ZAMPEADO A BASE DE MAMPOSTERIA DE 30 CMS. DE ESPESOR, UTILIZANDO MORTERO CEMENTO-ARENA DE RESISTENCIA DE 60 KG/ CM2</td> <td>Largo</td> <td>Ancho</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Zampeado aguas abajo</td> <td>10.50</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>105</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO		OPERACIONES ARITMETICAS		ZAMPEADO A BASE DE MAMPOSTERIA DE 30 CMS. DE ESPESOR, UTILIZANDO MORTERO CEMENTO-ARENA DE RESISTENCIA DE 60 KG/ CM2		Largo	Ancho	Zampeado aguas abajo		10.50	10.00				105	VOLUMEN A PAGAR 105.00 M2	
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMETICAS																	
ZAMPEADO A BASE DE MAMPOSTERIA DE 30 CMS. DE ESPESOR, UTILIZANDO MORTERO CEMENTO-ARENA DE RESISTENCIA DE 60 KG/ CM2		Largo	Ancho																
Zampeado aguas abajo		10.50	10.00																
			105																
																			


 RESIDENTE
 ING. OSCAR REYES LOPEZ


 CONTRATISTA
 ARQ. HECTOR M. ESTRADA ARAGONES
