

HECTOR M. ESTRADA A.

a r q u i t e c t o

CHIHUAHUA, CHIH. 07 DE JUNIO DE 2017

ING. OSCAR REYES LOPEZ
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No. 4 CON FACTURA 206 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES,
SENTIDO NORTE SUR.

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 01 DE FEBRERO AL 23 DE FEBRERO DE 2017
POR UN SALDO NETO FACTURADO [\$724,911.98 CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA
LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE



ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONÉS

RECIBE



ING. OSCAR REYES LOPEZ

Folio Fiscal

24b0599a-9993-436e-b32c-c43da6d1f570

Serie:

Folio: 206

Número de Certificado del Emisor

00001000000300574680

Lugar y Fecha de Emisión

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, 2017-06-07T14:58:25

HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES

EAAH430625GA5

PRIVADA LUIS PASTEUR 411

CUAHUTEMOC CHIHUAHUA CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31240

Reg. Fiscal: ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

FACTURA**Lugar y Fecha de certificación**

México Distrito Federal, 2017-06-07T14:58:28

Proveedor de Certificación de CFDI

AURORIAN S.A. DE C.V.

www.konesh.com.mx

Número Certificado del SAT: 00001000000404624465

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Dirección del Cliente

CALLE MINA 408

CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA

CHIHUAHUA MEXICO C.P. 31000

RFC del Cliente

MCI651010V22

CANT/UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00 No Aplica		REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR.	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00 No Aplica		ESTIMACION NUMERO 4	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00 No Aplica		SEGÚN CONTRATO NUM. 265/2016	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00 No Aplica		ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$ 624,924.12	\$ 624,924.12
1.00 No Aplica		RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00 No Aplica		C.M.I.C. DEL 0.2% \$ 1,249.85	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00 No Aplica		D.I.F. 0.2% \$ 1,249.85	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00 No Aplica		SUMA \$ 2,499.70	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00 No Aplica		NETO A RECIBIR \$ 722,412.28	\$ 0.00	\$ 0.00

IMPORTE EN LETRAS

SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 98/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISORsGK1IUUKH/w87nZPK8pobQ3o7umeTF8tbgHjs9OxbzQES2rHkS+V4ocCfokwnLdw03M1VhrP9JkOx5rffUITxiO0DvGWYqFikKYDkXQnTaw22
3g2DJVhqnL01+hKJCpvnNFDVKpqnqYV+6MS/2xWSHm5tZ3kzVTD0h4pEk+SRvk=**SELLO DIGITAL DEL SAT**cW9RYCcSQ33L/A+S62NSAFhZRAwez16MMcXRLWxXDAstLxQ99FCWZoSzEPd2R9WXITvhpJCoRIYB4icyKivMrNa5jnhexOM2N4A4Tol+NAx9
qUA1aBh+v7QPLZgCxBmnLcUfS0YCdYYEIPeOnq081YefAT/15nOVGky9Z+u8IGjZE9pxDyTB1AZjaQunNIQGB7upSs+FUmkStNxtoub7snTmeCEP'oe8sqSMBjslnIYxFnTMOxVuErIrTuyqG0zh**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**||1.0|24b0599a-9993-436e-b32c-c43da6d1f570|2017-06-07T14:58:28|sGK1IUUKH/w87nZPK8pobQ3o7umeTF8tbgHjs9OxbzQES2rHkS+V4ocCfokwnLdw03M1VhrP9JkOx5rffUITxiO
0DvGWYqFikKYDkXQnTaw223g2DJVhqnL01+hKJCpvnNFDVKpqnqYV+6MS/2xWSHm5tZ3kzVTD0h4pEk+SRvk=|00001000000404624465||Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: CONTADO**SUB-TOTAL**

\$ 624,924.12

Total de impuestos
Trasladados

\$ 99,987.86

Total de impuestos
Retenidos

\$ 0.00

IVA 16.00 %

\$ 99,987.86

TOTAL

\$ 724,911.98

Este documento es una representación impresa de un CFDI



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal	
RFC Emisor	
RFC Receptor	

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
EAAH430625GA5	HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
24B0599A-9993-436E-B32C-C43DA6D1F570	2017-06-07T14:58:25	2017-06-07T14:58:28	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$724,911.98	ingreso	Vigente	

Imprimir



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA:	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL	CONTRATO No.	265/2016	CONTRATADOS
OBRA:	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR.	ESTIMACIÓN No.	4	\$ 2,177,556.79 CON IVA
PERÍODO EJEC. 01 DE FEBRERO AL 23 DE FEBRERO DE 2017				
REFERENCIA:	LATITUD	LONGITUD		
	28.635772	-105.981893		
UBICACIÓN:	PERIFERICO LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES		IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 724,911.98 CON IVA
CONTRATISTA:	ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES		ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 266,834.08 CON IVA
RFC	EAAH430625-GA5		IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 991,746.06 CON IVA

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	<u>NORMALES</u>	\$ 341,090.38	
	<u>EXCEDENTES</u>	\$ 252,651.49	
	<u>EXTRAS</u>	\$ 31,182.25	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 624,924.12	

DESCUENTOS		
0.2% C.M.I.C.	\$	1,249.85
0.2% DIF	\$	1,249.85
SUMA DESCUENTOS	\$	2,499.70
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	624,924.12
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	624,924.12
I.V.A.	\$	99,987.86
TOTAL	\$	724,911.98
(CON LETRA)		
(SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 98/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	2,499.70
SALDO NETO A RECIBIR	\$	722,412.28

AUTORIZO	ELABORO
ING. OSCAR REYES LOPEZ	ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA	ING. EDNALIDETTE DEL RIO SIGALA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.
Vo. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

CHIHUAHUA, CHIH.,

24 DE FEBRERO DE 2017

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE: \$ 722,412.28
(SETECIENTOS VEINTI Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 28/100M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 4 CONTRATO No. 265/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 2,177,556.79
DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 79/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO
NORTE SUR.

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 624,924.12

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 624,924.12

IVA \$ 99,987.86

TOTAL \$ 724,911.98

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

C.M.I.C. DEL 0.2% 1,249.85

D.I.F. DEL 0.2% 1,249.85

SUMA 2,499.70

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 2,177,556.79
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 266,834.08
ESTA ESTIMACION	\$ 724,911.98
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 991,746.06
POR EJERCER	\$ 1,185,810.73

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% D.I.F.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 460.06	\$ 460.06
ESTA ESTIMACION	\$ 1,249.85	\$ 1,249.85
ACUMULADO ACTUAL	\$ 1,709.91	\$ 1,709.91

R E C I B I M O S

ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES
EAAH430625-GA5

OBRA: REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES. SENTIDO NORTE SUR.

UBICACIÓN

No. CONTRATO: 265/2016

4

ESTIMACIÓN No.

PERÍODO: 01 DE FEBRERO AL 23 DE FEBRERO DE 2017

CONTRATIST ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS	
No.	IMPORTE

NORMALES

341,090.38

EXCEDENTES

252,651.49

EXTRAS

31,182.25

SUBTOTAL	624,924.12
I.V.A.	99,987.86
TOTAL	724,911.98

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. HECTOR M. ESTRADA ARAGONES

ING. OSCAR REYES LOPEZ

OBRA: REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR.

UBICACIÓN PERIFERICO LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES No CONTRATO 285/2016

CONTRATISTA:

ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 23 DE FEBRERO DE 2017

ESTIMACIÓN No. 4

CONCEPTOS No.	DESCRIPCIÓN	PROYECTO UNIDAD	VOLUMENES		ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			VOLUMEN	ACUM. TOTAL				

OBRA NORMAL

E.P-7.	MAMPOSTERIA DE 3 CLASE A BASE DE PIEDRA DE CORTE ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE DE RESISTENCIA F'C=80 KG/CM2	m3	201.16	89.94	16.00	73.94	\$2,770.04	204,816.76
E.P-10.	CORONA EN PUENTE CON SECCION DE 1.2 MTS. DE ANCHO X 0.4 MTS. DE ALTO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 1/2" COMO ESPECIFICA PROYECTO INCLUYE CIMBRA, CANDADOS (6 PZAS), ANDAMIOS Y MEMBRANA DE CURADO.	ml	6.00	6.00	0.00	6.00	\$3,688.27	22,129.62

RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA

OBRA EXCEDENTE

E.P-10.	CORONA EN PUENTE CON SECCION DE 1.2 MTS. DE ANCHO X 0.4 MTS. DE ALTO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 1/2" COMO ESPECIFICA PROYECTO INCLUYE CIMBRA, CANDADOS (6 PZAS), ANDAMIOS Y MEMBRANA DE CURADO.	m3	580.00	580.00	0.00	580.00	\$196.80	114,144.00
								\$252,651.49
	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	ml	6.00	6.20	6.00	0.20	\$3,688.27	737.65

OBRA EXTRA

EXT-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO CICLOPEO DE Fc= 150 KG/CM2 CON PIEDRA BOLA, PROPORCION 50/50 EN MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL DE CIMENTACION DE ZAPATA DE MAMPOSTERIA.	m3	580.00	1,860.05	580.00	1280.05	\$196.80	251,913.84
								\$31,182.25
		M3	0.00	21.25	0.00	21.25	1,467.40	31,182.25

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. HECTOR M. ESTRADA ARAGONES

Pag 1 de 1

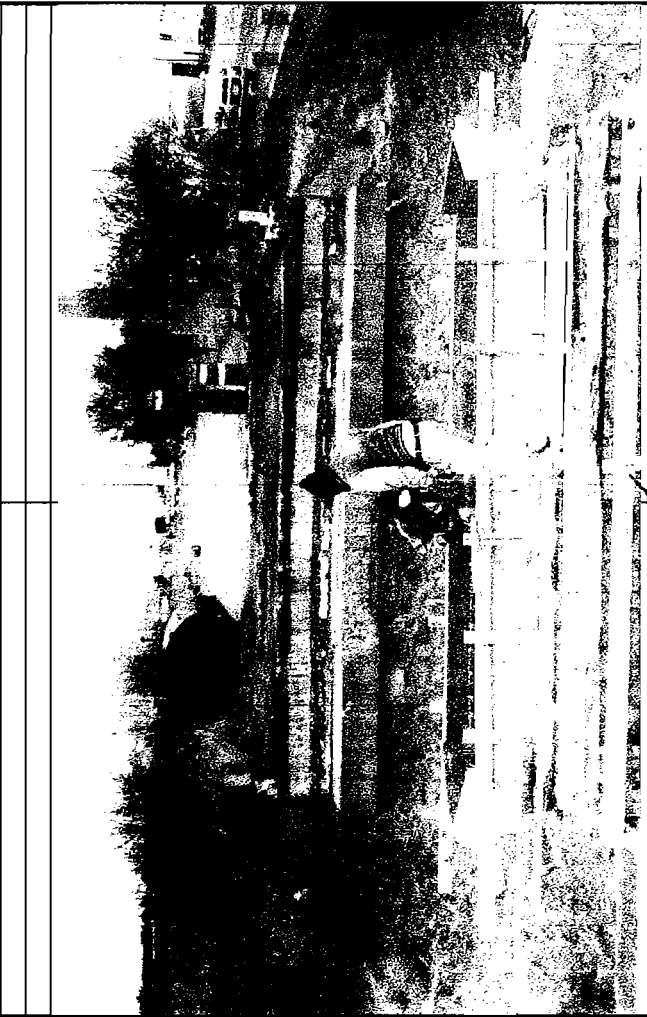
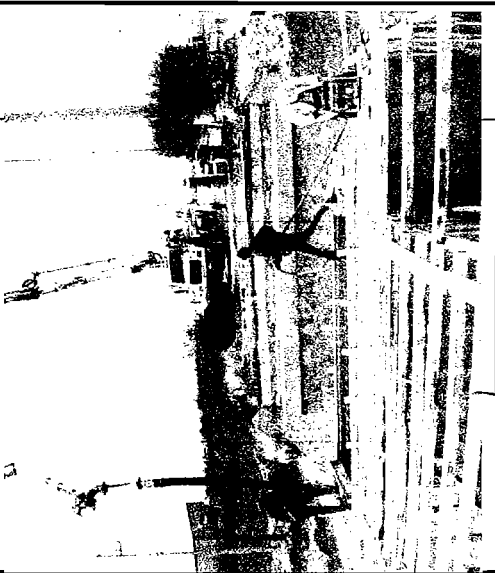
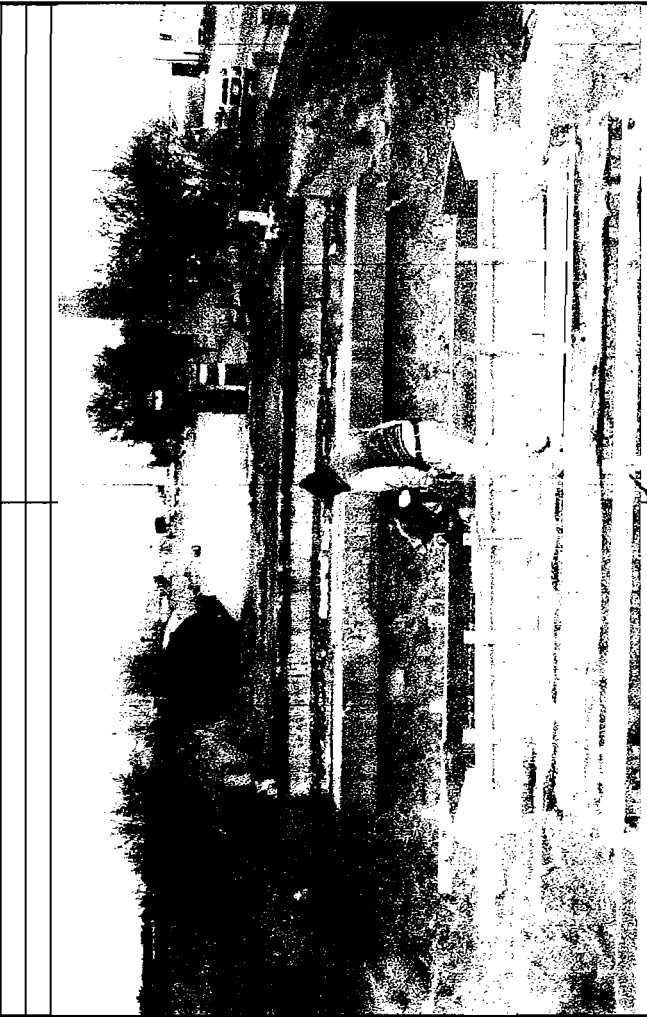
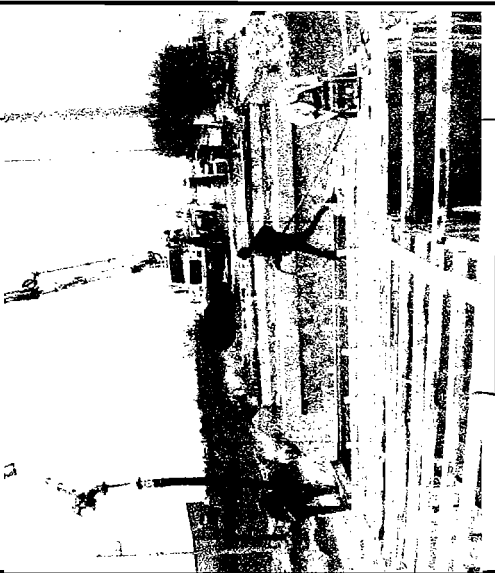
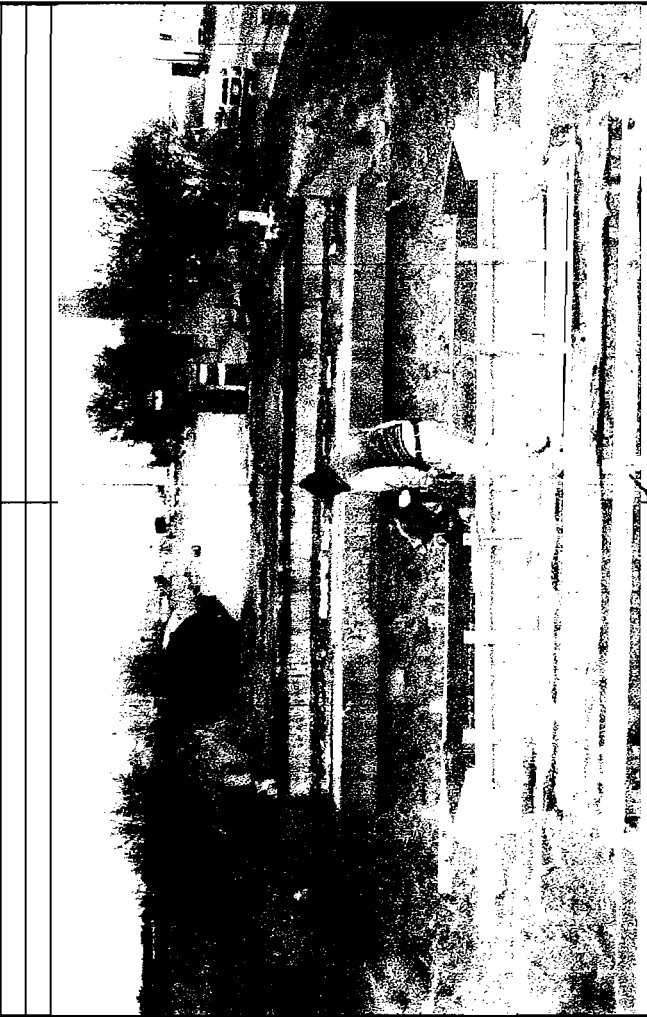
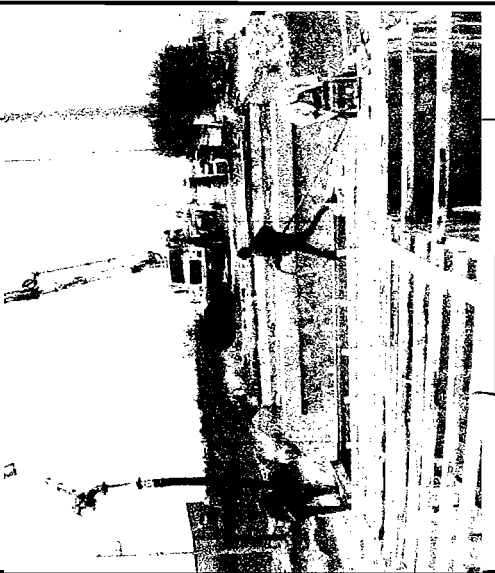
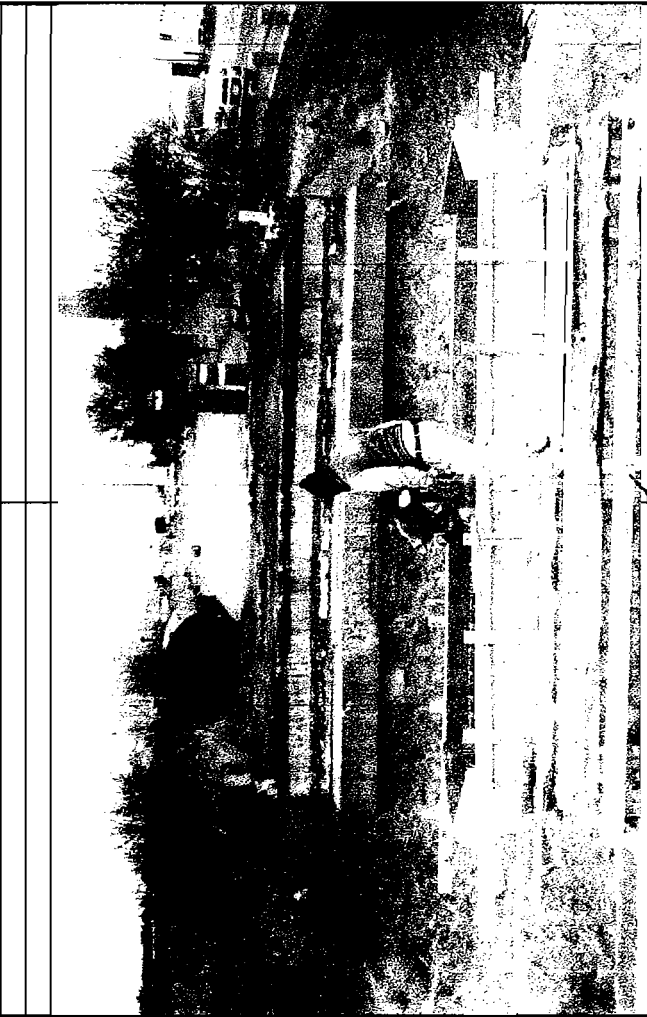
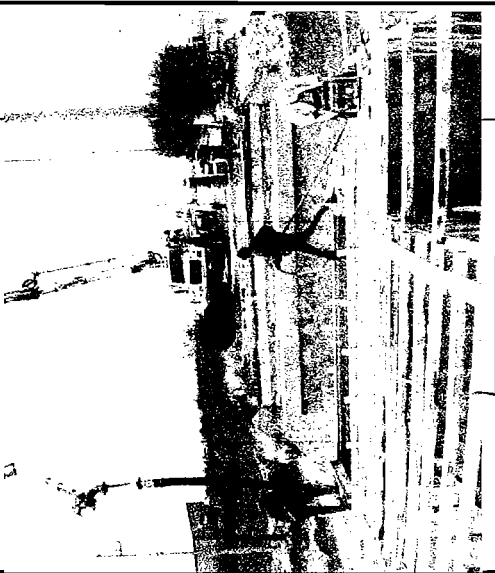
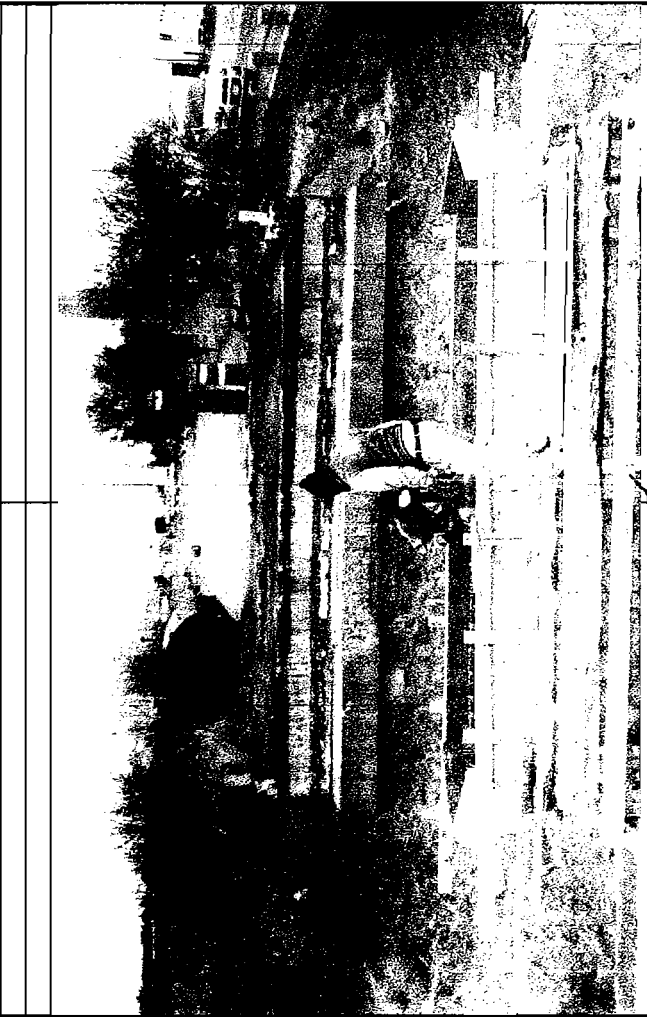
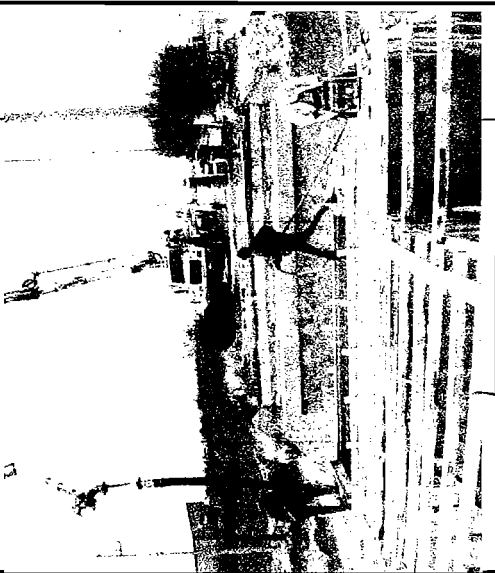
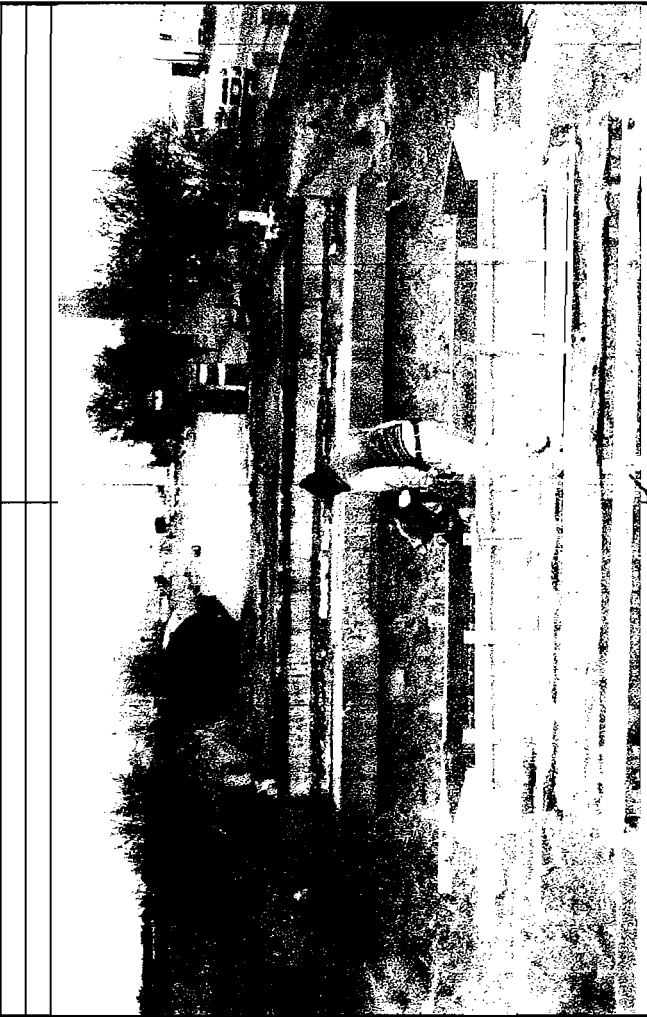
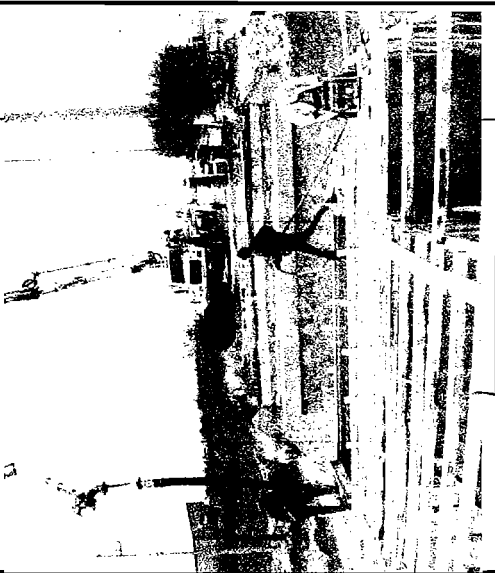
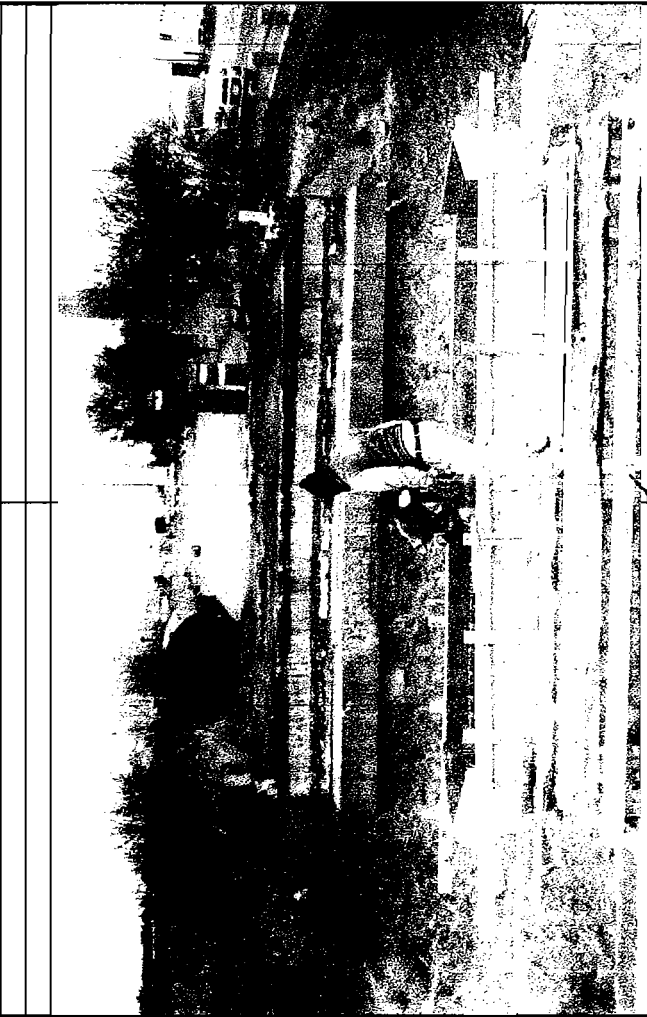
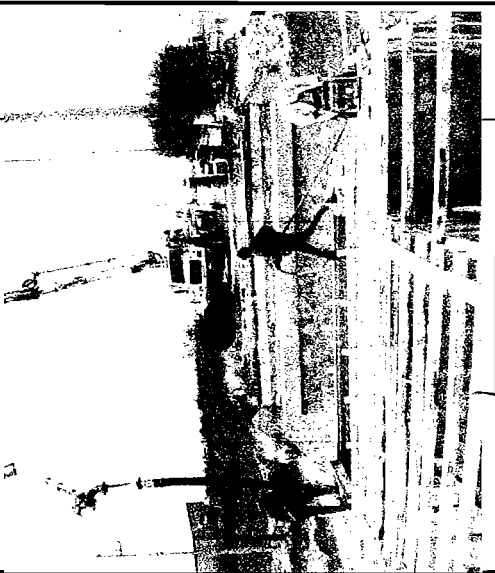
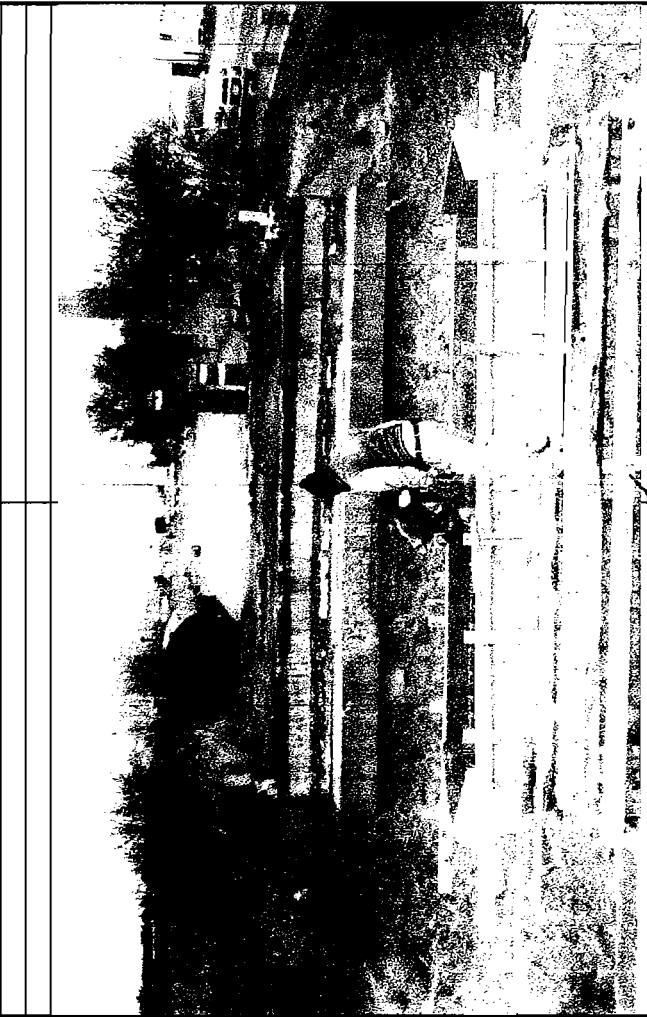
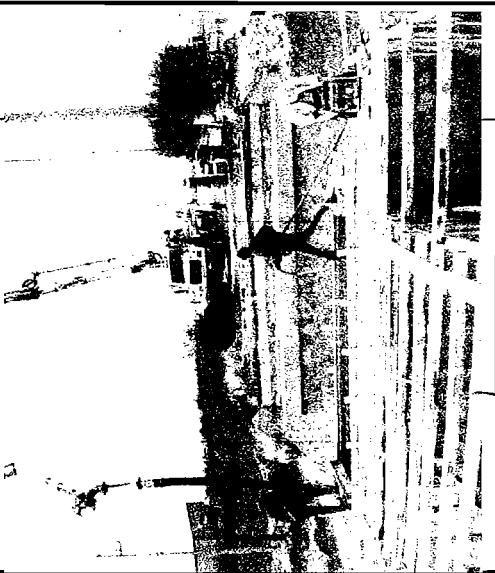
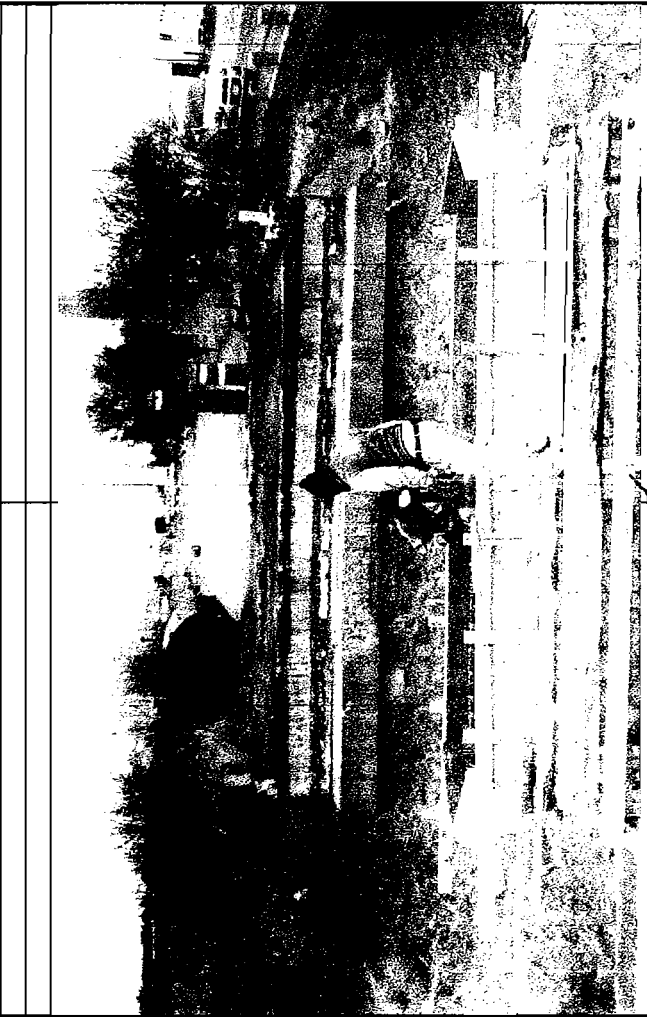
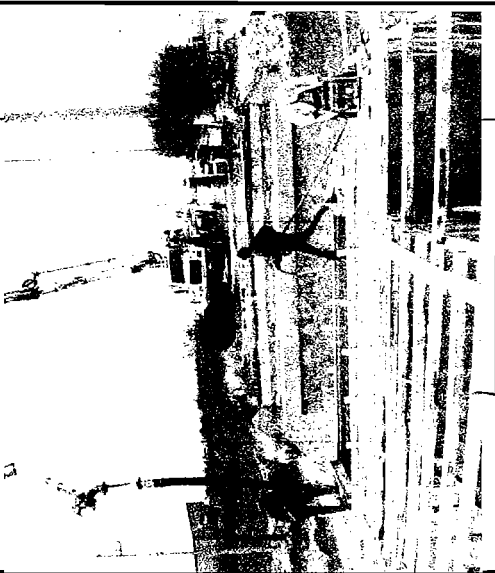
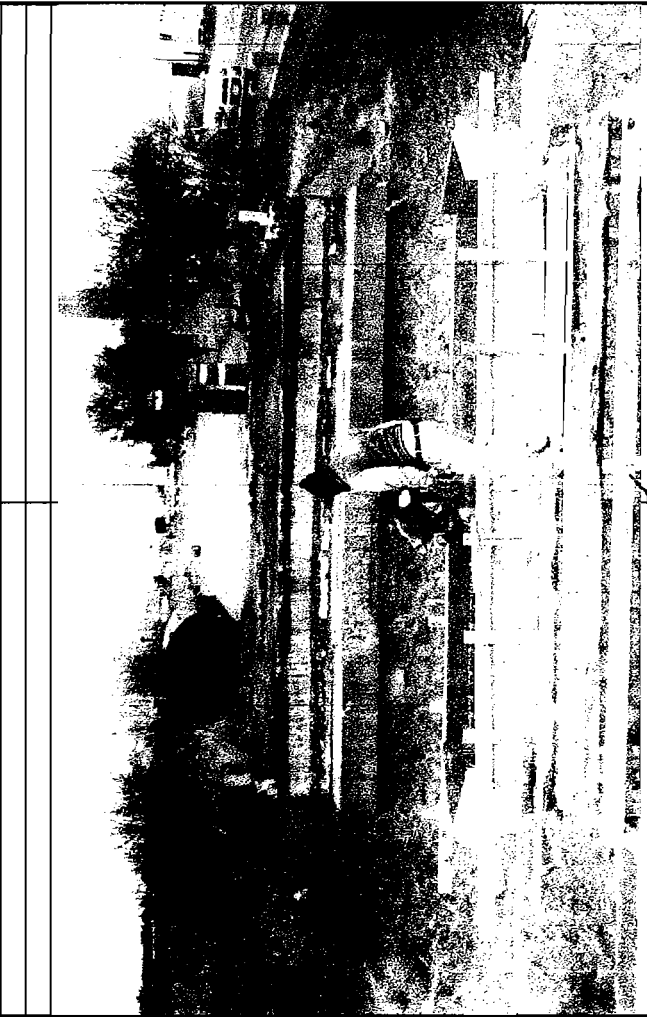
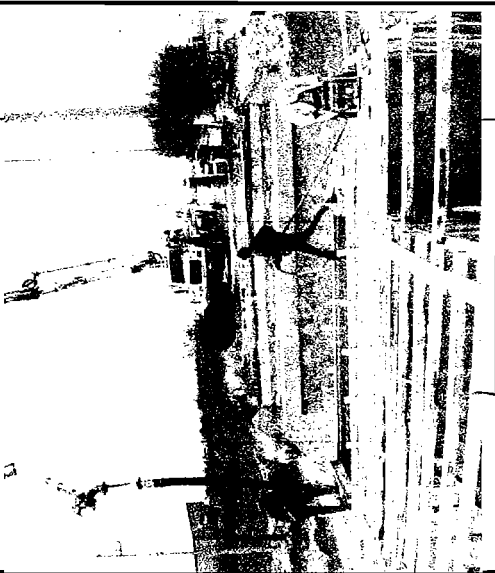
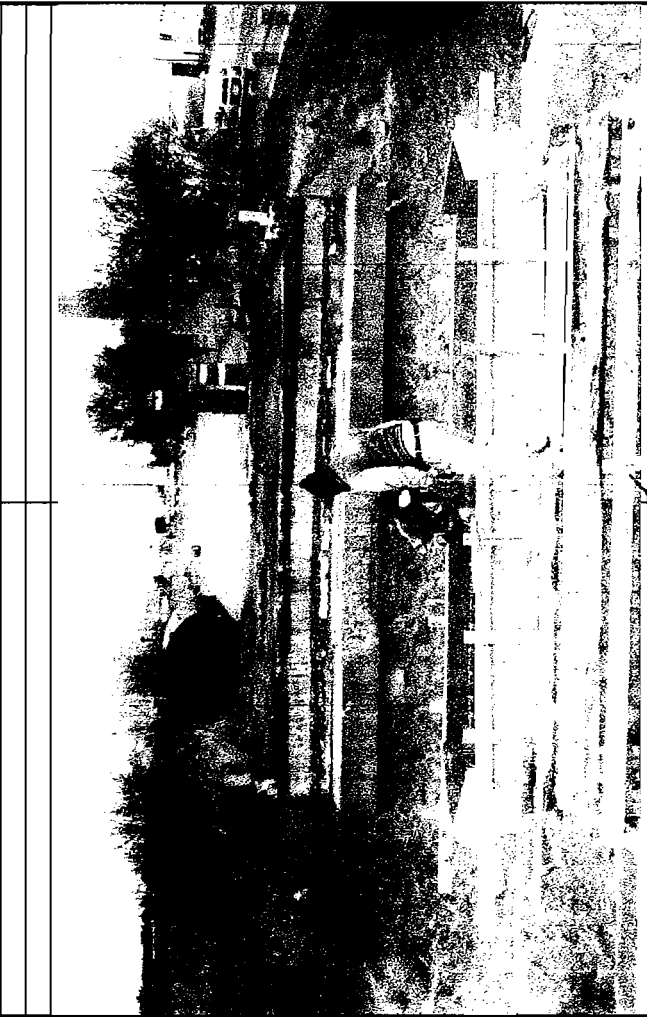
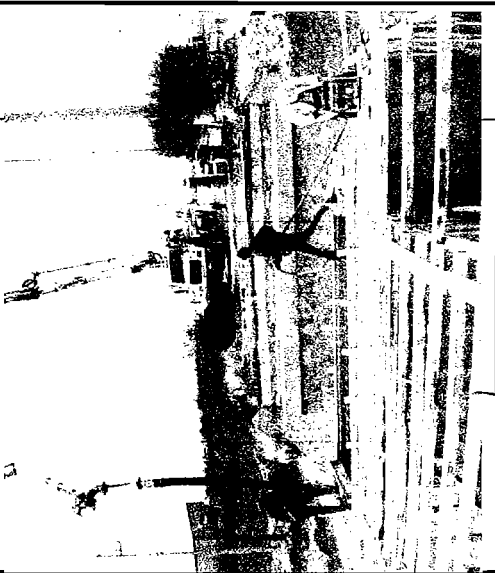
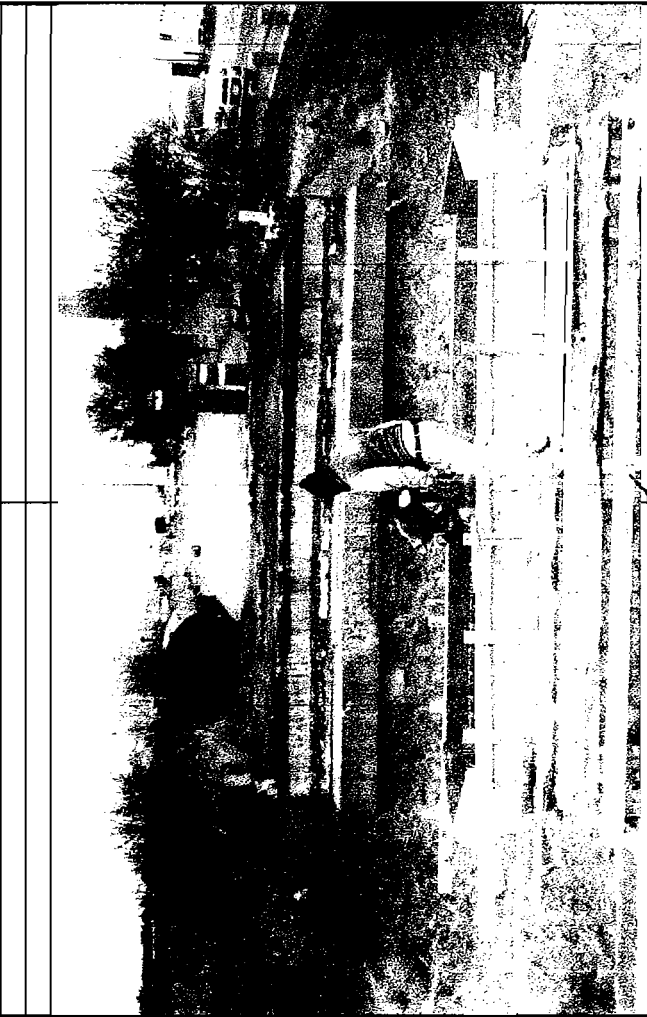
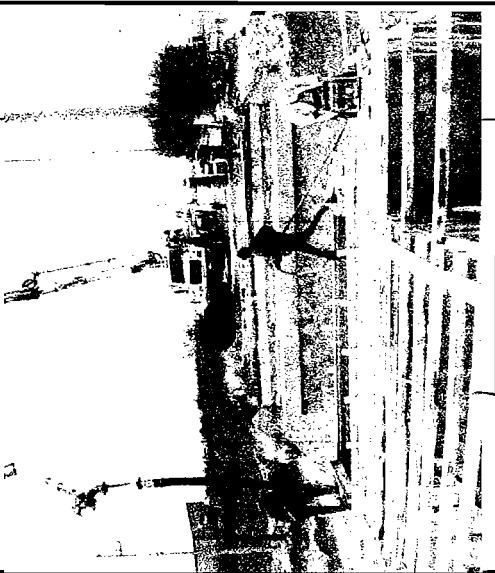
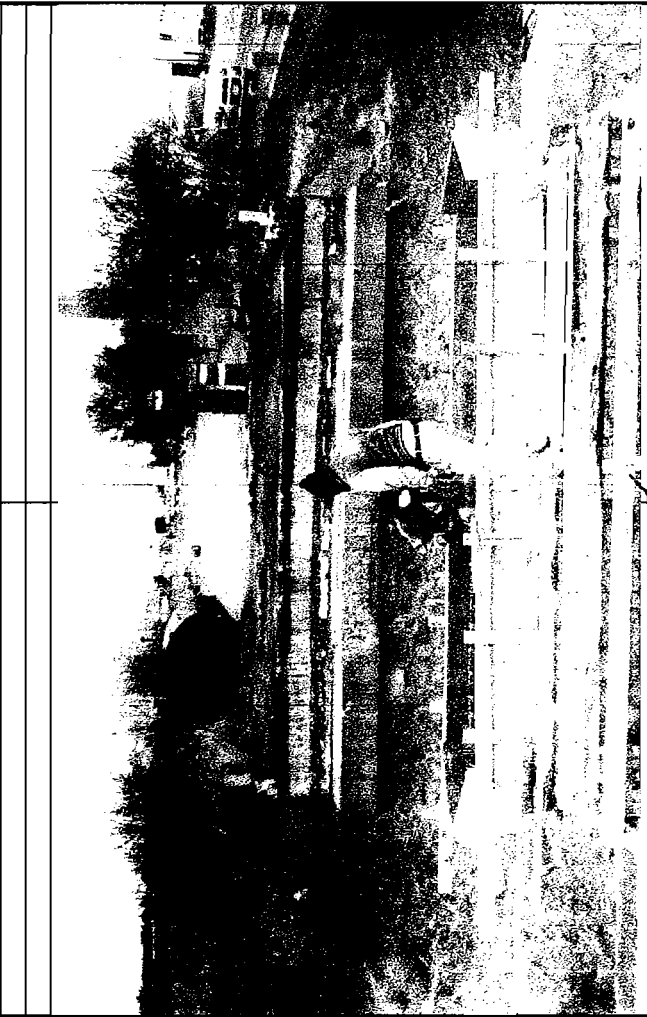
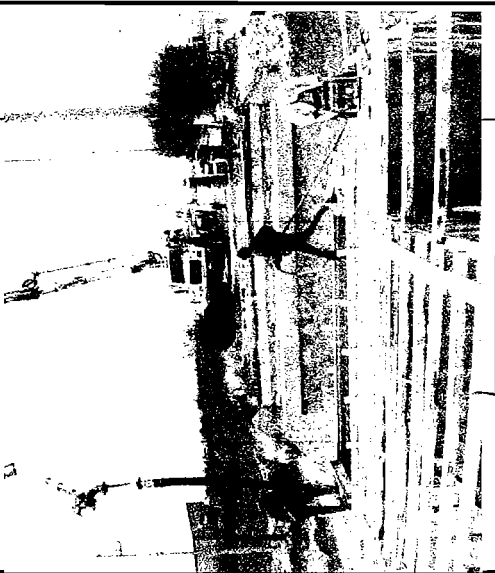
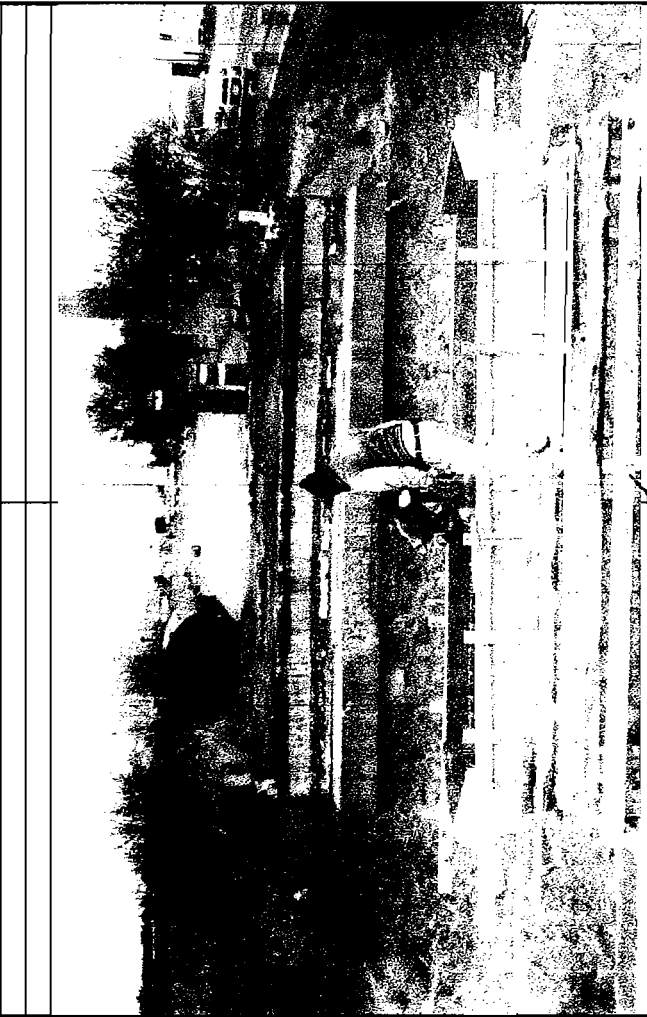
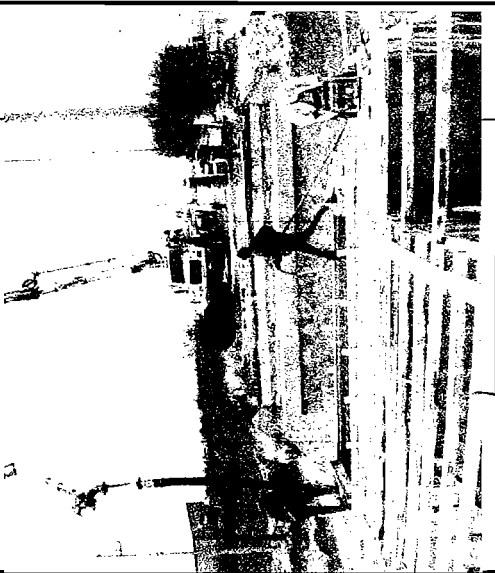
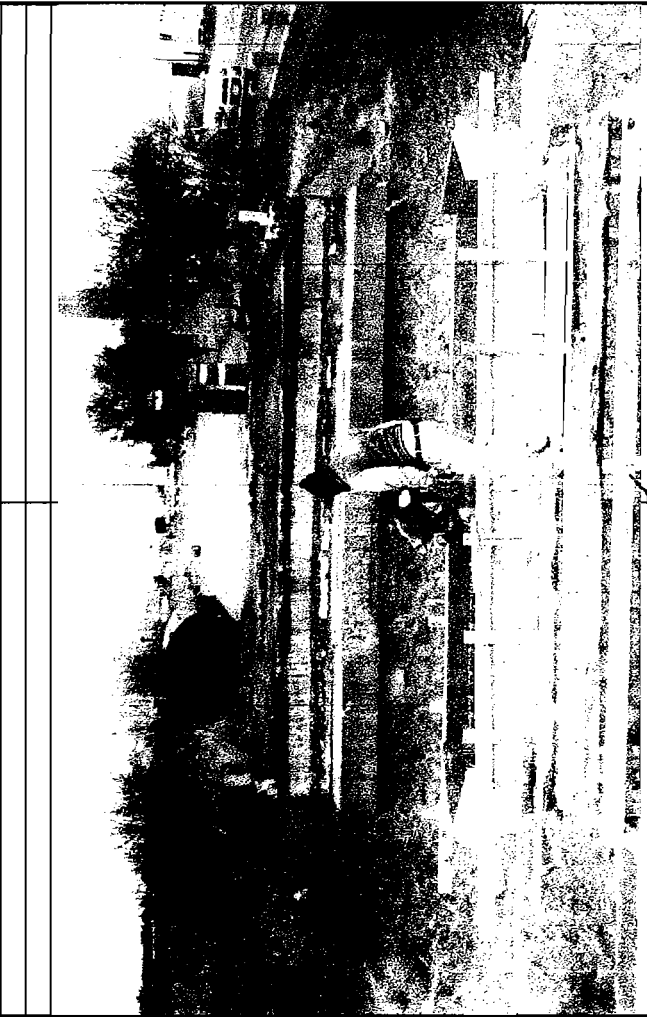
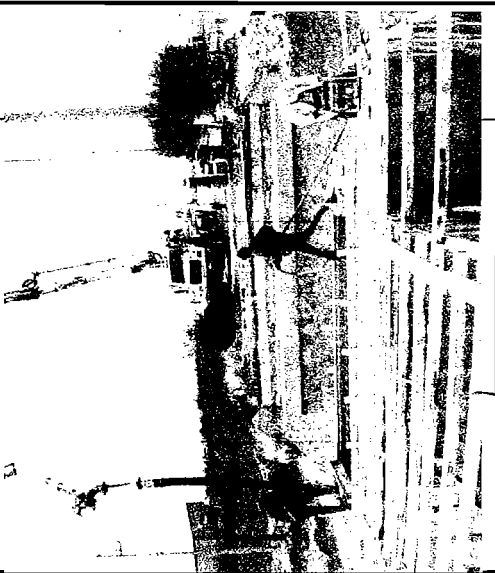
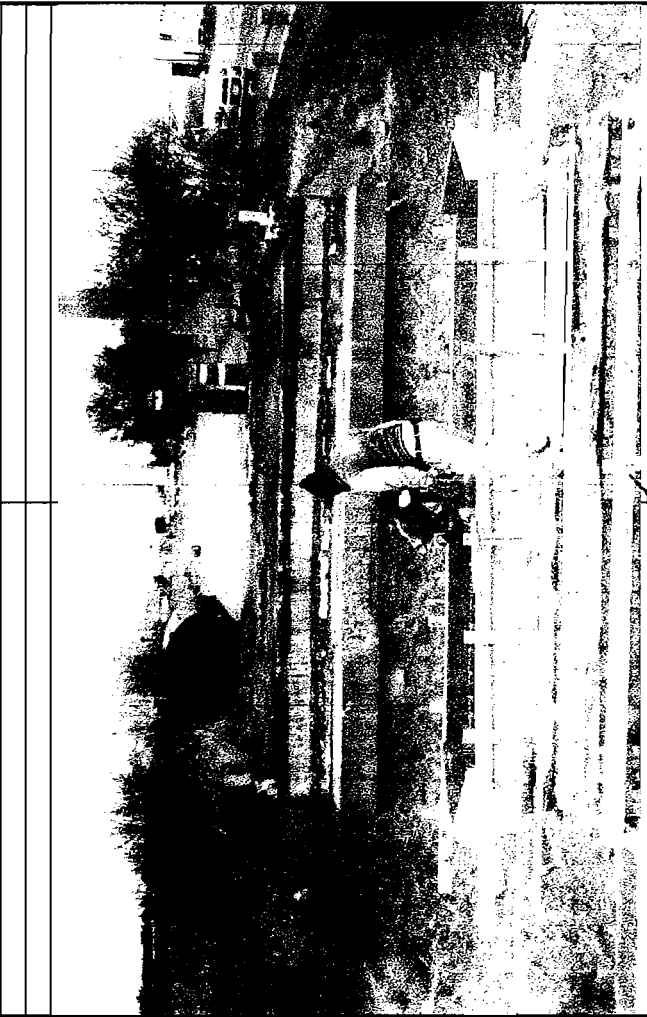
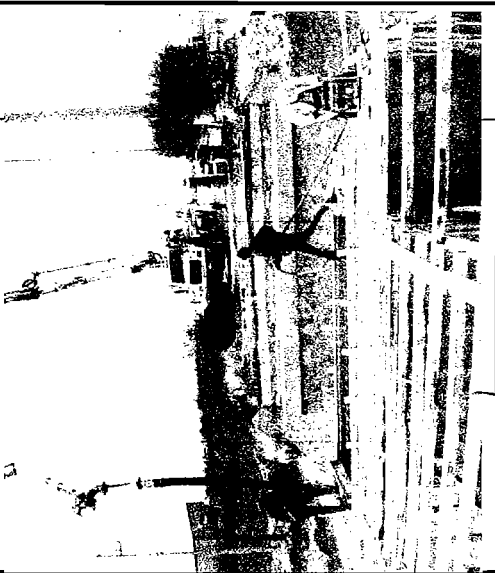
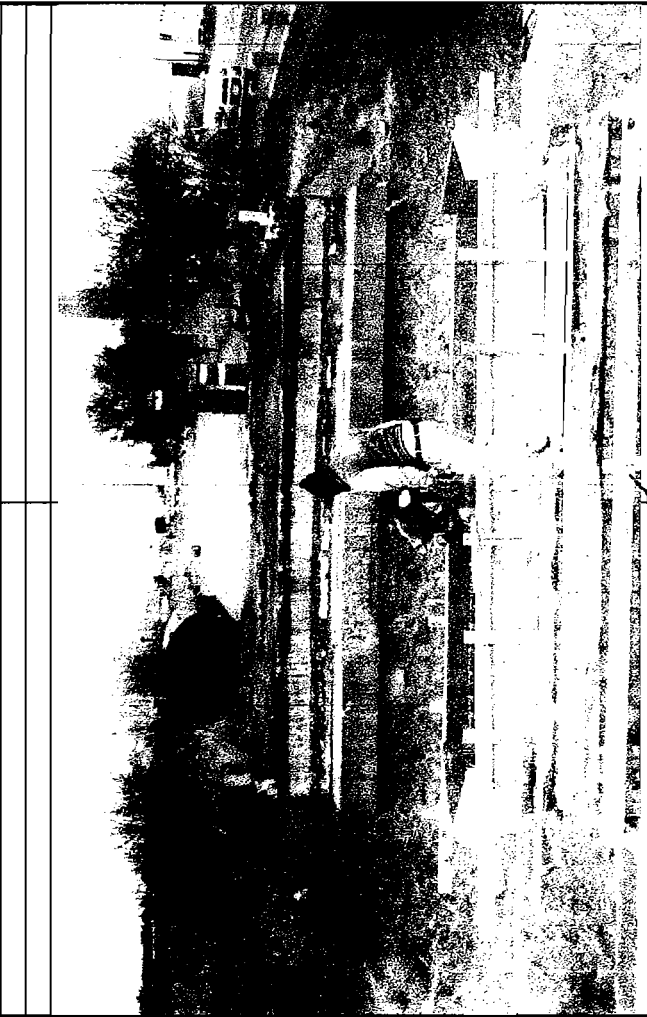
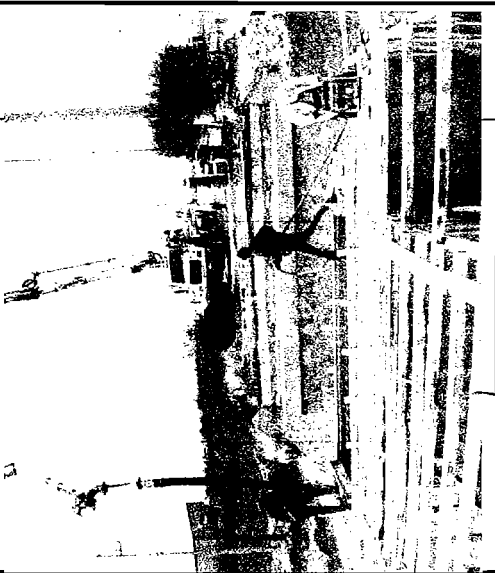
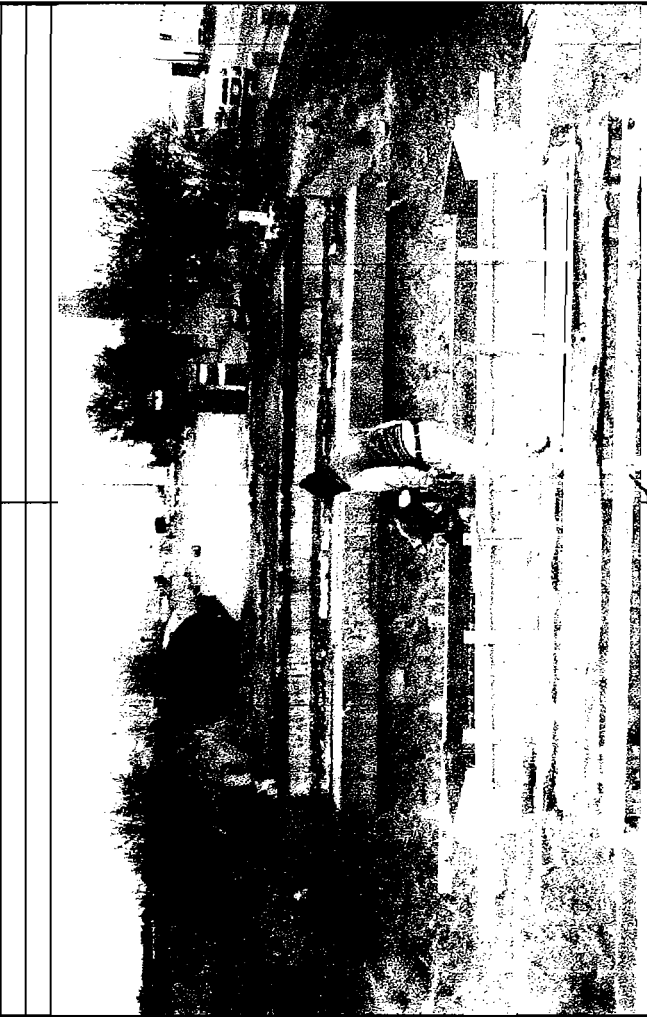
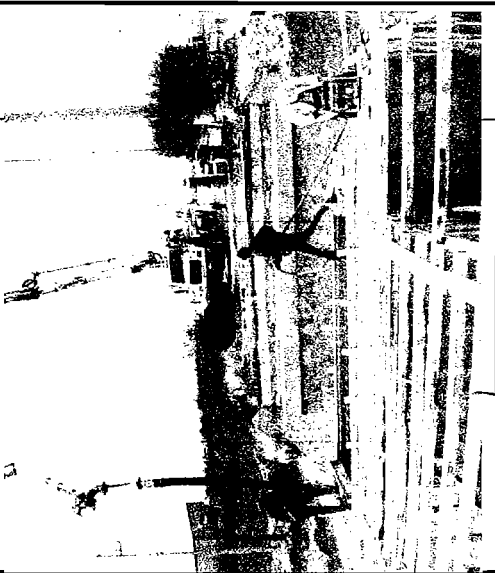
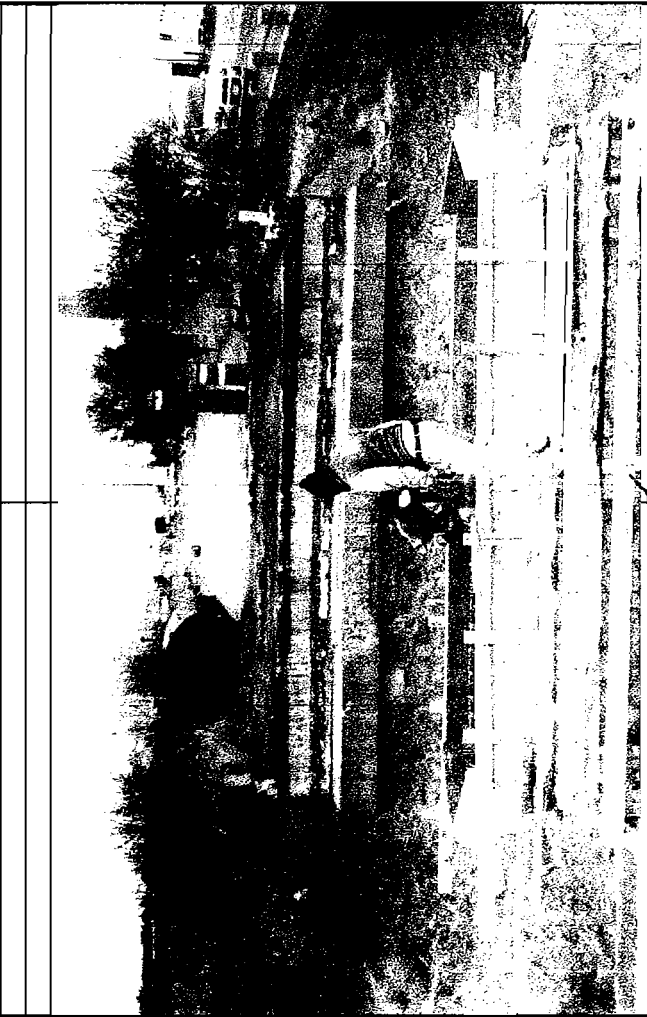
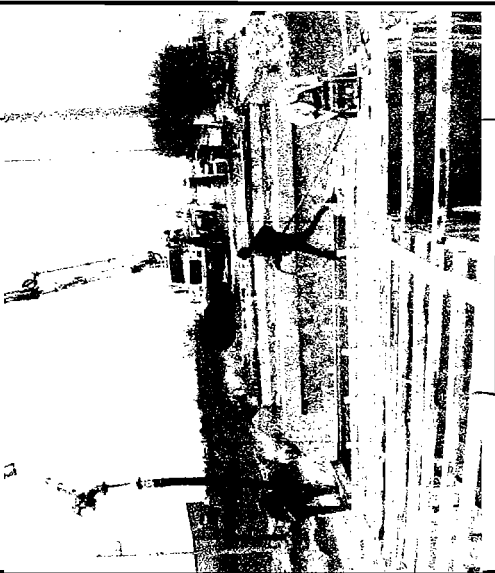
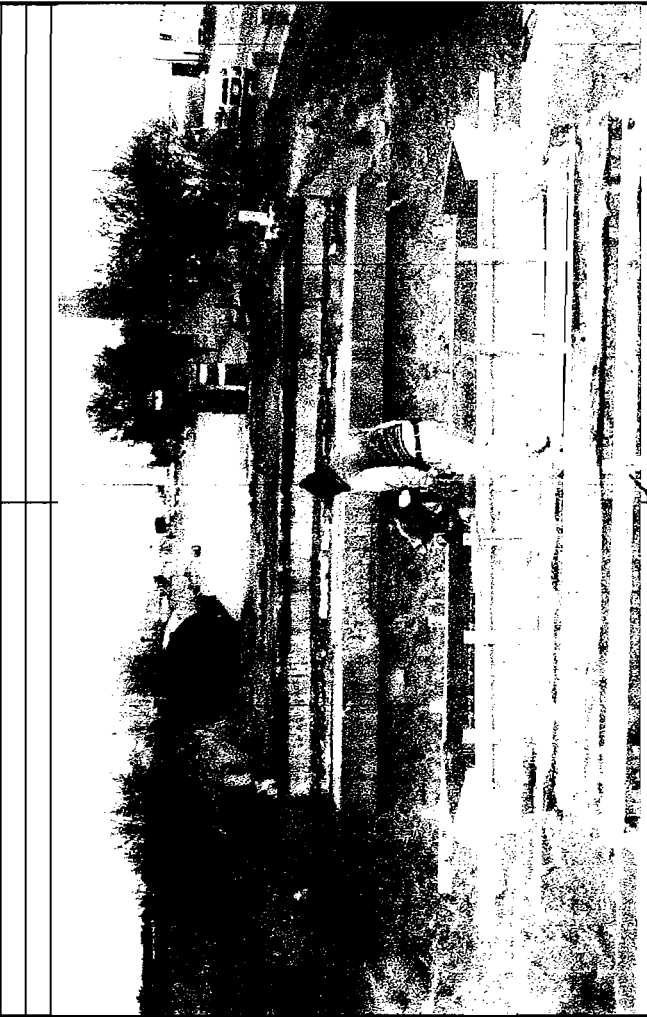
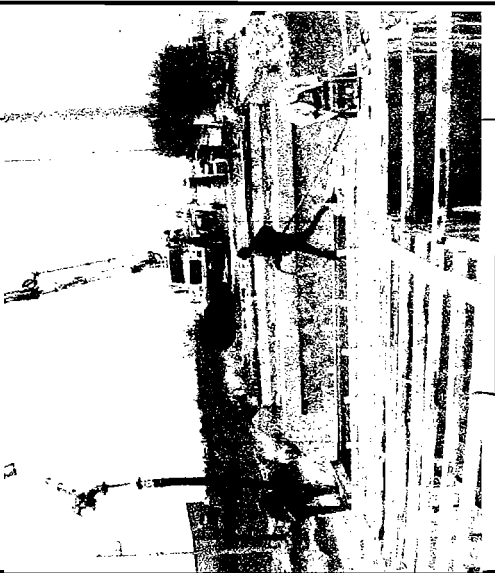
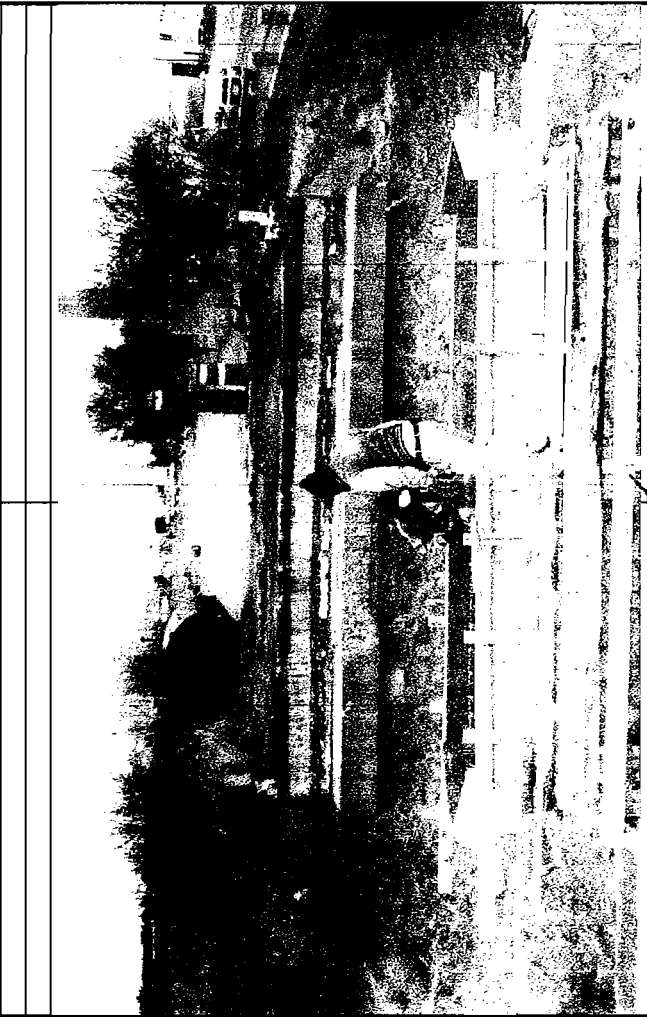
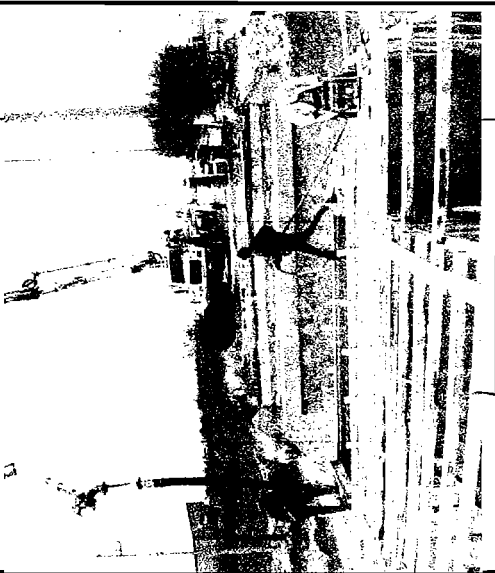
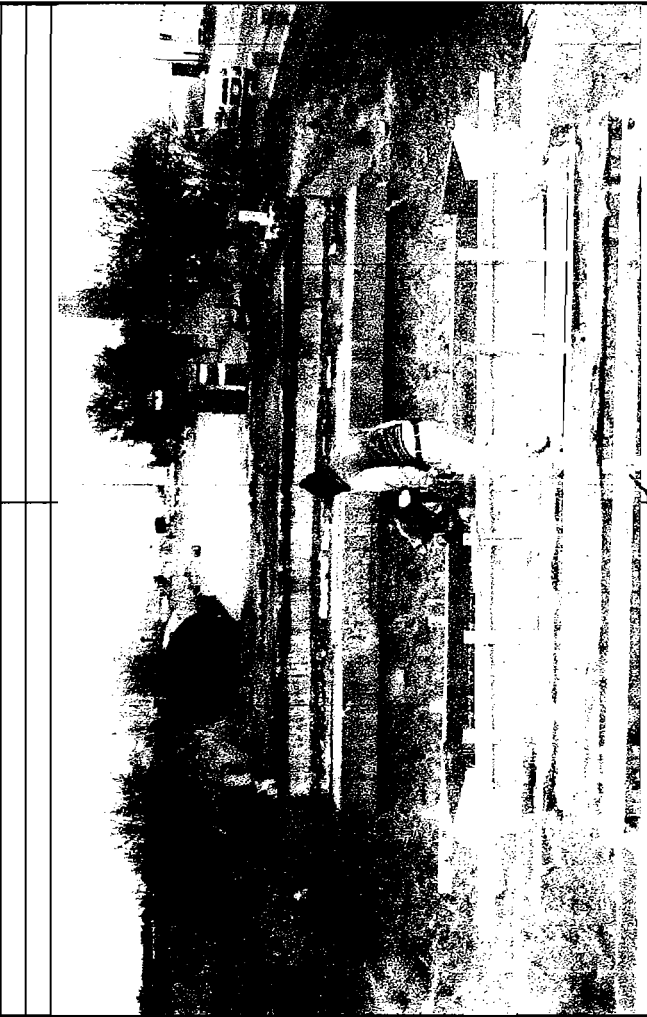
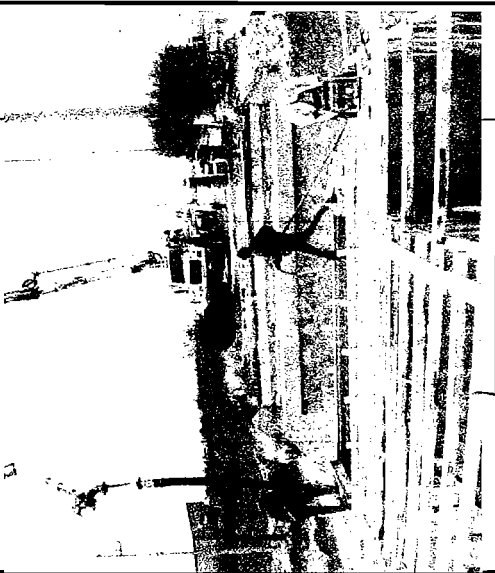
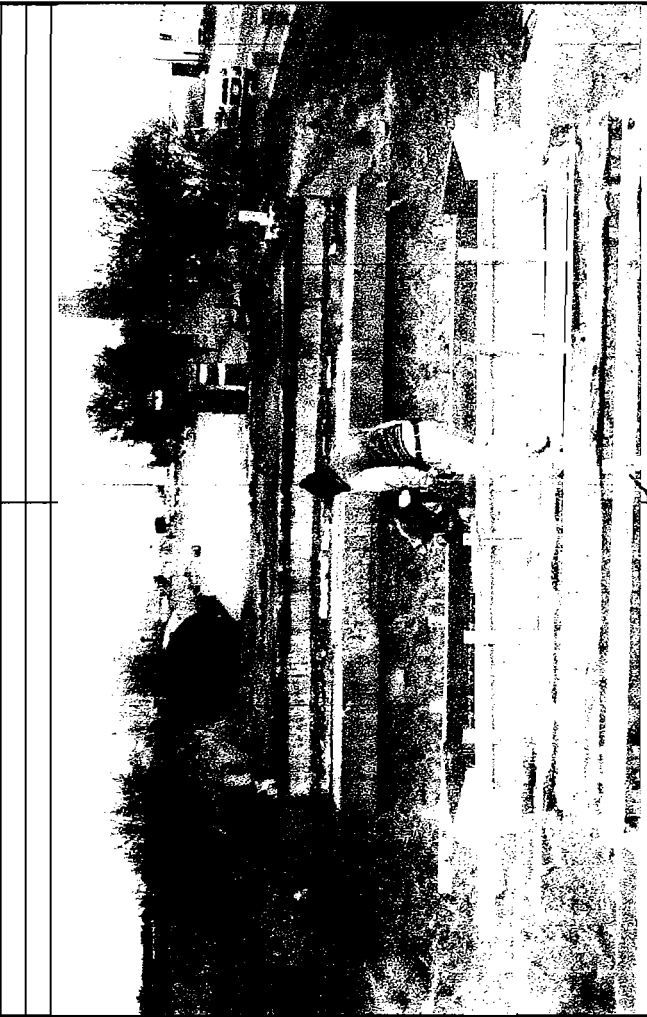
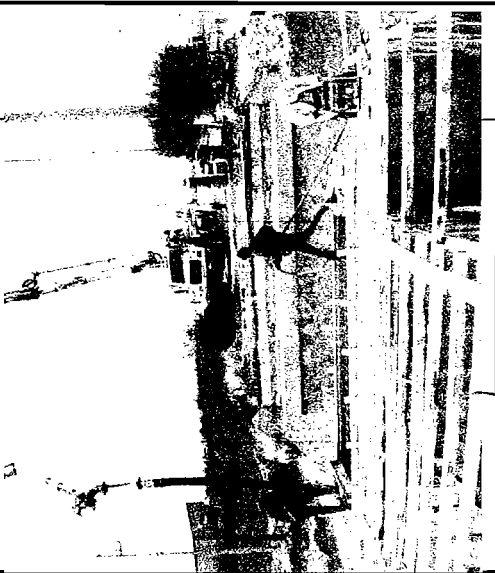
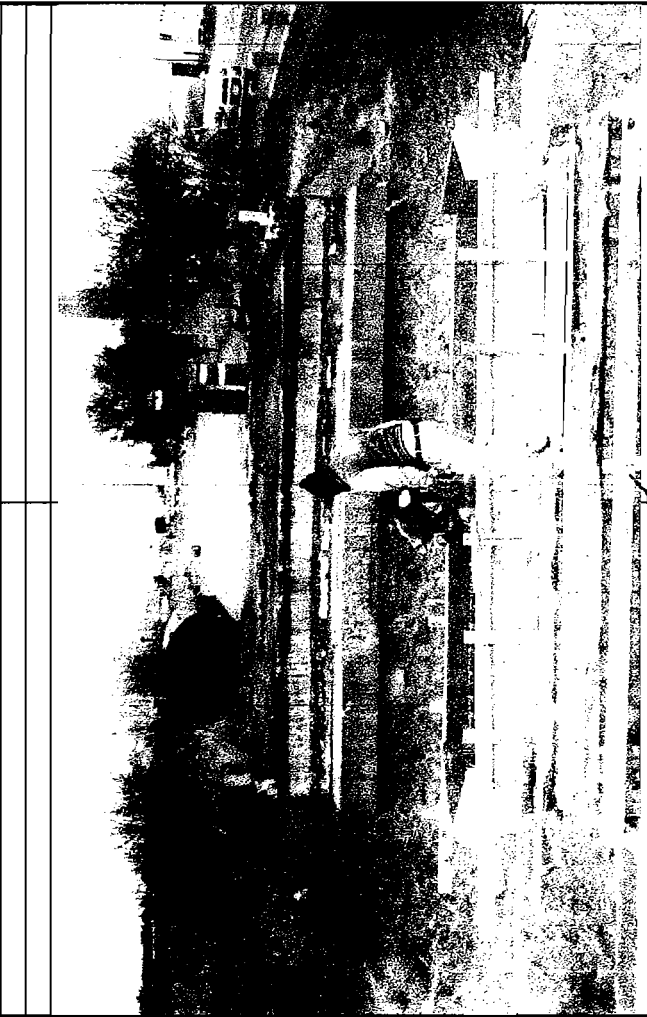
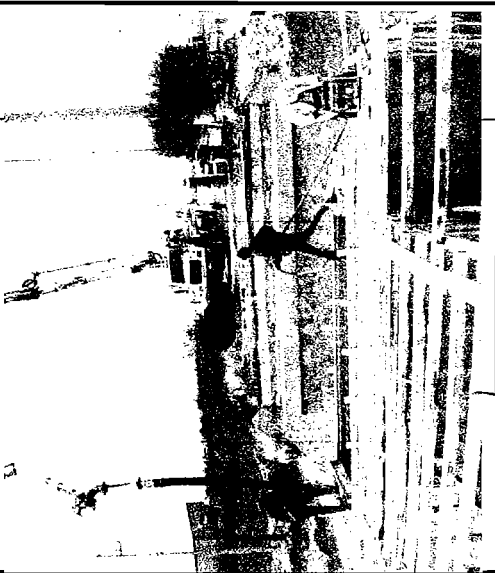
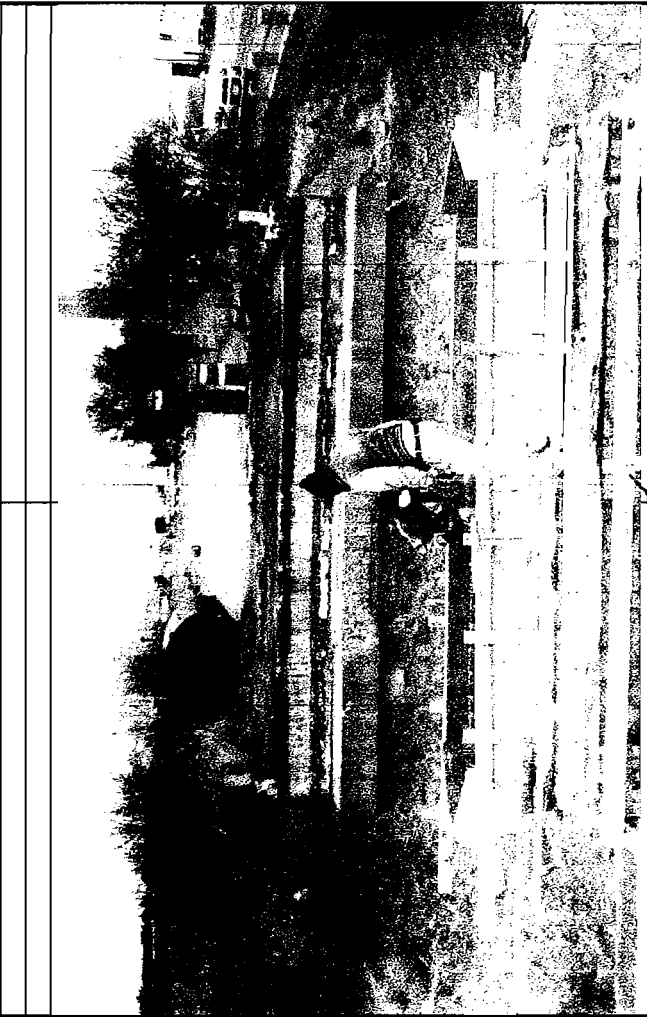
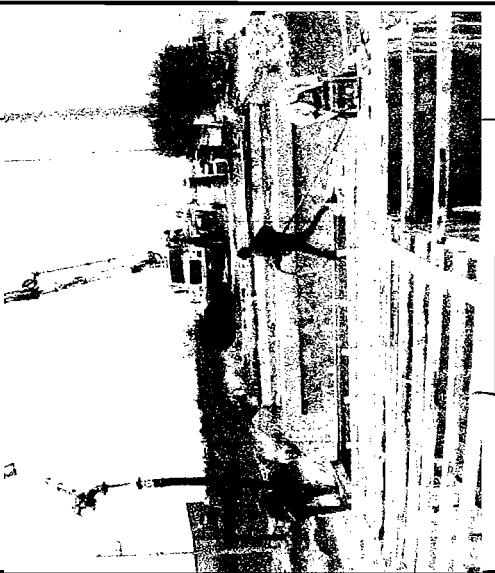
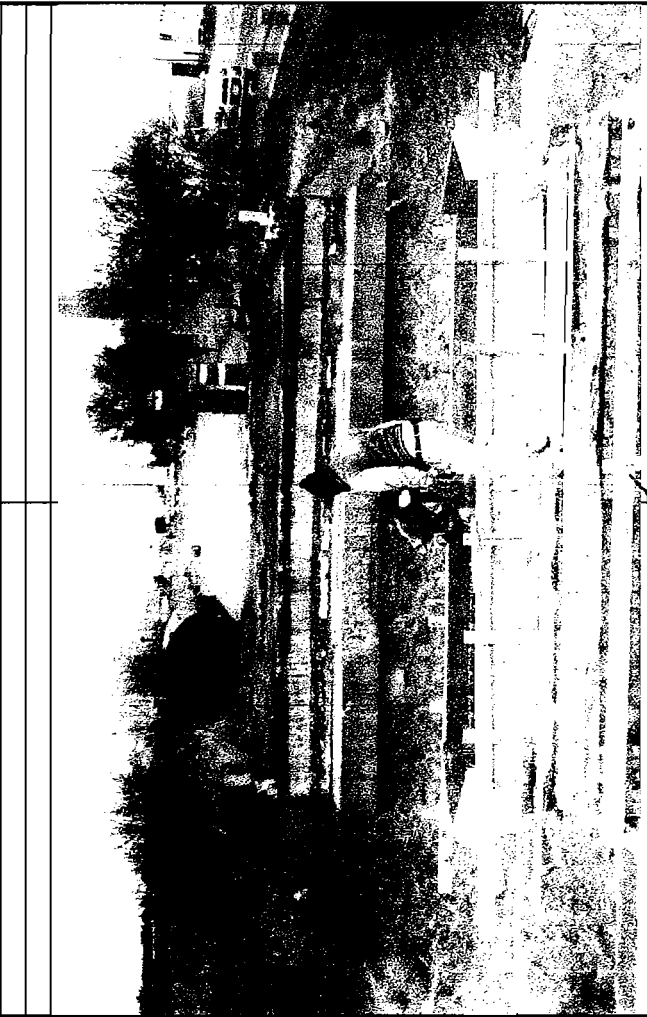
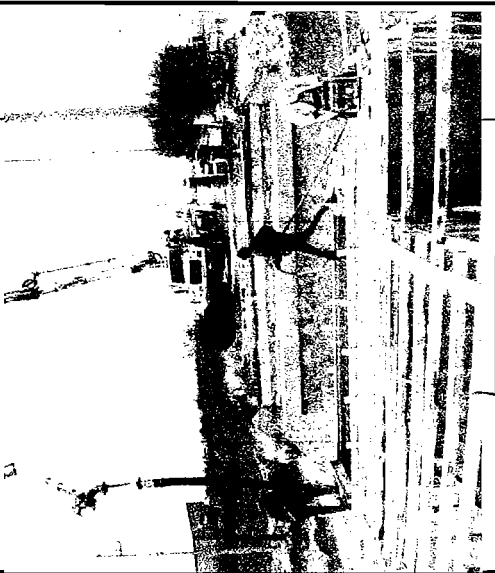
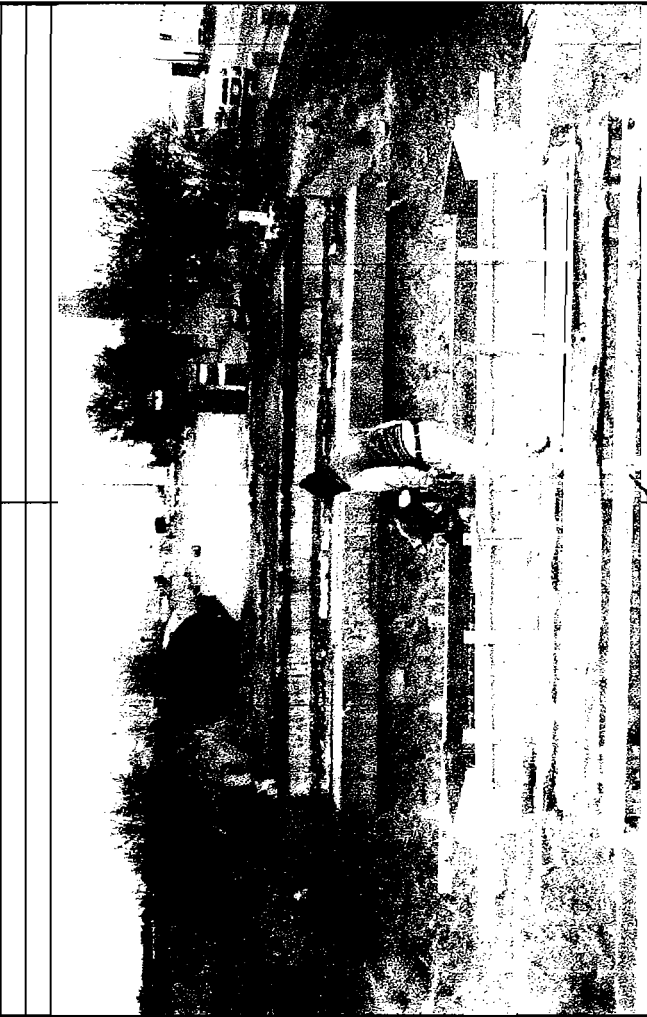
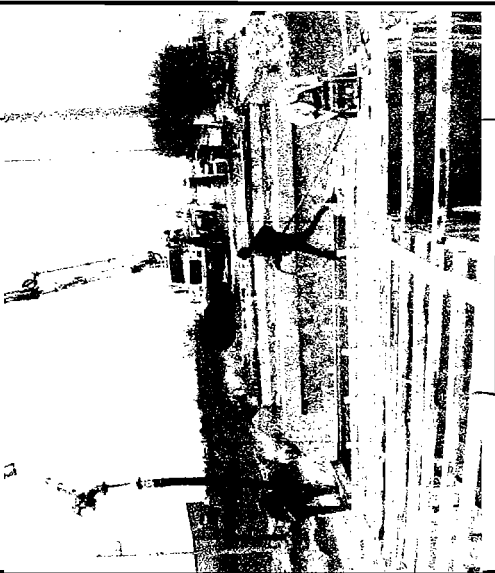
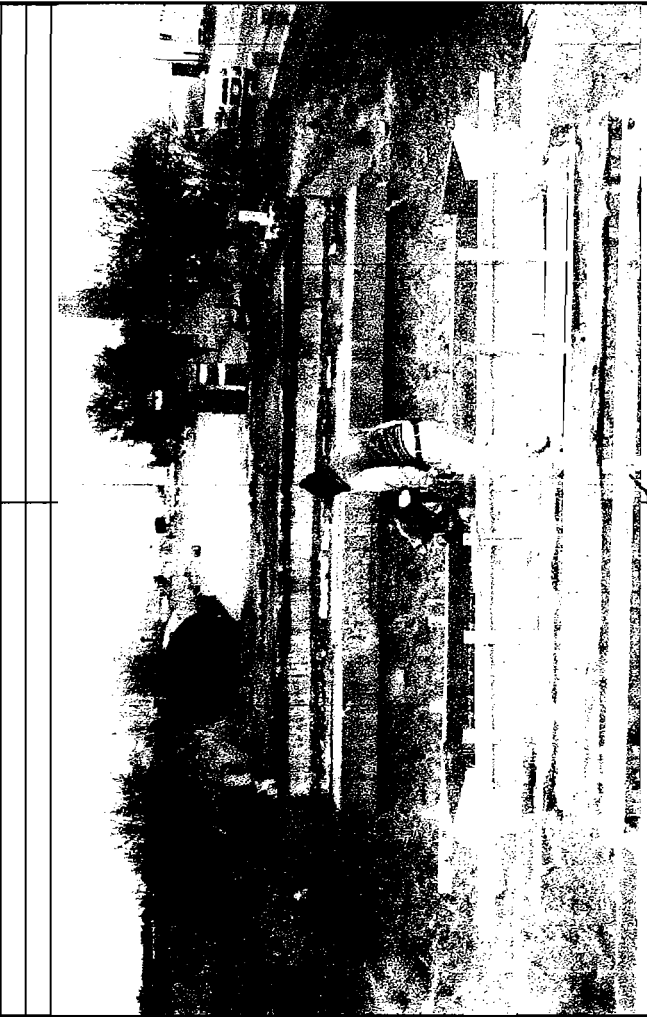
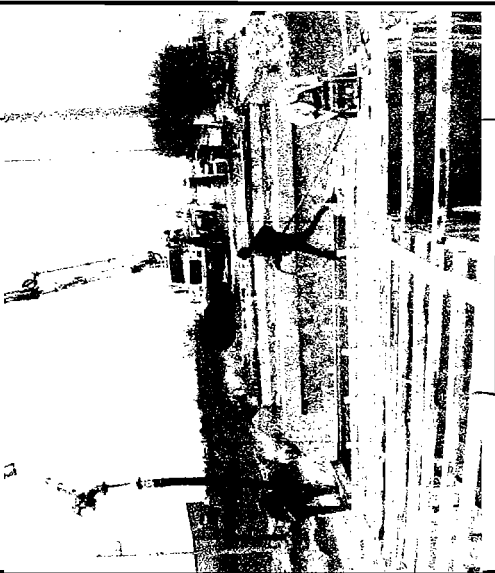
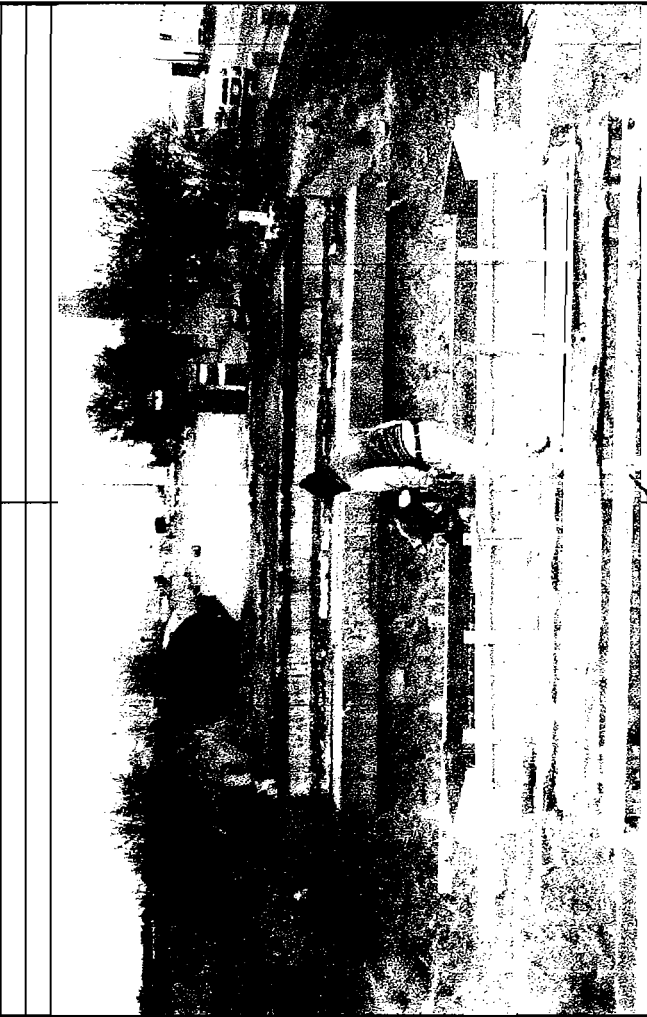
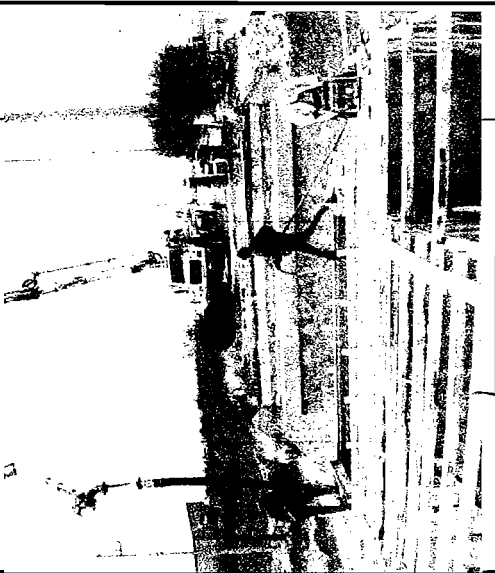
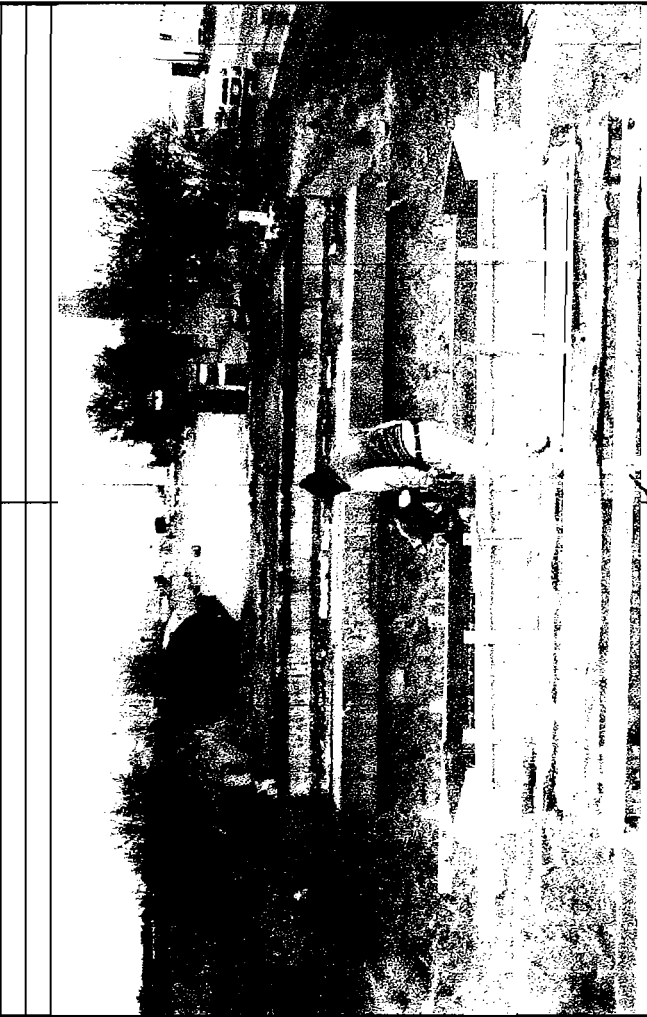
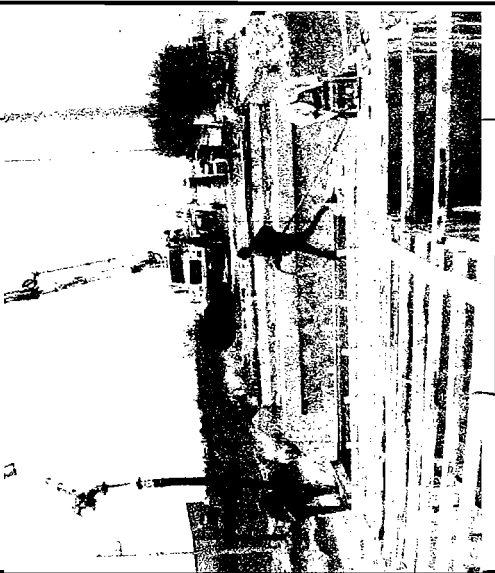
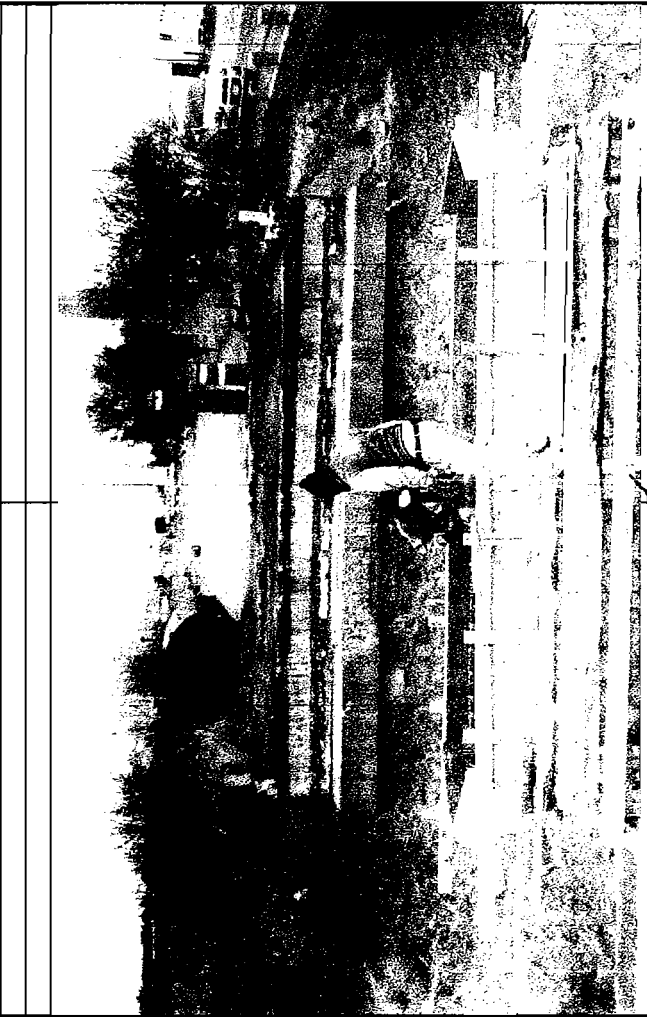
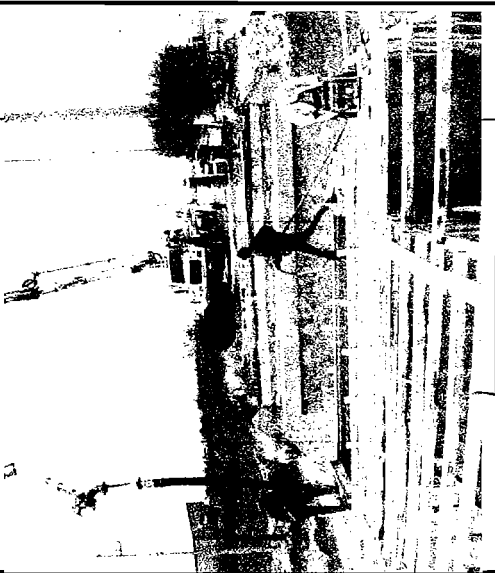
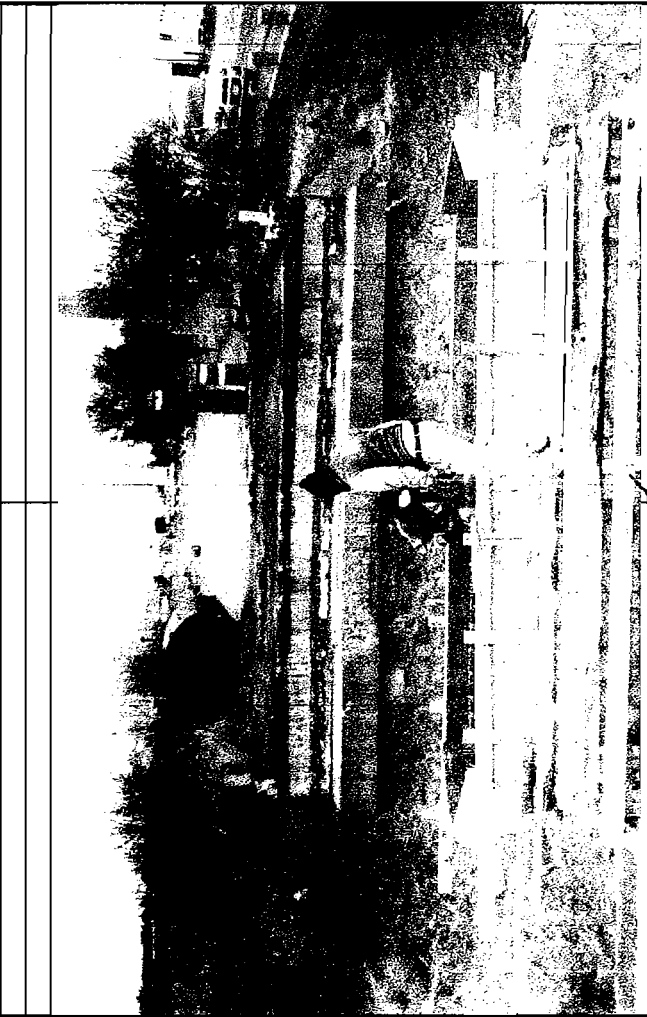
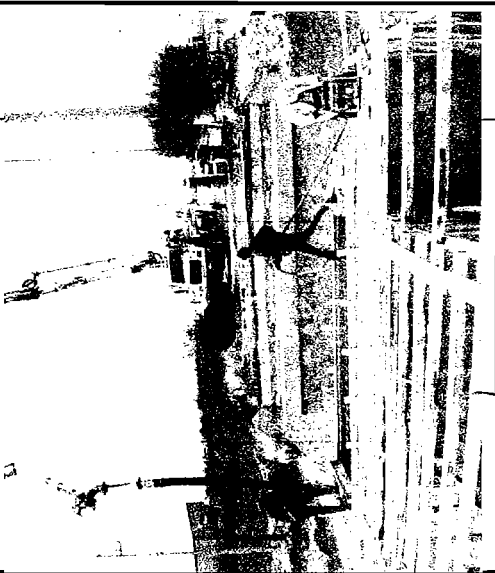
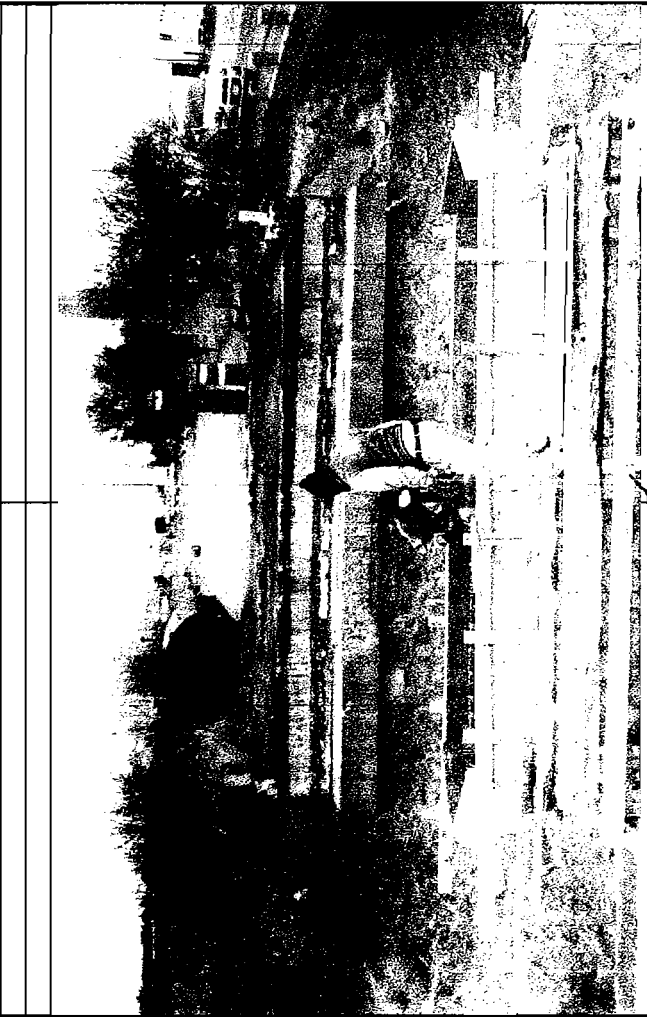
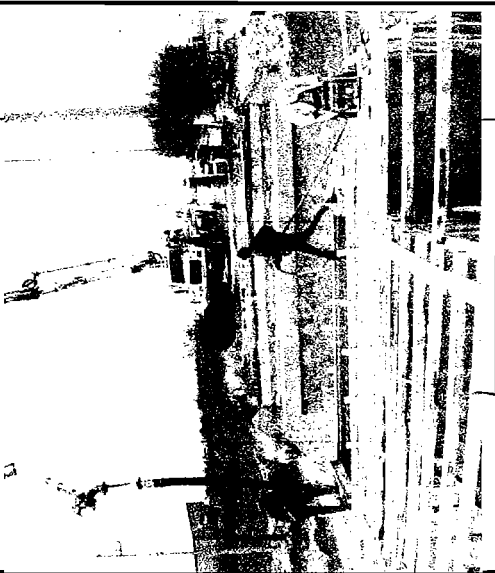
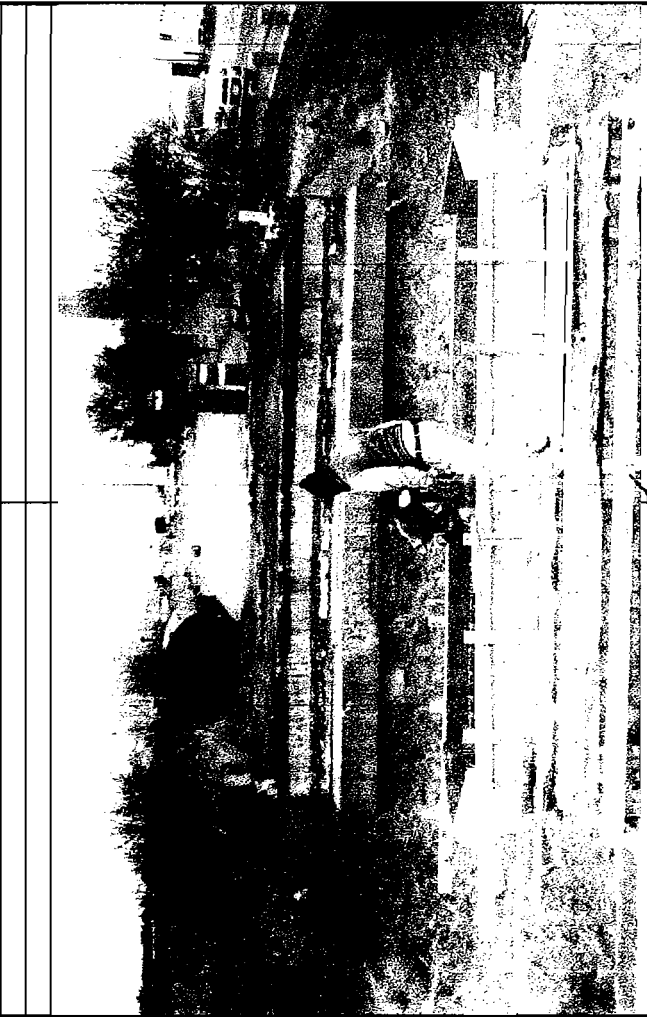
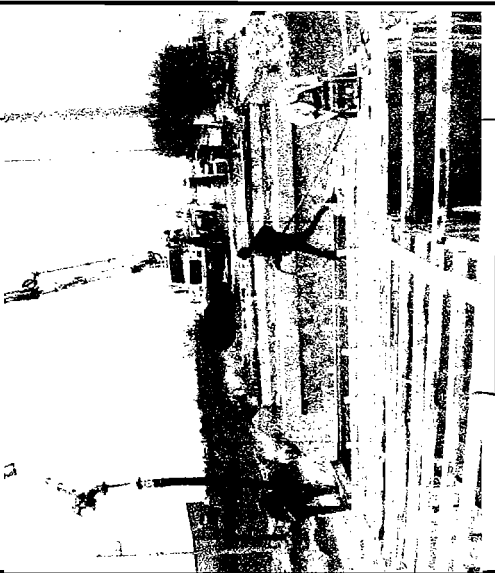
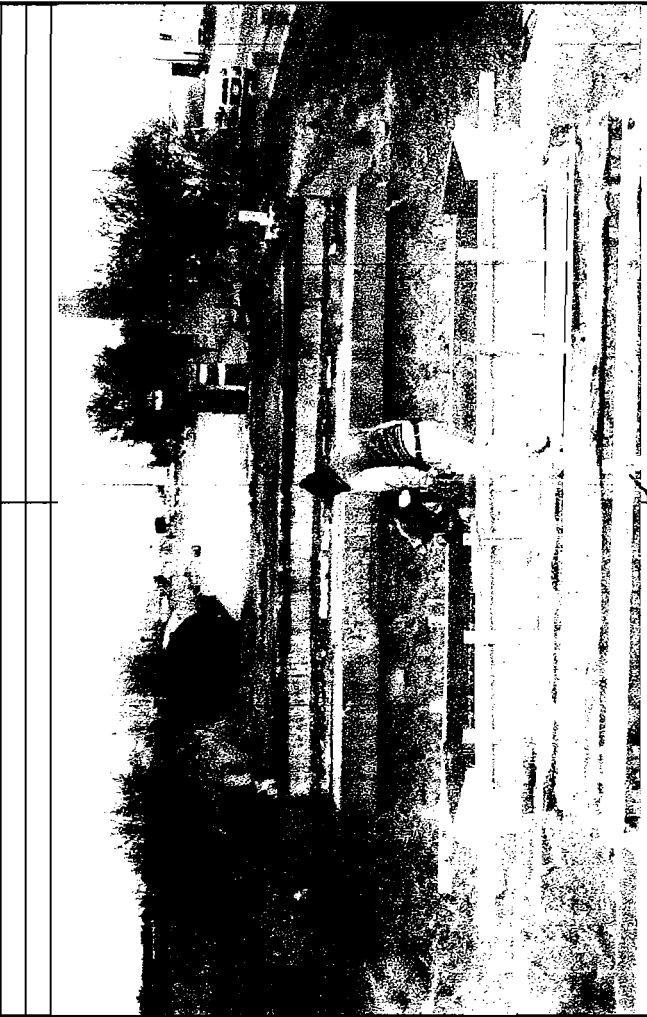
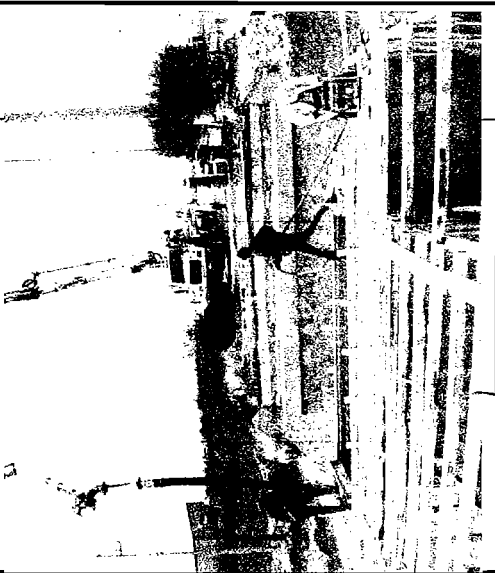
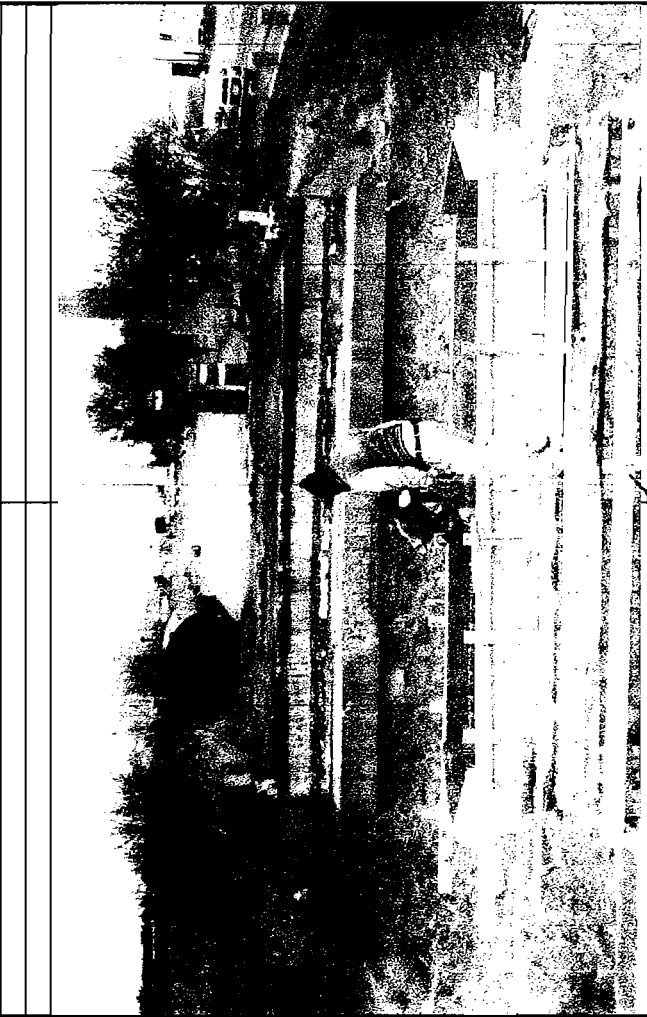
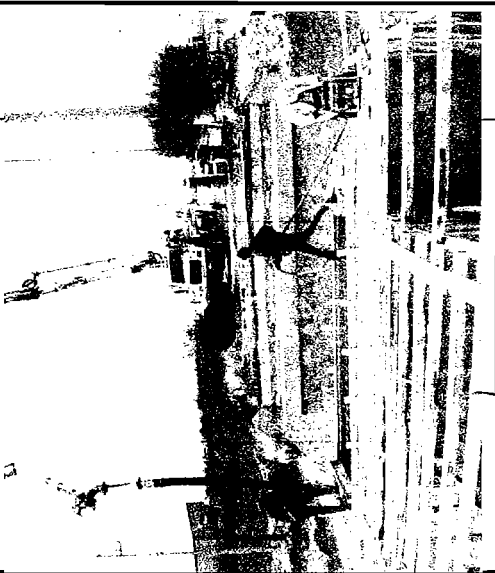
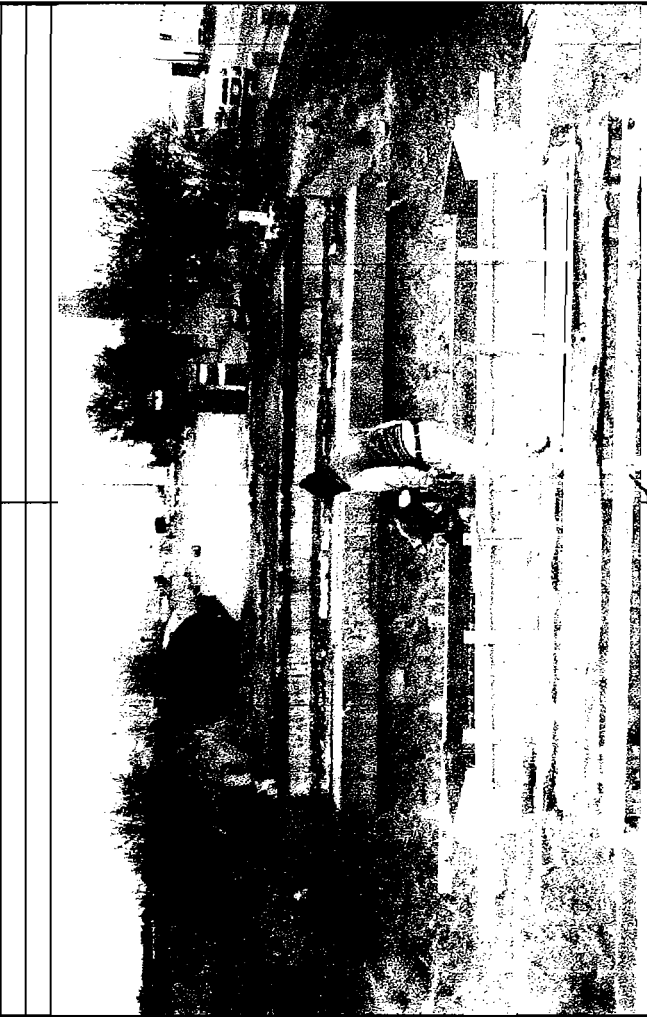
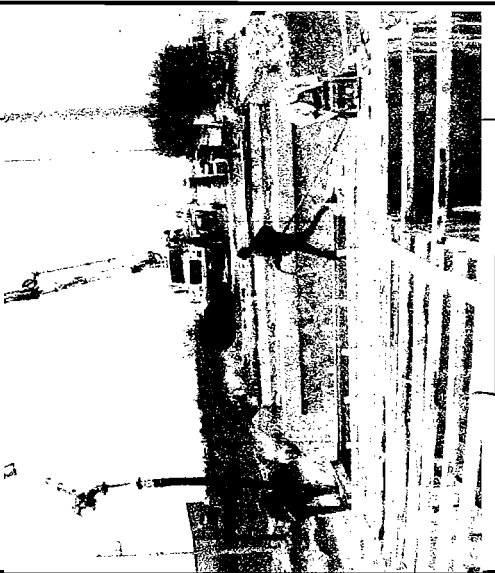
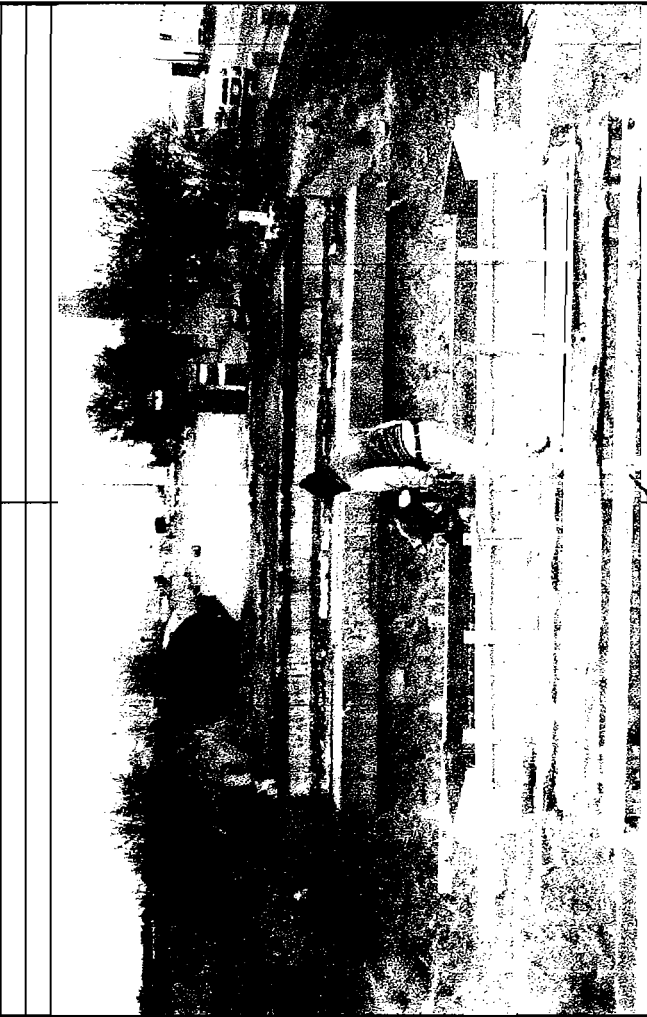
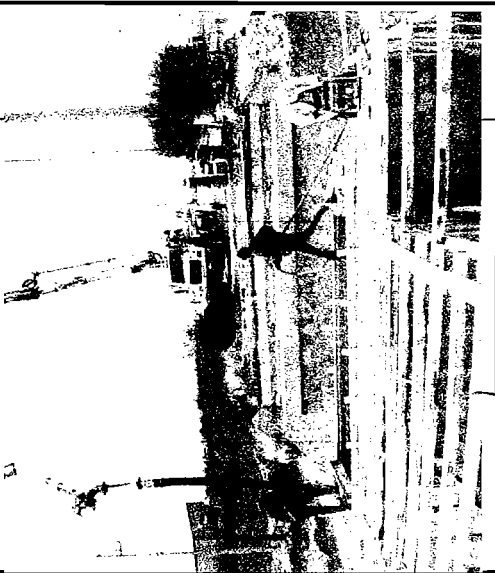
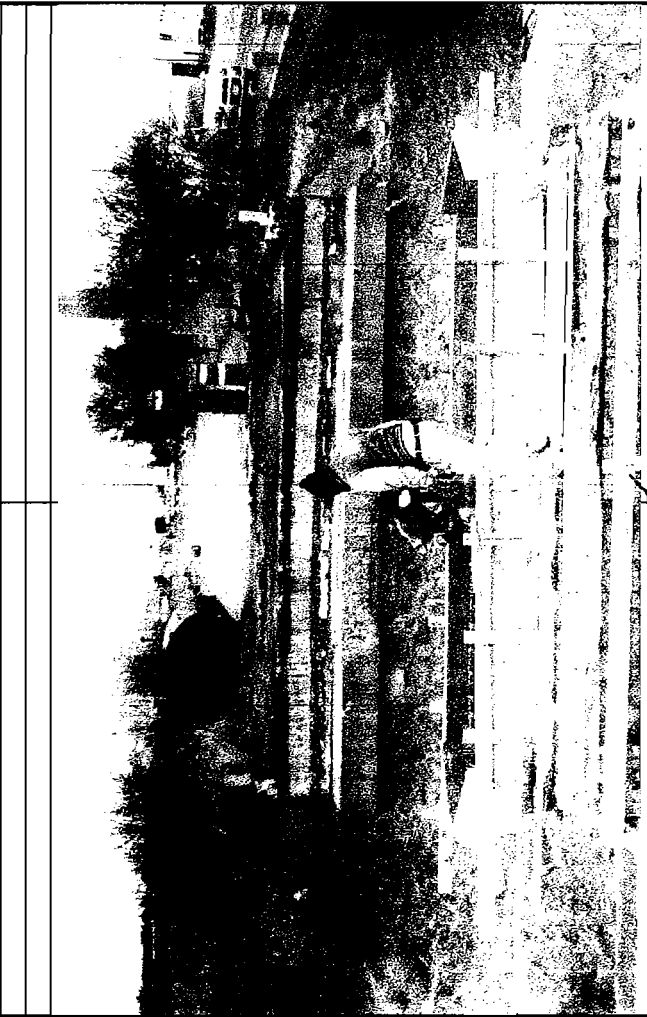
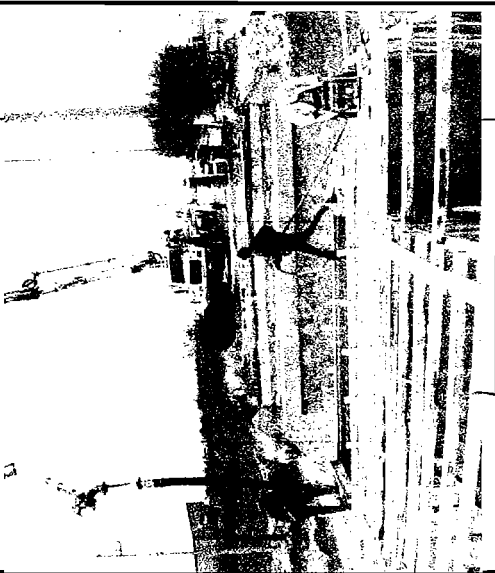
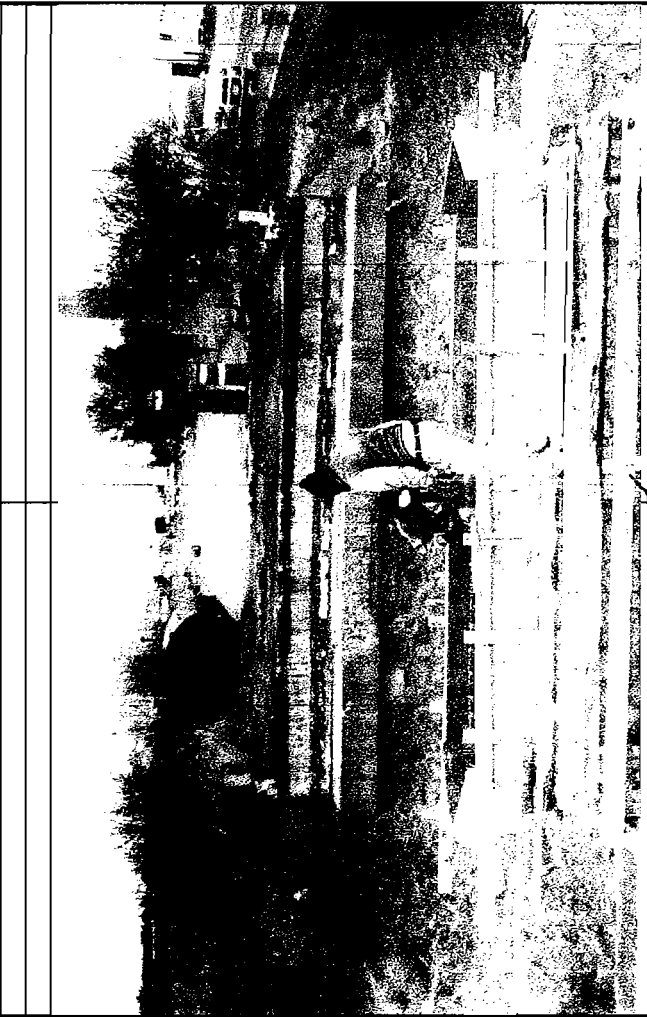
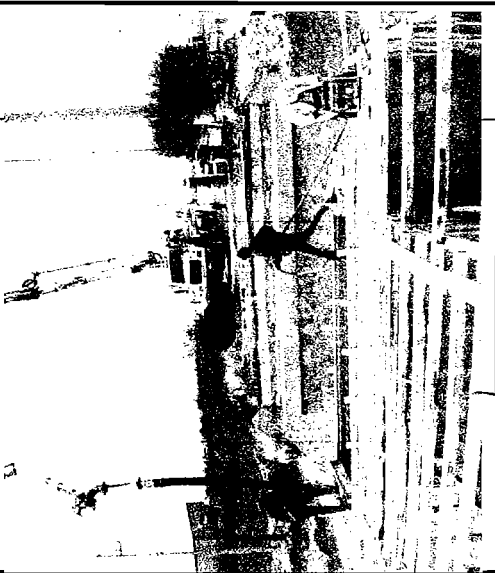
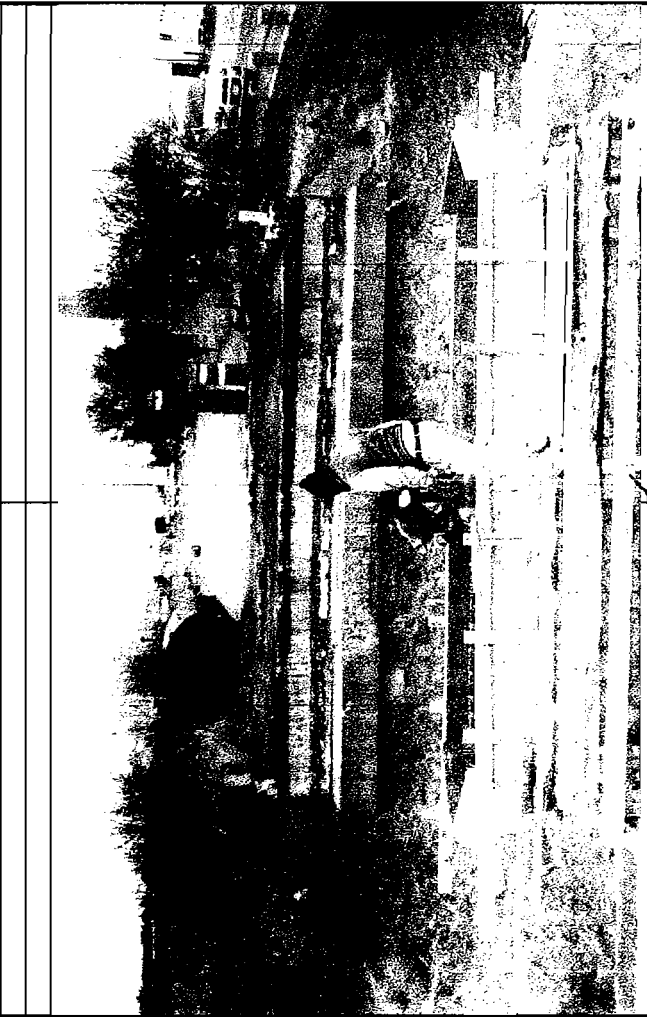
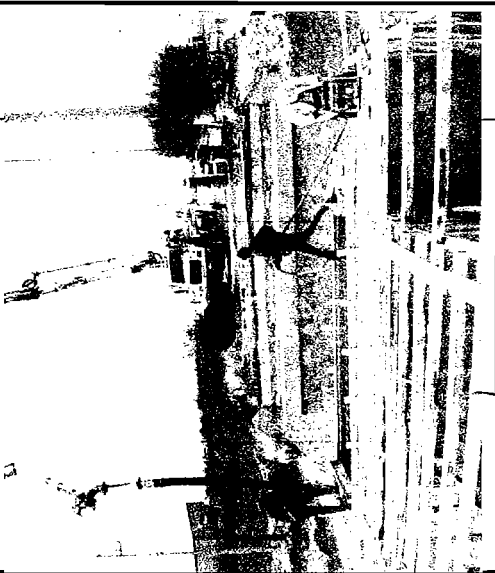
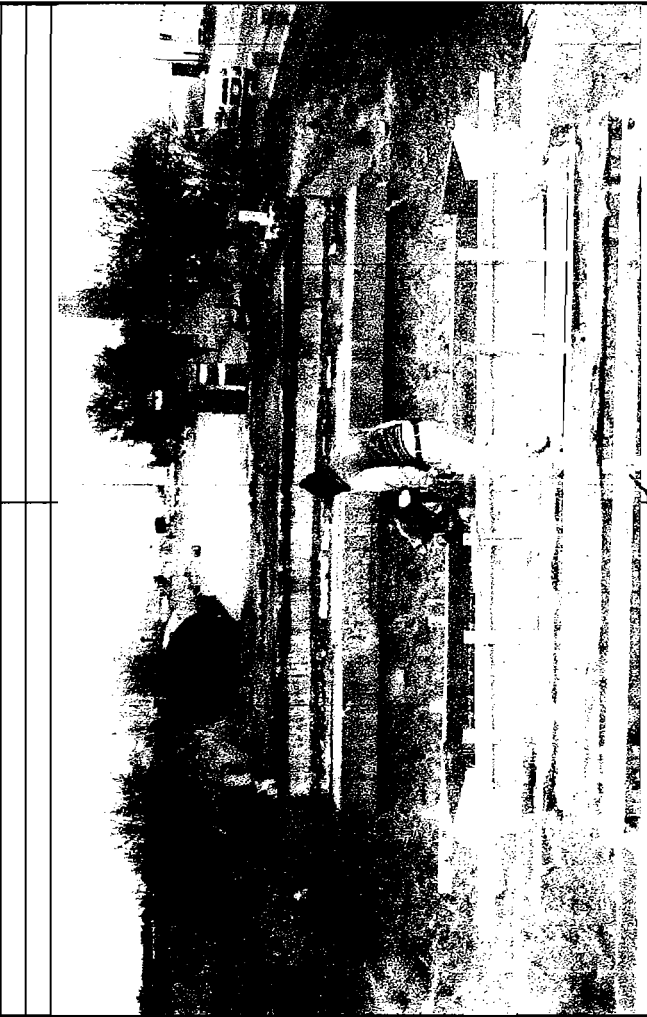
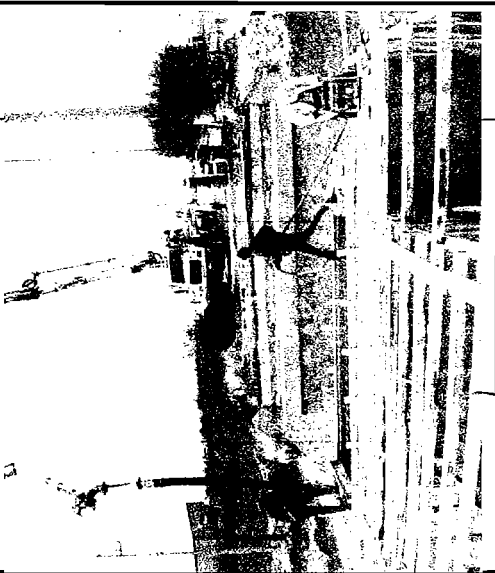
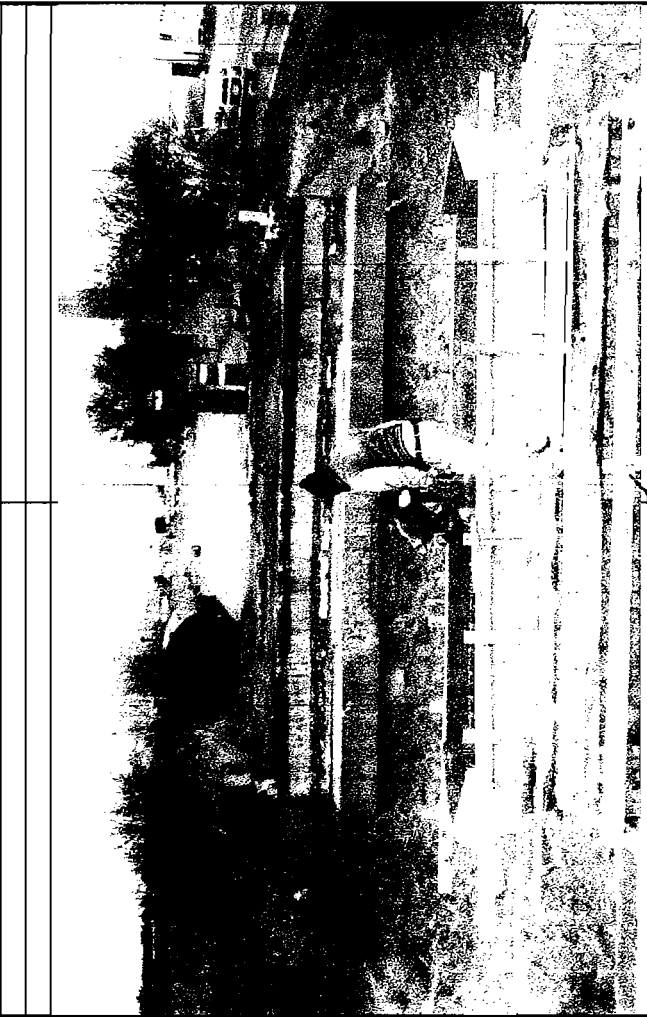
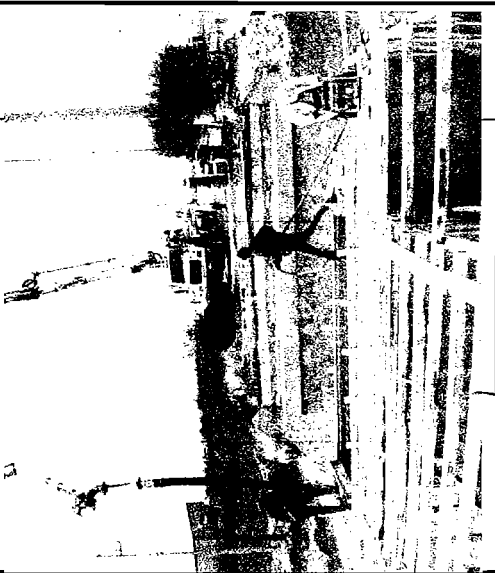
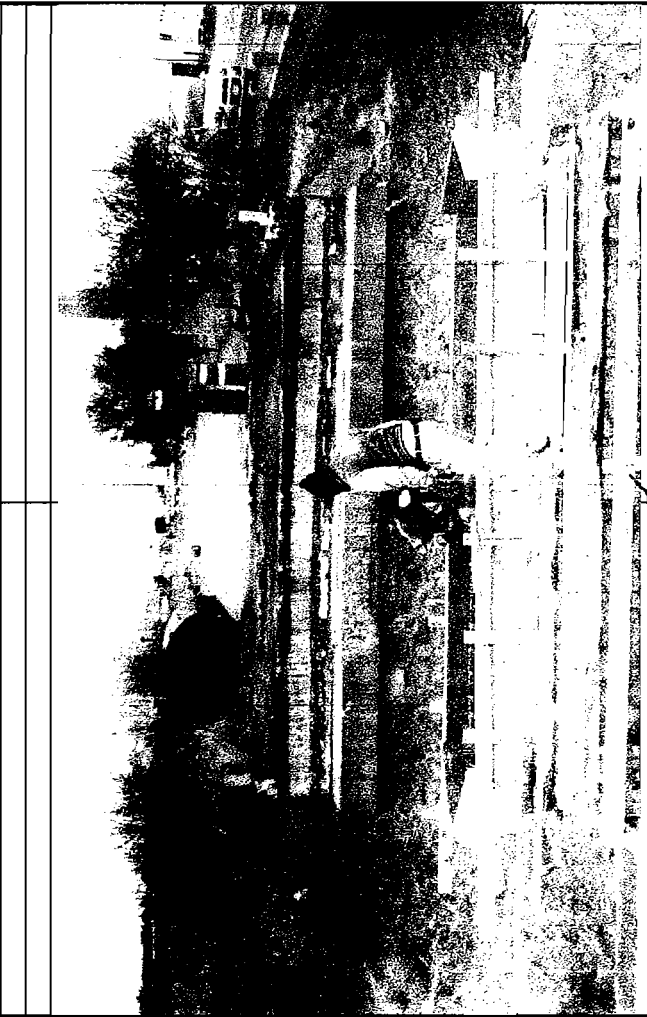
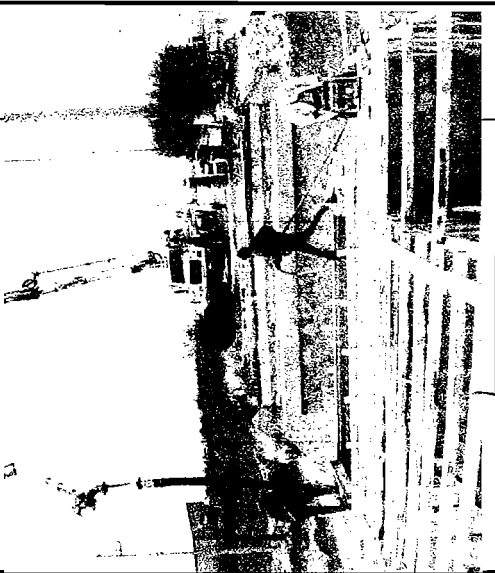
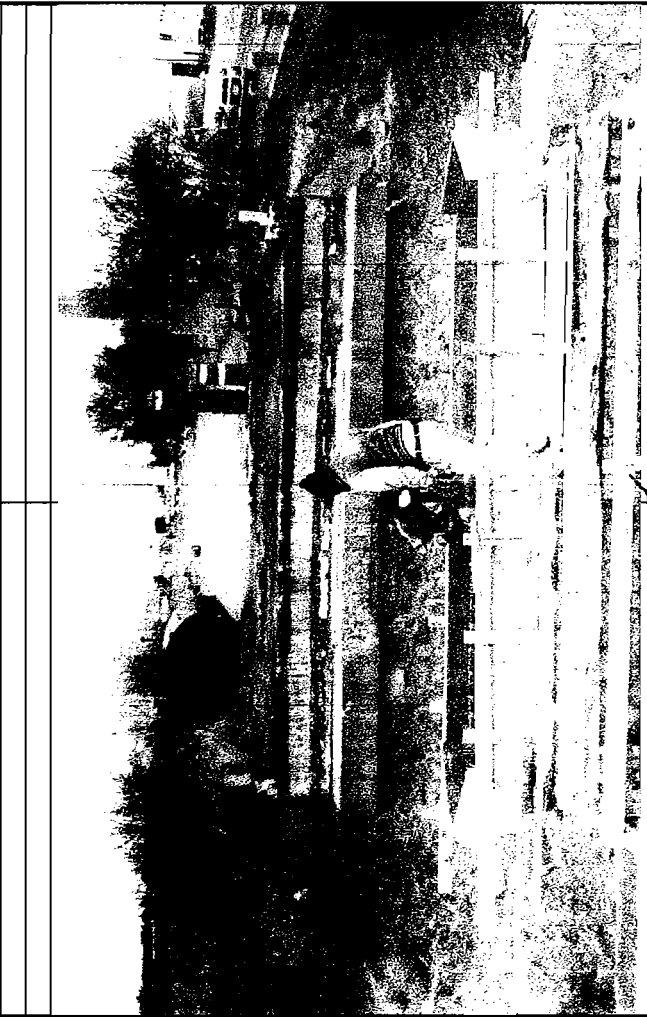
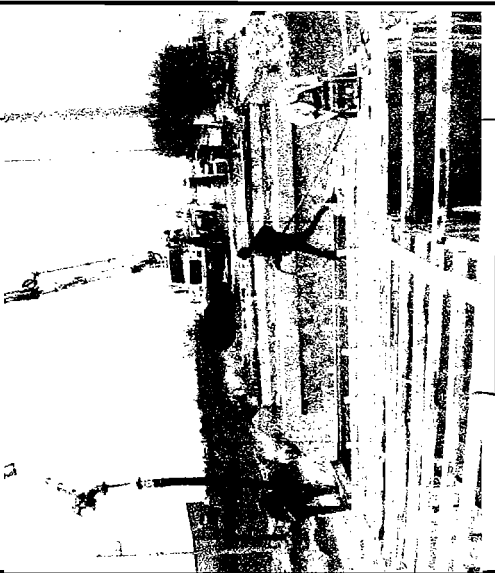
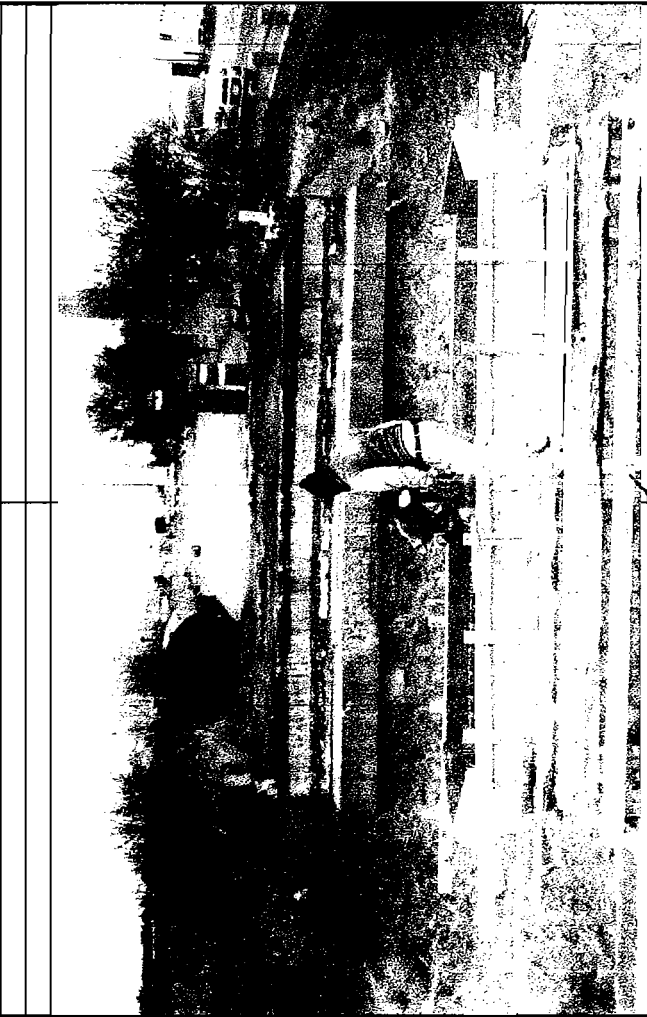
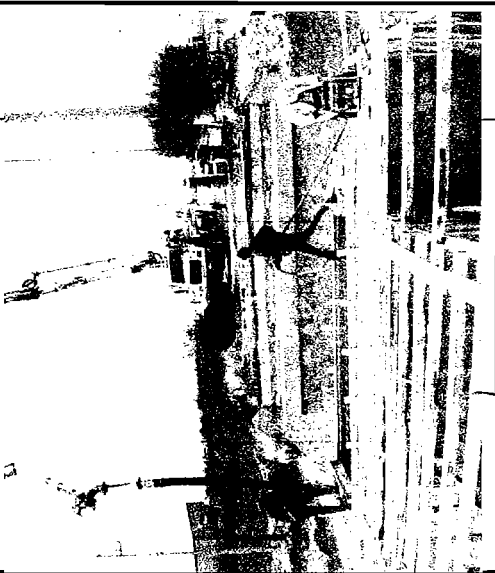
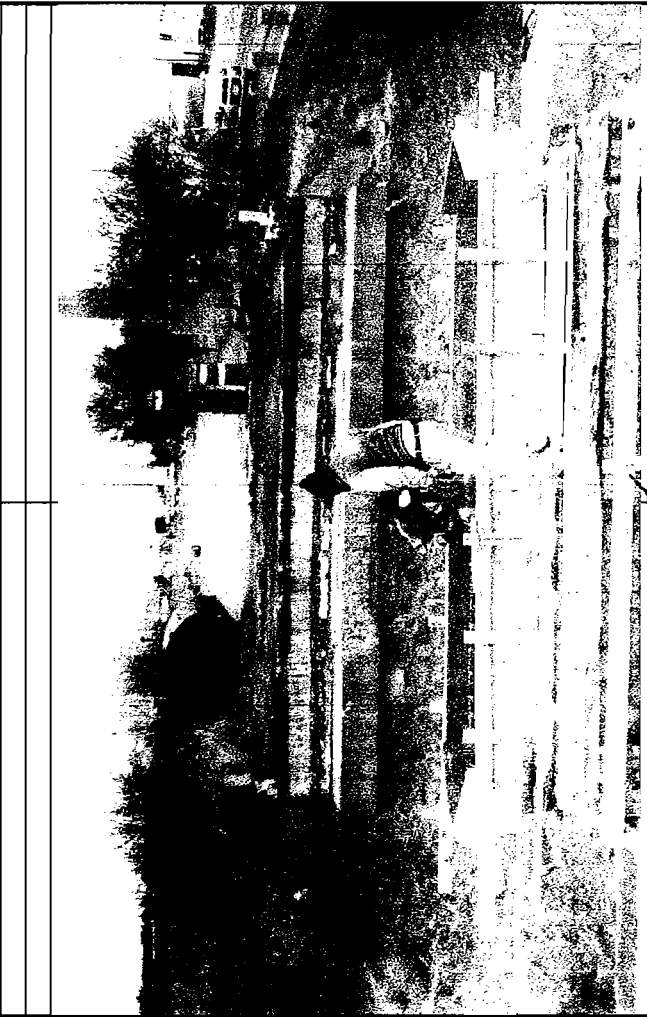
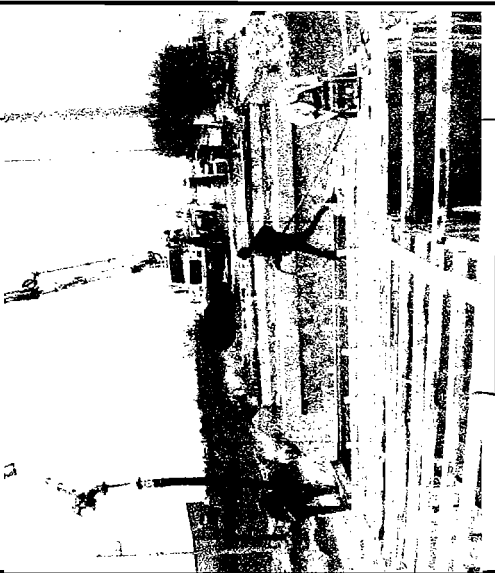
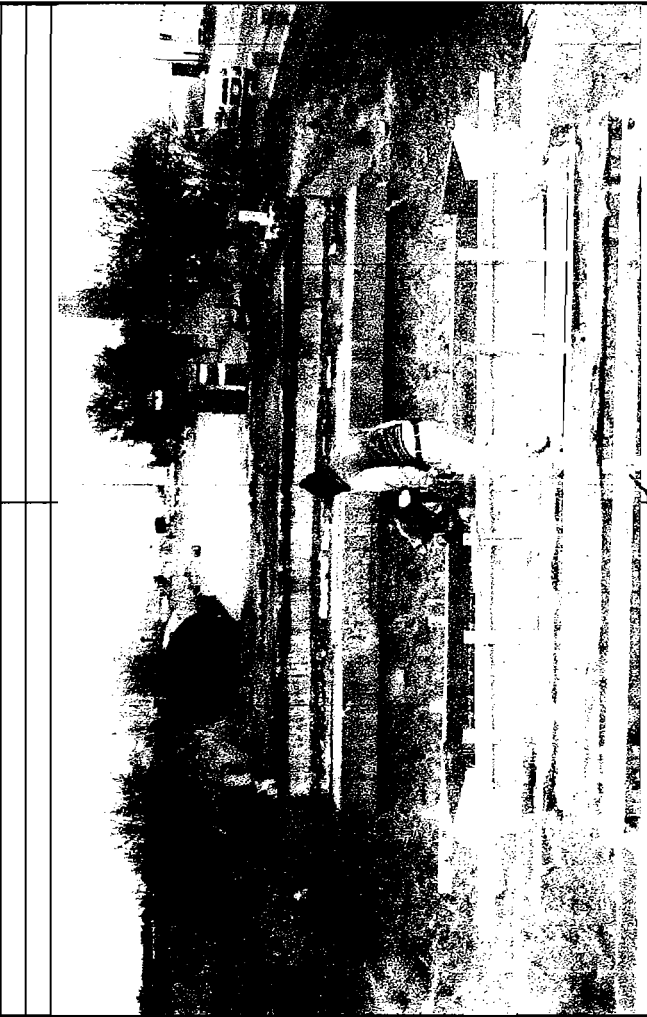
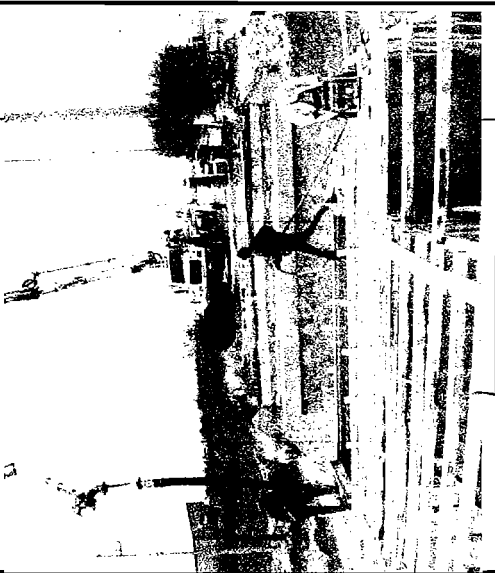
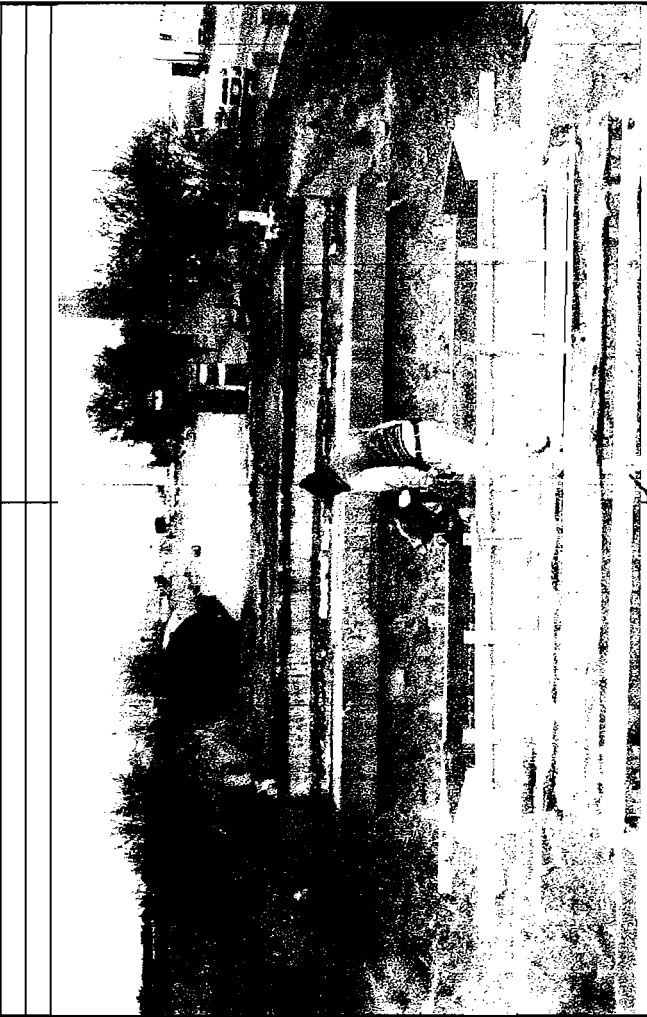
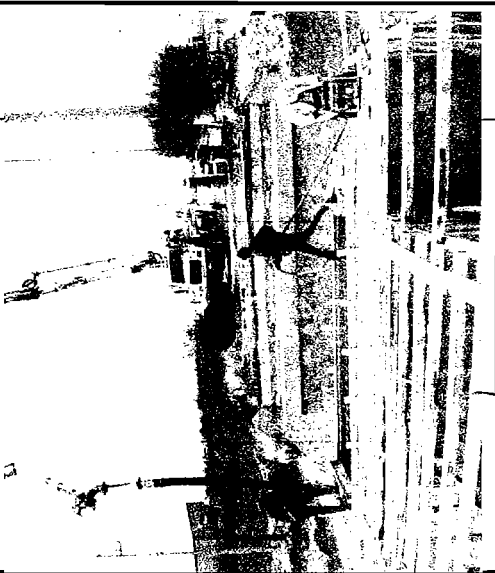
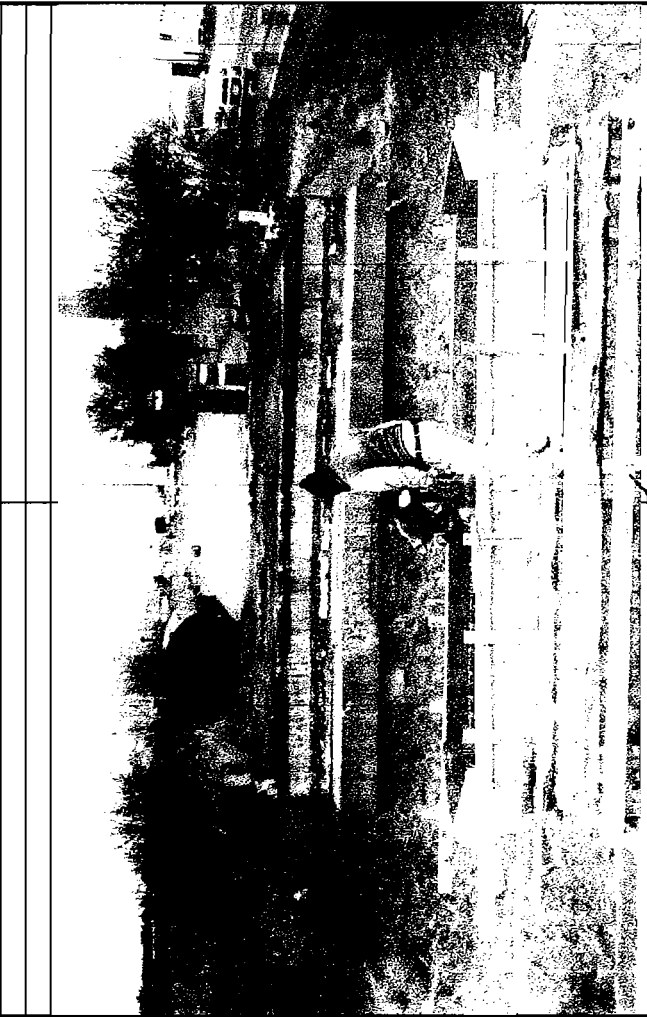
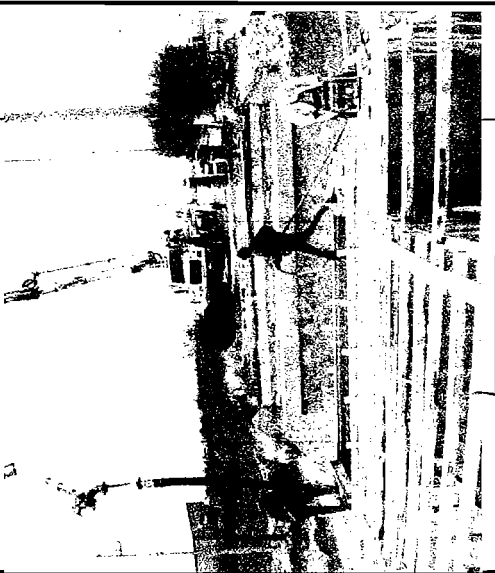
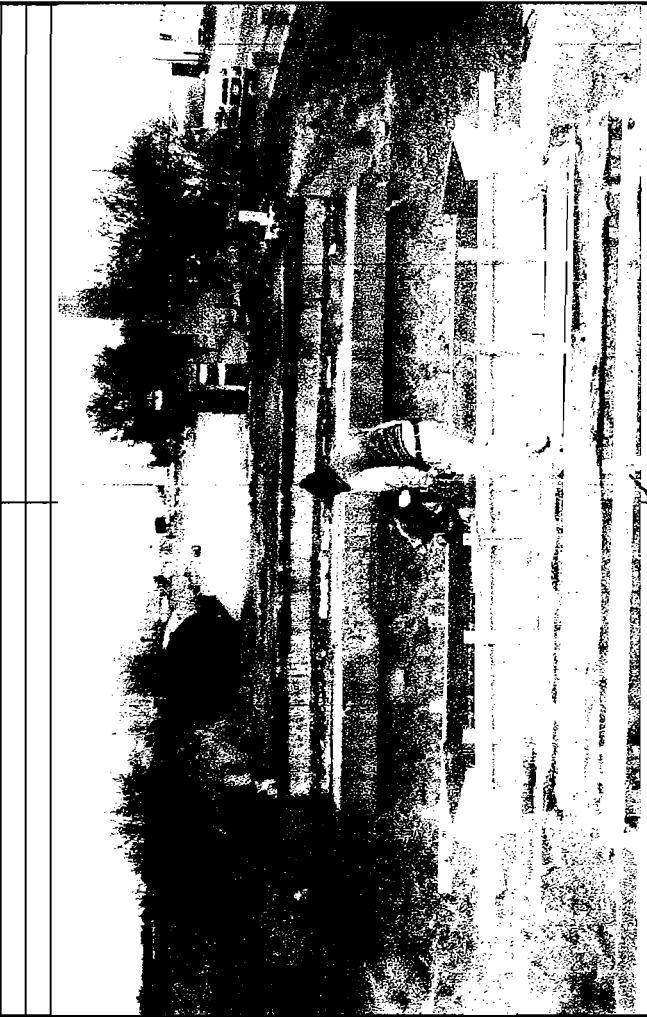
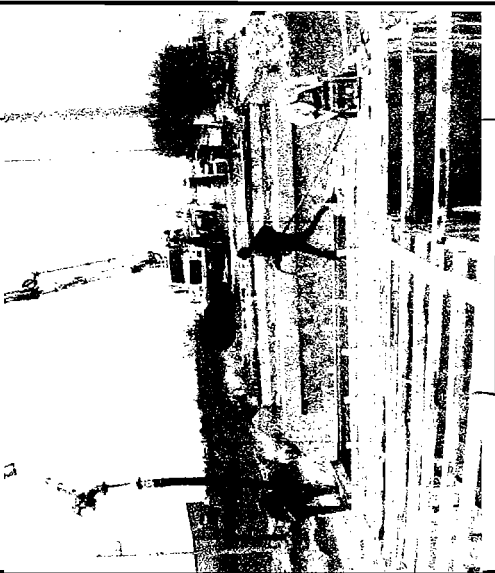
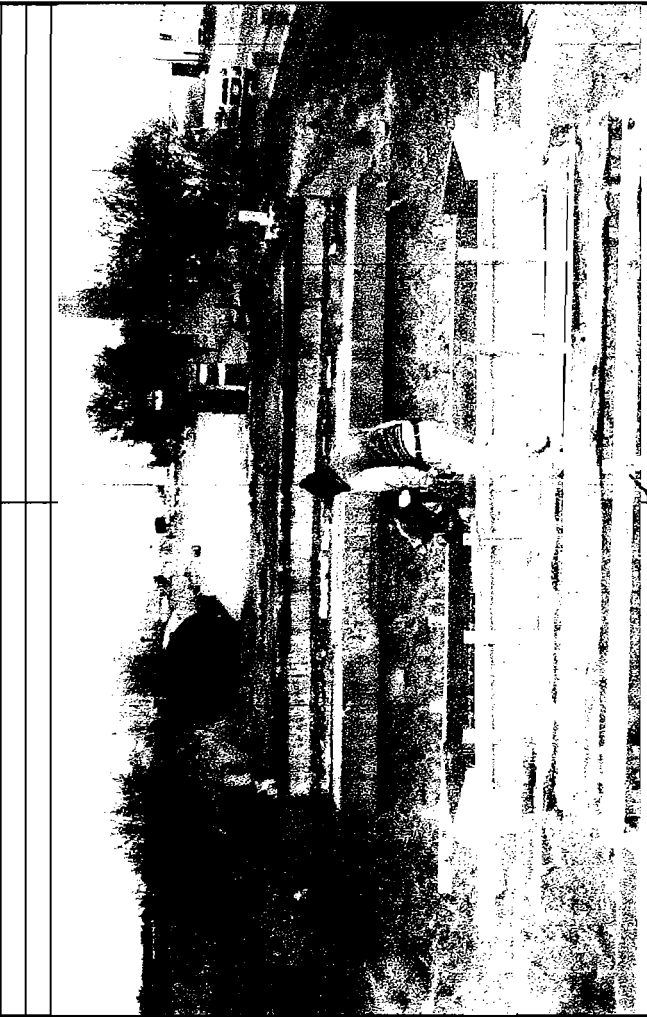
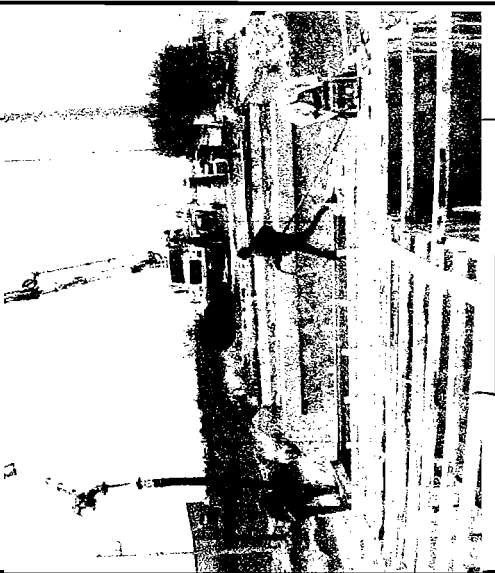
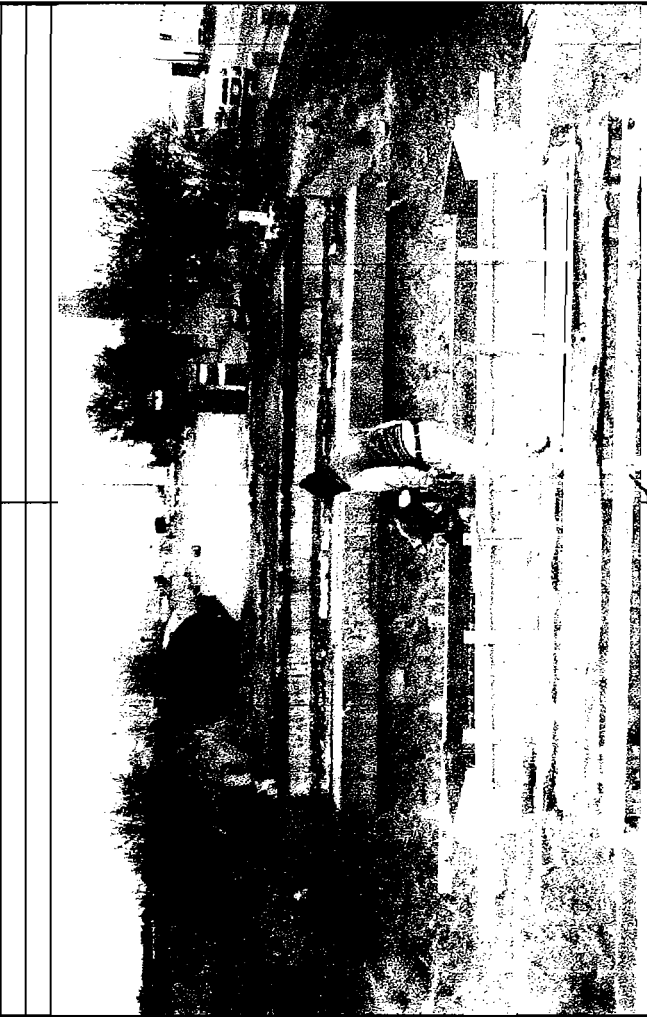
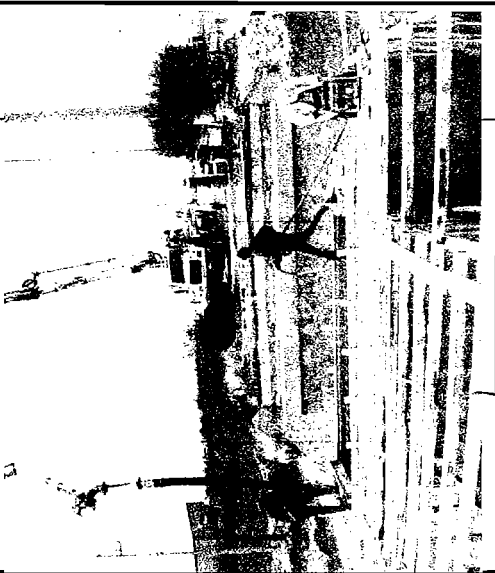
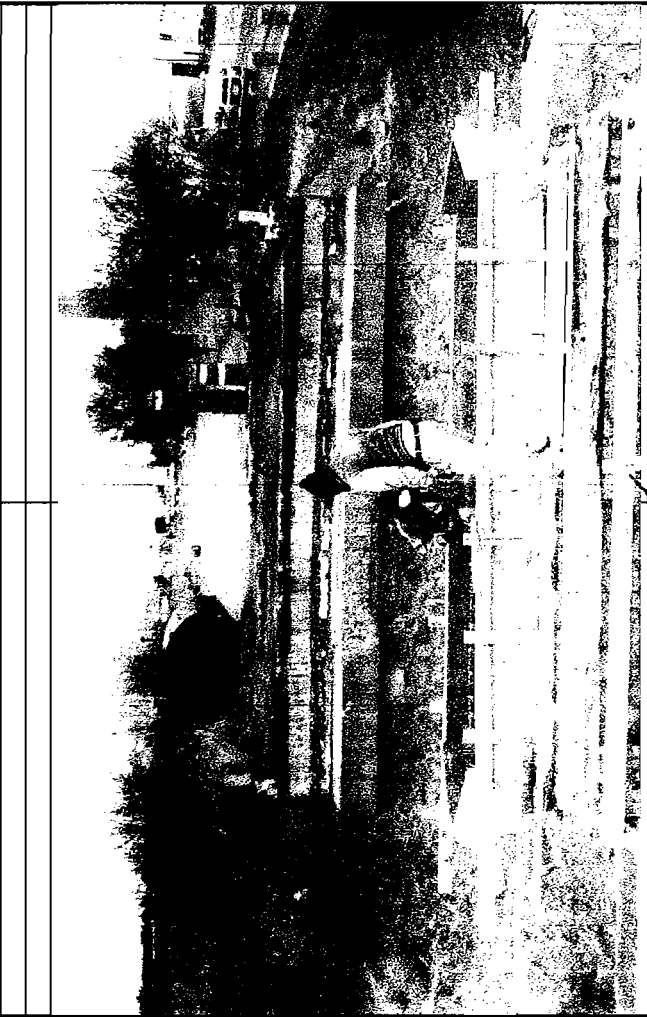
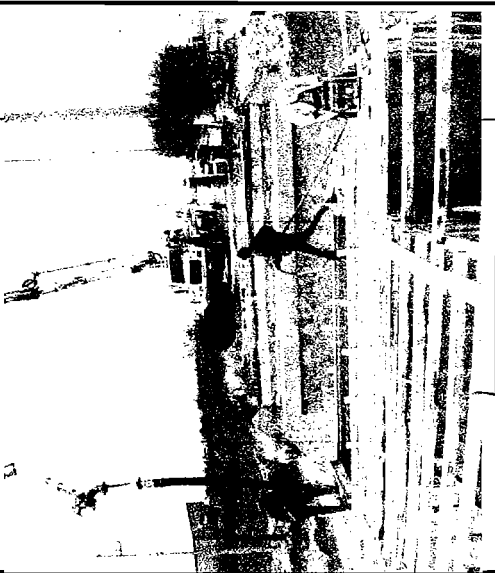
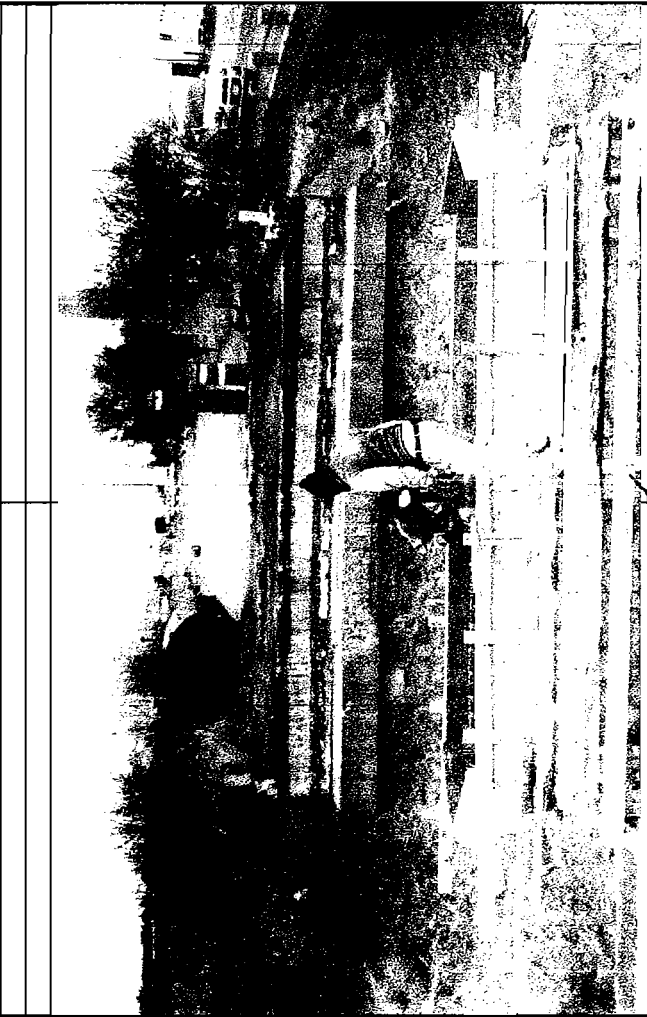
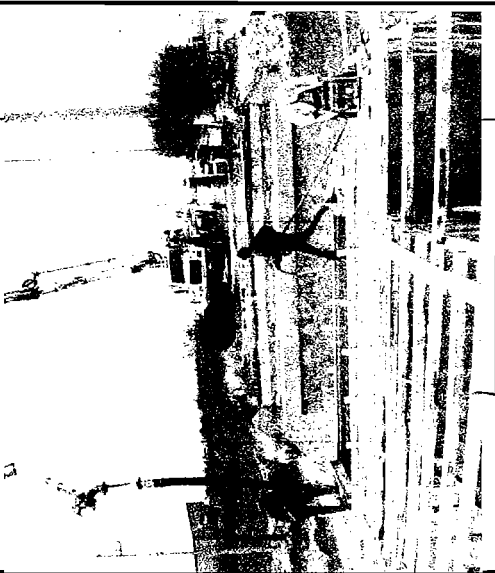
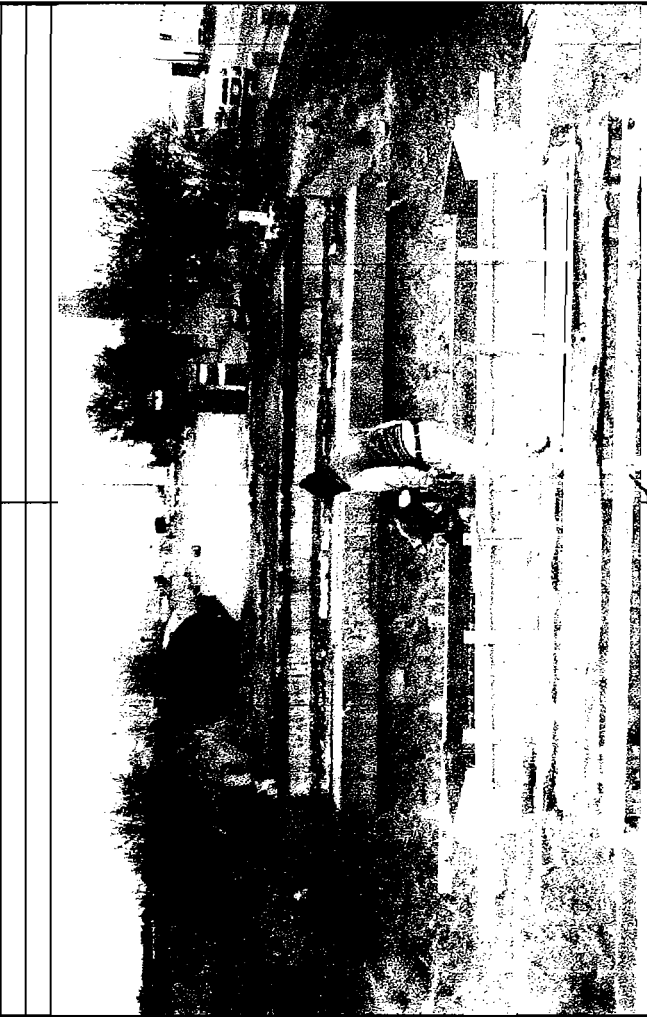
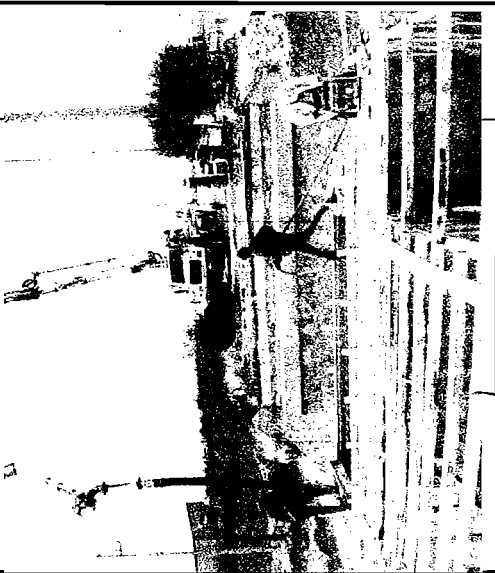
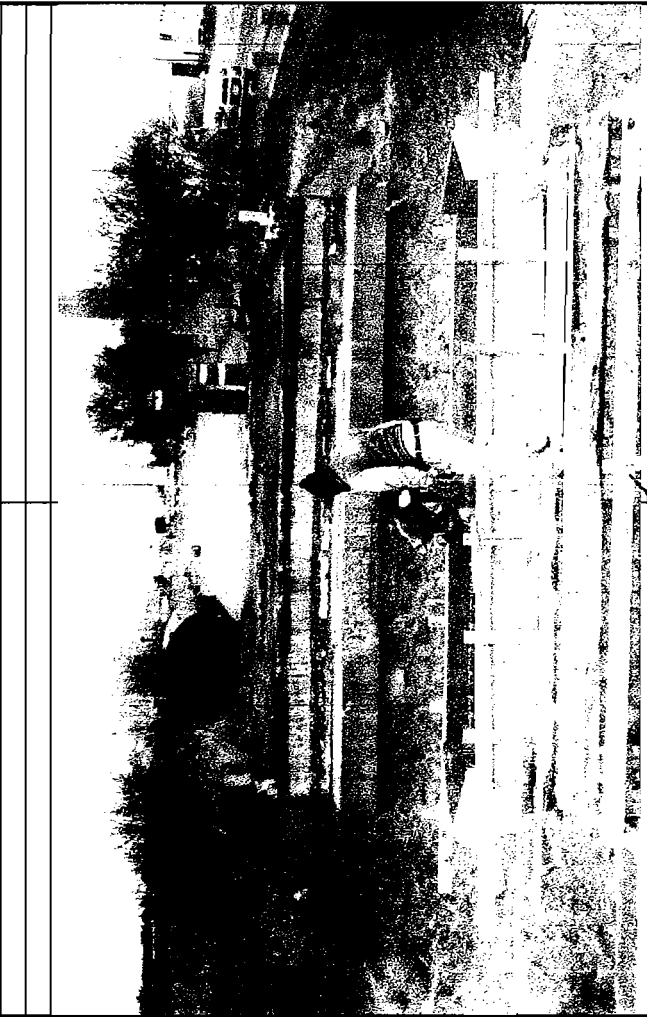
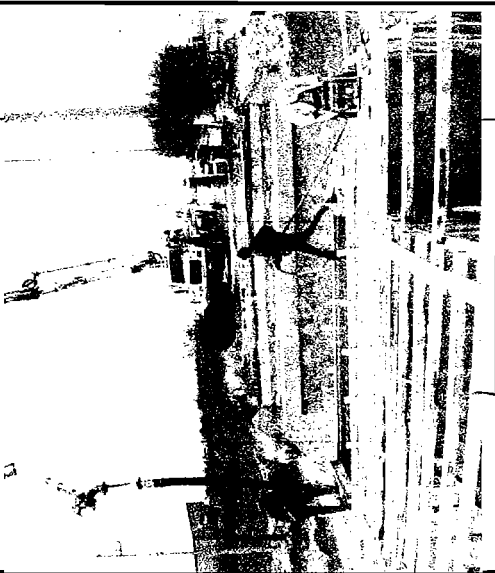
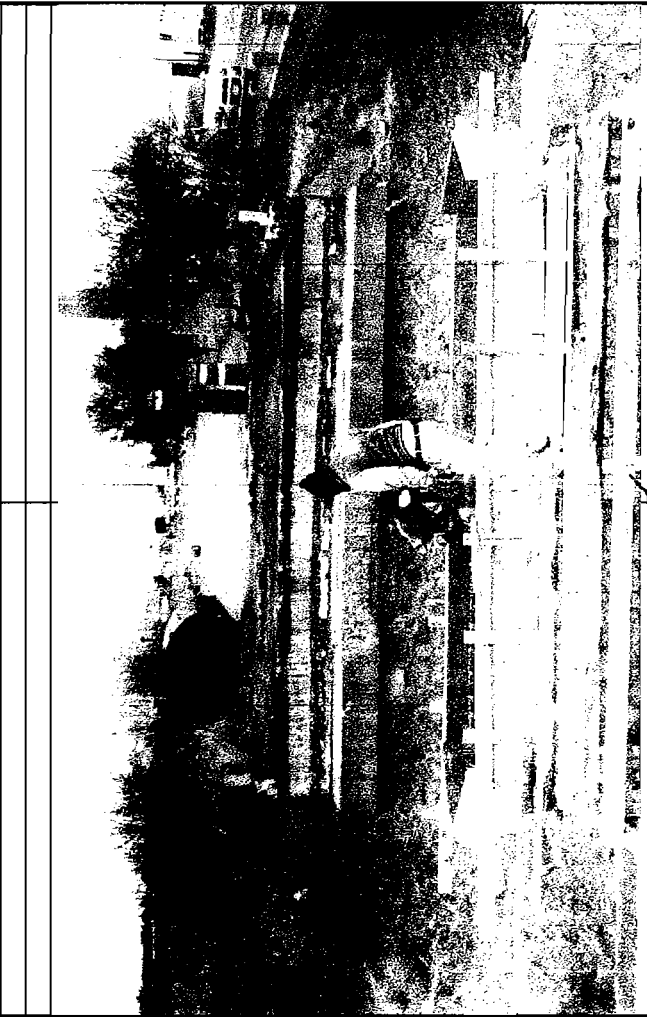
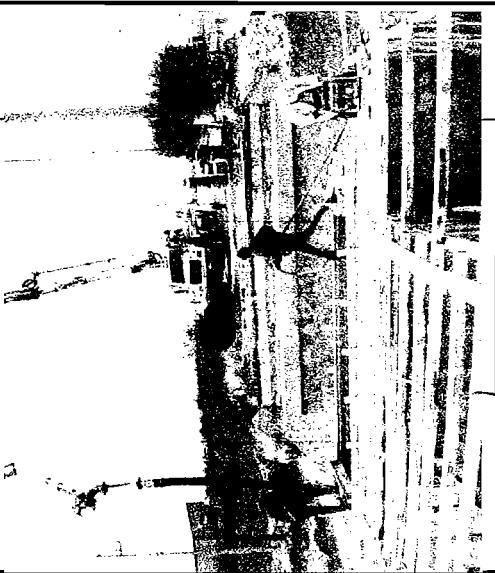
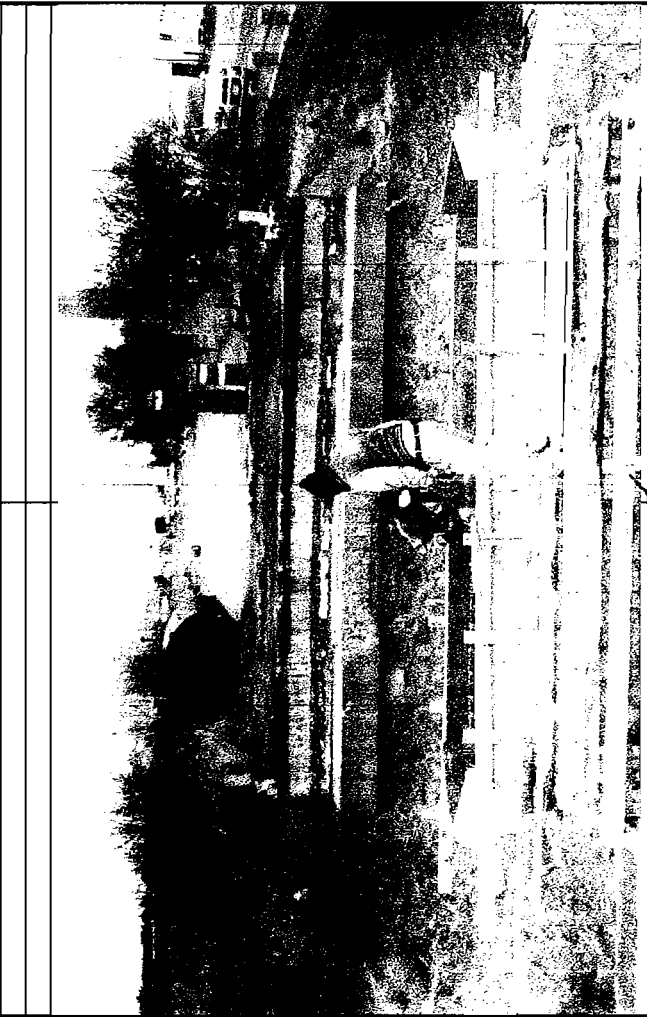
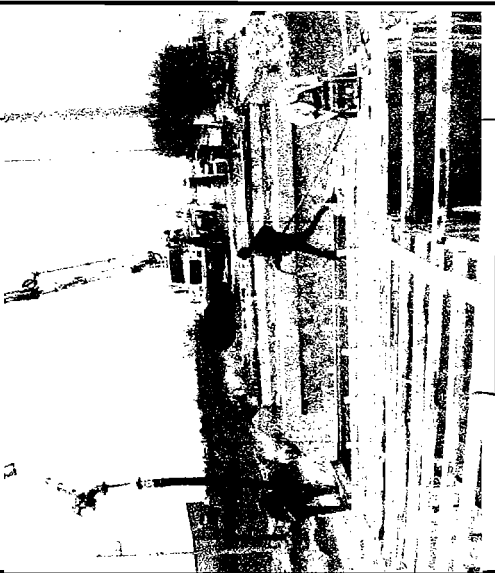
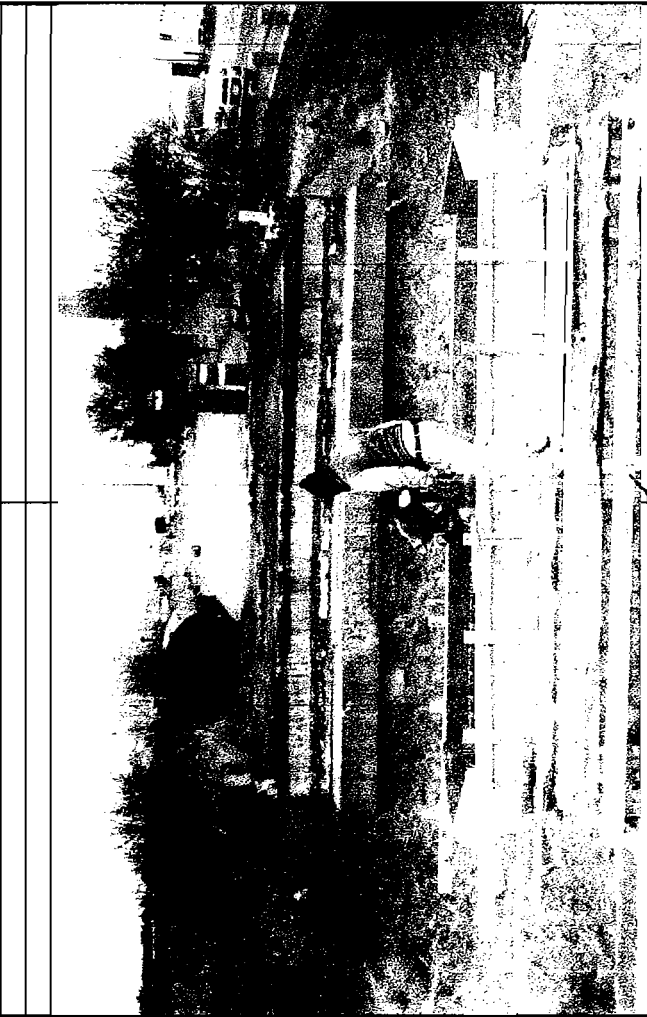
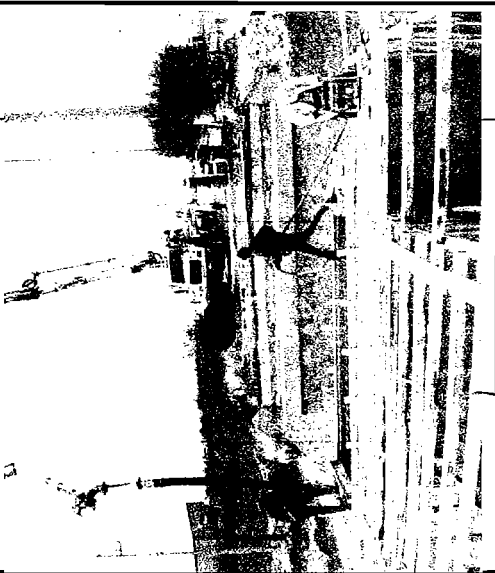
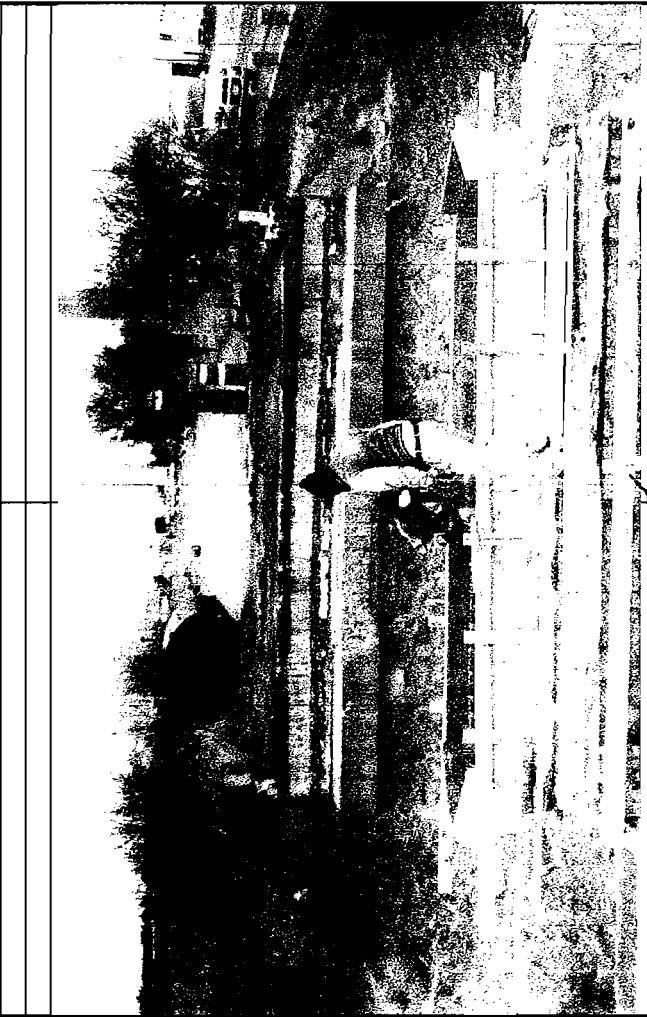
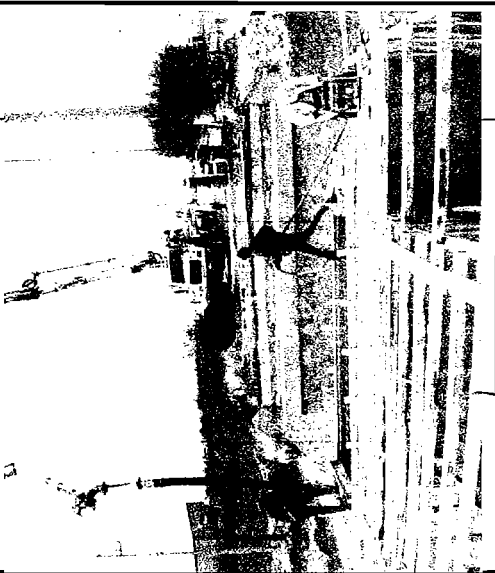

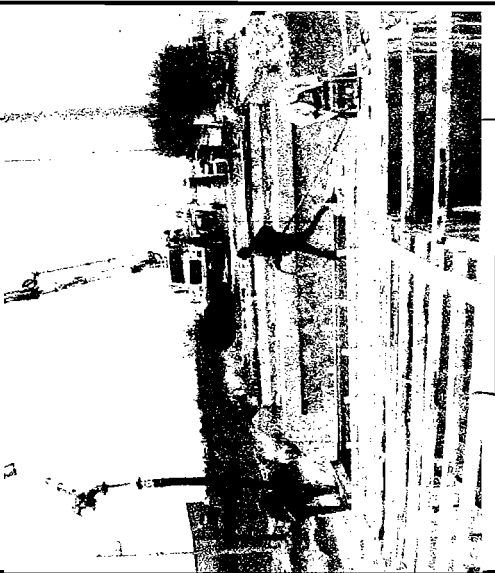
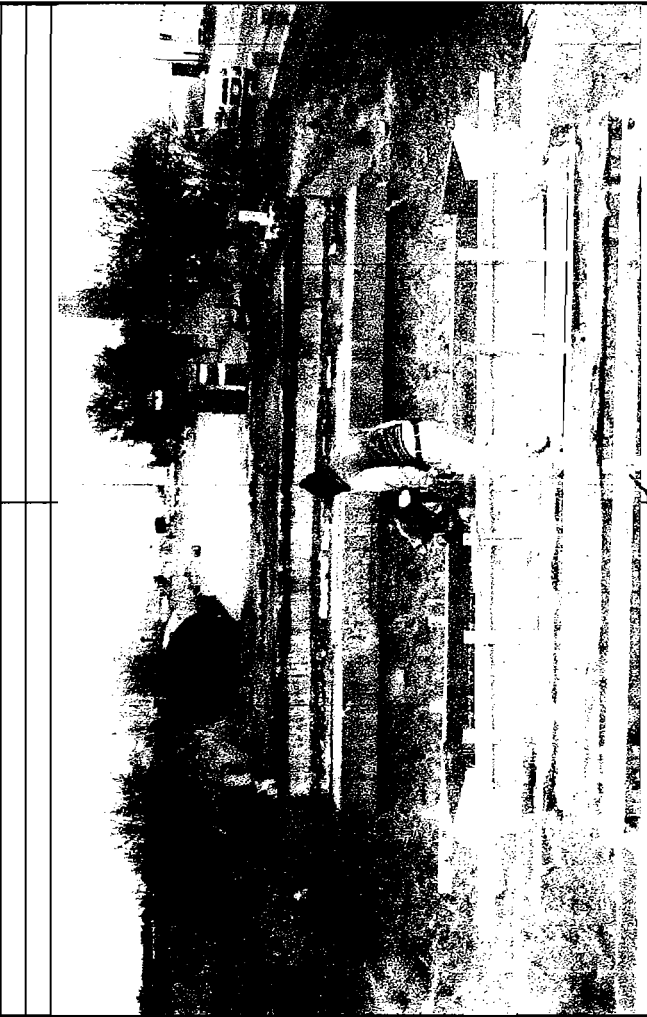
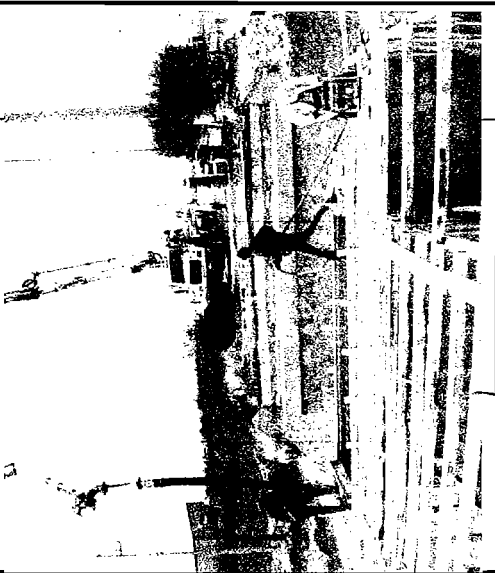
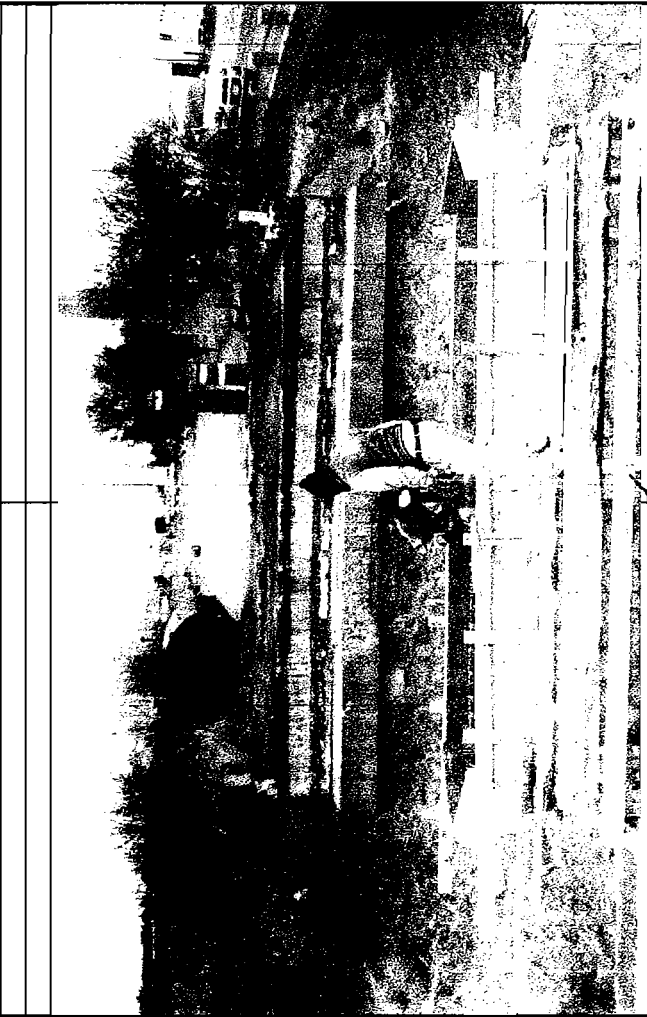
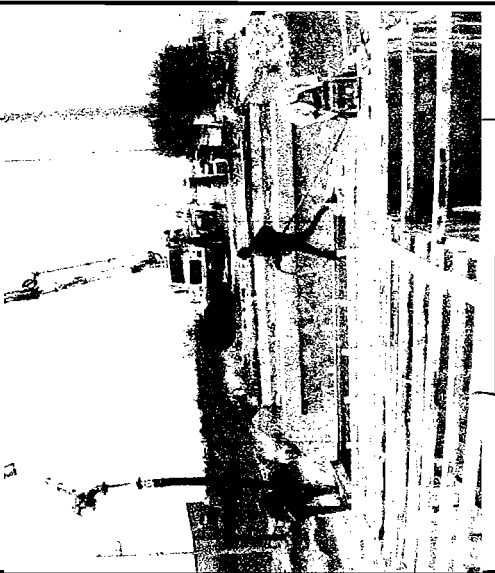
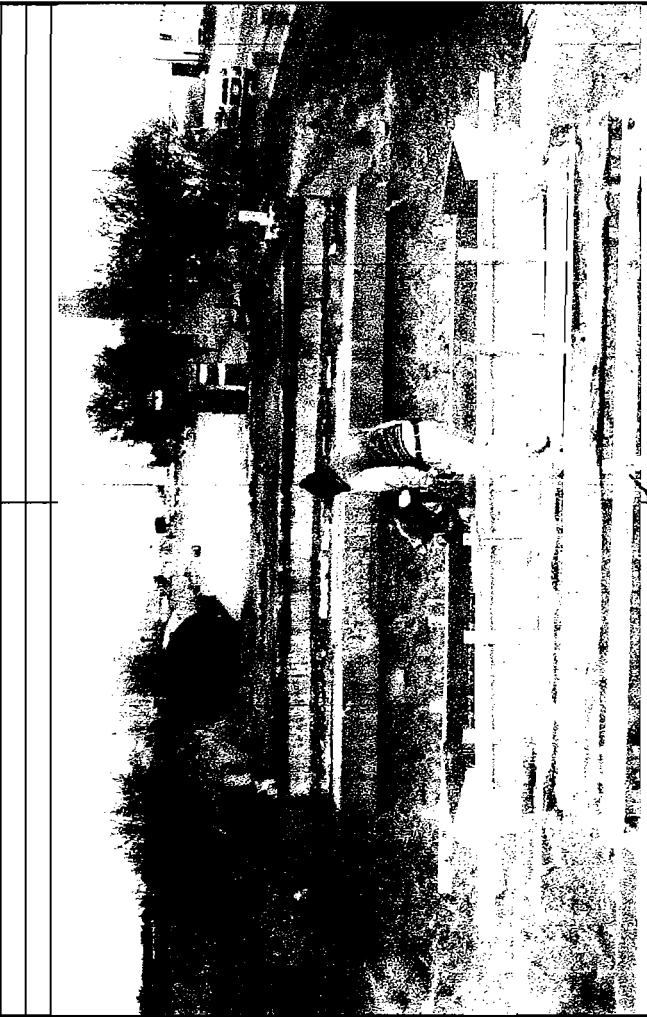
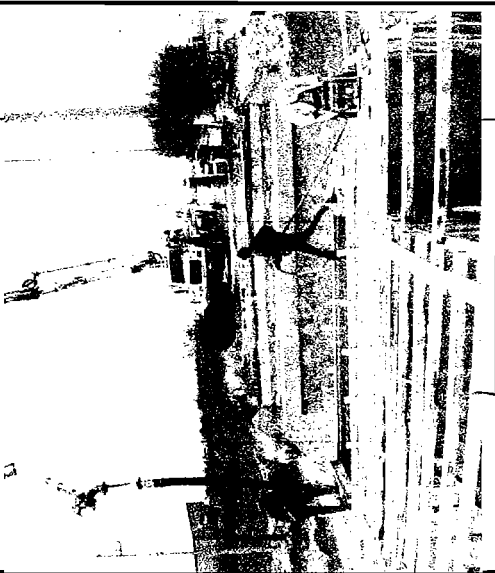
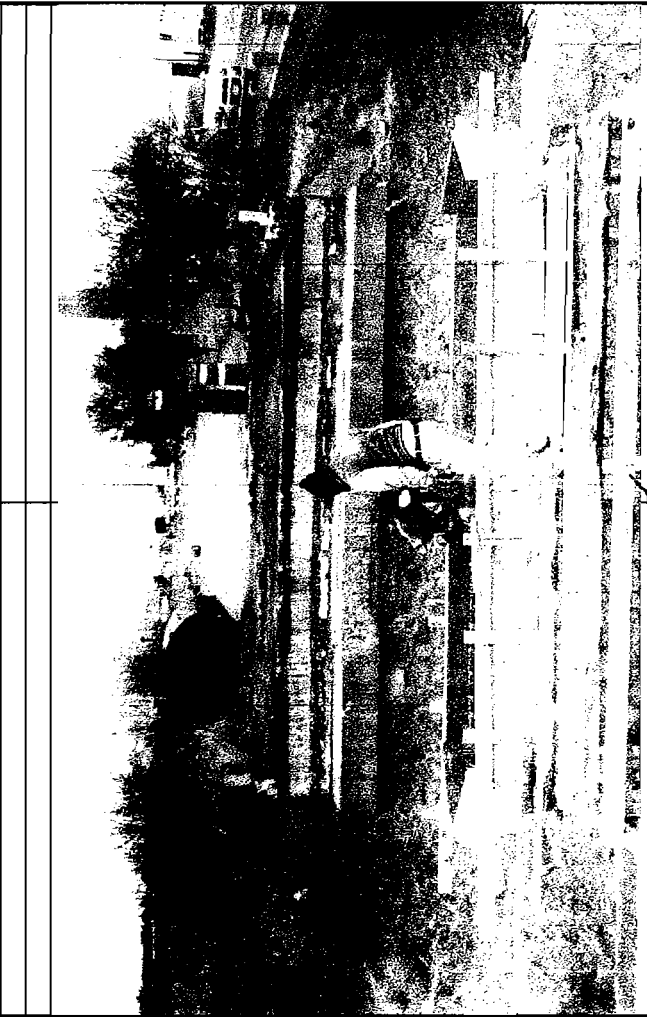
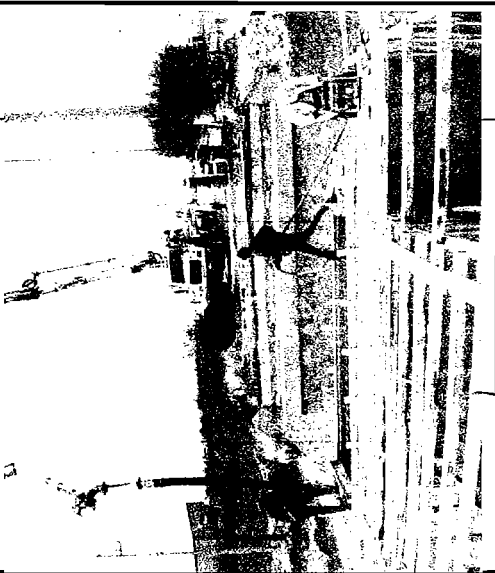
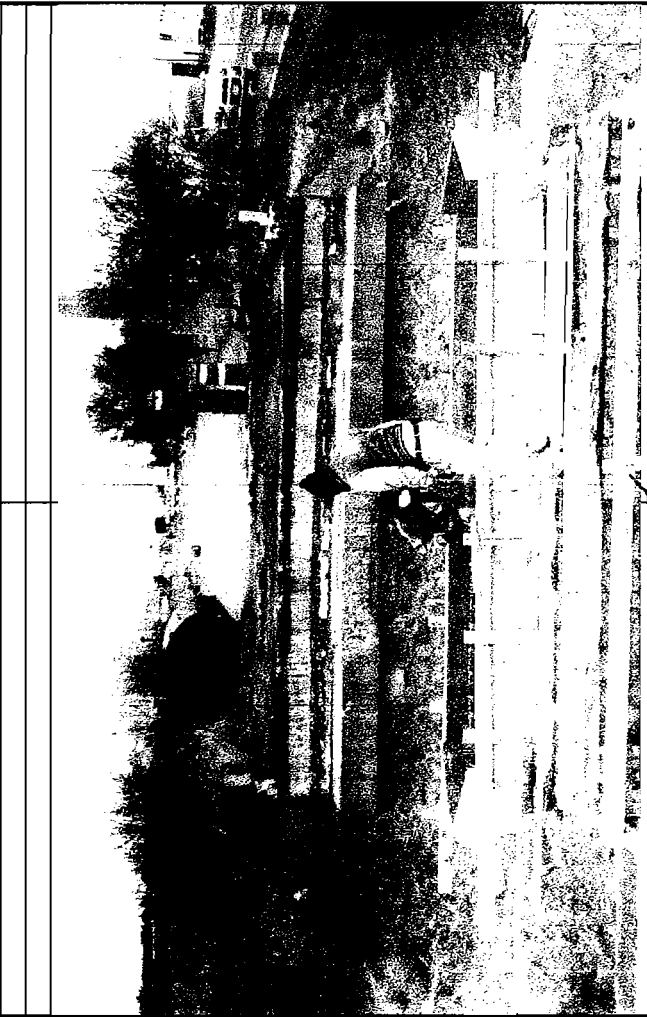
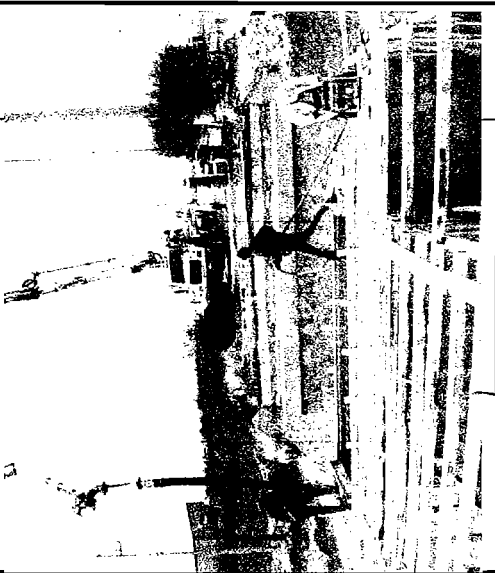
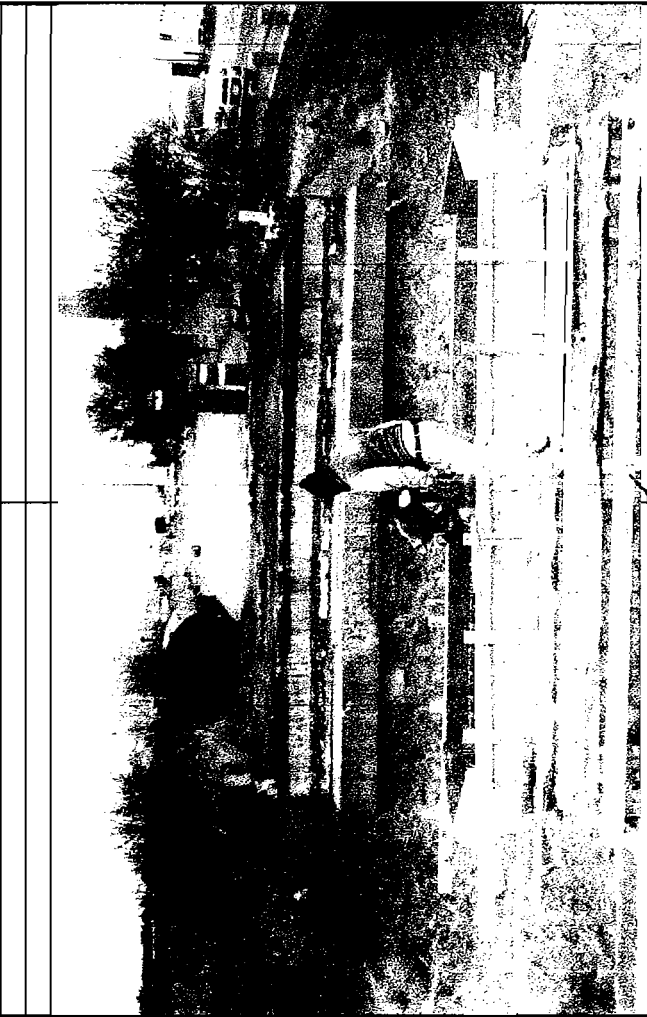
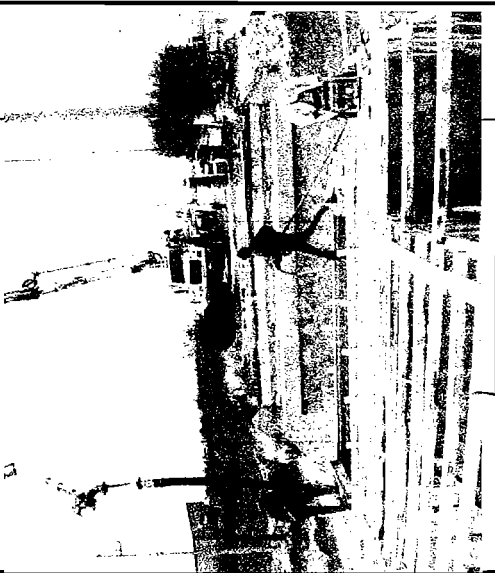
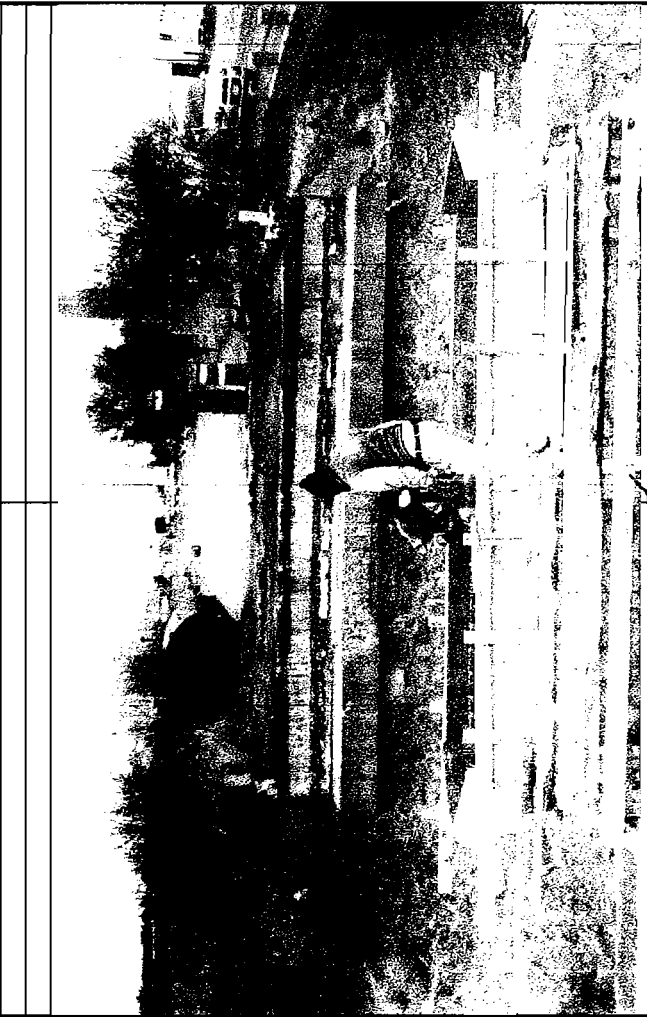
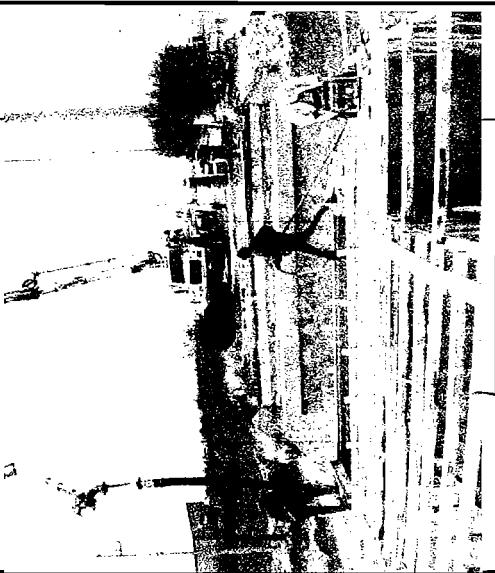
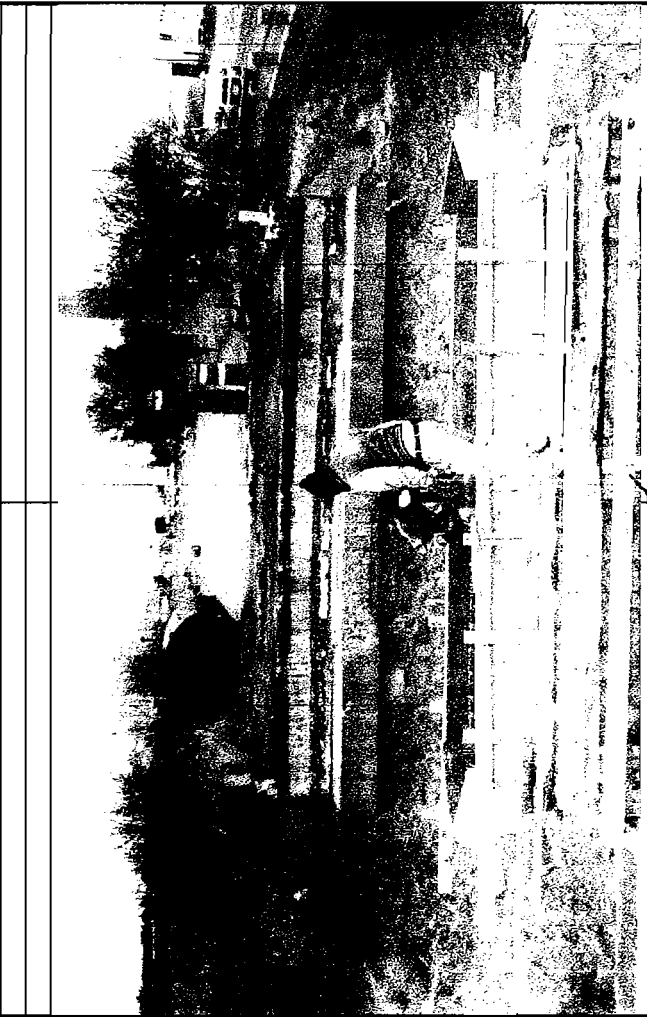
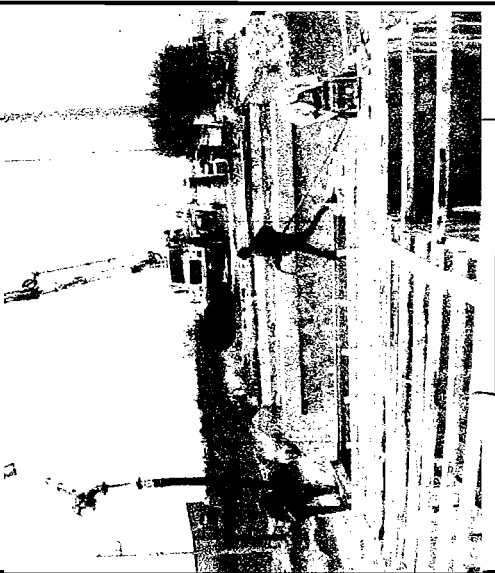
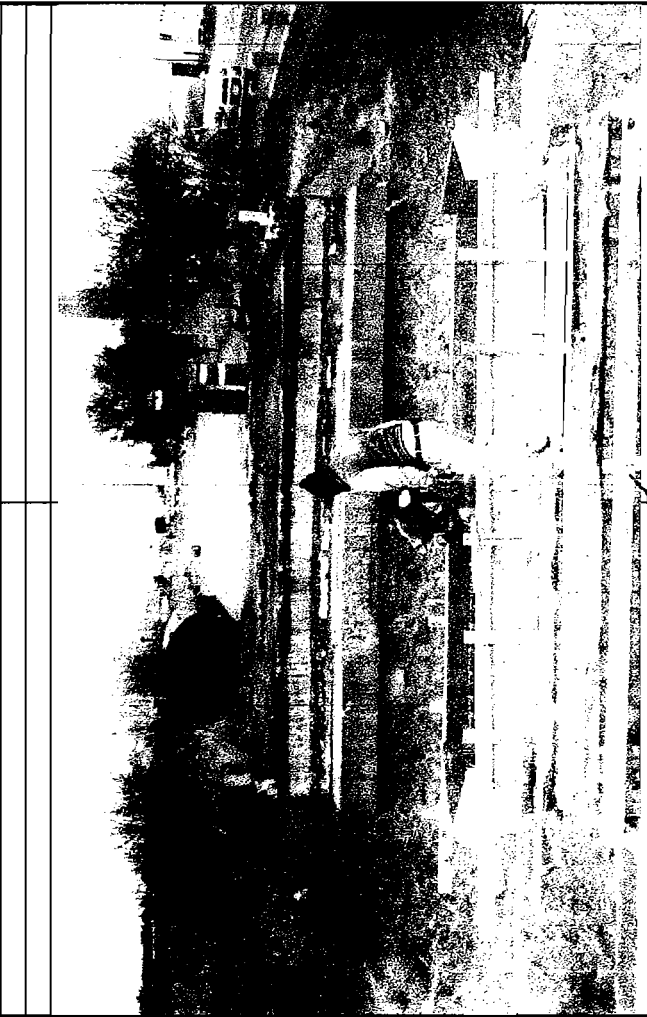
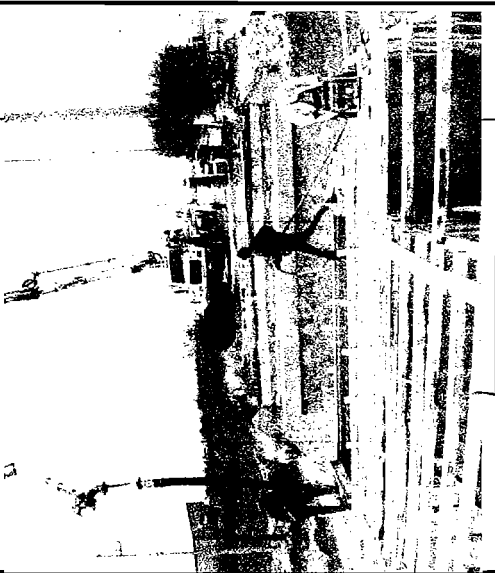
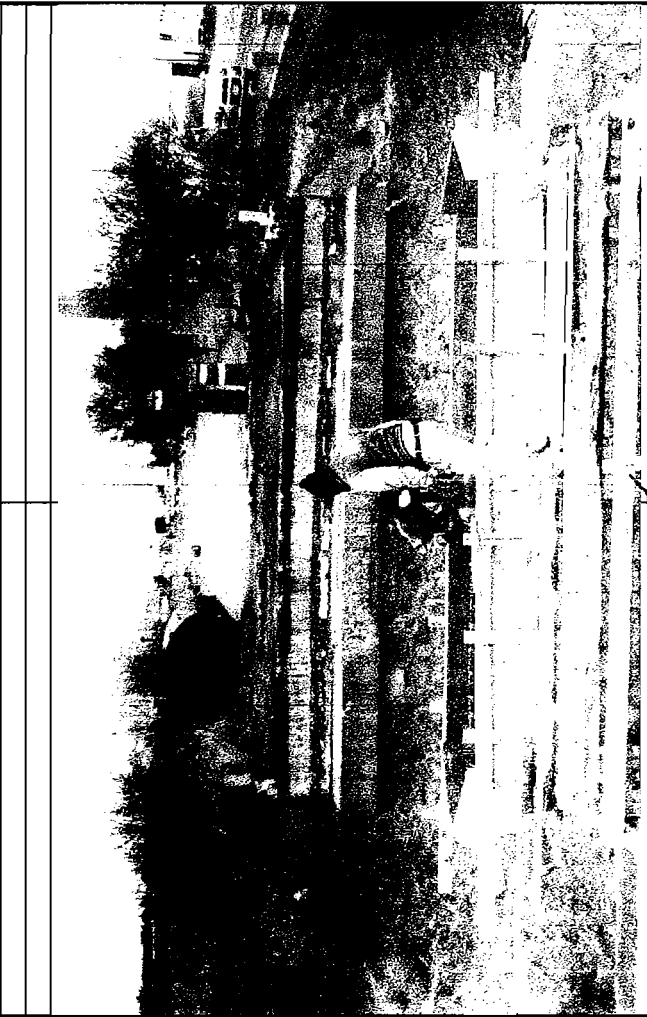
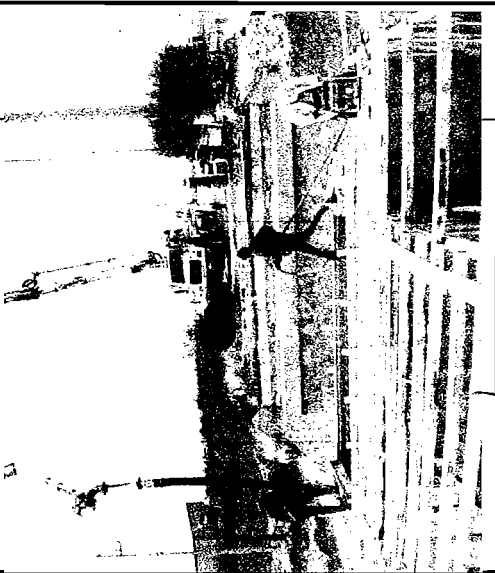
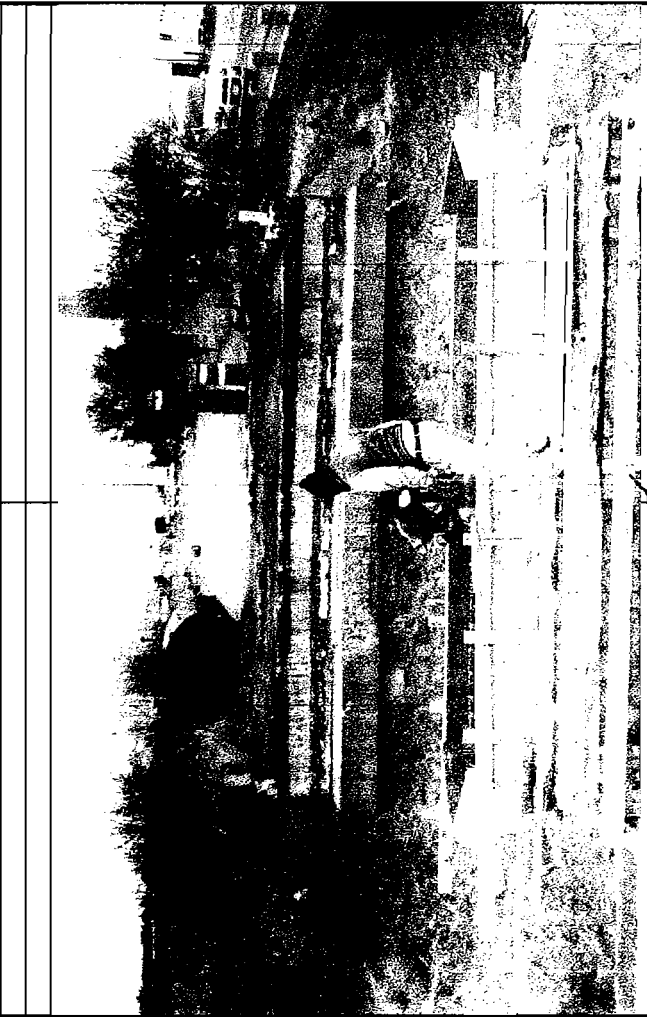
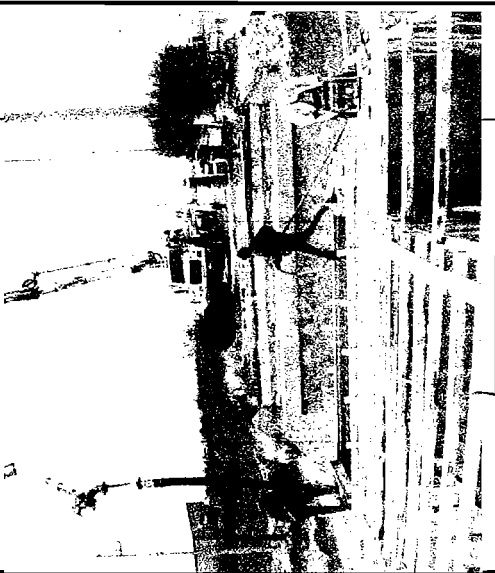
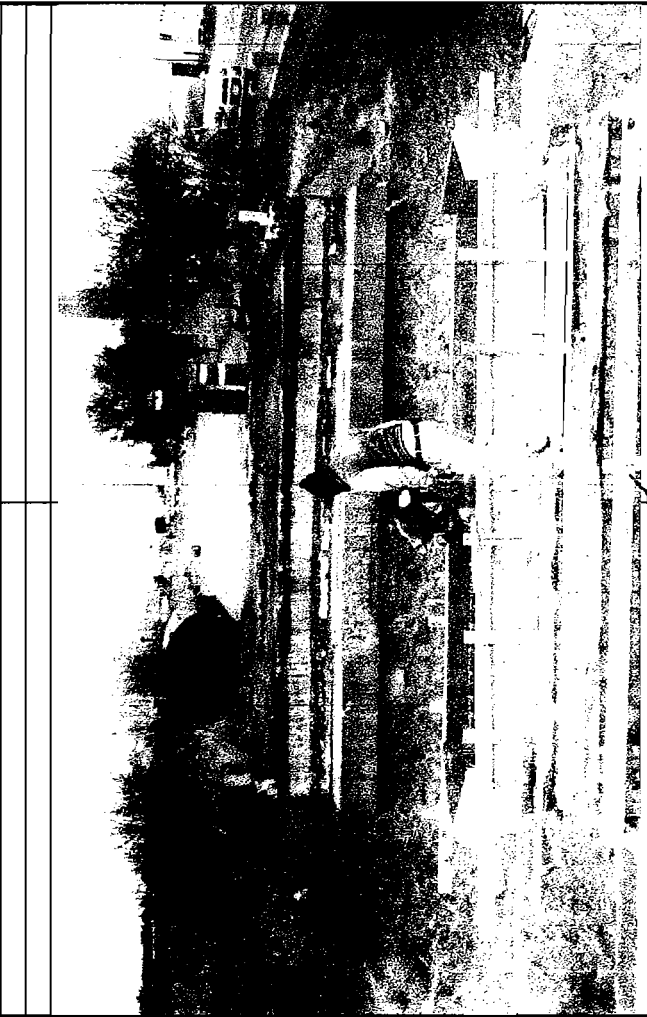
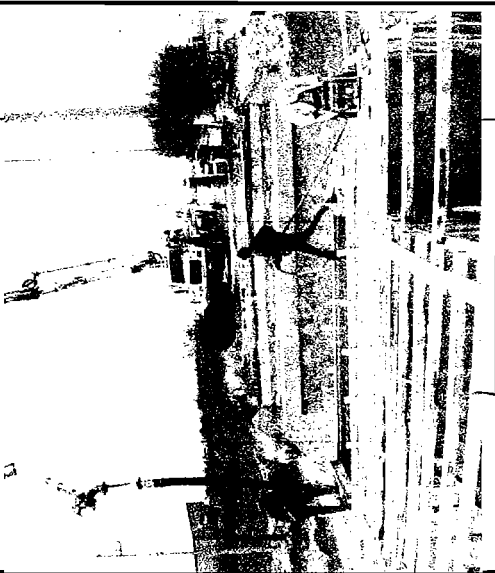
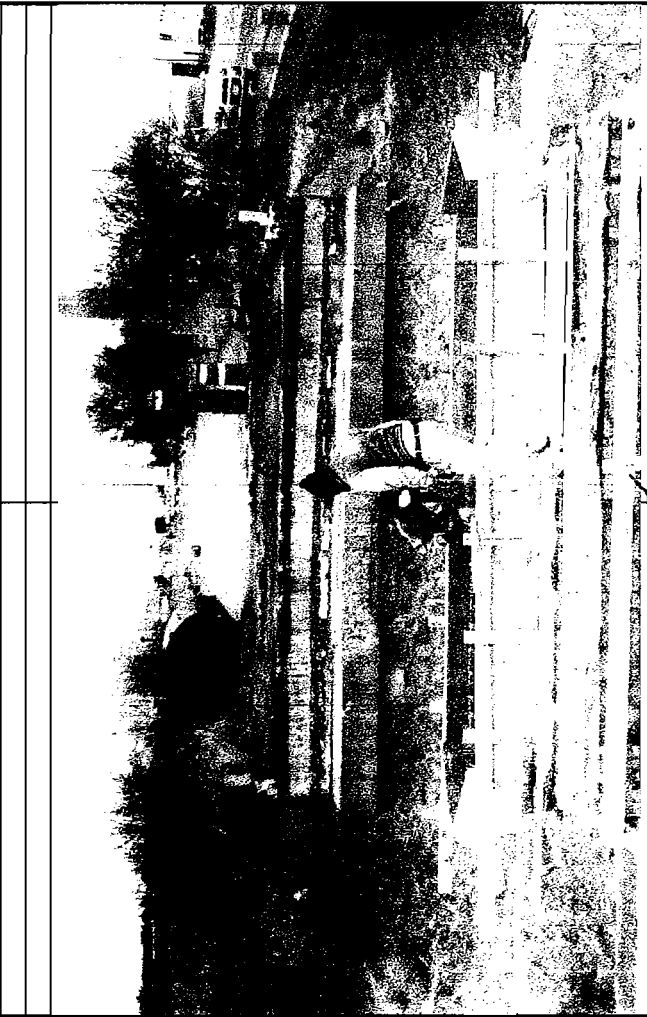
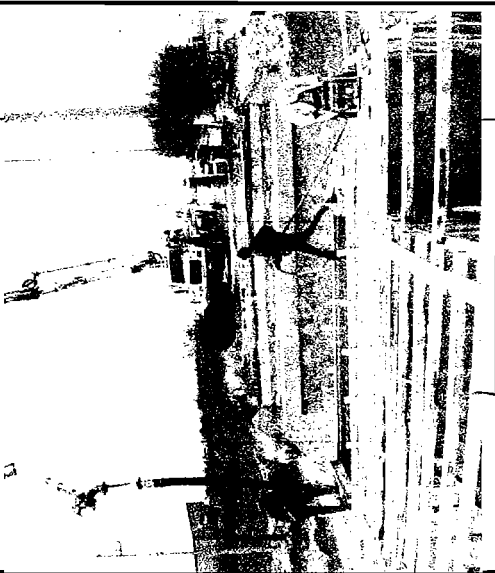
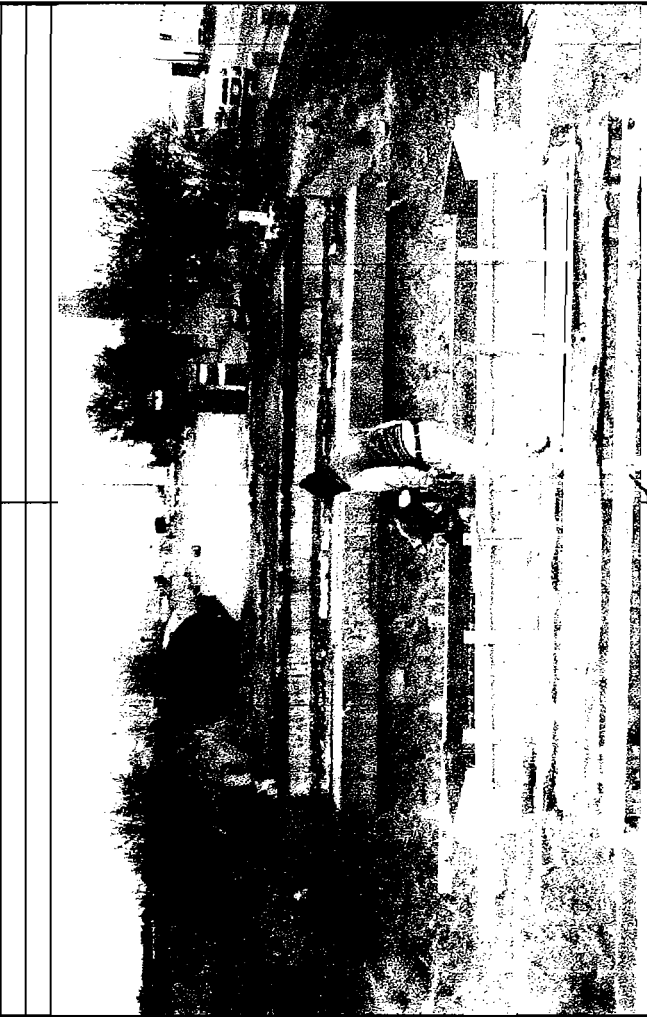
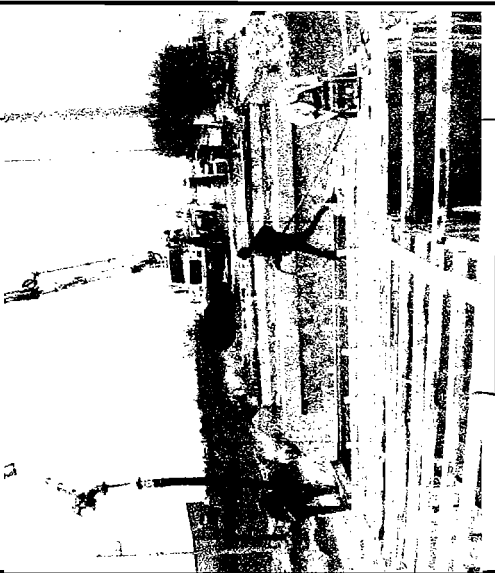
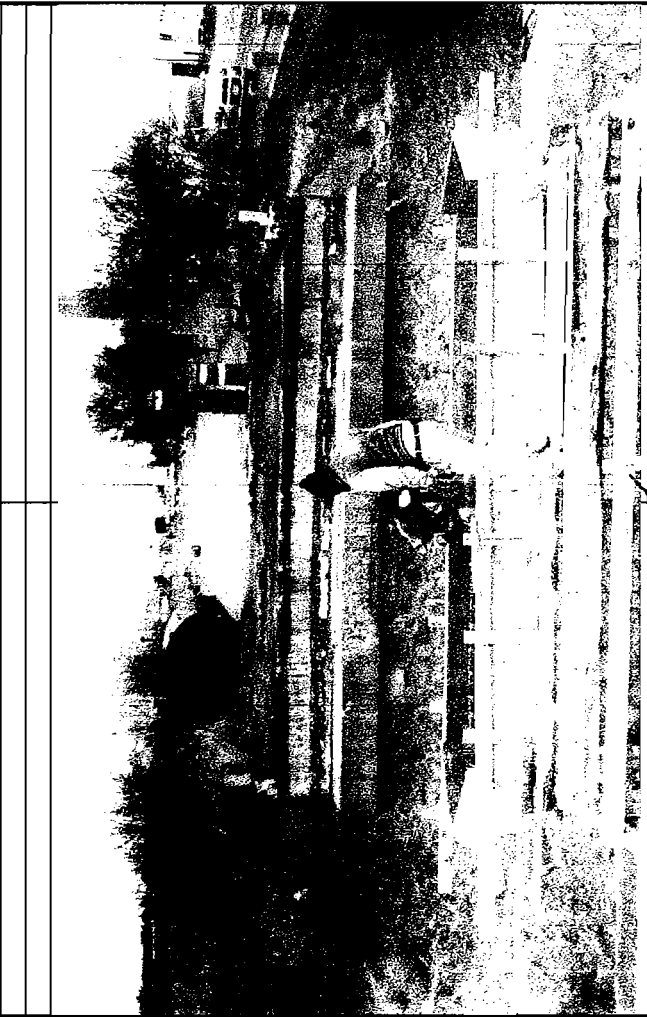
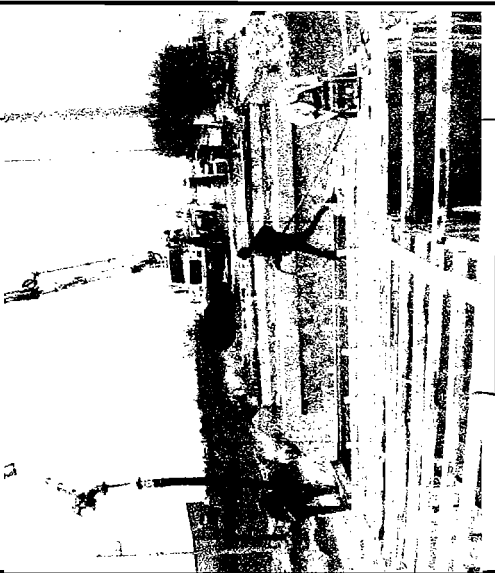
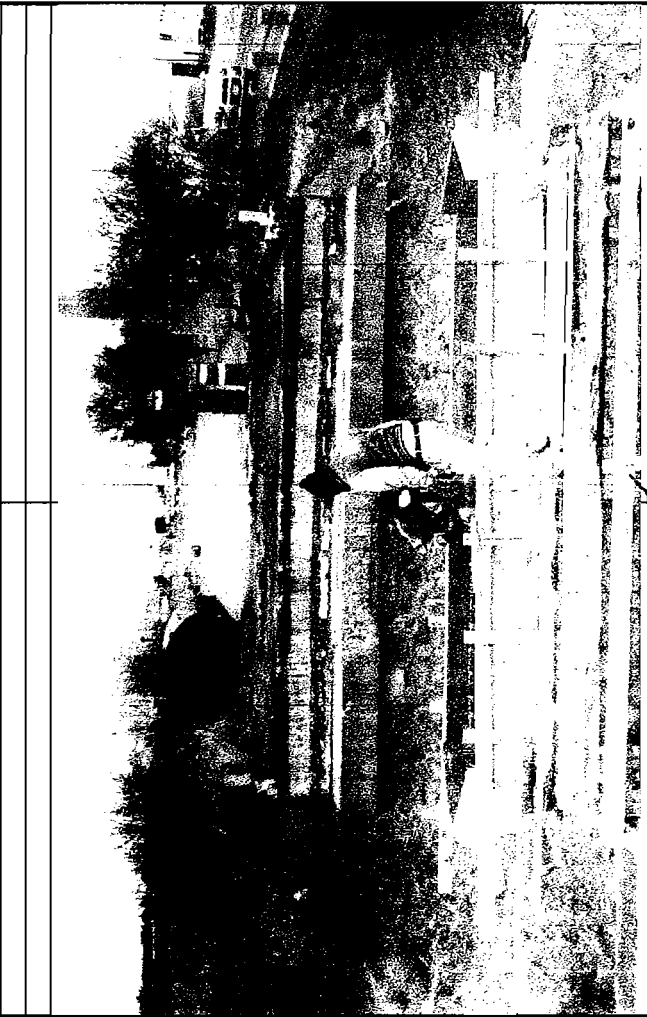
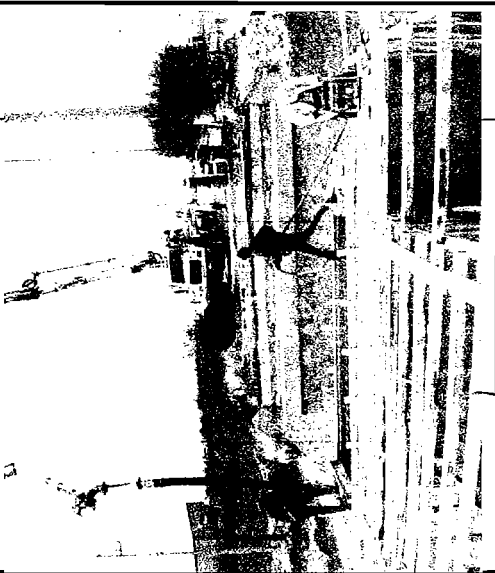
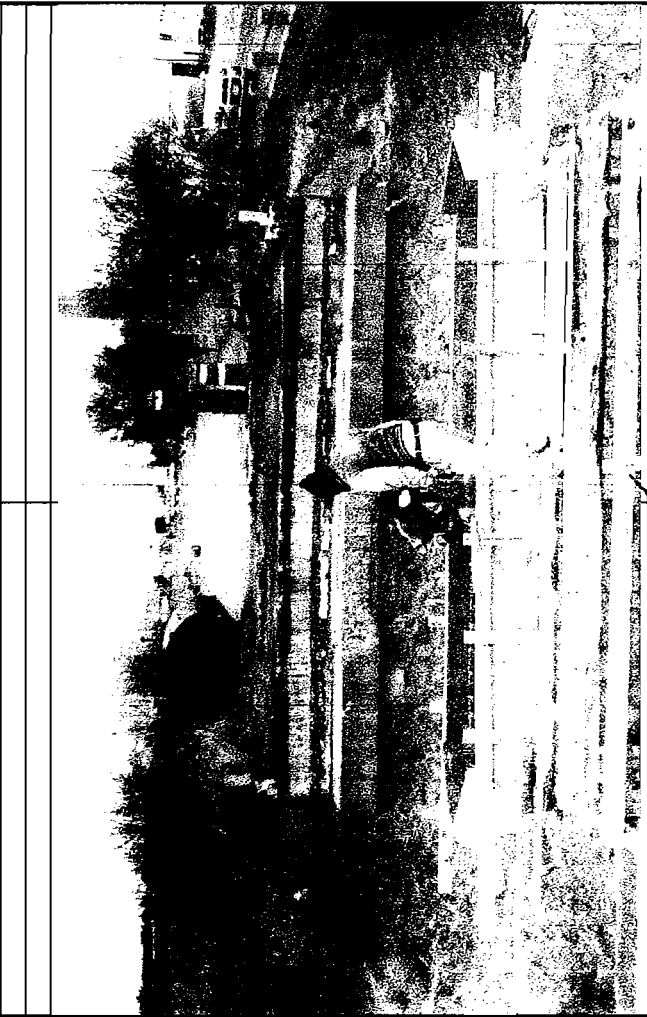
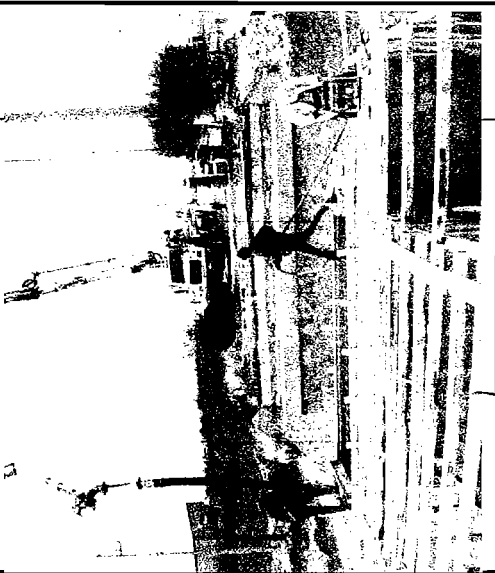
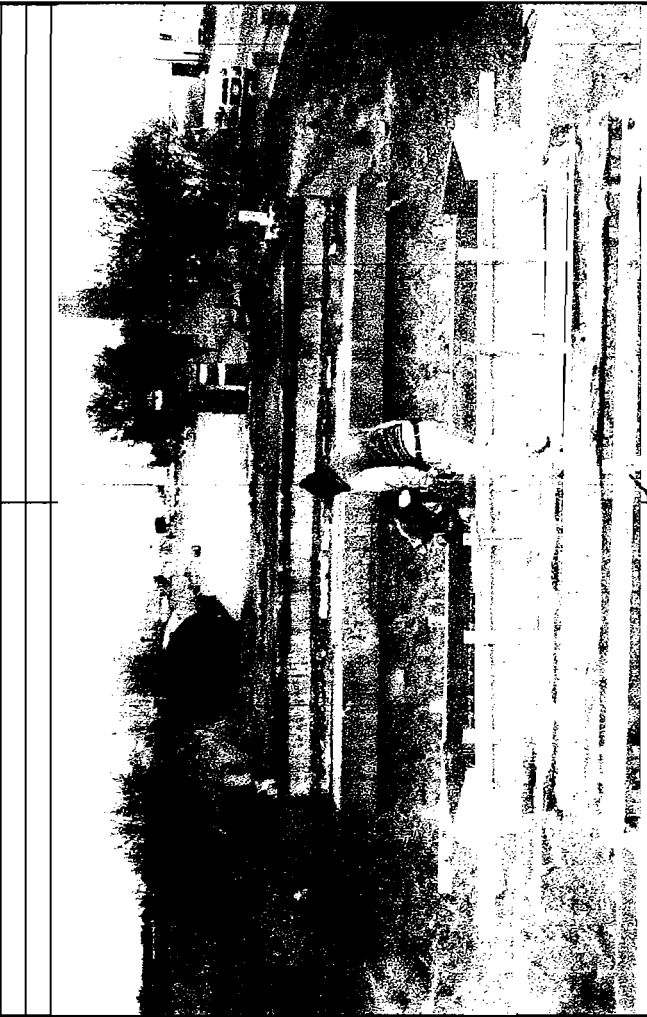
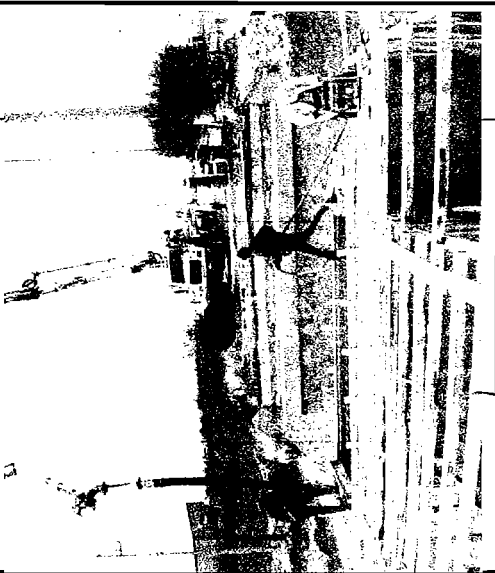
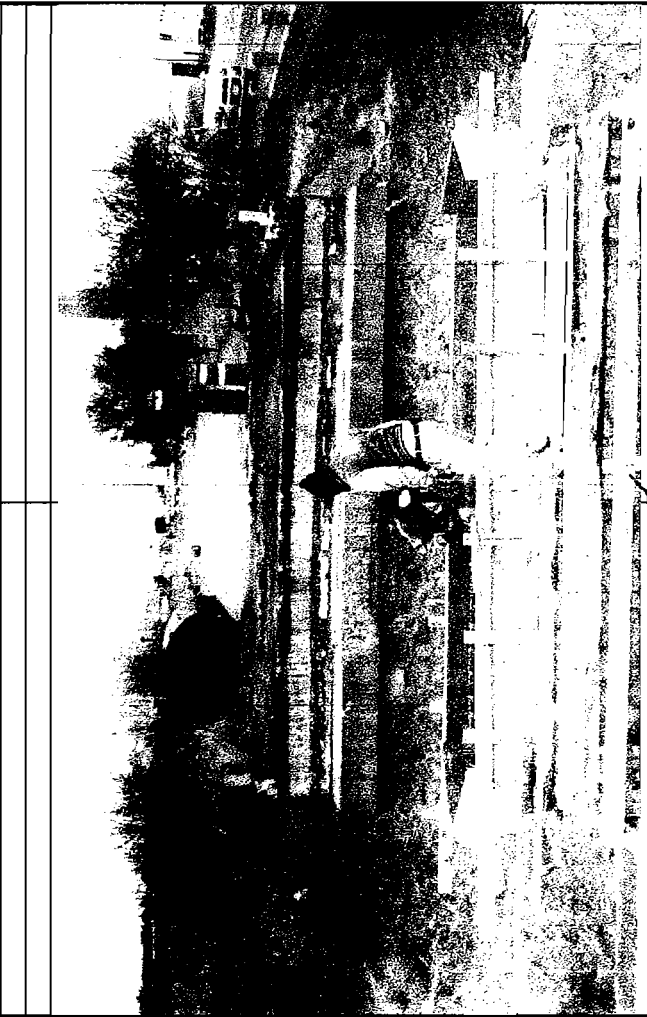
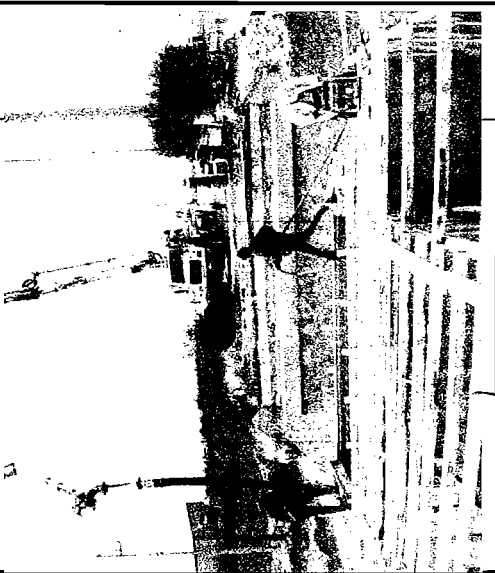
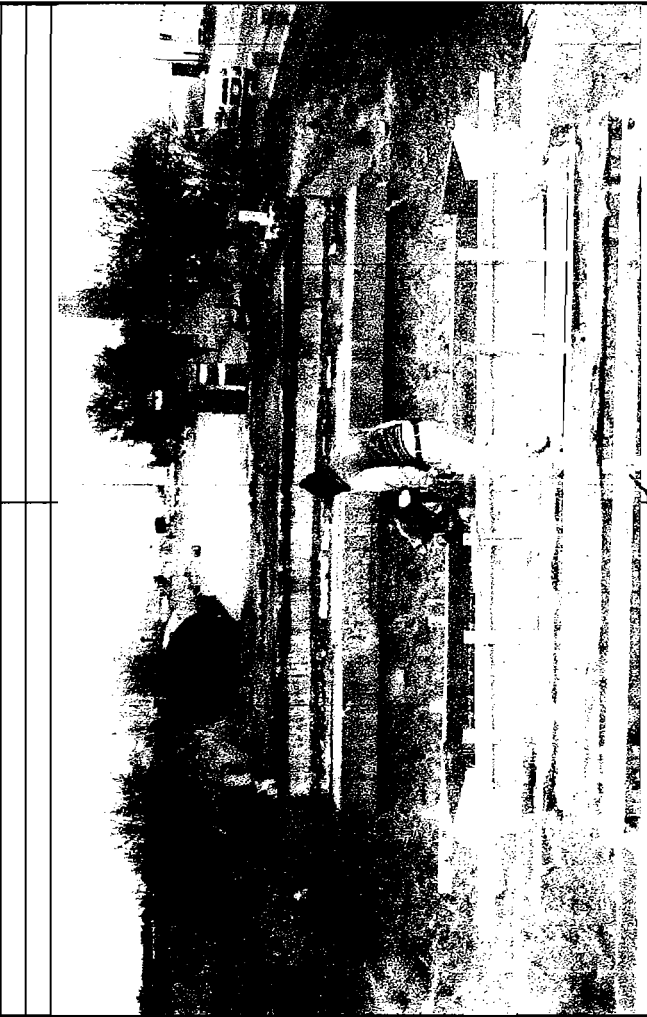
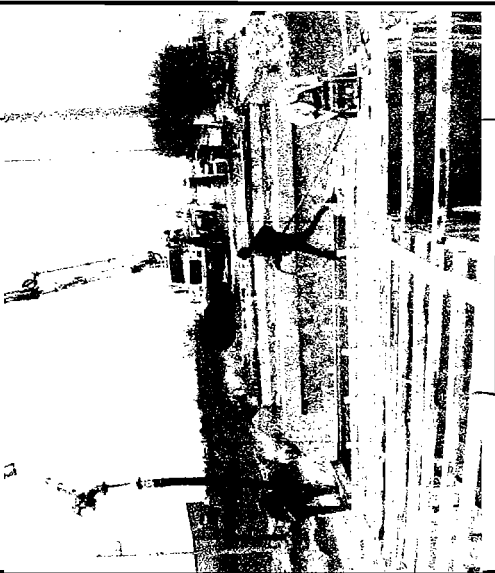
ING. OSCAR REYES LOPEZ

HOJA 1 / 4

CONTRATISTA
ARQ. HECTOR M. ESTRADA ARAGONES

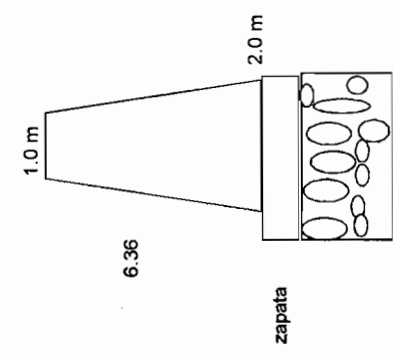
ING. OSCAR REYES LOPEZ

HOJA 214

CONTRATO 265/2016		REFERENCIA: LATITUD 28.635772, LONGITUD -105.981893	
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR.		CONTRATISTA: ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES	
OBRA:			
No De ESTIMACION: 4		PERIODO : 01 DE FEBRERO AL 23 DE FEBRERO DE 2017	
CONCEPTO	E. P-10.	OPERACIONES ARITMETICAS	
CORONA EN PUENTE CON SECCION DE 1.2 MTS. DE ANCHO X 0.4 MTS. DE ALTO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 1/2" COMO ESPECIFICA PROYECTO INCLUYE CIMBRA , CANDADOS (6 PZAS) , ANDAMIOS Y MEMBRANA DE CURADO.		0.60m 5 metros 0.60 m	
		VOLUMEN A PAGAR 6.20 ML	
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 4 / 4

CONTRATO 265/2016		REFERENCIA: LATITUD 28.635772, LONGITUD -105.981893	
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR.		CONTRATISTA: ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES	
No DE ESTIMACION: 4 PERIODO : 01 DE FEBRERO AL 23 DE FEBRERO DE 2017		CROQUIS Y FOTO	
CONCEPTO EXT-1	OPERACIONES ARITMETICAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO CICLOPEO DE Fc= 150 KG/CM2 CON PIEDRA BOLA, PROPORCION 50/50 EN MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL DE CIMENTACION DE ZAPATA DE MAMPOSTERIA.		
		VOLUMEN A PAGAR 21.25 M3	
			
RESIDENTE ING. OSCAR REYES LOPEZ		CONTRATISTA ARQ. HECTOR M. ESTRADA ARAGONES	



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

Departamento de Construcción
Oficio No. D-1026/2017

13 de febrero de 2017.

ARQ. HÉCTOR MANUEL ESTRADA ARAGONÉZ
P R E S E N T E.-



Con relación a la Obra: "REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR", que al amparo del Contrato No. 265/2016 ejecuta su representada; Al respecto, anexo al presente, me permito enviar a Ud., copia del Acuerdo de Reprogramación del plazo de ejecución de la obra citada por caso fortuito o causa de fuerza mayor.

Así mismo, se le solicita presente a la brevedad posible, el programa de obra de acuerdo al periodo autorizado en el citado Acuerdo.

Sin otro particular, quedo de Ud.

ATENTAMENTE


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.-ING. CARLOS AGUILAR GARCIA.-Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA.-Jefe del Departamento de Construcción.
C.c.p.-ING. OSCAR REYES LÓPEZ.-Residente de Obra
C.c.p.-Archivo.

CHCG/CAG/ELDS/geri


RECIBI
13 FEB 2017
ING. IRIS SINECIO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

ACUERDO DE REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 265/2016 POR
CASO FORTUITO O CAUSA DE FUERZA MAYOR

ACUERDO QUE EMITEN EL C. ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL, SIENDO ASISTIDO POR LOS CC. ARQUITECTO CARLOS AGUILAR GARCIA, SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA E INGENIERO EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA, PARA HACER CONSTAR LA REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 265/2016, CONSISTENTE EN: "REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR", POR CASO FORTUITO O CAUSA DE FUERZA MAYOR.

En Chihuahua, Chih., siendo las 13:00 horas del día 13 de febrero del 2017, el suscrito Director de Obras Públicas, asistido por el Subdirector de Infraestructura Urbana y la Jefe del Departamento de Construcción de la Subdirección de Infraestructura Urbana, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 70 ultimo párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua; y en el ejercicio de las facultades conferidas en el Artículo 71 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, emito el presente Acuerdo que autoriza la reprogramación del plazo de ejecución por motivo de caso fortuito o causa de fuerza mayor, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

- I.- Con fecha 21 de diciembre de 2016, se celebró con la empresa: ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONÉZ., el Contrato de Obra Pública No. 265/2016, el cual tiene como objeto la: **REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR.**, por un monto de \$ 2'177,556.79 (dos millones ciento setenta y siete mil quinientos cincuenta y seis pesos 79/100 M.N.) Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, estableciéndose un plazo de ejecución de 60 días naturales comprendidos dentro del periodo del 22 de diciembre de 2016 al 19 de febrero



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PUBLICAS**

ACUERDO DE REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 265/2016 POR
CASO FORTUITO O CAUSA DE FUERZA MAYOR

del 2017, pactándose que para el inicio de los trabajos no se hará entrega de anticipo.

II.- Mediante escrito S/N de fecha 10 de febrero del año en curso, el contratista solicita una prórroga para la conclusión de los trabajos para el día 28 de marzo del año en curso, debido a las circunstancias que afectaron el avance de la obra y que se encuentran plasmadas en las Notas de Bitácora No. 11, 12, 13, 14 y 19 de fechas 09, 10, 25 de enero y 07 de febrero respectivamente, en las cuales se asienta que se localizaron tuberías de conducción de aguas residuales, las cuales por motivo de esta obra, se requiere su relocalización por parte de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento, adicionalmente al demoler las pilas y la cimentación se observó que el estrato de suelo es de material inestable, por lo que se tuvieron que realizar trabajos adicionales para el reforzamiento del suelo de cimentación, una vez evaluada la solicitud de la empresa contratista, se consideran 30 (treinta) días naturales no imputables al contratista.

ACUERDO

PRIMERO. - Con base en los antecedentes y motivos antes expuestos y con fundamento en el último párrafo del artículo 70 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, se reprograma el plazo de ejecución del Contrato de Obra Pública No. 265/2016, estableciéndose como nuevas fechas de inicio y terminación de la obra, los días **22 de diciembre de 2016 y 21 de marzo de 2017**, respectivamente.

SEGUNDO.- Notifíquese a: **ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONÉZ**, el contenido y alcance legal del presente acuerdo.

"2017. Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

ACUERDO DE REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 265/2016 POR
CASO FORTUITO O CAUSA DE FUERZA MAYOR

ACUERDO que se dicta y firma para constancia en la Ciudad de Chihuahua,
Chih., a los trece días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.

EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

EL SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACUERDO DE REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Nº. 265/2016, RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFÉRICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO
LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR.

CONTROL DE TRAMITE DE ESTIMACIONES

DATOS GENERALES			
FOLIO	NUMERO DE ESTIMACION	FACTURA	SALDO NETO
	4		724,911.98
OBRA	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR.		
CONTRATISTA:	ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES	UBICACIÓN	PERIFERICO LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES
RESIDENTE	ING. OSCAR REYES LOPEZ	CONTRATO No.	265/2016

RESUMEN DE AUTORIZACIONES				
AUTORIZACION DE:	FECHA Y FIRMA RECIBIDO	FECHA Y FIRMA ENTREGA	CONTROL DE OBRA	
			FECHA Y FIRMA RECIBIDO	FIRMA Y FECHA ENTREGA
RESIDENTE				
JEFE DEPARTAMENTO				
SUBDIRECTOR				
* DIRECTOR				

EN CASO DE 1ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	

EN CASO DE 2ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	

EN CASO DE 3ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	



Dirección de Obras Públicas
Subdirección de Infraestructura Urbana
Departamento de Construcción
