

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL**

INFORMACIÓN BÁSICA

OBRA: "CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES"


CARACTERÍSTICAS: LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN DE EXPOSICIÓN EN EL CALLEJÓN CONTIGUO AL MUSEO CASA SIGLO XIX Y DENTRO DEL MUSEO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA AREA DE CAFETERIA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN SE COLOCARAN MARCOS METÁLICOS A BASE DE VIGAS IPR DE 8" Y COLUMNAS DE PTR VERDE DE 4"X4", POLINES MONTEN DE 8" CAL 14, SOBRE CIMENTACIÓN AISLADA DE 1.00X 1.00X0.20 M DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, EN LA CUBIERTA SE COLOCARA LAMINA DE ACRÍLICO CON DISEÑO MODERNO. EN LA CAFETERÍA SE COLOCARAN ZAPATAS AISLADAS DE 1.00 X 1.00 X 0.20 PARA LA CREACIÓN DE UN MEZZANINE, SOPORTADO POR COLUMNAS METÁLICAS DE 3.00 MTS DE ALTURA A BASE DE VIGA IPR DE 10" X 5 3/4", POLÍN DE 8" CAL. 14 EN STRUT, TRABE T-2 DE IPR DE 10X 5 ¾", PARA EL ENTREPISO DEL MEZZANINE SE COLOCARA LOSACERO DE LÁMINA DECK 25 CAL 24 CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6/6-6 DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA METÁLICA A BASE DE CANAL 6" CON HUELLAS DE ANGULO Y LAMINADO PLÁSTICO, SE COLOCARA FALSO PLAFÓN, TAMBIÉN SE CONTEMPLA LA COLOCACIÓN DE ACABADOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SALIDAS HIDROSANITARIAS.

CONTRATO: 197/2017
MONTO DE CONTRATO: \$1,960,706.10
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V.

CALENDARIZACIÓN

FECHA PROGRAMADA DE INICIO, SEGÚN CONTATO: 26/12/2017
FECHA DE INICIO REAL: 26/12/2017
FECHA DE TERMINO , SEGÚN CONTATO: 24/04/2018
FECHA DE TERMINO REAL: OBRA EN PROCESO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

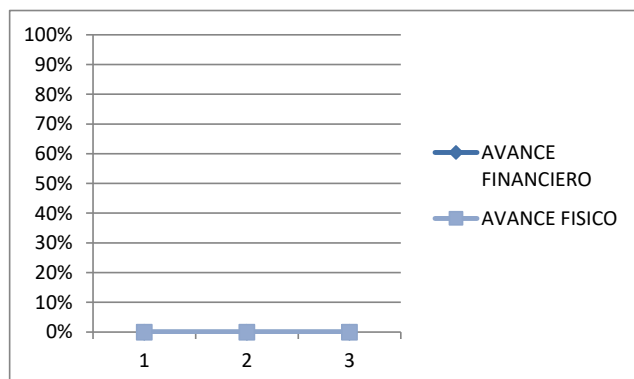

MES	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
OCTUBRE:	0.00%	0%
NOVIEMBRE:	0.00%	0%
DICIEMBRE:	0.00%	0%
TOTAL:	0.00%	0%
