

L.M.

JUAN CARLOS CANO DEL VAL
R.F.C.: CAVJ610125KQ4
ROMA 2204
MIRADOR CHIHUAHUA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO C.P. 31205
Reg. Fiscal: ACT. EMPRESARIAL

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 02
Condiciones de Pago: CONTADO
Número Cuenta Pago: NO IDENTIFICADO

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN	No. CERTIFICADO DEL EMISOR	PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI
CHIHUAHUA, CHIH., 2017-03-07T15:47:30	00001000000301647436	AURORIAN S.A. DE C.V. No CERT: 00001000000404624465
LUGAR Y FECHA DE CERTIFICACIÓN	FOLIO FISCAL	SERIE Y FOLIO
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, 2017-03-07T16:47:35	8333dd5f-9c21-4b7a-98cd-c0389599a197	127

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22
MINA 408
CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000

DESCRIPCIÓN

CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y BAÑOS, TELESECUNDARIA EJIDO LA ESPERANZA

ESTIMACION NUMERO 4 (CUATRO)
SEGUN CONTRATO NUMERO 102/2016

FIRMA DEL CONTRATISTA

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 18,807.45
AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$

RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO
C.M.I.C. 0.2 % \$ 37.61
I.C.I.C. 0.2 % \$ 37.61
D.I.F. 0.2 % \$ 37.61
1 % SANCION POR RETRASO \$ 188.07

NETO A RECIBIR \$ 21,515.73


SUB-TOTAL \$ 18,807.45
I.V.A. 3,009.19
TOTAL \$ 21,816.64

*VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 64/100



SELLO DIGITAL DEL SAT
VJULnP5y1BulxehYllayX5oYciaUfQ1yoyXHqIFoQhUq1o1NMaVO3FbSsKsSwX24gRtrMSxoP/KYqmXCpkOHG9UF4UTi6fsdBBPdVN6uR1h ZIGfMwWu5tBYRyspJDUGbpQIjYsreBi1QE+Fc1YEqd52IXBnWSWXUS7q05TGhCzyRsiQnT3eHhcgQEvHCvulWzNABD8nUlusI5EWo7Z8+r3epPaCdmHqgusVDDg7AXm1BdtCWeh
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
XujwuXhn7B+KfKz24vp5UrwUVPD1l9Y2QXIG0fM9WLK5TRC2FCW2bKQDOJw+nQ1CBi9N2x70JkzXVJdHQ/amc4WwmRoJshUHehEvznRm 3PHpVIZ+e+VGpH2ilvBldhqsrdOkKA7SnWuUf4AcGnTMGJBjRldzulo4SK0=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
1.0 8333dd5f-9c21-4b7a-98cd-c0389599a197 2017-03-07T16:47:35 XujwuXhn7B+KfKz24vp5UrwUVPD1l9Y2QXIG0fM9WLK5TRC2FCW2bKQDOJw+nQ1CBi9N 2x70JkzXVJdHQ/amc4WwmRoJshUHehEvznRm3PHpVIZ+e+VGpH2ilvBldhqsrdOkKA7SnWuUf4AcGnTMGJBjRldzulo4SK0= 00001000000404624465

Este documento es una representación impresa de un CFDI



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

X

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
CAVJ610125KQ4	JUAN CARLOS CANO DEL VAL	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
8333DD5F-9C21-4B7A-98CD-C0389599A197	2017-03-07T15:47:30	2017-03-07T16:47:35	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$21,816.64	ingreso	Vigente	

Impulsar

Cu



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
SUBDIRECCION DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

CONTRATO

102/2016

IMPORTE CONTRATO

\$465,952.47

CON IVA

CONTRATISTA

ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL

PERIODO DE EJECUCION

10 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2016

OBRA/ SERVICIO

CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA Y BAÑOS TELESECUNDARIA" EJIDO LA ESPERANZA

REPROGRAMACIÓN AUTORIZADO
CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO

MONTO PROGRAMADO DE CONTRATO

\$401,683.16 SIN IVA

IMPORTE PENDIENTE

\$18,807.45 SIN IVA

FUERA DE PROGRAMA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CALCULO DE RETENCION/SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA
DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA DEL CONTRATO

CONCEPTO	IMPORTE FUERA DE PROGRAMA	SANCIÓN / RETENCIÓN DEL 1.0%/MES	NUMERO DE MESES DE RETRASO	IMPORTE DE SANCION	IMPORTE DE REINTEGRO	ESTIMACION No. 4 (PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2016)
INCISO B	\$18,807.45	\$188.07	1.00	\$188.07		
TOTAL						\$188.07 SIN I.V.A.

ELABORO:

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ

REVISO:

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN

Vo.Bo.

Xóchitl Pérez Blanco
ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

CHIHUAHUA, CHIH., SEPTIEMBRE 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 102/2016	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y BAÑOS TELESECUNDARIA EJIDO LA ESPERANZA	ESTIMACIÓN No. 4(CUATRO)	\$ 465,952.47 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
UBICACIÓN: EJIDO LA ESPERANZA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 21,816.63 CON IVA
CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	344,165.43
RFC COS-120125-CA2	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 365,982.06 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 16,899.97	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ 1,907.48	
<u>EXTRAORDINARIOS</u>	\$	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 18,807.45

DESCUENTOS

0.1% Sancion por Retraso	188.07
0.2% C.M.I.C.	37.61
0.2% I.C.I.C.	\$ 37.61
0.2% D.I.F.	\$ 37.61

SUMA DESCUENTOS \$ 300.90

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 18,807.45
MORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 18,807.45
I.V.A.	\$ 3,009.19
TOTAL	\$ 21,816.64

(CON LETRA)

(VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 64/100
M.N.)

DESCUENTOS	\$ 300.90
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 21,515.73

AUTORIZO

ELABORO

Jesus m. Franco
ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
RESIDENTE D.O.P.M

Juan Carlos Cano del Val
ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL
CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

Xochitl Perez Blanco
ING. XOCHITL PEREZ BLANCO
SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA
E INFRAESTRUCTURA

Enrique Villarreal Aleman
ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION

Vo. Bo.

Ramon David Ramos Armenta
ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

CHIHUAHUA, CHIH.

9 DE OCTUBRE DE 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/ DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, LA CANTIDAD DE \$ 21,703.81
(VEINTIUN MIL SETECIENTOS TRES PESOS 81/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 4(CUATRO) CONTRATO No. 102/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 465,952.47
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y BAÑOS TELESECUNDARIA EJIDO LA ESPERANZA

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	18,807.45
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$	18,807.45
	IVA	\$	3,009.19
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO	TOTAL	\$	21,816.64
C.M.I.C. DEL 0.2%	37.61		
I.C.I.C. DEL 0.2%	37.61		
D.I.F. DEL 0.2%	37.61		
SUMA	112.83		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO	
\$	465,952.47
\$	-
\$	344,165.43
\$	21,816.63
\$	365,982.06
\$	99,970.41

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO	
\$	-
\$	-

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% D.I.F. 0.2% C.M.I.C. 0.2% IC.I.C.

ACUMULADO ANTERIOR	\$	576.14	\$	576.14	\$	576.14
ESTA ESTIMACION	\$	37.61	\$	37.61	\$	37.61
ACUMULADO ACTUAL	\$	613.75	\$	613.75	\$	613.75

RECIBIMOS

ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL
COS-420125/CA2

ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL

CHIHUAHUA, CHIH. 9 DE OCTUBRE DE 2016

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ
RESIDENTE LA OBRA

- ANEXO ESTIMACION No. 4(CUATRO) CON FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y BAÑOS TELESECUNDARIA EJIDO LA ESPERANZA

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
POR UN SALDO NETO FACTURADO DE \$21,816.64 CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFIAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE



ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL

RECIBE



ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ

OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA 3AÑOS TELESECUNDARIA EJIDO LA
ESPERANZA

MUNICIPIO JIDO LA ESPERANZA No. CONTRATO

100/2016

ESTIMACIÓN No. 4(CUATRO)

CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

NORMALES

\$ 16,899.97

EXCEDENTES


\$ 1,907.48

EXTRAORDINARIOS

\$

SUBTOTAL	18,807.45
I.V.A.	3,009.19
TOTAL	21,816.64

POR EL CONTRATISTA



ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL

POR EL RESIDENTE




ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 102/2016	TRAMO: EJIDO LA ESPERANZA
OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y BAÑOS TELESECUNDARIA EJIDO LA ESPERANZA	CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL

Nº DE ESTIMACION 4 (cuatro) PERIODO: 01 de sept de 2016

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS
7.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PG DE 1" INCLUYE: MANO DE OBRA, CURVAS, CONDULET TIPO "C", COPLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	15.5 ML
7.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TRIPLEX SUBTERRANEO 3X6 DE ALUMINIO INCLUYE: CONECTORES, CINTA, MANO DE OBRA Y TODO LO	53.2 ml
7.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE UN POLO DE 15 A 50 AMPERES.	4 PIEZAS
7.5 SALIDA PARA CONTACTO DOBLE CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, CONTACTO MARCA BETECINO O SIMILAR, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	2 PZAS

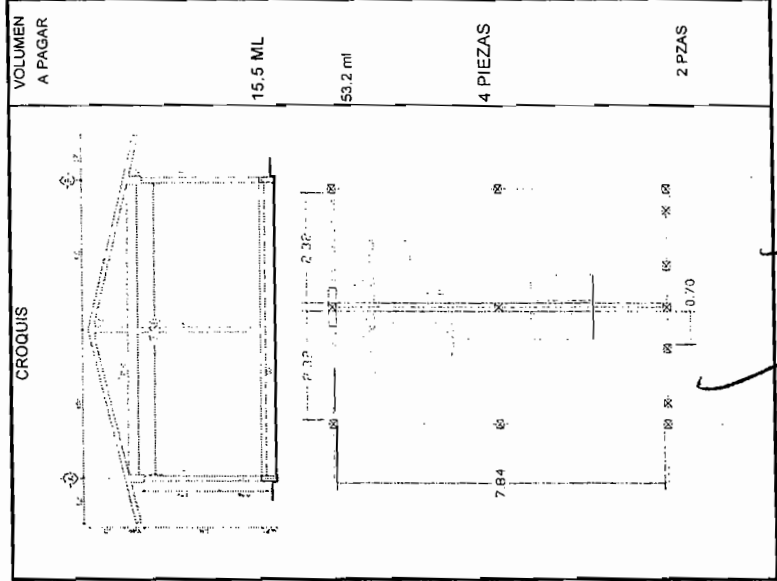

Juan Carlos Cano del Val
RESIDENTE

[Signature]
CONTRATISTA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 102/2016	OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y BAÑOS TELESECUNDARIA EJIDO LA ESPERANZA	TRAMO: EJIDO LA ESPERANZA
		CONTRATISTA: ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL

Nº DE ESTIMACION: 4 Cuatro PERIODO: 01 al 30 de Sept de 2016

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS
7.7	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE 2X32 WATTS, NL CAT. NLSCE30 2 32T-8 127 E MODELO CLASICO DE SOBREPONER DIMENSIONES 122X30X10 CMS FABRICADA EN LAMINA CAL. 24. ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER BLANCO, CON REFLECTANCIA DEL 94% CON 2 LF. 32W. 4100 OK. 2 JUEGOS DE BASES, 1 BALASTRO ELECTRONICO 2X32 W, 127 W, APP. E.I. SOLA BASIC Y DIFUSOR ACRILICO ENVOLVENTE. MARCA NEW LIGHT O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE CABLE Y TUBO DE MONTAJE PARA CABLE.	4 PZAS
7.8	
REGISTRO ELECTRICO 60X60X80 CMS. A INTERIORES A BASE DE TABIQUE 7X14X28 CMS. ASENTADO Y ACABADO PULIDO CON CEMENTO ARENA 1:3. TAPA METALICA DIAMANTADA DE LAMINA CAL. 18, CON MARCO Y CONTRAMARCO (TAPA) A BASE DE ANGULO 1"x1"x3/16 Y 1 1/4" X 1 1/4" X 3/16" RESPECTIVAMENTE ACABADOS CON PINTURA DE ESMALTE REKOR 100 A 2 MANOS COLOR BLANCO. Y LEYENDA DE IDENTIFICACION DE TIPO DE REGISTRO, ANCLAS MISMAS MEDIDAS DEL CONTRAMARCO. AHOGADAS EN CADENA DE CONCRETO ARMADO F'C=150 KG/CM2 DE 15X15 CMS. CON 5 VARILLAS #3, E #2 @ 20 CMS. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2 DE 8 CMS DE	1 PZA

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
	4 PZAS
	1 PZA

Juan m. Franco
RESIDENTE

Juan m. Franco
CONTRATISTA

CONTRATO :	102/2016	TRAMO:	EJIDO LA ESPERANZA
OBRA :		CONTRATISTA:	ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL






TELESECUNDARIA EJIDO LA ESPERANZA
No DE ESTIMACION: Alcatoro PERIODO: 01 al 30 de sept de 2016

[illegible][illegible]

RESIDENTE

~~CONFIDENTIAL~~

FOTOGRAFIAS

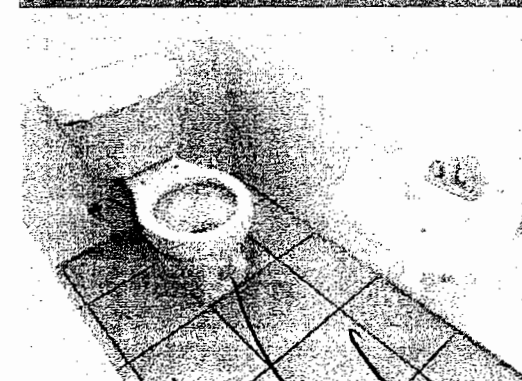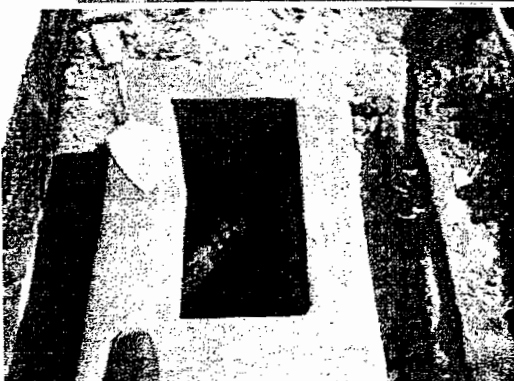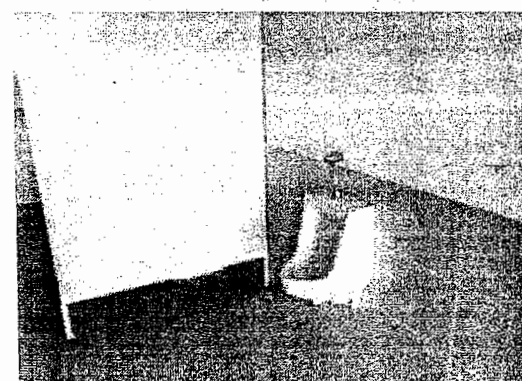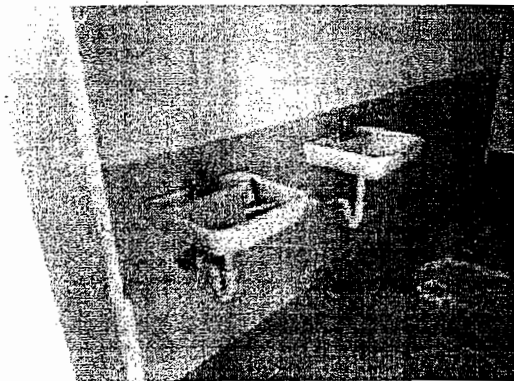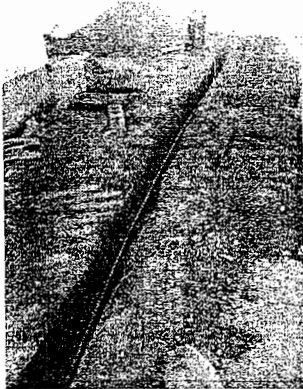

Jr.

Leandro
