



Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: NO UTILIZANDO

SUB-TOTAL \$ 110,576.53
Total de Impuestos Traslados \$ 17,692.24
Retenidos \$ 0.00
IVA 16.00 % \$ 17,692.24
TOTAL \$ 128,268.77

!1u02od151a0-c6e2-4eca-9b1f-8986325c6a2d!2016-10-04T15:27:59Z!Eg2vAKDh+9g9Wm+hFD5J89WTXLB+g2yL5wkyNk+G0NV15TgXhknurDeD1G6E5IABUmZMF3aRZDIFa12ITwBQC6uc5yVTa2ISUDAZGKGU+Wos
+59vTm2ISUDAZGKGU+WosubhYd1ZOH+e9BbWwPVyS7HgbS9PpT107M60Gd114NV0580d5TMz03mdKc2-
mihVEpIdqOv+BBM71BSbCSK2WZy22iyIHfTY3wEj0jHHEf0dUYGfVA/7ZF+8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N.

IMPORTE EN LETRAS

[Handwritten signature]

ESTIMACION 3 SEGUN CONTRATO 141/2016
FIRMA DEL CONTRATISTA
ALCANCE DE LA ESTIMACION \$157,966.47
AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$47,389.94
RETENCIONES PACCTADA EN CONTRATO
I.C.I.C. DEL 0.2% \$315.93
D.I.F. DEL 0.2% \$315.93
C.M.I.C. DEL 0.2% \$315.93
SUMA \$947.79
NETO A RECIBIR \$127,320.98

CONSTRUCCION DE BAHUA EN ESCUELA PRIMARIA CHIHUAHUA 2757
UBICADA EN CALLE EUCALIPTO ENTRE CALLE PRIMERA Y SEGUNDA DE
LA COLONIA GRANAS CERRO GRANDE

Direccion del Cliente
MINA 408
CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO C.P. 31000

Nombre del Cliente
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

FC del Cliente
FC1651010V22

CANT./UNIDAD CLAVE

CONCEPTO

P. UNITARIO

IMPORTE

\$ 110,576.53

FACTURA
Lugar y Fecha de certificación
México Distrito Federal, 2016-10-04T15:27:59
Proveedor de Certificación de CFDI
AURORIAN S.A. DE C.V.
www.konesh.com.mx
Número Certificado del SAT: 00001000000202809550

Folio Fiscal
2dd151a0-c6e2-4eca-9b1f-8986325c6a2d
Serie: C
Folio: 41
Número de Certificado del Emisor
00001000000301653590
Lugar y Fecha de Emisión
CHIHUAHUA CHIH. 2016-10-04T14:27:57

GARMET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CALLE PINO No. 599 1 TEL. 417-68 01
COL. LAS GRANUAS CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO C.P. 31100
Reg. fiscal PERSONA MORAL GENERAL DE LEY

gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT


Folio Fiscal

RFC Emisor



RFC Receptor

Verificar CFDI

Proporcione los datos de la imagen



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
GCO7911283P3	GARMEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MC1651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha de Certificación SAT	CAC que Certifica
2DD151A0-C6E2-4EC4-9B1F-8966325C6A2D	2016-10-04T14:27:57	2016-10-04T15:27:59	AUR100128NN3
1004 del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	Vigente
\$128,268.77	Ingreso		





RESUMEN DE ESTIMACION



PROGRAMA: INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTO		CONTRATO NO. 141/2016	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANDA EN ESCUELA PRIMARIA CHIHUAHUA 2757 UBICADA EN CUE EUGALPITO ENTRE CALLES PRIMERA Y SEGUNDA DE LA COLONIA GRANAS		ESTIMACIÓN NO. 3	\$ 913,716.39 CON IVA
UBICACIÓN: CHIHUAHUA CHIH		PERIODO EJEC. 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
CONTRATISTA: GARMET CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 183,241.10 CON IVA
RFC: GCO 791128 3P3		ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 622,463.34 CON IVA
		IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 805,704.44 CON IVA
TIPO DE OBRA		IMPORTE	OBSERVACIONES
NORMALES		\$ 157,966.47	
EXCEDENTES		\$ -	
EXTRAS		\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 157,966.47	

DESCUENTOS	\$ 315.93
0.2% I.C.T.C.	\$ 315.93
0.2% D.H.	\$ 315.93
0.2% C.M.C.	\$ 315.93
SUMA DESCUENTOS	\$ 947.79
RESUMEN	
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 157,966.47
AMORT ANHICOPO	\$ 47,389.94
SUB TOTAL	\$ 110,576.53
I.V.A.	\$ 17,692.24
TOTAL	\$ 128,268.77
(CON LITRA)	
(CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N.)	
DESCUENTOS	\$ 947.79
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 127,320.98

AUTORIZO: 
 REVISO: 
 COMPROBADO: 
 VO. BO.
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE:

COMO PAGO A LA
CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 98/100 (M.N.)
CONTRATO NO. 141/2016 POR LA CANTIDAD DE \$ 913,763.99 INCLUYE CONVENIO
DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 00/100 MN
CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA CHIHUAHUA 2/57 UBICADA EN CALLE EUCALIPTO ENTRE CALLES PRIMERA Y SEGUNDA
DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 157,966.47
AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 47,389.94

SUBTOTAL	\$	110,576.53
IVA	\$	17,692.24
TOTAL	\$	128,268.77
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		
I.C.T.C. DEL 0.2%	315.93	
DIE 0.2%	315.93	
C.M.I.C. 0.2%	315.93	
SUMA	947.79	

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO	IMPORTE CONTRATADO	\$	913,716.39
	CONVENIO MODIFICATORIO	\$	692,463.34
	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$	183,241.10
	ESTA ESTIMACION	\$	805,704.44
	ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$	108,011.95
	POR EJERCER	\$	

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO	IMPORTE DE ANTICIPO	\$	274,114.92
	ACUMULADO ANTERIOR	\$	186,739.01
	ESTA ESTIMACION	\$	44,972.33
	ACUMULADO ACTUAL	\$	241,711.34
	POR AMORTIZAR	\$	32,403.58

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO	0.2% I.C.T.C.	\$	315.93
	0.2% DIF	\$	315.93
	0.2% C.M.I.C.	\$	315.93
		\$	947.79

RECIBIMOS

GARMEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
GCO-791128-3P3



CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA CHIHUAHUA 2757 UBICADA EN CITE EUCCALUPITO ENTRE CALLES PRIMERAY SEGUNDA DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE

OBRA: CHIHUAHUA CHIH
MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIH
CONTRATISTA: GARMEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
PERIODO: 31 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016
ESTIMACIÓN No. 3
No CONTRATO: 141/2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
-----	-----------------------------	---------

NORMALES		\$ 157,966.47
EXCEDENTES		\$
EXTRAS		\$

SUBTOTAL \$	157,966.47
I.V.A. \$	25,274.64
TOTAL \$	183,241.10

FOR EL CONTRATISTA

GARMEL CONSTRUCCIONES SA DE CV

RESIDENCIA DE OBRA

ING. EVER GARFIO PALMA



CONSTRUCCION DE BARRA EN ESC. PRIMARIA CHIHUAHUA 2757 UB. CADA EN CALLE
EUCALIPTO ENTRE CALLES PRIMERA Y SEGUNDA DE LA COLONIA GRANJAS CERRO
GRANDE

MUNICIPIO CHIHUAHUA CHIH.
O. CHIHUAHUA CHIH.
CONTRATISTA SARNEEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
ESTIMACION No. 3
PERIODO: 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
ESTIMACION No. 3
CONTRATACION No. 141/2016

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ESTIMADO				
	BARRA								\$	157,966.47
12.00	CASTILLOS DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 DE SECCION DE 15X20 CMS INC. MATERIAL M. DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	306	172.66	74.24	125.44	237.16		\$	29,749.35
8.-	DALA DE CERMAMIENTO DE 15X20 CMS ARMADA CON 4 VS#3 Y ST DE #2 INC. MATERIAL M. DE OBRA, CIMBRA Y	ML	320	176.00	39.90	65.1	265.00		\$	23,346.50
10.-	MALLA CICLONICA DE 1.25 MT DE ALTURA CAL 10.5 Y POSTES DE ARRAQUE DE 2 1/2" CAL 30 POSTES DE LINEA DE 1 1/2" CAL 30. BARRA SUPERIOR E INFERIOR DE 1 1/2" INC. MATERIAL M. DE OBRA, ACCESORIOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	320	174.00		174		264.42	\$	46,016.04
1.-	INSTALACION DE ALAMBRE DE NAVAJA INC. MATERIAL M. DE OBRA, ACCESORIOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	596	74.00		74	118.24		\$	20,573.76

CONTRATISTA
SARNEEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA
ING. EVERARDO PAJMA





OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE MANO DE OBRERA EN ESC. PRIMARIA CHIHUAHUA 3757 UBICADA EN CALLE
 BUCAPIERTO ENTRE CALLES PRIMERA Y SEGUNDA DE LA COLONIA GRANJAS CERRO
 GRANDE
 MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIH.
 O: _____
 CONTRATO: CARRE. CONSTRUCCIONES S.A. DE CV
 STA: _____
 PERIODO: 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
 ESTIMACIÓN No. 3
 O: _____
 No. _____
 CONTRATO: 141/206

CONCEPTOS		PROYECTO	VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	OL. ESTIMADO	
13-	DEMOLICION DE DATA EXISTENTE DE CONCRETO SIMPLE INC. EQUIP. MATERIAL MANO DE OBRERA RETIRO DE MATERIAL A UN JUEGO AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	35	33.90		35.9	\$ 12,411.47
14	RETRO DE MANO DE OBRERA DE 2 MTS DE ALTURA INC. DESMONTES Y RETIRO FUERA DE OBRA	M3	277	45.32	29.02	35.32	\$ 13,858.26
15	RELLENO CON CONCRETO FC=150 KG/CM2 ARMADO CON WOTERO CEMENTARE 1:4 Y RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE	M3	57.13	45.82	37.37	8:66	\$ 2,537.59
16	MATERIAL PROYECTO DE LA EXCAVACION RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	M3	165.00	57.13	74	127.75	\$ 1,450.50
18.00							\$ 157,396.47
							\$ 25,274.64
							\$ 150,211.90

15-06-2011
 15-06-2011
 15-06-2011

PRESIDENTE DE OBRA
 INC. EVER CARROPAIMA

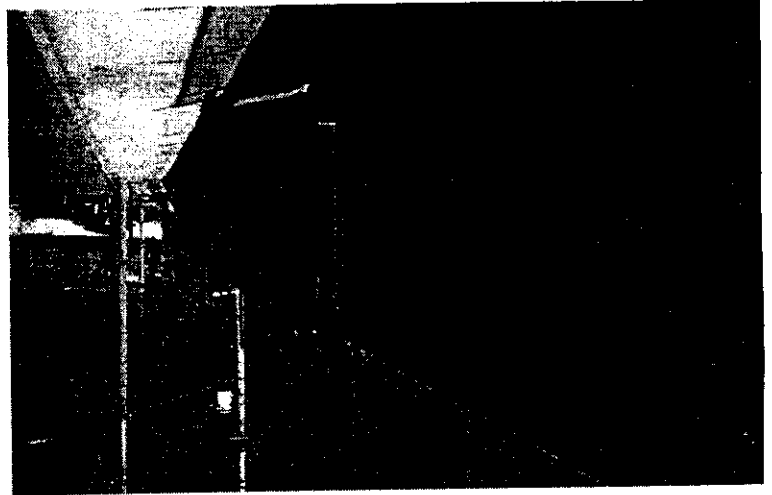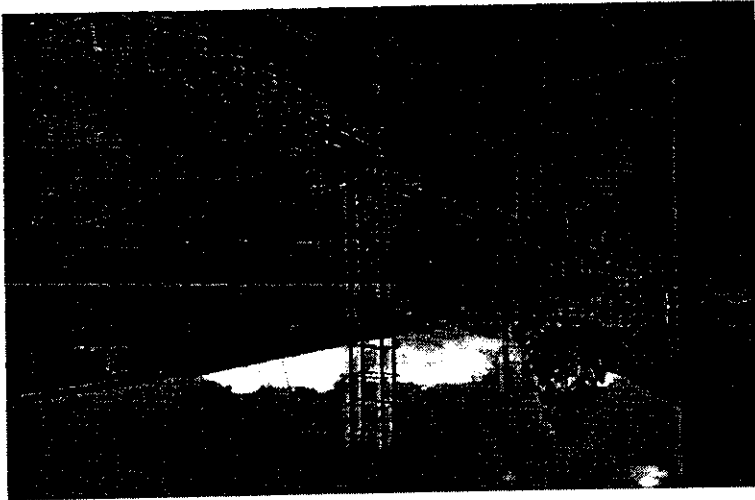

ACUERDO DE DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 141/2016 POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO

AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 2016



ACUERDO QUE EMITEN EL C. ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, SIENDO ASISTIDO POR LOS CC. INGENIEROS XÓCHITL PÉREZ BLANCO, SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA Y ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA, PARA HACER CONSTAR EL DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA, PARA HACER CONSTAR EL DE OBRA PÚBLICA NO. 141/2016, CONSISTENTE EN: "CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA "CHIHUAHUA" 2757 CON CLAVE 08EPR0819E, UBICADA EN C. EUCALIPTO ENTRE 1ª Y 2ª DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE", EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO.

En Chihuahua, Chih., siendo las 15.00 horas del día 05 de agosto de 2016, el suscrito Director de Obras Públicas y Mantenimiento, asistido por la Subdirectora de Obra Pública e Infraestructura y el Jefe del Departamento de Construcción de la Subdirección de Obra Pública e Infraestructura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 62 fracción I de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, y en el ejercicio de las facultades conferidas en el Artículo 71 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, emito el presente Acuerdo que autoriza el diferimiento del plazo de ejecución por motivo del atraso en la entrega del anticipo que se otorga en los trabajos de la obra arriba referida, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 29 de junio de 2016, se celebró con la empresa Garmel Construcciones, S.A. de C.V., el Contrato de Obra Pública No. 141/2016, el cual tiene como objeto la: "CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA "CHIHUAHUA" 2757 CON CLAVE 08EPR0819E, UBICADA EN C. EUCALIPTO ENTRE 1ª Y 2ª DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE", por un monto de \$ 913,716.39 (novecientos trece mil setecientos dieciséis pesos 39/100 M.N.) Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, estableciéndose un plazo de ejecución de 62 días naturales com-

Camino a la
Presa Chuviescar No. 1108
Col. Compeñina Nueva
Chihuahua, Chih. Mex.

Larga Distancia
(614) 200 48 00
Tel./Fax Directo 418-65-51

Para uso exclusivo de Asuntos Oficiales

www.mpiochihuahua.gob.mx

CONSTRUIMOS
FUTURO

ACUERDO DE DIFERIMIENTO DEL PLAZO
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 141/2016 POR
ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO

AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 2016



prendidos dentro del periodo del 01 de julio de 2016 al 31 de agosto del 2016, pactándose un anticipo del 30%, para el inicio de la obra y la compra de materiales y equipos de instalación permanente en la misma.

II.- Que el cheque que ampara el importe del anticipo fue entregado a la empresa contratista hasta el día viernes 29 de julio de 2016, por lo que el importe del anticipo fue puesto efectivamente a su disposición hasta el lunes 01 de agosto de 2016, por lo anteriormente expuesto, la empresa contratista no pudo llevar a cabo el inicio de los trabajos y la adquisición de equipos y materiales de instalación permanente en la obra en la fecha señalada en el contrato; aunado al hecho y como consta en el expediente del referido contrato 141/2016, el contratista exhibió de manera oportuna y de conformidad con el artículo 41 de la Ley en la materia, las garantías al anticipo y de cumplimiento a dicho contrato mediante las pólizas de fianza números 1730220-0000 y 1730221-0000, respectivamente, ambas emitidas por Primero Fianzas, S.A. de C.V., es procedente diferir el plazo de ejecución de la obra.

ACUERDO

PRIMERO. - Con base en los antecedentes y motivos antes expuestos y con fundamento en la fracción I del artículo 62 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, se difiere el plazo de ejecución del Contrato de Obra Pública No. 141/2016, estableciéndose como nuevas fechas de inicio y terminación de la obra, los días 01 de agosto de 2016 y 01 de octubre de 2016., respectivamente.

SEGUNDO.- Notifíquese a la empresa Garmel Construcciones, S.A. de C.V., el contenido y alcance legal del presente acuerdo.

Para uso exclusivo de Asuntos Oficiales

Comunador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx

Camino a la
Presidencia No. 1108
Col. Campestre Nueva
Chihuahua, Chih. Mex.

CONSTRUIMOS
FUTURO

ACUERDO DE DIFERIMIENTO DEL PLAZO
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 141/2016 POR
ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO



ACUERDO que se dicta y firma para constancia en la Ciudad de Chihuahua,
Chih., a los cinco días del mes de agosto del año dos mil dieciséis.

EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA

LA SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACUERDO DE DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA No. 141/2016, RELATIVO A CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA "CHIHUAHUA" 2757 CON CLAVE
08EPR0819E, UBICADA EN C. EUCALIPTO ENTRE 1ª Y 2ª DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE
