

OSCAR SANDOVAL OCHOA
SA00590801MZ2
Domicilio Fiscal
ARBOL DE LIMA 18939
Col. QUINTAS MONTECARLO 31170
Chihuahua Chihuahua México
Tel. 5434707

Factura No: 94
FOLIO FISCAL (UUID):
4EADC1AA-5810-4318-8812-EF2DDE664165
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304489099
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-04-03T11:29:17
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-04-03T11:24:17

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: MINA 408
CENTRO C.P. 31000
Chihuahua Chihuahua
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: Chihuahua, Chihuahua
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 99-Otros
Fecha de Expedición: 03 abril 2017
Clave de Moneda: MXN
NumCtaPago: NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	1	REHABILITACIÓN DE COMEDOR EL SAUZ, CHIHUAHUA. ESTIMACIÓN NÚMERO 2 (DOS) SEGÚN CONTRATO NUM. 187/2016 ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN \$ 125,504.84 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$ - RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO C.M.I.C. DEL 0.2% \$ 251.01 I.C.I.C. DEL 0.2% \$ 251.01 D.I.F. DEL 0.2% \$ 251.01 SANCIÓN POR RETENCIÓN DEL 1% MES \$16,641.48 SUMA \$17,394.51 NETO A RECIBIR \$128,191.10 	\$ 125,504.84	\$ 125,504.84

IMPORTE CON LETRA: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, 61/100
MXN

SUBTOTAL: \$ 125,504.84
IVA(IVA 16.00%): \$ 20,080.77
TOTAL: \$ 145,585.61

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Pa3JgnbR3bn05gr28yGEILPFIIT5piHCojMVecr9ZJrU2AlsviaKNWBPBHSccOWFIS3IDG0TvBe+kBhApLP601aPleu4dw9KSZezgft.fuqW+higEFqK7xxOkZSm5AcBO4polVzyCuRgmHW1b6cWVLF3oITVuXuldcVQ4+

SELLO DIGITAL DEL SAT

yK9H555dsskY27fFbzXgwSLyknWFrRqC2/43gdyAa0+kHDBnCIeHyd74VsqwYANG1FxlKpEvqRAX1LYnwkuEXNfISu+/B2XpUIMic2WwWv1ENTaFK1p8sXr4m4QgY1N8n3eCQIU5eF+XPIZwIL6qdrB487EP049xx+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT


||1.0|4EADC1AA-5810-4318-8812-EF2DDE664165|2017-04-03T11:29:17|Pa3JgnbR3bn05gr28yGEILPFIIT5piHCojMVecr9ZJrU2AlsviaKNWBPBHSccOWFIS3IDG0TvBe+kBhApLP601aPleu4dw9KSZezgft.fuqW+higEFqK7xxOkZSm5AcBO4polVzyCuRgmHW1b6cWVLF3oITVuXuldcVQ4+|0000100000203495276||



www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son
obligatorios desde Enero de 2011

Proveedor Autorizado de Certificación
FOLIOS DIGITALES





gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT


Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

SAOO590801MZ2

OSCAR SANDOVAL OCHOA

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

4EADC1AA-5810-4318-8812-
EF2DDE664165

2017-04-03T11:24:17

2017-04-03T11:29:17

FMD100203JS7

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$145,585.61

ingreso

Vigente

Imprimir



an fw



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION SOCIAL

CONTRATO

187/2016

IMPORTE CONTRATO \$1,184,252.32 CON IVA

CONTRATISTA

OSCAR SANDOVAL OCHOA

PERIODO DE EJECUCION

10 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

OBRASERVICIO

REHABILITACION DE COMEDOR, EL SAUZ, CHIHUAHUA

MONTO PROGRAMADO DE CONTRATO

\$551,042.56 SIN IVA

SIN IVA

IMPORTE PENDIENTE

\$551,042.56 SIN IVA

FUERA DE PROGRAMA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CALCULO DE RETENCION/SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA
DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA DEL CONTRATO

CONCEPTO	IMPORTE FUERA DE PROGRAMA	SANCION / RETENCION DEL 1.0%/MES	NUMERO DE MESES DE RETRASO	IMPORTE DE SANCION	IMPORTE DE REINTEGRO	ESTIMACION No. 2 (PERIODO 10 NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016)
INCISO B	\$551,042.56	\$5,510.43	3.02	\$16,641.48		

TOTAL \$16,641.48 SIN I.V.A.

ELABORO:

ING. ROBERTO ORTIZ

REVISO:

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO

Vo.Bo.

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA

CHIHUAHUA, CHIH., DICIEMBRE 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 187/2016	CONTRATADOS
OBRA: Rehabilitación de comedor El Sauz, Chihuahua.	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS)	\$ 1,184,252.32 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 10 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	
UBICACIÓN: El Sauz, Chihuahua	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 145,585.61 CON IVA
CONTRATISTA: C. OSCAR SANDOVAL OCHOA	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 399,341.06 CON IVA
RFC SAOO-590901-MZ2	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 544,926.67 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ -	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>OBRA EXTRAORDINARIA</u>	\$ 125,504.84	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 125,504.84	

--

DESCUENTOS		
0.2% C.M.I.C.		251.01
0.2% I.C.I.C.	\$	251.01
0.2% D.I.F.	\$	251.01
SANCION POR RETENCION DEL 1%		16,641.48
SUMA DESCUENTOS	\$	17,394.51
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	125,504.84
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	125,504.84
I.V.A.	\$	20,080.77
TOTAL	\$	145,585.61
(CON LETRA)		
(CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	17,394.51
SALDO NETO A RECIBIR	\$	128,191.10

AUTORIZO	ELABORO
	
ING. RODOLFO ORTIZ RESIDENTE D.O.P.M	C. OSCAR SANDOVAL OCHOA CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
	
ING. JAVIER VILLARREAL ROSADA	ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGENIO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL
Vo. Bo.	
	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

CHIHUAHUA, CHIH.,

08 DE DICIEMBRE DE 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/ DIR. DE OBRAS PUBLICAS, LA CANTIDAD DE:
(CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 10/100 M.N.)

ESTIMACIÓN NUM. 2 (DOS) CONTRATO No. 187/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 1,184,252.32
0.00

Rehabilitacion de comedor El Sauz, chihuahua.

\$ 128,191.10
COMO PAGO A LA

POR TRABAJOS EN LA OBRA:

ALCANCE DE LA ESTIMACION

\$ 125,504.84

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

SUBTOTAL

\$ 125,504.84

IVA

\$ 20,080.77

TOTAL

\$ 145,585.61

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

C.M.I.C.. DEL 0.2%	251.01
I.C.I.C. DEL 0.2%	251.01
D.I.F. DEL 0.2%	251.01
SANCION POR RETENCION DEL 1% MES	16,641.48
SUMA	17,394.51

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO

\$	1,184,252.32
\$	-
\$	399,341.06
\$	145,585.61
\$	544,926.67
\$	639,325.65

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$	355,275.70
\$	355,275.70
\$	-
\$	355,275.70
\$	-


3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% D.I.F.

0.2% C.M.I.C. 0,2% IC.I.C.

ACUMULADO ANTERIOR	\$	688.72	\$	688.72	\$	688.72
ESTA ESTIMACION	\$	251.01	\$	251.01	\$	251.01
ACUMULADO ACTUAL	\$	939.73	\$	939.73	\$	939.73

R E C I B I M O S



C. OSCAR SANDOVAL OCHOA
SAOO-590901-MZ2

OBRA: Rehabilitación de comedor El Sauz, chihuahua.

MUNICIPIO: El Sauz, Chihuahua No. CONTRATO: 187/2016


ESTIMACIÓN No. 2 (DOS)

CONTRATISTA: C. OSCAR SANDOVAL OCHOA

PERÍODO: 10 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
<u>NORMALES</u>		
		0.00
<u>EXCEDENTES</u>		
		0.00
<u>OBRA EXTRAORDINARIA</u>		
		125,504.84
SUBTOTAL		125,504.84
I.V.A.		20,080.77
TOTAL		145,585.61


POR EL CONTRATISTA
OSCAR SANDOVAL OCHOA


POR EL PRESIDENTE
ING. RODOLFO ORTIZ MARTINEZ

OBRA: REHABILITACION DE COMEDOR El Sauz , chihuahua

MUNICIPIO: No. CONTRATO: 187/2016

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS)
PERIODO: 10 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CONTRATISTA: C. OSCAR SANDOVAL OCHOA

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		ACUM. TOTAL FUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN				

OBRA NORMAL

\$0.00

EXCEDENTES

\$0.00

OBRA EXTRAORDINARIA

\$125,504.84

EXT-2 Suministro y colocación de impermecrest rojo, incluye la preparación de la superficie para su correcta aplicación

M2	815.39	0.00	815.39	\$153.92	\$	125,504.83
----	--------	------	--------	----------	----	------------

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE INFR. URBANA

C. OSCAR SANDOVAL OCHOA

ING. RODOLFO ORTIZ

EL CONTRATISTA
OSCAR SANDOVAL OCHOA

EL PRESIDENTE
ING. RODOLFO ORTIZ

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 127/2016	TRAMO: El Sauz, Chihuahua
OBRA : Rehabilitación de comedor El Sauz, chihuahua.	CONTRATISTA: C. OSCAR SANDOVAL OCHOA


Nº DE ESTIMACION: 2 (DOS)	PERIODO: 10 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
---------------------------	--

CONCEPTO	Suministro y colocación de impermecrest rojo, incluye la preparación de la superficie para su correcta aplicación			
6.34 m	33.5 m			
9.0 m	33.5 m			

OPERACIONES ARITMETICAS			
largo	ancho	area	unidad
33.5	6.34	212.39	m2
33.5	9.00	301.5	m2
33.5	9.00	301.5	m2
Total			815.39
			m2



RESIDENTE

CONTRATISTA

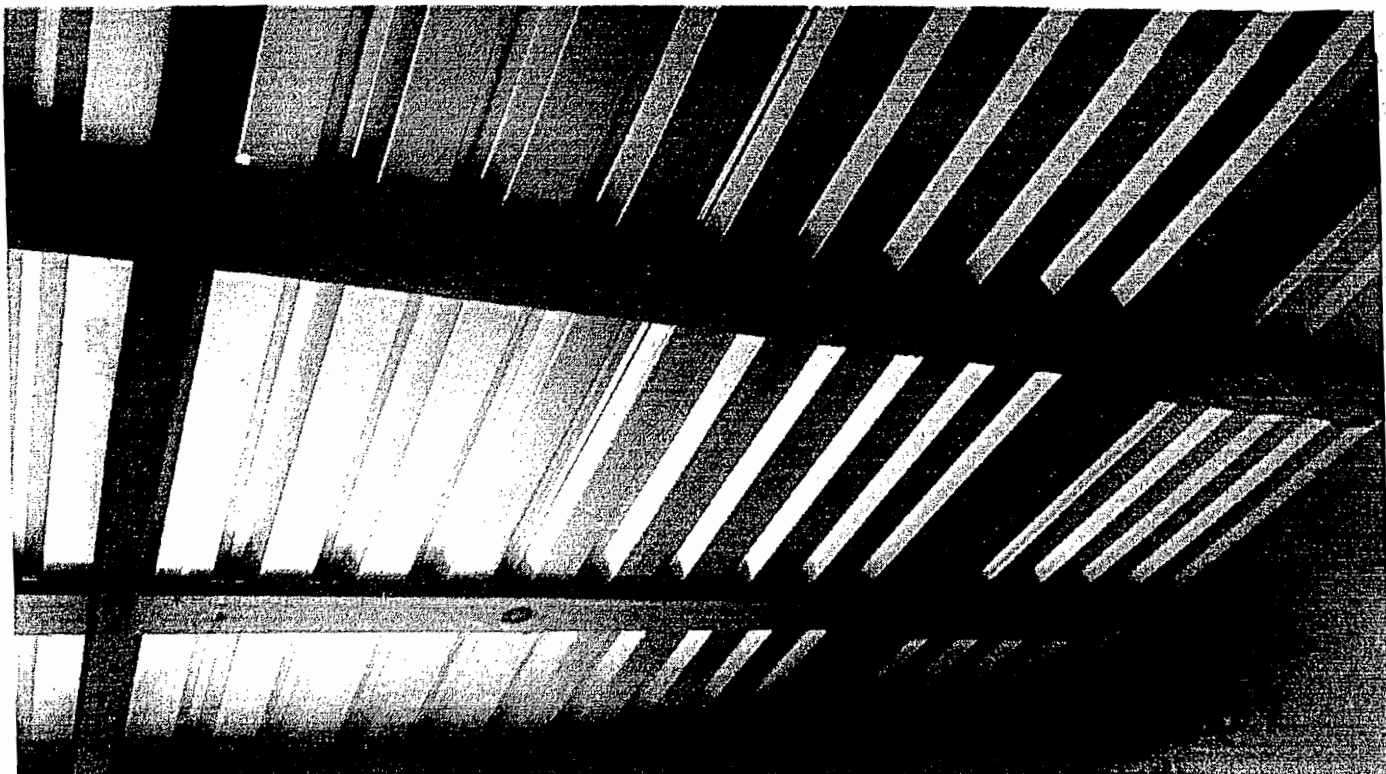



6

Roof

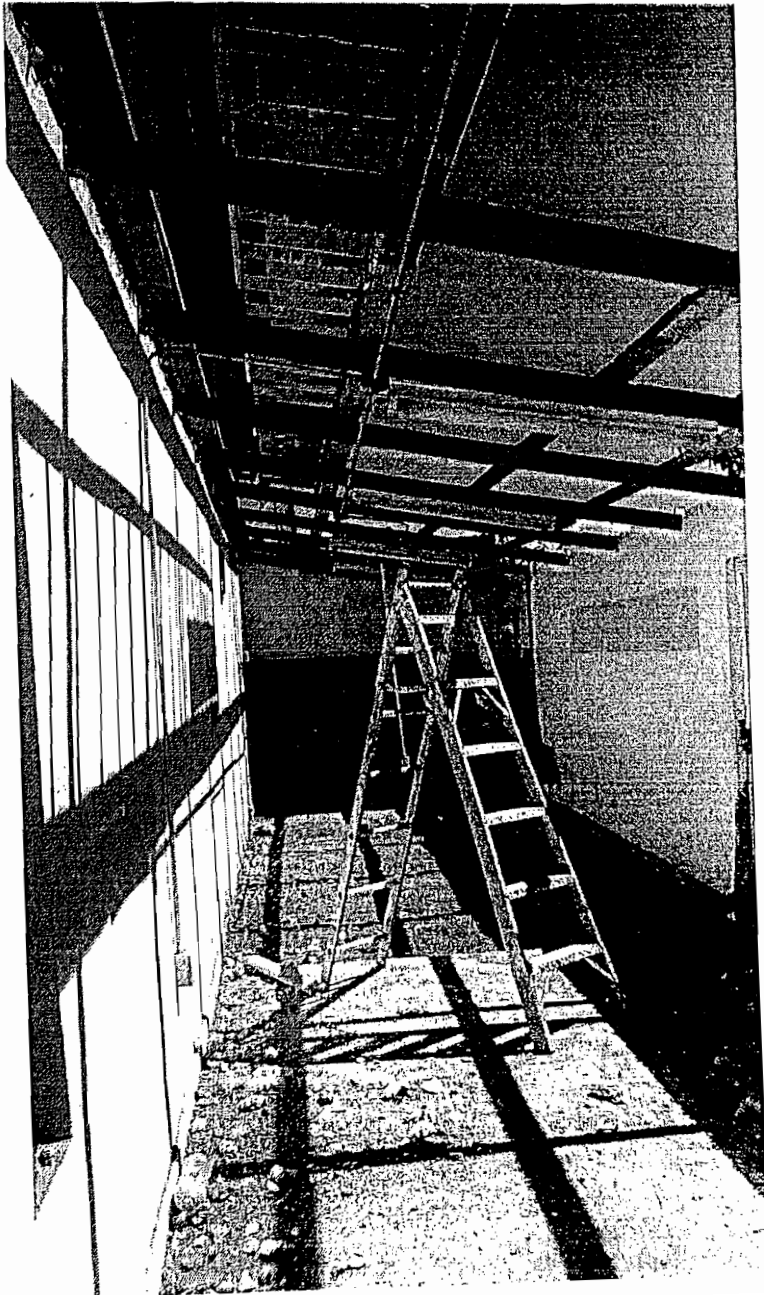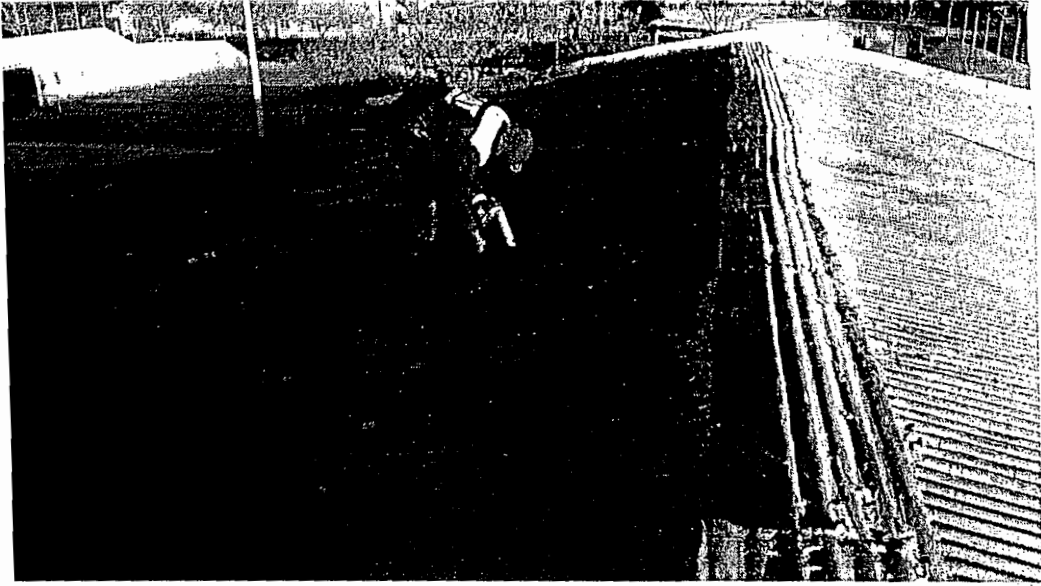



Roof

6

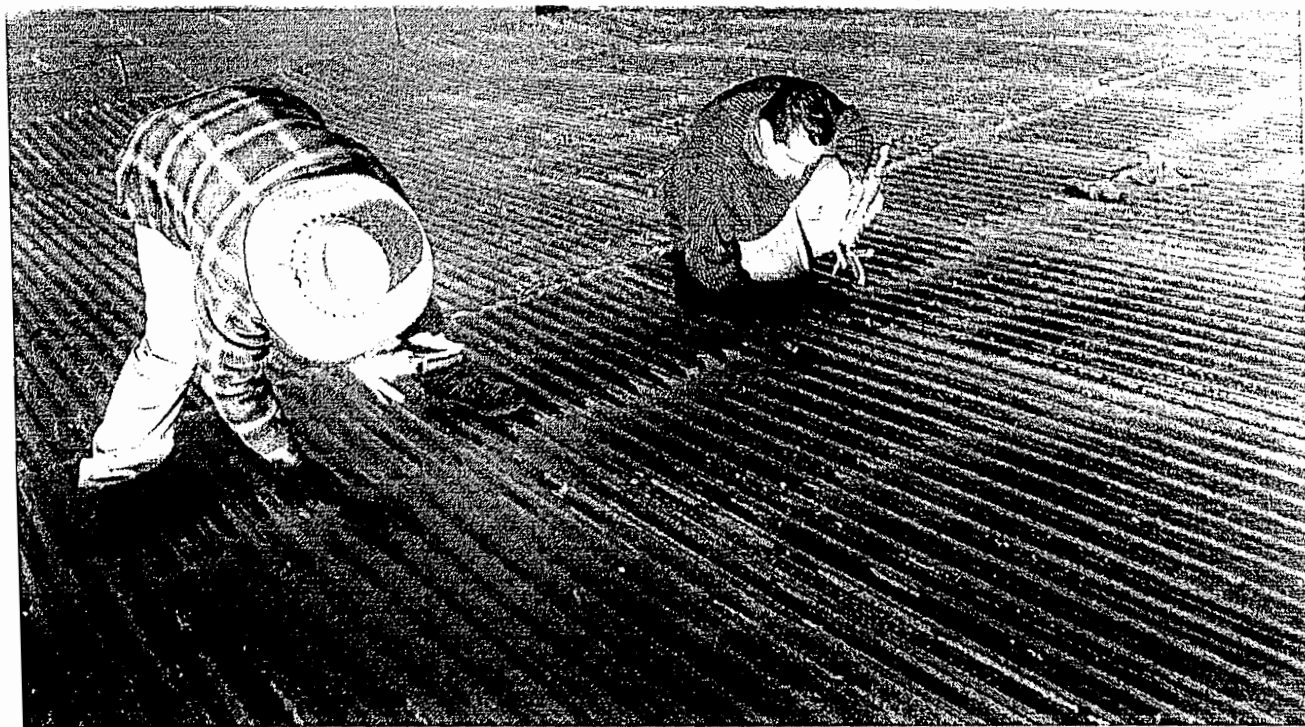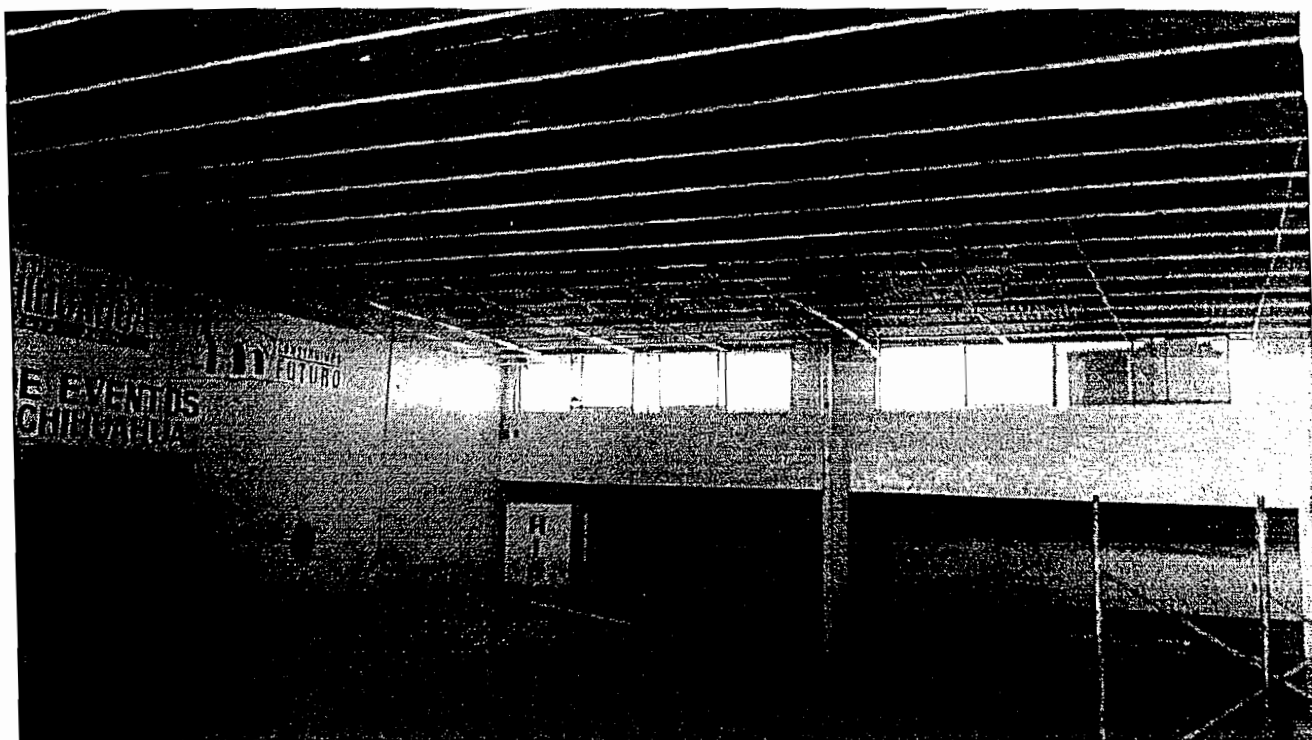

8

Pine put

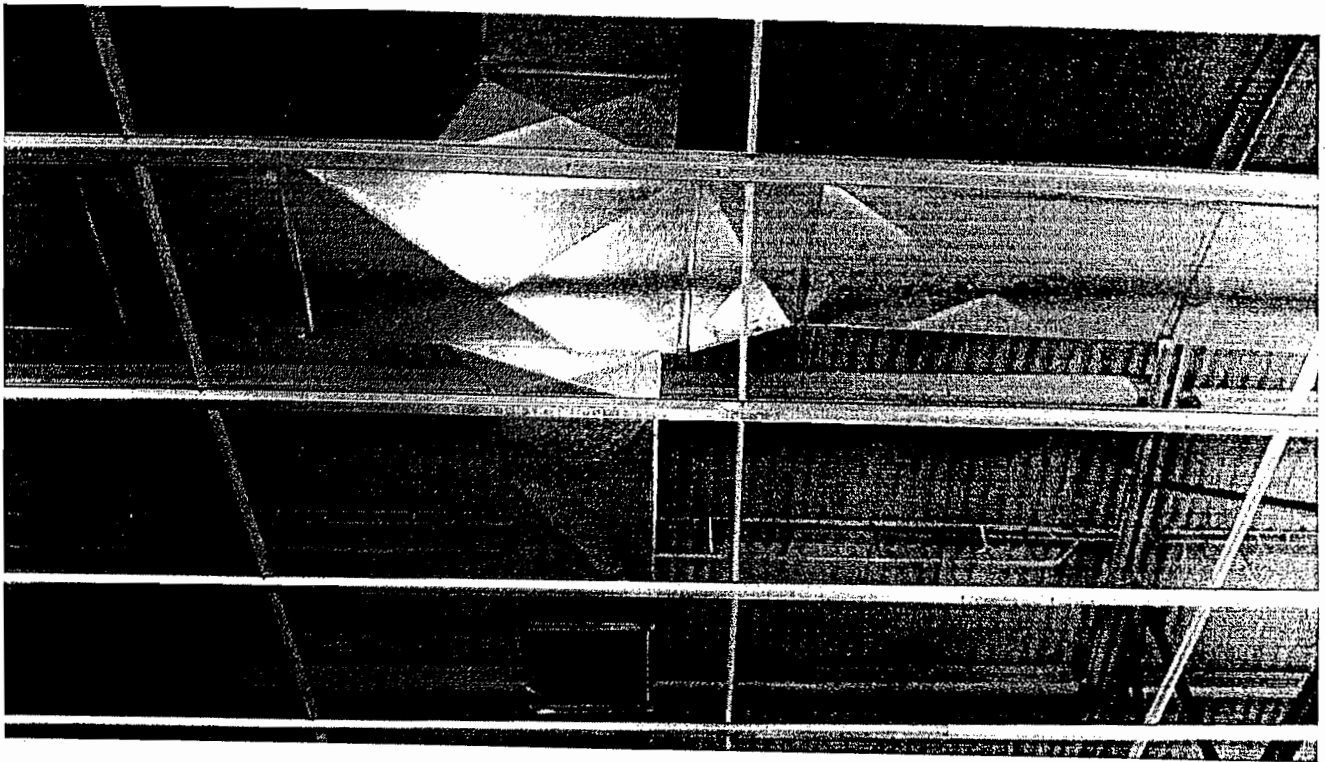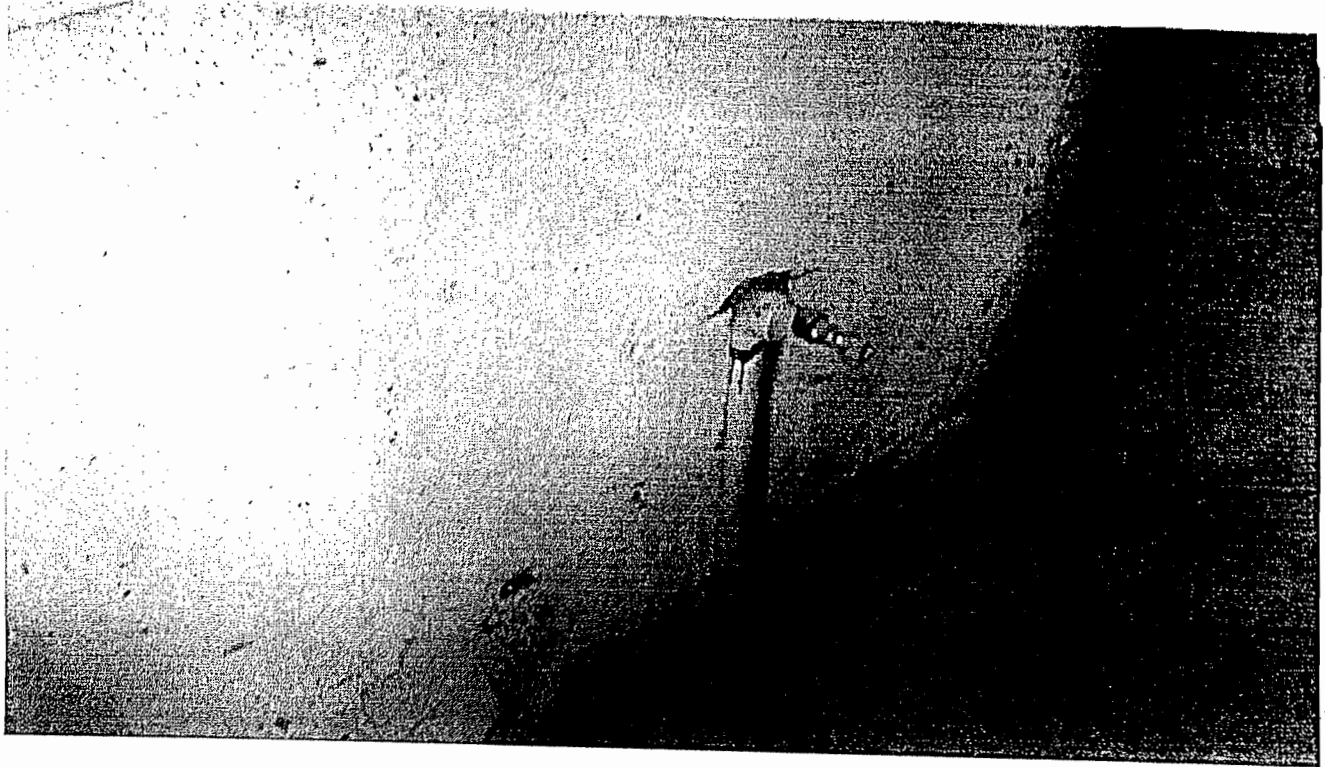



6

Project 7




6

Ruiz

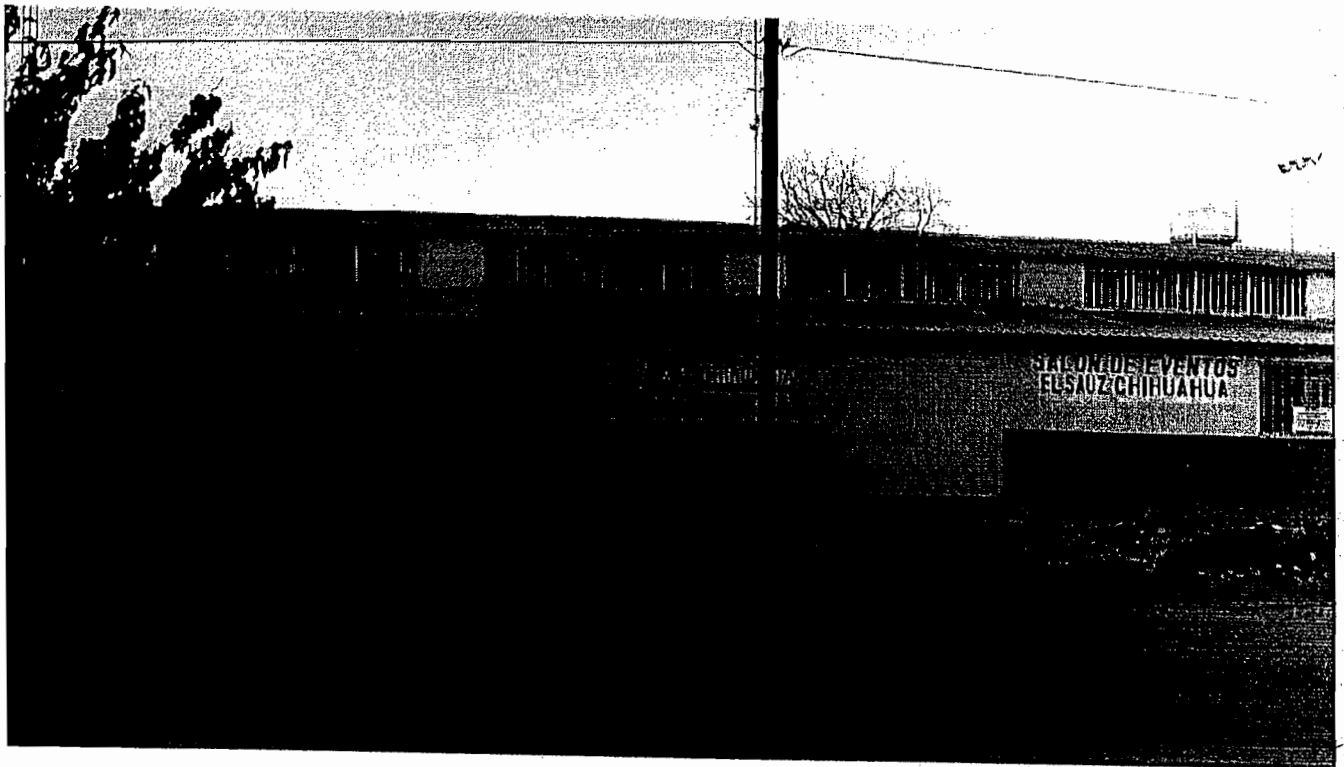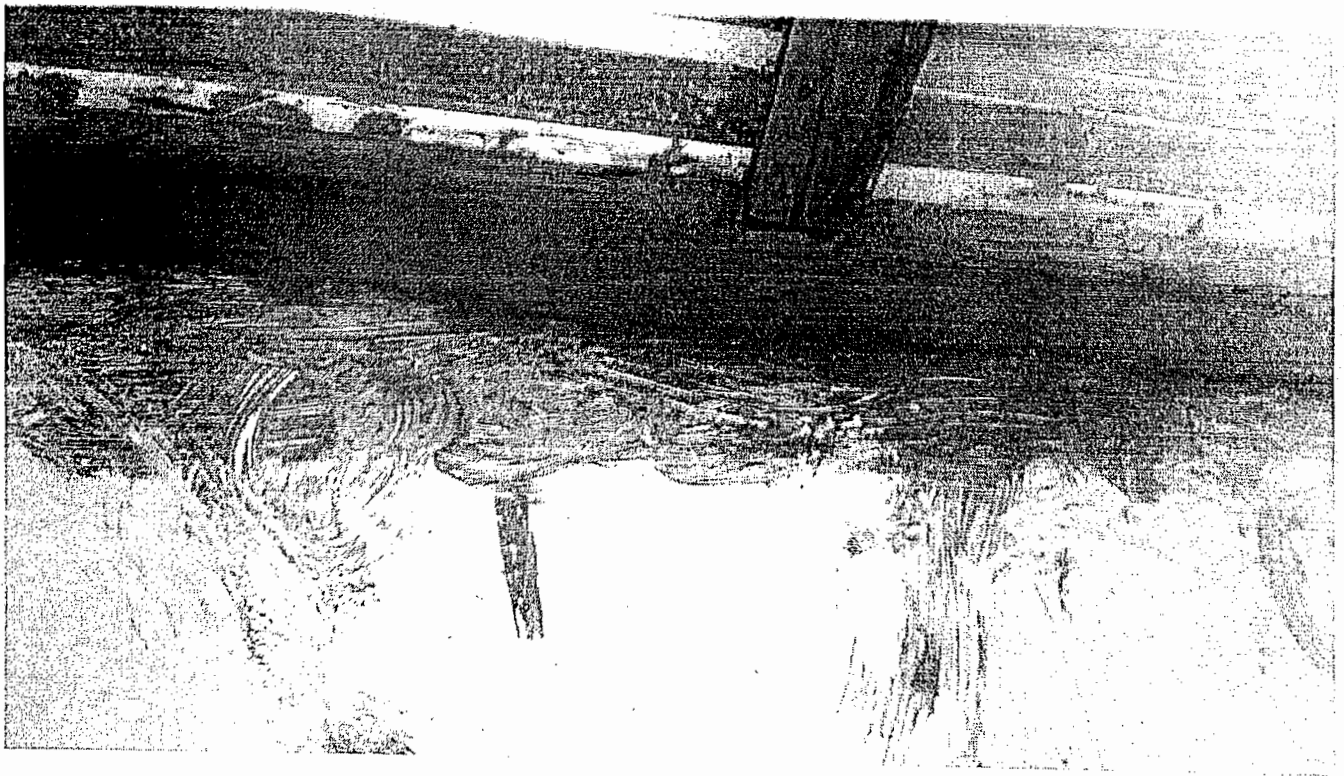


6

Reef

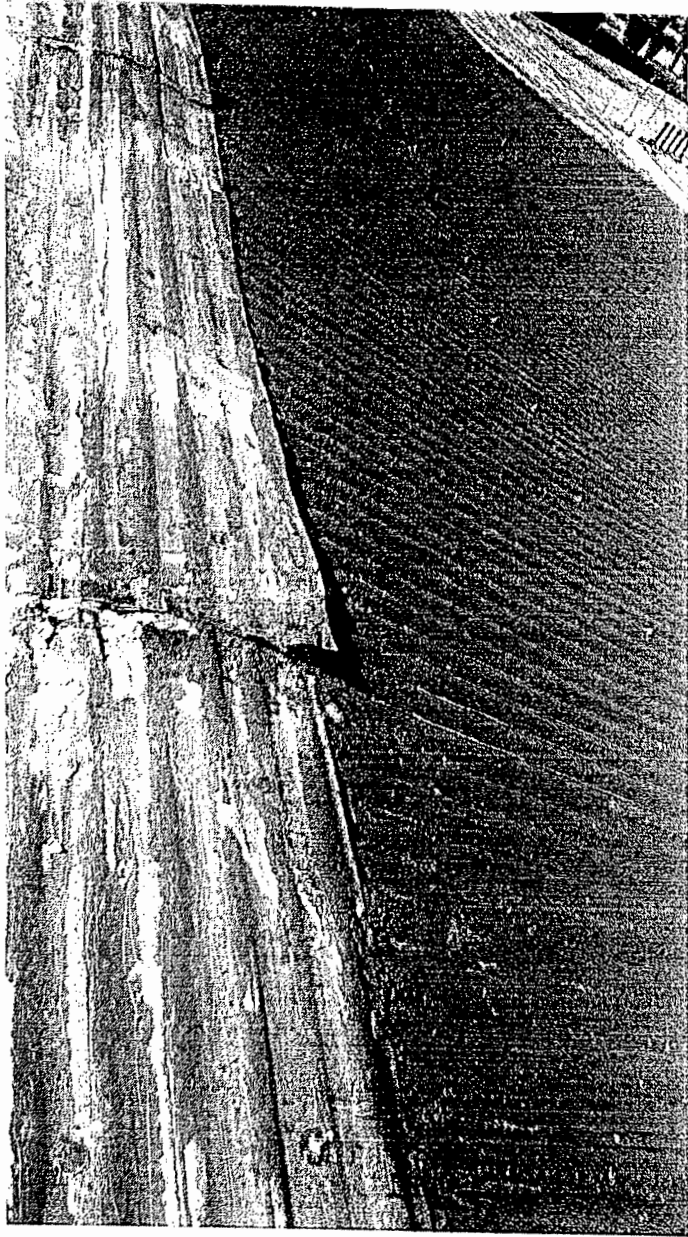

✓

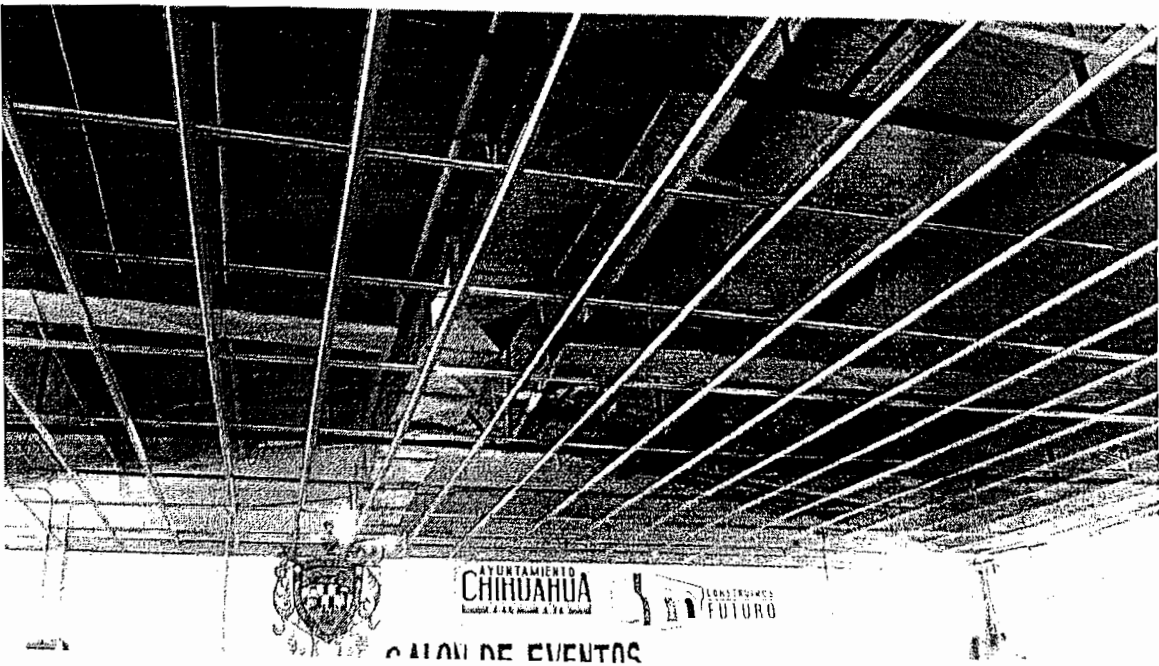

6

Electro 7



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
OFICIO N° D/3048/2016

CHIHUAHUA, AGOSTO DEL 2016

ING. OSCAR SANDOVAL OCHOA
PRESENTE.-

Con relación a su solicitud mediante escrito S/N de fecha 01 de agosto del presente, en el que presenta a revisión y autorización de precios extraordinarios de la obra: **REHABILITACION DE COMEDOR EL SAUZ, CHIH** que al amparo del contrato No. **187/2016** ejecuta su representada; al respecto me permito comunicar que los mismos han sido autorizados tal y como se relacionan a continuación:

No	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO SOLICITADO	PRECIO AUTORIZADO
EXT.-01	RETIRO DE POLIURETANO EXISTENTE EN TECHUMBRE	M2	\$24.00	\$24.00
EXT.-02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERCREST ROJO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	\$153.92	\$153.92

ATENTAMENTE

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

C.C.P. ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO, SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA
C.C.P. ING. ENRIQUE VILLARREAL ALFÁN, JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN
C.C.P. ING. RODOLFO ORTIZ, RESIDENTE DE OBRA
ARCHIVO/RDRA/XPBI/JVA/jcc
