

Control

CONTROL DE TRAMITE DE ESTIMACIONES

DATOS GENERALES			
FOLIO	NUMERO DE ESTIMACION	FACTURA	SALDO NETO
	7		1,273,933.40
OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)			
CONTRATISTA:	ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA		UBICACIÓN EN VARIAS COLONIAS AL SUR D
RESIDENTE	ING. SERGIO GARCIA CARDENAS		CONTRATO No. 259/2016

RESUMEN DE AUTORIZACIONES				
AUTORIZACION DE:	FECHA Y FIRMA RECIBIDO	FECHA Y FIRMA ENTREGA	CONTROL DE OBRA	
			FECHA Y FIRMA RECIBIDO	FIRMA Y FECHA ENTREGA
☐ RESIDENTE				
☐ JEFE DE OFICINA				
☐ JEFE DEPARTAMEN				
☒ DIRECTOR				
☐ DEP. SERV. ADM.				

EN CASO DE 1ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	31/08/17
EXPLICACION	Revisada Correcta.

EN CASO DE 2ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	

EN CASO DE 3ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	



NOMBRE Y FECHA DE ENTREGA EN CONTROL DE OBRA

Dirección de Obras Públicas
Subdirección de Infraestructura Urbana
Departamento de Construcción



Factura

SERIE:

FOLIO: 399

FECHA: 31/8/2017 10:50:27

Documento Válido

IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

SIOI671110T93 ARGENTINA No. 731 SAN ANDRES,
31110
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

Cliente: Municipio de Chihuahua

R.F.C.: MCI651010V22

Domicilio: Calle Mina No. 408

Teléfono:

Ciudad: Chihuahua

Colonia: Centro
Estado: Chihuahua

C.P.: 31000
País: México

Lugar de Expedición: ARGENTINA 731, SAN ANDRES, 31110, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Regimen: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	ESTIMACION Pago por concepto de Estimación 7 (Siete) del Contrato de Obra Pública No. 259/2016, que ampara los trabajos referentes a la obra denominada: "Construcción de Colector en varias colonias al sur de la ciudad (2a. Etapa)". Firma del Contratista Alcance de la Estimación \$ 1,098,218.45 (Menos) Amortización del Anticipo \$ 0.00 Subtotal \$ 1,098,218.45 IVA 16% \$ 175,714.95 Total \$ 1,273,933.40 (Menos) Retenciones Pactadas en Contrato: D.I.F. del 0.2% \$ 2,196.44 C.M.I.C. del 0.2% \$ 2,196.44 Suma \$ 4,392.88 Neto a Recibir \$ 1,269,540.52	1,098,218.45	1,098,218.45

Importe con letra
UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.
Método de Pago
03 Transferencia Electrónica de Fondos

SUBTOTAL:	1,098,218.45
I.V.A.:	175,714.95
TOTAL:	1,273,933.40

Este documento es una representación impresa de un CFDI
"Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404546655
Folio fiscal:	5B8053A4-D46B-4971-8026-E35D081D5805
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074



Fecha y hora de certificación. Agosto 31 2017 - 11:50 55

Sello digital del CFDI

QIdC6o/94u7b2cB+YKnTepfiH9B4sApdL9xEPrQssy+j9044fPsCvhOhilqbE9J0pV70ldXC+Hd8sOd3Tc6h6u
HhB3xKloloFi7zVrANGLyTgEaLZkRrfFoYwJrtMmL4wA3S8K6+53gCcyPDgrA1qDNjKEd+9jdXdE9eLrW3ZFfb
qKdy444+qKLDz6TAqB1xnAbIRJhc55o2uBNn9h3Rhu86RQWvrFg3wGsz2S5AEo5UxGzL6RP4k/jq8CTBn90V
si5rdz+FVVU/i+CZiJwTCFoyaYHUHJogNsRlsGP11UVpr0NsJUeQMVSjDnkcqzJg/dPDI1ahjgI7aE9C6KA==

Sello del SAT

QIdC6o/94u7b2cB+YKnTepfiH9B4sApdL9xEPrQssy+j9044fPsCvhOhilqbE9J0pV70ldXC+Hd8sOd3Tc6h6u
HhB3xKloloFi7zVrANGLyTgEaLZkRrfFoYwJrtMmL4wA3S8K6+53gCcyPDgrA1qDNjKEd+9jdXdE9eLrW3ZFfb
qKdy444+qKLDz6TAqB1xnAbIRJhc55o2uBNn9h3Rhu86RQWvrFg3wGsz2S5AEo5UxGzL6RP4k/jq8CTBn90V
si5rdz+FVVU/i+CZiJwTCFoyaYHUHJogNsRlsGP11UVpr0NsJUeQMVSjDnkcqzJg/dPDI1ahjgI7aE9C6KA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111015BB052A4-D46B-4971-8026-E25D081D5807|2017-08-31T11:50:55|QIdC6o/94u7b2cB+Y
KnTepfiH9B4sApdL9xEPrQssy+j9044fPsCvhOhilqbE9J0pV70ldXC+Hd8sOd3Tc6h6uHhB3xKloloFi
7zVrANGLyTgEaLZkRrfFoYwJrtMmL4wA3S8K6+53gCcyPDgrA1qDNjKEd+9jdXdE9eLrW3ZFfbqKdy
444+qKLDz6TAqB1xnAbIRJhc55o2uBNn9h3Rhu86RQWvrFg3wGsz2S5AEo5UxGzL6RP4k/jq8CTBn90
Vsi5rdz+FVVU/i+CZiJwTCFoyaYHUHJogNsRlsGP11UVpr0NsJUeQMVSjDnkcqzJg/dPDI1ahjgI7aE
9C6KA==10000100000040448607411


[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/) Inicio

SISTEMA

SAT
Servicio de Atención al Contribuyente

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:**RFC emisor*:****RFC receptor*:****Proporcione los dígitos de la imagen*:**

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor

SIOI671110T93

Folio fiscal5BB053A4-D46B-4971-8026-
E35D081D5807**Total del CFDI**

\$1,273,933.40

Nombre o razón social del emisor

IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

Fecha de expedición

2017-08-31T10:50:27

Efecto del comprobante

ingreso

RFC del receptor

MCI651010V22

Fecha certificación SAT

2017-08-31T11:50:55

Estado CFDI

Vigente

Nombre o razón social del receptor

Municipio de Chihuahua

PAC que certificó

MAS0810247C0

Chihuahua, Chih., 31 Agosto del 2017.

ING. SERGIO GARCIA CARDENAS


RESIDENTE LA OBRA

Anexo Estimación No. 7 con factura No. 399 correspondiente a la obra denominada: Construcción de Colector en varias colonias al sur de la ciudad (2a. Etapa).

De los trabajos efectuados durante el período de: Del 18 de mayo al 11 de junio 2017, por un saldo neto facturado de \$ 1,273,933.40 con IVA incluido.

Acompañada de los números generadores, fotografías y croquis, así como la documentación que acredita la procedencia de su pago; para su revision y autorización.

Atentamente,

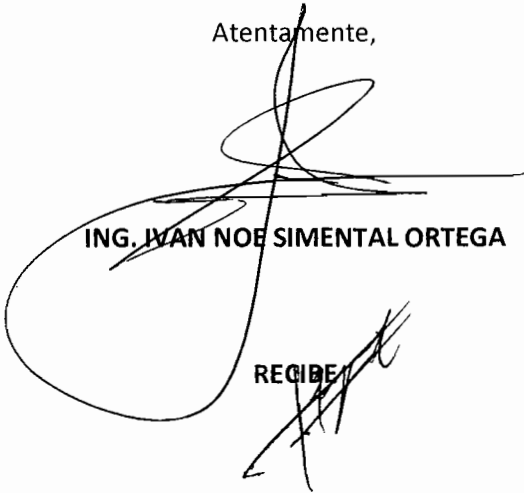

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 259/2016	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)	ESTIMACIÓN No. 7	\$ 33,356,540.64 CON IVA
	PERÍODO EJEC. DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017	
UBICACIÓN: EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 1,273,933.40 CON IVA
CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 21,137,491.02 CON IVA ✓
RFC SIOI671110T93	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 22,411,424.42 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 481,148.71	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ 443,690.84	
<u>EXTRAS</u>	\$ 173,378.90	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 1,098,218.45	

--

DESCUENTOS		
0.2% C.M.I.C.	\$	2,196.44
0.2% D.I.F	\$	2,196.44
SUMA DESCUENTOS	\$	4,392.88
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	1,098,218.45
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	1,098,218.45
I.V.A.	\$	175,714.95
TOTAL	\$	1,273,933.40
(CON LETRA)		
(UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	4,392.88
SALDO NETO A RECIBIR	\$	1,269,540.52

AUTORIZO	ELABORO
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS	ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA	ING. EDNA ZENTENO DEL RIO SIGALA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.
Vo. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

CHIHUAHUA, CHIH.,

11 JUNIO DE 2017

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Y OBRAS PUBLICAS, LA CANTIDAD DE: \$ 1,269,540.52
(UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 52/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 7 CONTRATO No. 259/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 33,356,540.64
TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 64/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 1,098,218.45

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 1,098,218.45

IVA \$ 175,714.95

TOTAL \$ 1,273,933.40

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

D.I.F DEL 0.2% 2,196.44

C.M.I.C DEL 0.2% 2,196.44

SUMA 4,392.88

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 33,356,540.64
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 21,137,491.02
ESTA ESTIMACION	\$ 1,273,933.40
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 22,411,424.42
POR EJERCER	\$ 10,945,116.22

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% D.I.F

0.2% C.M.I.C.

ACUMULADO ANTERIOR	\$ 36,443.94	\$ 36,443.94
ESTA ESTIMACION	\$ 2,196.44	\$ 2,196.44
ACUMULADO ACTUAL	\$ 38,640.38	\$ 38,640.38

R E C I B I M O S

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
SIOI671110T93

OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)

UBICACIÓN EN VARIAS COLONI No. CONTRATO: 259/2016 ✓

ESTIMACIÓN No. 7 ✓


CONTRATIST ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

PERÍODO: DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017 ✓

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
<u>NORMALES</u>		481,148.71 ✓
4	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIONES, PLANTILLAS, INSTALACIONES DE TUBERIA, RELLENOS, ACARREOS, ETC.	51,064.36 ✓
6	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIONES, PLANTILLAS, INSTALACIONES DE TUBERIA, RELLENOS, ACARREOS, ETC.	278,752.90 ✓
10	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIONES, PLANTILLAS, INSTALACIONES DE TUBERIA, RELLENOS, ACARREOS, ETC.	20,042.56 ✓
12	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIONES, PLANTILLAS, INSTALACIONES DE TUBERIA, RELLENOS, ACARREOS, ETC.	131,288.89 ✓
<u>EXCEDENTES</u>		443,690.84 ✓
<u>EXTRAS</u>		173,378.90 ✓

SUBTOTAL	1,098,218.45	✓
I.V.A.	175,714.95	✓
TOTAL	1,273,933.40	✓

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

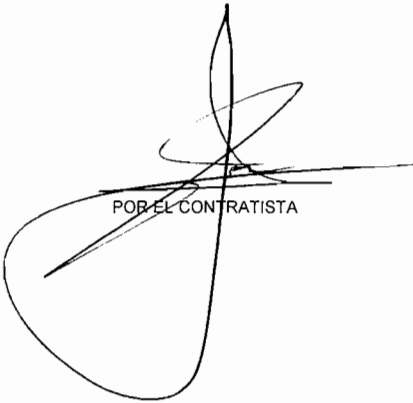
POR EL CONTRATISTA


POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

No.	CONCEPTOS DESCRIPCION	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		

OBRA NORMAL

4	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIONES, PLANTILLAS, INSTALACIONES DE TUBERIA, RELLENOS, ACARREOS,			-				51,064.36
---	--	--	--	---	--	--	--	-----------

4.15	Pozo Caja para Tuberías de 36" de diámetro, con entronque de 20" de diámetro. Incluye: Concreto F'c = 150 Kg/cm2 en plantilla, Concreto f'c = 250 Kg/cm2 con Impermeabilizante Integral y Fibra de Polipropileno en Estructura y Media Caña, Acero de Refuerzo F'y = 4200 kg/cm2, Habilitado y Colocación de Acero, Cimbrado, Colado, Vibrado, Descimbrado, Curado, Escalones, etc., Prueba de Estanqueidad; Según Plano Anexo.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	50,321.97	50,321.97
------	---	------	------	------	------	------	-----------	-----------

4.20	Brocal de Concreto Reforzado para fijación adecuada de marco y tapa de Fo.Fo.; Incluye: Concreto con modulo de ruptura de 40 Kg/cm2, Acero de refuerzo de 3/8" F'y = 4200 Kg/cm2, de 1/4" F'y = 2530 Kg/cm2, Impermeabilizante Integral, Fibra de Polipropileno, curado, cimbrado y descimbrado, etc..	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	742.39	742.39
------	--	------	------	------	------	------	--------	--------

6	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIONES, PLANTILLAS, INSTALACIONES DE TUBERIA, RELLENOS, ACARREOS,			-				278,752.90
---	--	--	--	---	--	--	--	------------

6.1	Suministro de material de banco para plantilla y relleno de zanja (caliche cribado); L.A.B. OBRA.	m3	4,066.75	2,163.22	1,535.17	628.05	124.08	77,928.44
-----	---	----	----------	----------	----------	--------	--------	-----------

6.3	Trazo con cal, medición y nivelación con cadenasamientos a cada 20.00 m. como máximo y elaboración del perfil y planta de obra terminada.	ml	1,685.50	1,685.50	1,300.50	385.00	4.24	1,632.40
-----	---	----	----------	----------	----------	--------	------	----------

6.4	Excavación para estructuras, de acuerdo con su clasificación, a cualquier profundidad inciso (3.01.02.022-H.01): excavado por unidad de obra terminada, cualesquiera que sean su clasificación y profundidad, excavado en zanja en cualquier clasificación y profundidad, en seco o en presencia de agua, tablestacado para mantener estabilidad de taludes, donde se requiera. Por unidad de obra terminada. incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta ,sobreeexcavación, afine y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	6,689.29	6,689.29	5,125.28	1,564.01	48.99	76,620.85
-----	---	----	----------	----------	----------	----------	-------	-----------

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

Pag 1 de 7

ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO		IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
6.5	Plantilla de apoyo para tubería en zanjas, con material "A" y/o "B", Incluye: selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, apisonado con pisón de mano, formación de apoyo semicircular (conchas) en campanas y/o coples de tubería para dar apoyo completo a la misma, etc.	m3	304.82	304.82	217.28	87.54	46.80	4,096.87
6.16	Instalación de Brocal redondo de Polietileno de alta resistencia (marco y tapa) de 32 kg. de peso mínimo, para pozo de visita; L.A.B. Obra; Según plano anexo.	pieza	38.00	38.00	27.00	11.00	77.50	852.50
6.18	Relleno de protección para tuberías en zanjas, con material "A" y/o "B", Incluye: selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, apisonado y compactado con pisón de mano en capas de 0.20 m. de espesor, etc.	m3	1,621.10	1,621.10	1,148.01	473.09	42.55	20,129.98
6.19	Relleno de zanjas, con material "A" y/o "B". Incluye: selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, apisonado y compactado con compactador de impacto tipo "BAILARINA" en capas de 0.20 m. de espesor; al 90% P.V.S.M., etc.	m3	4,136.66	4,136.66	3,206.54	930.12	56.69	52,728.50
6.21	Acarreo 1er Kilómetro de materiales pétreos: Arena, grava, m3 piedra, caliche, material producto de excavación, etc. en camión volteo; Incluye carga con equipo y descarga a volteo, en zona urbana tránsito normal.	m3	5,220.37	3,695.88	2,515.63	1,180.25	21.61	25,505.20
6.22	Acarreo Kms subsecuentes al 1er. Km. de materiales pétreos: arena, grava, piedra, caliche, material producto de excavación, etc. en camión volteo en zona urbana tránsito normal.	m3/k	99,187.03	13,569.05	9,202.12	4,366.93	4.41	19,258.16
10	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIONES, PLANTILLAS, INSTALACIONES DE TUBERIA, RELLENOS, ACARREOS,	-	-	-	-	-	-	20,042.56
10.11	Pozo de Visita Común de 3.75m. de profundidad para Tuberías de 24" de Ø.; Incluye: Plantilla, Concreto F'c = 250 kg/cm2 en Cimentación, Media Caña, Piso, Brocal de Concreto MR = 40 kg/cm2, Mampostería y Muros de	pozo	3.00	3.00	2.00	1.00	13,341.26	13,341.26
10.15	Instalación de Brocal redondo de Polietileno de alta resistencia (marco y tapa) de 32 kg. de peso mínimo, para pozo de visita; L.A.B. Obra; Según plano anexo.	pieza	47.00	47.00	40.00	7.00	77.5	542.50

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

Pag 2 de 7

ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

No.	CONCEPTOS DESCRIPCION	UNIDAD	PROYECTO VOLUMEN	ACUM. TOTAL	VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
					ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
10.19	Excavación y relleno de protección para localización de líneas de agua potable, agua residual tratada, alcantarillado sanitario y/o instalaciones diversas, sondeo de (1.00m x 1.00m x 1.75m), medida en banco.	lote	20.00	20.00	0.00	20.00	307.94	6,158.80
SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIONES, PLANTILLAS, INSTALACIONES DE TUBERIA, RELLENOS, 12 ACARREOS, ETC.								
12.1	Suministro de material de banco para plantilla y relleno de zanja (caliche cribado); L.A.B. OBRA.	m3	3,758.18	1,433.63	1,232.42	201.21	124.08	24,966.14
	Trazo con cal, medición y nivelación con cadenas a cada 20.00 m. como máximo y elaboración del perfil y planta de obra terminada.	ml	1,612.00	1,388.35	1,192.55	195.80	4.24	830.19
12.3	H.01): excavado por unidad de obra terminada, cualesquiera que sean su clasificación y profundidad, 12.4 excavado en zanja en cualquier clasificación y "A" y/o "B". Incluye: selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, apisonado con pisón de mano, formación de apoyo semicircular (conchas) en 12.5 campanas y/o coples de tubería para dar apoyo completo Instalación y junteo de Tubería de P.V.C. de 24" (630mm) de diámetro serie 20; Incluye: bajada de los materiales, de herramientas y equipo, prueba hidrostática, 12.6 acarreo a un km y maniobras locales.	m3	6,188.40	5,957.81	5,149.45	808.36	48.99	39,601.56
	Instalación de Brocal redondo de Polietileno de alta resistencia (marco y tapa) de 32 kg. de peso mínimo, para 12.15 pozo de visita; L.A.B. Obra; Según plano anexo. material "A" y/o "B". Incluye: selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, apisonado y compactado con pisón de mano en capas de 0.20 m. de 12.21 espesor, etc.	m3	266.94	228.55	196.47	32.08	46.80	1,501.34
	selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, apisonado y compactado con compactador de impacto tipo "BAILARINA" en capas de 0.20 m. de 12.22 espesor; al 90% P.V.S.M., etc.	m3	1,612.00	1,352.35	1,162.55	189.80	112.31	21,316.44
	Excavación y relleno de protección para localización de líneas de agua potable, agua residual tratada, alcantarillado sanitario y/o instalaciones diversas, sondeo 12.23 de (1.00m x 1.00m x 1.75m), medida en banco.	lote	35.00	33.00	25.00	8.00	77.50	620.00
		pieza	1,406.73	1,188.09	1,018.96	169.13	42.55	7,196.48
		m3	3,881.53	3,881.53	3,577.68	303.85	56.69	17,225.26
		m3	20.00	6.00	0	6.00	307.94	1,847.64

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

Pag 3 de 7

ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
12.24	Acarreo 1er Kilómetro de materiales pétreos: Arena, grava, piedra, caliche, material producto de excavación, etc. en camión volteo; Incluye carga con equipo y descarga	m3	4,885.67	2,312.83	1,886.12	426.71	21.61	9,221.20
	12.24 a volteo, en zona urbana tránsito normal.							
12.25	Acarreo Kms subsecuentes al 1er Km. de materiales pétreos: arena, grava, piedra, caliche, material producto de excavación, etc. en camión volteo en zona urbana tránsito	m3/km	92,827.73	8,557.46	6,978.63	1,578.83	4.41	6,962.64
	12.25 normal.							

POR EL CONTRATISTA

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PROYECTO VOLUMEN	VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR		

EXCEDENTES - - 443,690.84

6 SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIONES, PLANTILLAS, INSTALACIONES DE TUBERIA, RELLENOS,

6.3 Trazo con cal, medición y nivelación con cadenas a cada 20.00 m, como máximo y elaboración del perfil y planta de obra terminada. ml 1,685.50 ✓ 1,787.30 1,685.50 101.80 4.24 431.63

6.4 Excavación para estructuras, de acuerdo con su clasificación, a cualquier profundidad inciso (3.01.02.022-H.01): excavado por unidad de obra terminada, cualesquiera que sean su clasificación m3 6,689.29 ✓ 7,677.94 6,689.29 988.65 48.99 48,433.96

6.5 Plantilla de apoyo para tubería en zanjas, con material "A" y/o "B", incluye: selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, apisonado con pisón de mano, formación de apoyo m3 304.82 ✓ 315.43 304.82 10.61 46.80 496.55

6.12 Pozo de Visita Común de 3.50m. de profundidad para Tuberías de 24" de Ø.; Incluye: Plantilla, Concreto F'c = 250 kg/cm2 en Cementación, Media Caña, Piso, Brocal de Concreto pozo 1.00 ✓ 16.00 4.00 12.00 12,463.64 149,563.68

6.16 Instalación de Brocal redondo de Polietileno de alta resistencia (marco y tapa) de 32 kg. de peso mínimo, para pozo de visita, L.A.B. Obra; Según plano anexo. pieza 38.00 ✓ 39.00 ✓ 38.00 ✓ 1.00 77.50 77.50

6.18 Relleno de protección para tuberías en zanjas, con material "A" y/o "B", incluye: selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, apisonado y compactado con pisón de mano en m3 1,621.10 ✓ 1,677.91 ✓ 1,621.10 ✓ 56.81 42.55 2,417.27

6.19 Relleno de zanjas, con material "A" y/o "B", incluye: selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, apisonado y compactado con compactador de impacto tipo "BAILARINA" en m3 4,136.66 ✓ 4,704.97 ✓ 4,136.66 ✓ 568.31 56.69 32,217.49

6.20 Excavación y relleno de protección para localización de líneas de agua potable, agua residual tratada, alcantarillado sanitario y/o instalaciones diversas, sondeo lote 20.00 ✓ 37.00 34.00 3.00 307.94 923.82

10 SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIONES, PLANTILLAS, INSTALACIONES DE TUBERIA, RELLENOS, ACARREOS, ETC. - -

10.4 Excavación para estructuras, de acuerdo con su clasificación, a cualquier profundidad inciso (3.01.02.022-H.01): excavado por unidad de obra terminada, cualesquiera que sean su clasificación y profundidad, excavado en zanja en cualquier clasificación y profundidad, en seco o en presencia de agua, tablestacado para mantener estabilidad de taludes, donde se requiera. Por unidad de obra terminada. incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta m3 6,918.08 ✓ 8,143.21 ✓ 8,085.10 ✓ 58.11 48.99 2,846.81

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

Pag 5 de 7

ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO		IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
10.9	Tuberías de 24" de Ø.; Incluye: Plantilla, Concreto F'c = 250 kg/cm2 en Cimentación, Media Caña, Piso, Brocal de Concreto MR = 40 kg/cm2, Mampostería y Muros de Tabique de 28 cm, Aplanado Interior y Exterior con Mortero	pozo	1.00 ✓	33.00	30.00	3.00	10,708.37	32,125.11
10.10	Tuberías de 24" de Ø.; Incluye: Plantilla, Concreto F'c = 250 kg/cm2 en Cimentación, Media Caña, Piso, Brocal de Concreto MR = 40 kg/cm2, Mampostería y Muros de Tabique de 28 cm, Aplanado Interior y Exterior con Mortero	pozo	2.00 ✓	5.00	2.00	3.00	11,586.00	34,758.00
10.15	Instalación de Brocal redondo de Polietileno de alta resistencia (marco y tapa) de 32 kg. de peso mínimo, para pozo de visita; L.A.B. Obra; Según plano anexo.	pieza	47.00 ✓	49.00	47.00	2.00	77.5	155.00
10.19	Excavación y relleno de protección para localización de lote líneas de agua potable, agua residual tratada, alcantarillado sanitario y/o instalaciones diversas, sondeo de (1.00m x 1.00m x 1.75m), medida en banco.		20.00 ✓	56.00	20.00 ✓	36.00	307.94	11,085.84
12	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIONES, PLANTILLAS, INSTALACIONES DE TUBERIA, RELLENOS, ACARREOS, ETC.		-	-				
12.9	Pozo de Visita Común de 3.00m. de profundidad para Tuberías de 24" de Ø.; Incluye: Plantilla, Concreto F'c = 250 kg/cm2 en Cimentación, Media Caña, Piso, Brocal de Concreto MR = 40 kg/cm2, Mampostería y Muros de Tabique de 28 cm, Aplanado Interior y Exterior con Mortero Cemento-Arena 1:3, Acero de F'y = 4200 kg/cm2, Cimbrado, Descimbrado, Curado, Fibra de Polipropileno, Impermeabilizante, Escalones, etc.; y Prueba de Estanqueidad; Según Plano Anexo.	pozo	4.00 ✓	19.00	12.00 ✓	7.00	10,708.37	74,958.59
12.10	Pozo de Visita Común de 3.25m. de profundidad para Tuberías de 24" de Ø.; Incluye: Plantilla, Concreto F'c = 250 kg/cm2 en Cimentación, Media Caña, Piso, Brocal de Concreto MR = 40 kg/cm2, Mampostería y Muros de Tabique de 28 cm, Aplanado Interior y Exterior con Mortero Cemento-Arena 1:3, Acero de F'y = 4200 kg/cm2, Cimbrado, Descimbrado, Curado, Fibra de Polipropileno, Impermeabilizante, Escalones, etc.; y Prueba de Estanqueidad; Según Plano Anexo.	pozo	2.00 ✓	7.00	5.00	2.00	11,586.00	23,172.00

POR EL CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA PERIODO: DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017 ESTIMACIÓN No. 7

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO		IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
12.13	Pozo de Visita Común de 4.00m. de profundidad para Tuberías de 24" de Ø.; Incluye: Plantilla, Concreto F'c = 250 kg/cm2 en Cimentación, Media Caña, Piso, Brocal de Concreto MR = 40 kg/cm2, Mampostería y Muros de Tabique de 28 cm, Aplanado Interior y Exterior con Mortero Cemento-Arena 1:3, Acero de F'y = 4200 kg/cm2, Cimbrado, Descimbrado, Curado, Fibra de Polipropileno, Impermeabilizante, Escalones, etc.; y Prueba de Estanqueidad; Según Plano Anexo.	pozo	1.00 ✓	6.00 ✓	5.00	1.00	14,218.90	14,218.90
12.17	Incremento del Pozo de Visita Común para Tuberías de 8" a 24" de diámetro.; Incluye: Muro de Tabique asentado con Mortero Cemento Arena 1:3, Aplanado Interior y Exterior con Mortero Cemento-Arena 1:3, Impermeabilizante Integral y Escalones; Incremento por cada 25 cm de profundidad del pozo. Relleno de zanjas, con material "A" y/o "B", Incluye: selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, apisonado y compactado con compactador de impacto tipo "BAILARINA" en capas de 0.20 m. de cada 25 cm de profundidad del pozo.	incr	2.00 ✓	31.00 ✓	29.00 ✓	2.00	877.62	1,755.24
12.22	EXTRAS Acarreo en carretilla a primer estación (20.00 m), de material producto de excavación o de banco dentro de la obra sin pendiente. Incluye carga y descarga del material.	m3	3,881.53	4,129.43	3,881.53	247.90	56.69	14,053.45
EXT-02	Instalación y junteo de Tubería de P.V.C. De 30" (762mm) de diámetro Novafort; Incluye: bajada de los materiales, de herramientas y equipo, prueba hidrostática, acarreo a un km. y maniobras locales.	m3	0.00	21,547.59 ✓	17,439.83 ✓	4,107.76	18.34	75,336.32
EXT-04	Instalación y junteo de Tubería de P.V.C. De 30" (762mm) de diámetro Novafort; Incluye: bajada de los materiales, de herramientas y equipo, prueba hidrostática, acarreo a un km. y maniobras locales.	m3	0.00	471.20 ✓	0.00 ✓	471.20	208.07	98,042.58
TOTAL								1,098,218.45

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN


ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 20259/2016		TRAMO:	
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)		CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA	

No DE ESTIMAC	7	PERIODO	DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017
---------------	---	---------	---------------------------------------

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			
	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
FC4				471.20
Instalación y junteo de Tubería de P.V.C. De 30" (762mm) de diámetro				
Novafort; Incluye: bajada de los materiales, de herramientas y equipo, prueba hidrostática, acarreo a un km. y maniobras locales.				

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
	471.20
30" DE DIAM	ML

RESIDENTE


CONTRATISTA

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION

CONTRATO : /2011 259/2016		TRAMO:	
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)		CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA	
No DE ESTIMACION: 7		PERIODC DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017	

CONCEPTO	FC4	12.6	INSTALACION DE TUBERIA
----------	-----	------	------------------------

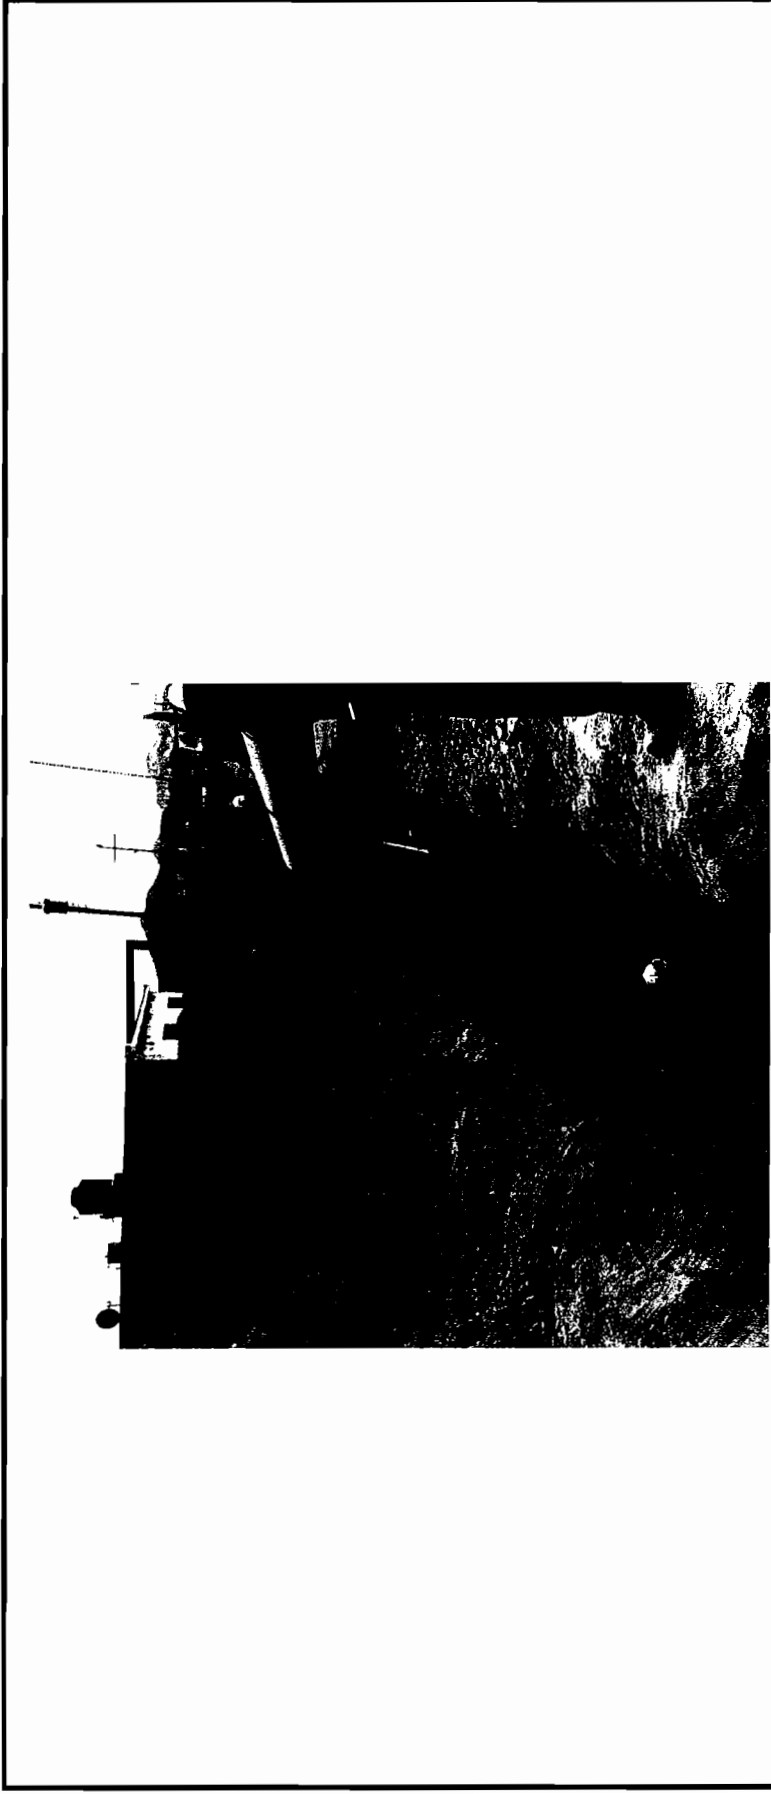

RESIDENTE
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA /

CONTRATO : 259/2016	TRAMO:
OBRA : (2A ETAPA)	CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

No DE ESTIMACION: 7	PERIOD DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017
---------------------	--

CONCEPTO	LARGO	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
6.1	PLANTILLA				
Suministro de material de banco para plantilla y relleno de zanja (caliche cribado); L.A.B. OBRA.					
TRAMO					
1-2	33.80	1.50	0.14	7.10	
2-3	49.20	1.50	0.14	10.33	
3-4	14.80	1.50	0.14	3.11	
4-5	30.75	1.50	0.14	6.46	
5-6	48.85	1.50	0.14	10.26	
6-7	44.05	1.50	0.14	9.25	
7-8	4.10	1.50	0.14	0.86	
8-9	49.65	1.50	0.14	10.43	
9-10	46.80	1.50	0.14	9.83	
10-11	21.70	1.50	0.14	4.56	
11-12	25.60	1.50	0.14	5.38	
12-13	47.60	1.50	0.14	10.00	
13-14	50.40	1.50	0.14	10.58	
SUMA	467.30	SUMA		98.15	
RELLENO HASTA 30 CM ARRIBA DEL LOMO					
1-2	33.80	1.50	1.06	53.74	
2-3	49.20	1.50	1.06	78.23	
3-4	14.80	1.50	1.06	23.53	
4-5	30.75	1.50	1.06	48.89	
5-6	48.85	1.50	1.06	77.67	
6-7	44.05	1.50	1.06	70.04	
7-8	4.10	1.50	1.06	6.52	
8-9	49.65	1.50	1.06	78.94	
9-10	46.80	1.50	1.06	74.41	
10-11	21.70	1.50	1.06	34.50	
11-12	25.60	1.50	1.06	40.70	
12-13	47.60	1.50	1.06	75.68	
13-14	50.40	1.50	1.06	80.14	
PULGADAS		SUMA		742.99	
AREA DE TUBO D 30	467.30	-0.456		-213.09	
0.456 M2					
					529.90

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR									
DIMENSIONES DE ZANJA PARA TUBERIAS DE ALCANTARILLADO <table><thead><tr><th>D</th><th>A (m)</th><th>P (m)</th></tr></thead><tbody><tr><td>24" (600 mm)</td><td>0.80</td><td>0.10</td></tr><tr><td>30" (760 mm)</td><td>1.50</td><td>0.14</td></tr></tbody></table>	D	A (m)	P (m)	24" (600 mm)	0.80	0.10	30" (760 mm)	1.50	0.14	M3 628.05
D	A (m)	P (m)								
24" (600 mm)	0.80	0.10								
30" (760 mm)	1.50	0.14								

RESIDENTE

CONTRATISTA

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION

CONTRATO : /2011 259/2016		TRAMO:
OBRA :	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)	CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
No DE ESTIMACION:	7	PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017


CONCEPTO 6.10 12.1 MATERIAL DE BANCO



RESIDENTE
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

No DE ESTIMACION: 7 PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

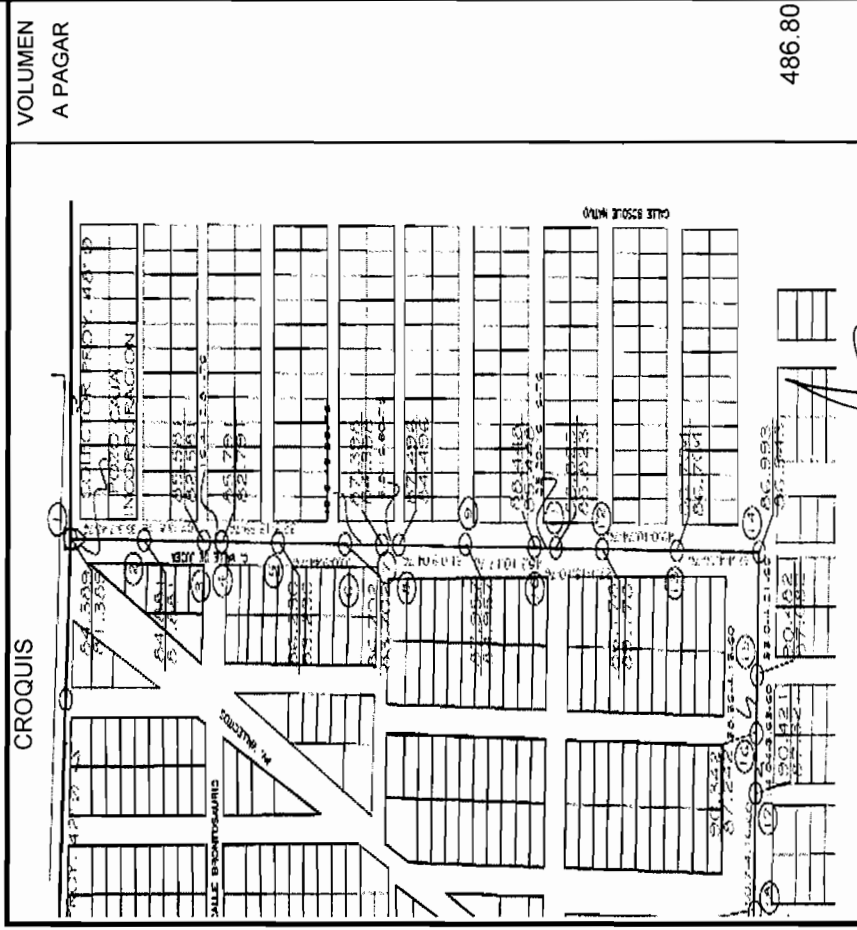[illegible]

RESIDENTE


~~CONTRATISTA~~

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION

CONTRATO : /2011 259/2016		TRAMO:	
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)		CONTRATISTA:	ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
No DE ESTIMACION:		7	PERIODC DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	6.30	12.3	TRAZO
----------	------	------	-------

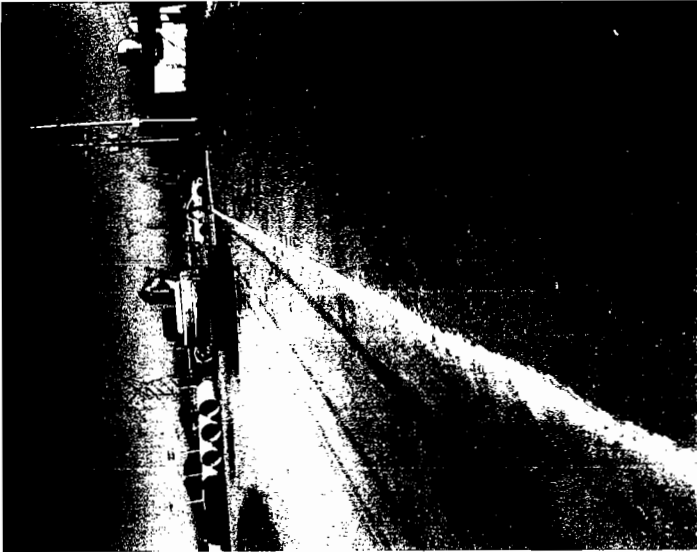

RESIDENTE

ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

CONTRATISTA

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

HOJA /

TRAMO:

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				
	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
6.4 Excavacion para estructuras, de acuerdo con su clasificaci3n, a cualquier profundidad inciso (3.01.02.022-H.01): excavado por unidad de obra terminada, cualesquiera que sean su clasificaci3n y profundidad, excavado en zanja en cualquier clasificacion y pr	1-2	35.30	1.50	3.19	168.91
	2-3	50.70	1.50	3.29	250.20
	3-4	16.30	1.50	3.29	80.44
	4-5	32.25	1.50	3.27	158.19
	5-6	50.35	1.50	3.29	248.48
	6-7	45.55	1.50	3.29	224.79
	7-8	5.60	1.50	3.29	27.64
	8-9	51.15	1.50	3.27	250.89
	9-10	48.30	1.50	3.29	238.36
	10-11	23.20	1.50	3.32	115.54
	11-12	27.10	1.50	3.27	132.93
	12-13	49.10	1.50	3.27	240.84
	13-14	51.90	1.50	3.58	278.70
		SUMA			
POZO					
TOTAL DE PROF.					
	40.70	1.40	2.40	136.75	
	TOTAL				2,552.66
/					

CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR	
POZO	PROF	POZO	PROF
2	3.35	8	3.40
3	3.45	9	3.35
4	3.35	10	3.45
5	3.40	11	3.40
6	3.40	12	3.35
7	3.40	13	3.40
SUMAS	20.35	20.35	40.70

DIMENSIONES DE ZANJA
PARA TUBERIAS DE ALCANTARILLADO

D	A (m)	P (m)
24" (600 mm)	0.80	0.10
30" (760 mm)	1.50	0.14

M3 2,552.66

~~CONTRATISTA~~

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION

CONTRATO : /2011 259/2016		TRAMO:
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)		CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
No DE ESTIMACION:		7 PERIODC DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	6.40	12.4	10.4	EXCAVACION
----------	------	------	------	------------



RESIDENTE
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS


CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 259/2016		TRAMO:	
OBRA :	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)	CONTRATIS	ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

No DE ESTIMACION: 7	PERIODO : DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017
---------------------	---

CONCEPTO	TRAMO	OPERACIONES ARITMETICAS			
		LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
Plantilla de apoyo para tubería en zanjas, con material "A" y/o "B". Incluye: selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, apisonado con pisón de mano, formación de apoyo semicircular (conchas) en campanas y/o coples de tubería para da	PLANTILLA				
	1-2	33.80	1.50	0.14	7.10
	2-3	49.20	1.50	0.14	10.33
	3-4	14.80	1.50	0.14	3.11
	4-5	30.75	1.50	0.14	6.46
	5-6	48.85	1.50	0.14	10.26
	6-7	44.05	1.50	0.14	9.25
	7-8	4.10	1.50	0.14	0.86
	8-9	49.65	1.50	0.14	10.43
	9-10	46.80	1.50	0.14	9.83
	10-11	21.70	1.50	0.14	4.56
	11-12	25.60	1.50	0.14	5.38
	12-13	47.60	1.50	0.14	10.00
	13-14	50.40	1.50	0.14	10.58
TOTAL					98.15

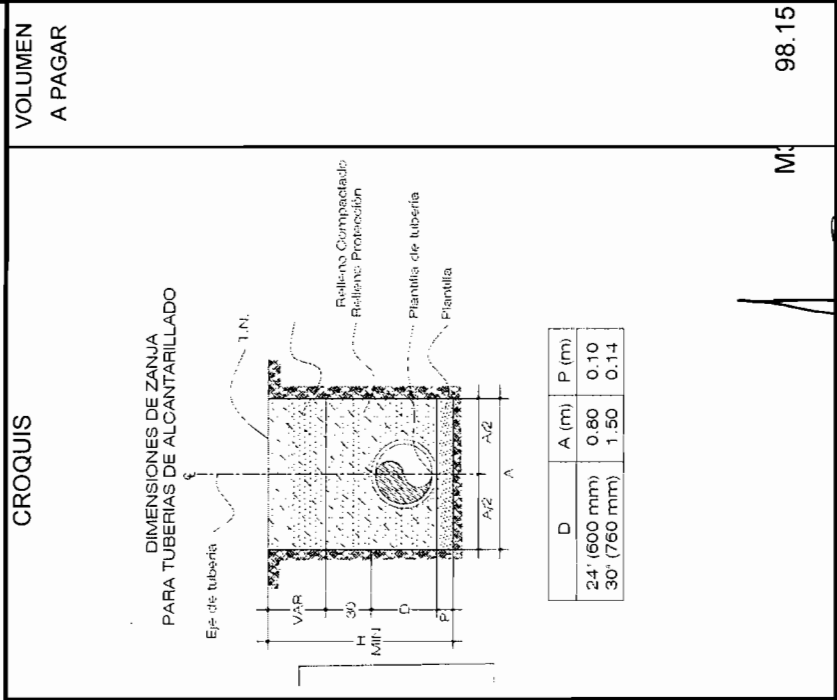

RESIDENTE


CONTRATISTA

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION

CONTRATO : /2011 259/2016		TRAMO:	
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)		CONTRATISTA:	ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
No DE ESTIMACION:		7	PERIODC DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO 6.50 12.5 PLANTILLA

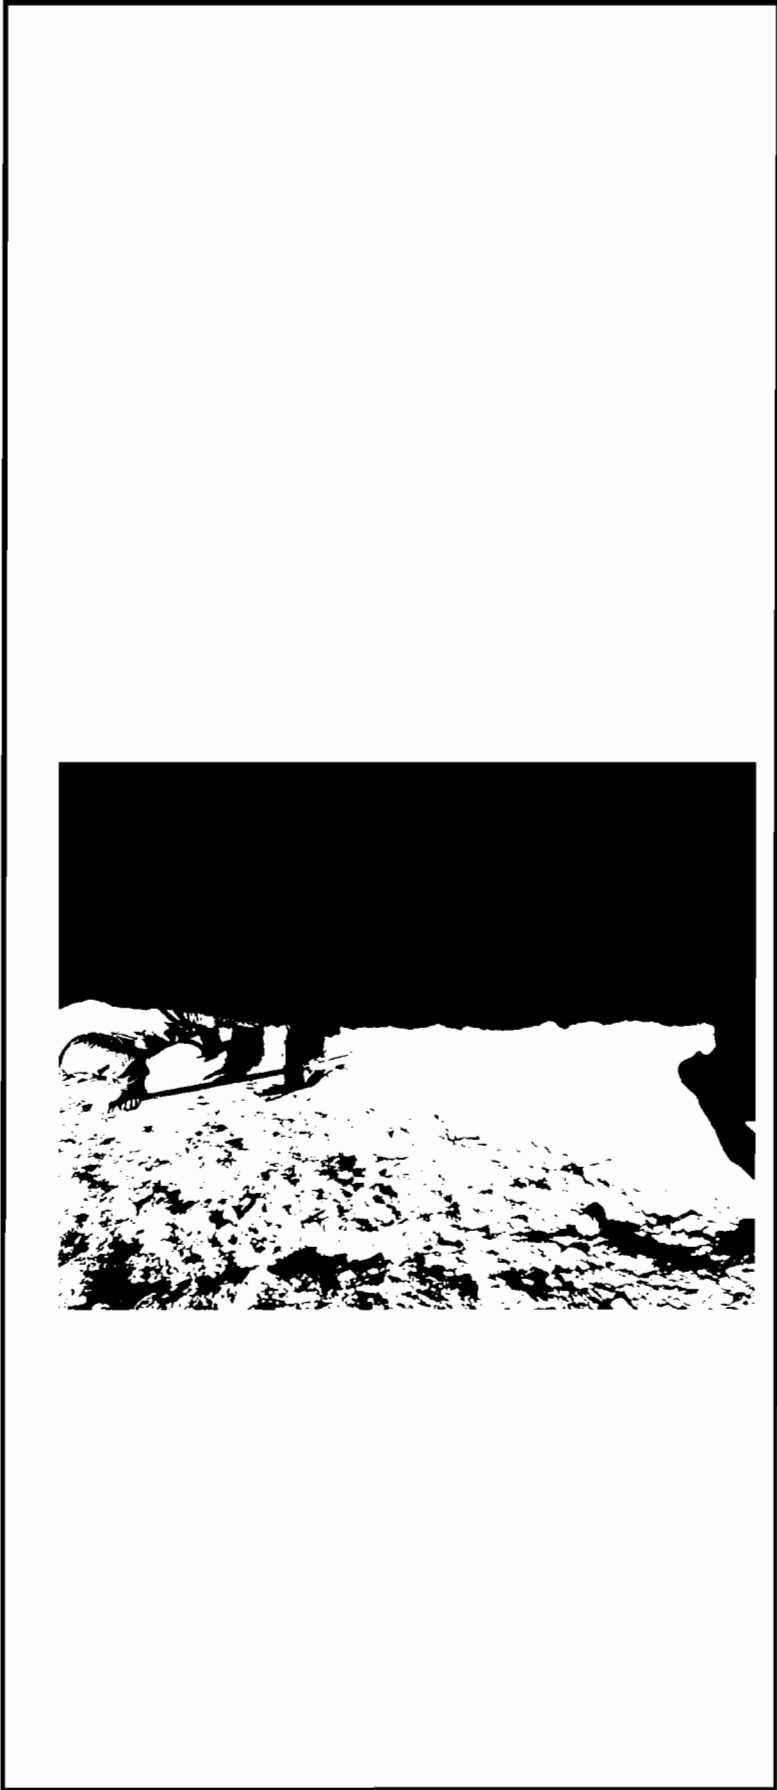

RESIDENTE
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS


CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

HOJA /

TRAMO:

PERIODO : DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

SUMA



~~CONTRATISTA~~

~~"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"~~

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION

CONTRATO : /2011 259/2016		TRAMO:	
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)		CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA	
No DE ESTIMACION:		7 PERIODC DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017	

CONCEPTO	6.12	12.90	12.10	12.13	10.90	10.10	10.11	POZO DE VISITA
----------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------



RESIDENTE
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS


CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 259/2016			TRAMO:		
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A E			CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA		

No DE ESTIMACION:	7	PERIODC DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017
-------------------	---	---

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			
	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
6.16 Instalación de Brocal redondo de Polietileno de alta resistencia (marco y tapa) de 32 Kg. de peso mínimo, para pozo de visita; L.A.B. Obra; Según plano anexo.	POZO			
		2		1.00
		3		1.00
		4		1.00
		5		1.00
		6		1.00
		7		1.00
		8		1.00
		9		1.00
		10		1.00
		11		1.00
		12		1.00
		13		1.00
		SUMA		12.00

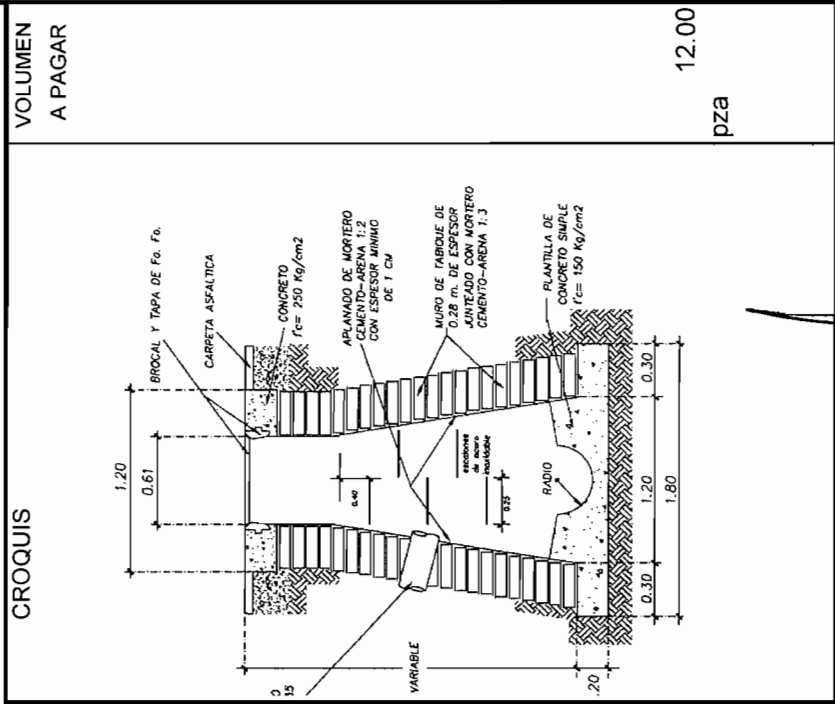

RESIDENTE


CONTRATISTA

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION

CONTRATO : /2011 259/2016		TRAMO:
OBRA :	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)	CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
No DE ESTIMACION:	7	PERIODC DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO 6.16 12.15 10.15 INSTALACION DE BROCAL

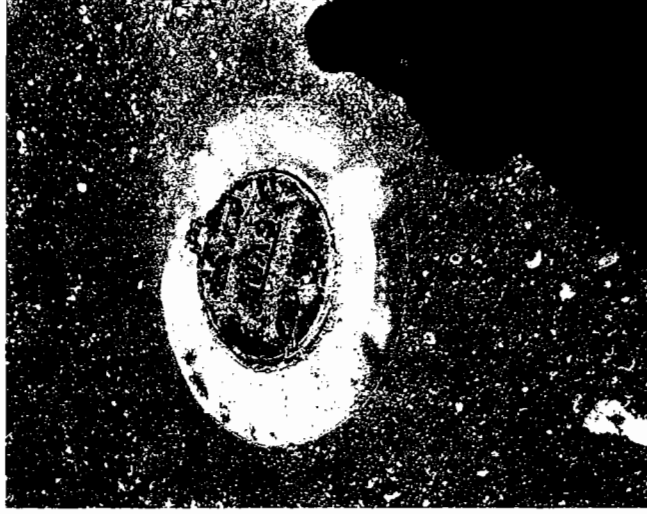

RESIDENTE
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 259/2016

OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)

CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

TRAMO:

No DE ESTIMACION: 7


PERIOD DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				
	LARGO	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
Relleno de protección para tuberías en zanjas, con material "A" y/o "B", Incluye: selección y	TRAMO				
	RELLENO HASTA 30 CM ARRIBA DEL LOMO				
	1-2	33.80	1.50	1.06	53.74
	2-3	49.20	1.50	1.06	78.23
	3-4	14.80	1.50	1.06	23.53
	4-5	30.75	1.50	1.06	48.89
	5-6	48.85	1.50	1.06	77.67
	6-7	44.05	1.50	1.06	70.04
	7-8	4.10	1.50	1.06	6.52
	8-9	49.65	1.50	1.06	78.94
	9-10	46.80	1.50	1.06	74.41
	10-11	21.70	1.50	1.06	34.50
	11-12	25.60	1.50	1.06	40.70
	12-13	47.60	1.50	1.06	75.68
	13-14	50.40	1.50	1.06	80.14
SUMA				742.99	
TUBERIA	467.30	-0.456			-213.09
					529.90

PULGADAS

AREA DE TUBO DE 30

0.456 M2

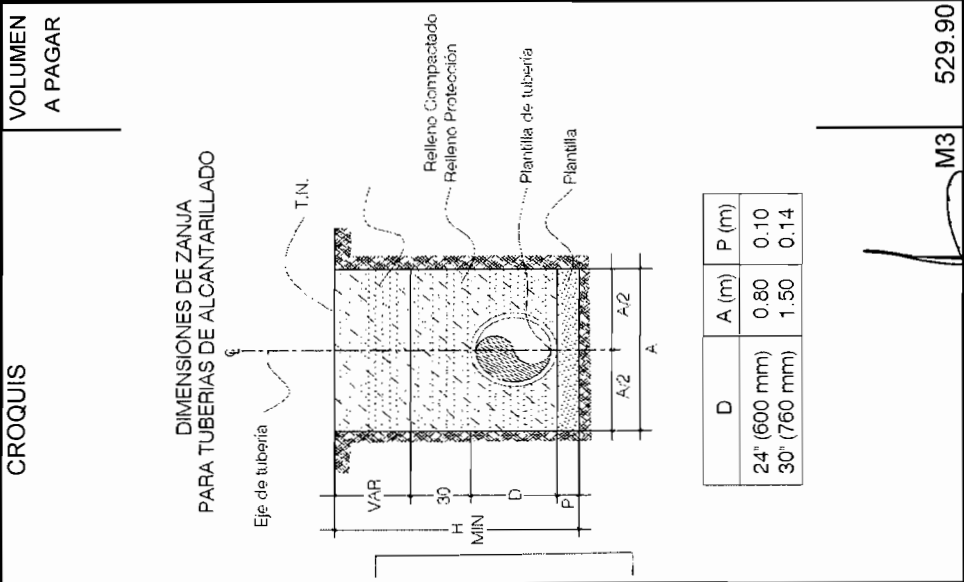

RESIDENTE

CONTRATISTA

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION

CONTRATO : /2011 259/2016		TRAMO:	
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)		CONTRATISTA:	ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
No DE ESTIMACION:		7	PERIODC DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO 6.18 12.21 RELLENO DE PROTECCION



RESIDENTE
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

CONTRATO: 259/2016

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)

CONTRATIS

TA:

PERIODO: DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

2


ESTIMACION

[illegible]

~~RESIDENTE~~

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA FUERA DE LOS INTERESES DE LOS PARTIDOS POLITICOS, Y DEBE SER DISTINTO A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA "

CONTRATISTA

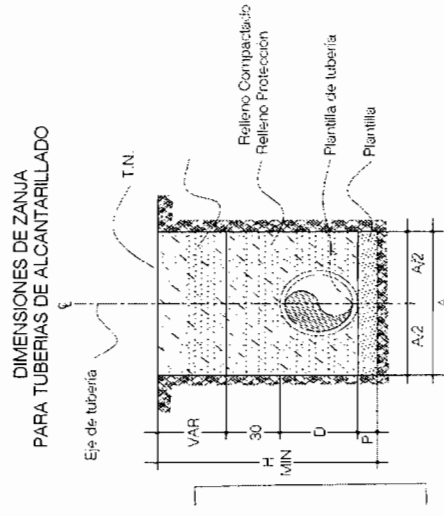

D	A (m)	P (m)
24" (600 mm)	0.80	0.10
30" (760 mm)	1.50	0.14


M3

1 498 43

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION

CONTRATO : /2011 259/2016		TRAMO:	
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)		CONTRATISTA:	ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
No DE ESTIMACION:		7	PERIODC DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	6.19	12.22	RELLENO COMPACTO	RELLENO
----------	------	-------	------------------	---------

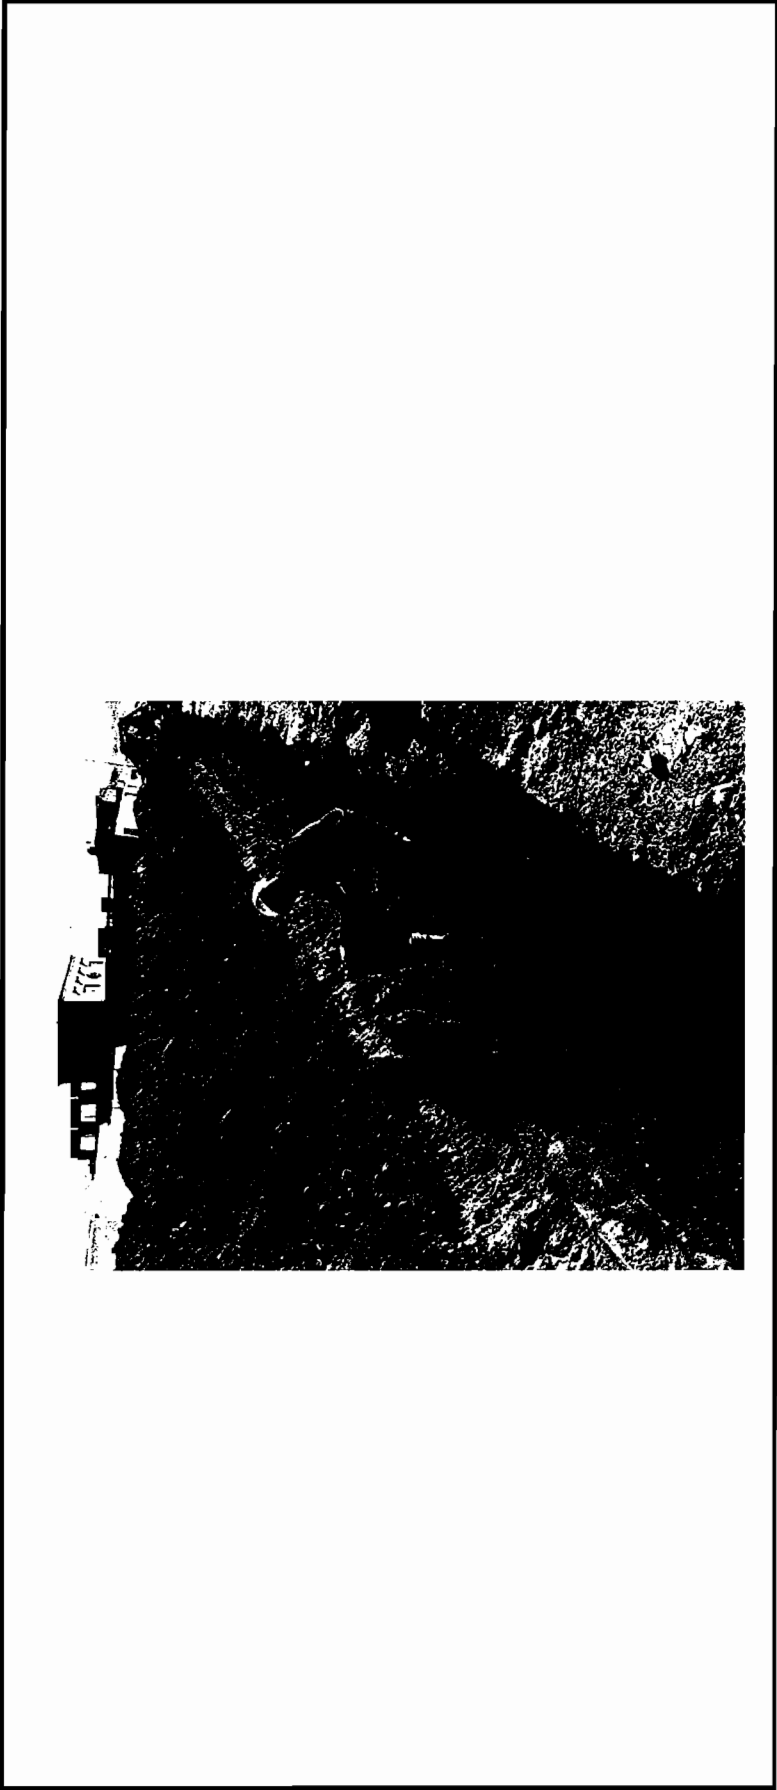

RESIDENTE
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

HOJA /

TRAMO:

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

[illegible]

CROQUIS		DIMENSIONES DE ZANJA PARA TUBERIAS DE ALCANTARILLADO	
POZO	PROF	POZO	PROF
2	3.35	8	3.40
3	3.45	9	3.35
4	3.35	10	3.45
5	3.40	11	3.40
6	3.40	12	3.35
7	3.40	13	3.40
SUMAS	20.35	20.35	40.70

VOLUMEN
A PAGAR

lote

3.00

DIMENSIONES DE ZANJA
 PARA TUBERIAS DE ALCANTARILLADO

D	A (m)	P (m)
24" (600 mm)	0.80	0.10
30" (760 mm)	1.50	0.14

RESIDENTE

CONTRATISTA

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

CONTRATO :	259/2016	TRAMO:
OBRA :	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)	ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA TA:

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
---------	-----------------

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
	1,180.25


~~CONTRATISTA~~

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION

CONTRATO : /2011 259/2016		TRAMO:
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)		CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
No DE ESTIMACION: 7		PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO 6.21 12.24 ACARREO PRIMER KM

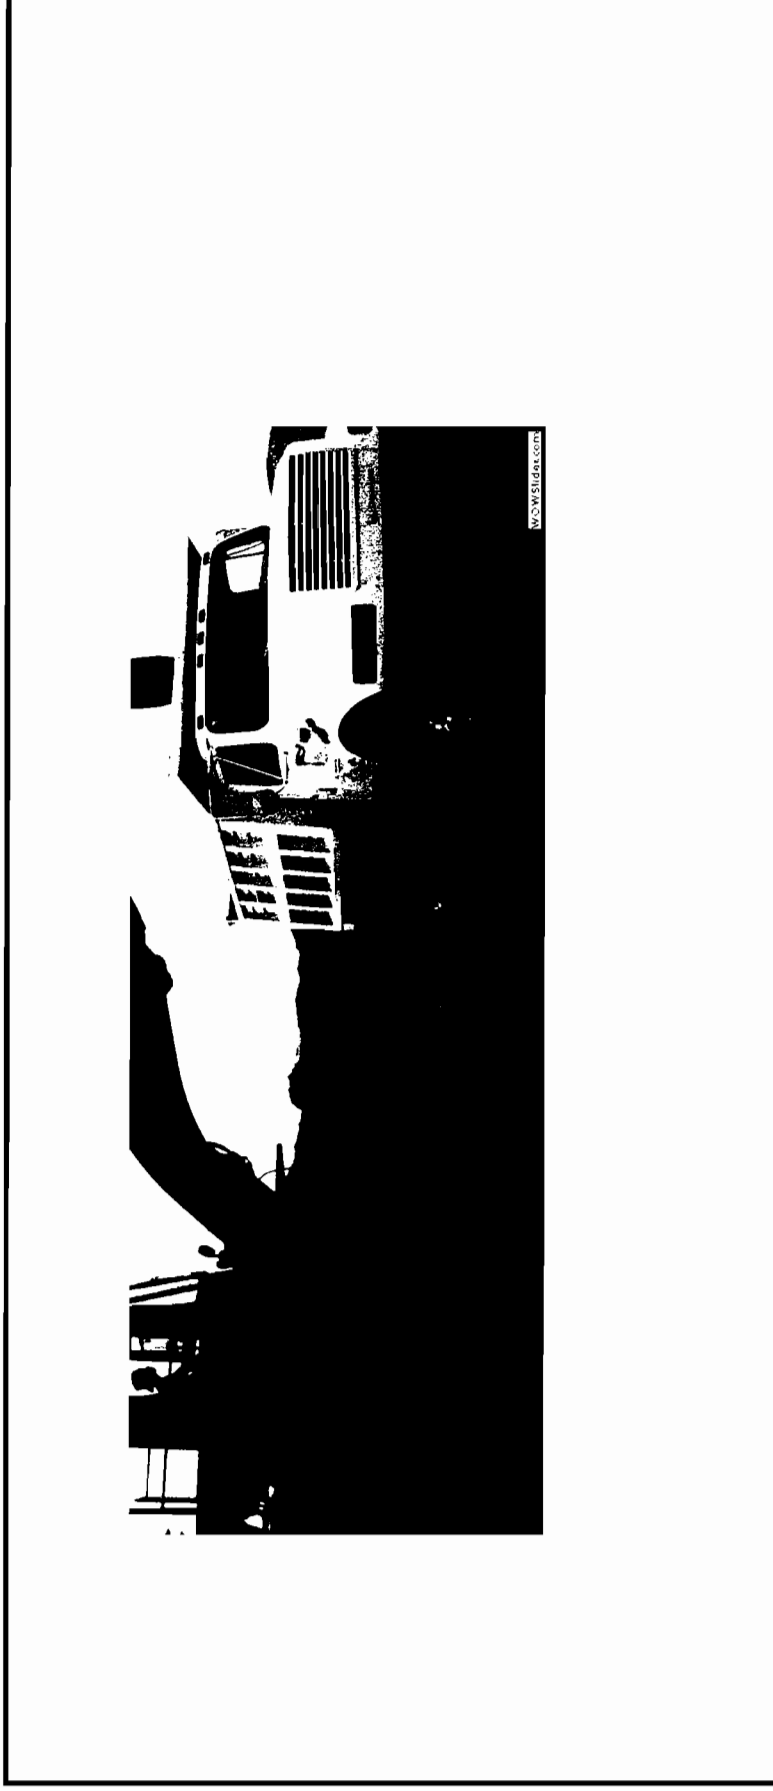

RESIDENTE
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

CONTRATO : 259/2016	TRAMO:
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)	ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA TA:

No DE	7	PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017
ESTIMACION	:	:

[illegible]

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
	4,366.93

~~RESIDENTE~~
~~ING. HECTOR IRIGOYEN RASCON~~

~~CONTRATISTA~~
~~ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA~~

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION

CONTRATO : /2011 259/2016		TRAMO:	
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)		CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA	
No DE ESTIMACION:		7 PERIODC DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017	

CONCEPTO 6.22 12.25 ACARREO KM SUBSECUENTE



RESIDENTE
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

HOJA /

CONTRATO : /2011 F 259/2016

OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD 2ª CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

7 periodo DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS		
EXT-2	LARGO	ANCHO	TOTAL
Acarreo en carretilla a primer estación (20.00 m), de material producto de excavación o de banco dentro de la obra sin pendiente. Incluye carga y descarga del material.			98.15
RELLENO DE PROTECCION			529.90

		SUMA	628.05
		ABUNDAMIENTO 20 %	125.61
		TOTAL	753.66

CROQUIS

VOLUMEN A PAGAR

Sección Tipo 24" de O.A.S.

Eje de tubería

Repleno Compactado

Repleno Protección

Almohada de tubería

Planta

130

65

65

75

30

15

2.2

753.66

~~CONTRATISTA~~

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION

CONTRATO : /2011 259/2016		TRAMO:
OBRA :	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS	CONTRATISTA:
	AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)	
Nº DE ESTIMACION:		7 PERIODC DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO EXT 2 ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL DE BANCO



RESIDENTE
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA


HOJA /

TRAMO:

OBRA :	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD 2A	CONTRATISTA:	ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
--------	--	--------------	-------------------------------

No DE ESTIM/	7 PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017
--------------	---

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS		
	LARGO	ANCHO	TOTAL
12.1			
Suministro de material de banco para plantilla y relleno de zanja (caliche cribado); L.A.B. OBRA.			
	189.80	1.30	0.13
			32.08
	RELLENO HASTA 30 CM ARRIBA DEL LOMO		
	189.80	1.30	0.91
			224.53
	DESCUENTO TUBERIA		-55.40
			201.21

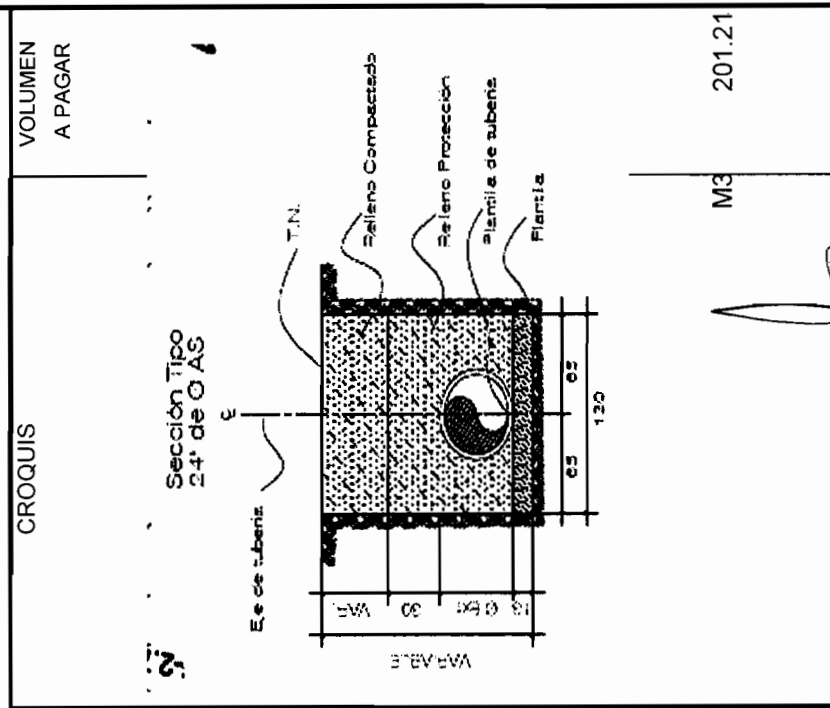

RESIDENTE

~~CONTRATISTA~~

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION

CONTRATO : /2011 259/2016		TRAMO:
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)		ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
No DE ESTIMACION:		7 PERIODC DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO 6.10 12.1 MATERIAL DE BANCO




RESIDENTE
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

HOJA /

CONTRATO :	259/2016	TRAMO:
OBRA :	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2ª CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA	

Nº DE ESTIM./	7	PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017
---------------	---	---

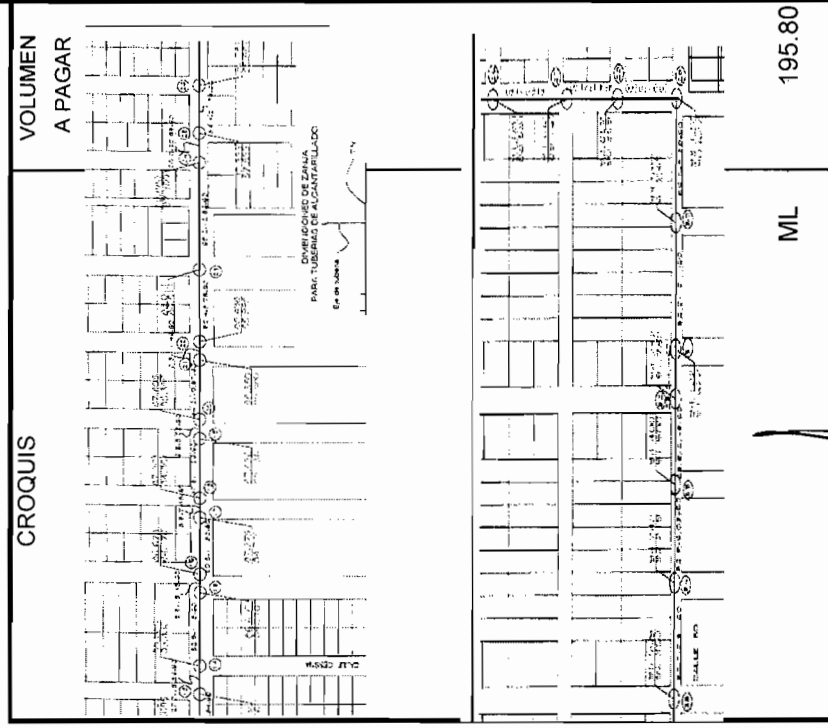[illegible]

RESIDENTE


~~CONTRATISTA~~

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION

CONTRATO : /2011 259/2016		TRAMO:
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)		CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
No DE ESTIMACION:		7 PERIODC DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	6.30	12.3	TRAZO
----------	------	------	-------

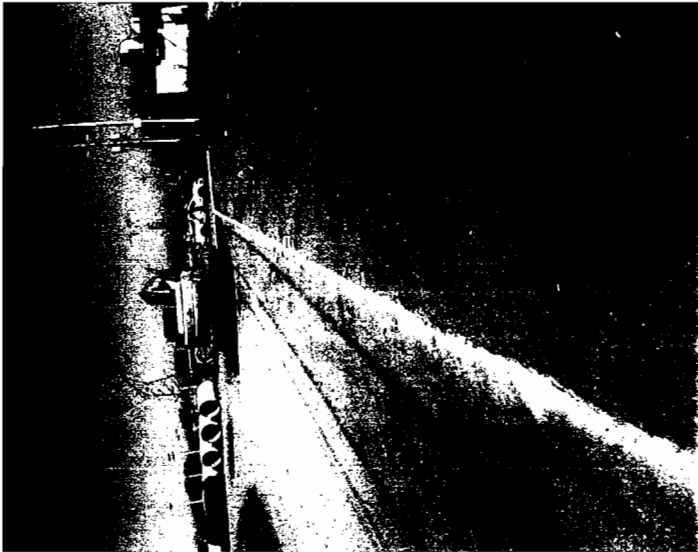

RESIDENTE
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

CONTRATO : 259/2016	OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)
CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA	

CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR	
POZO	PROF	pozo	prof
30	3.20	2	2.85
31	3.00	3	2.85
32	2.95	4	2.85
33	2.90	15	4.05
34	3.05		
35	2.85		
SUMAS	30.55		
	total	52.56	

Sección Tipo 2+ de O.A.S.

Eje de tubería

T.N.

Sello Compuesto

Sello Protección

Planilla de tubos

Planilla

65 65 130

V.M.A.S. 13 30 13 65 130

M3 808.36

~~CONTRATISTA~~

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION

CONTRATO : /2011 259/2016		TRAMO:
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)		CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
No DE ESTIMACION: 7		PERIODC DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	6.40	12.4	10.4	EXCAVACION
----------	------	------	------	------------



RESIDENTE
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA


HOJA /

[illegible]

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION

CONTRATO : /2011 259/2016		TRAMO:
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)		CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
No DE ESTIMACION: 7		PERIODC DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO 6.50 12.5 PLANTILLA

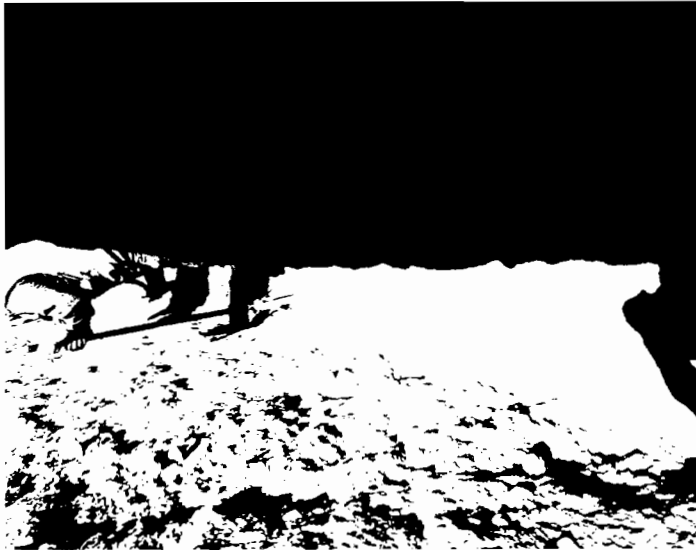


RESIDENTE
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO :	259/2016	TRAMO:
OBRA :	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA	

Nº DE ESTIMAC	7	PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017
---------------	---	---

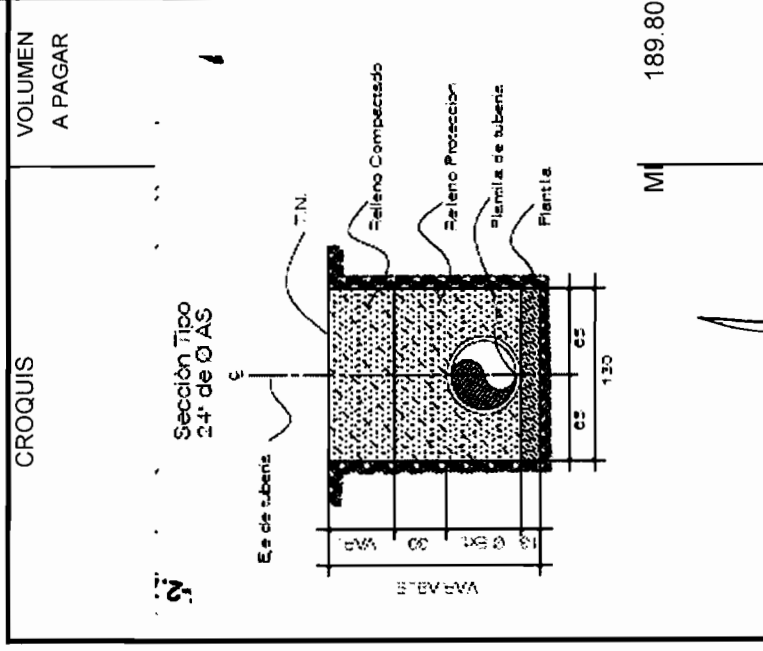[illegible]

RESIDENTE


~~CONTRATISTA~~

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA".

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION

CONTRATO : /2011 259/2016	TRAMO:
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)	CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
No DE ESTIMACION: 7	PERIODC DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO FC4 12.6 INSTALACION DE TUBERIA

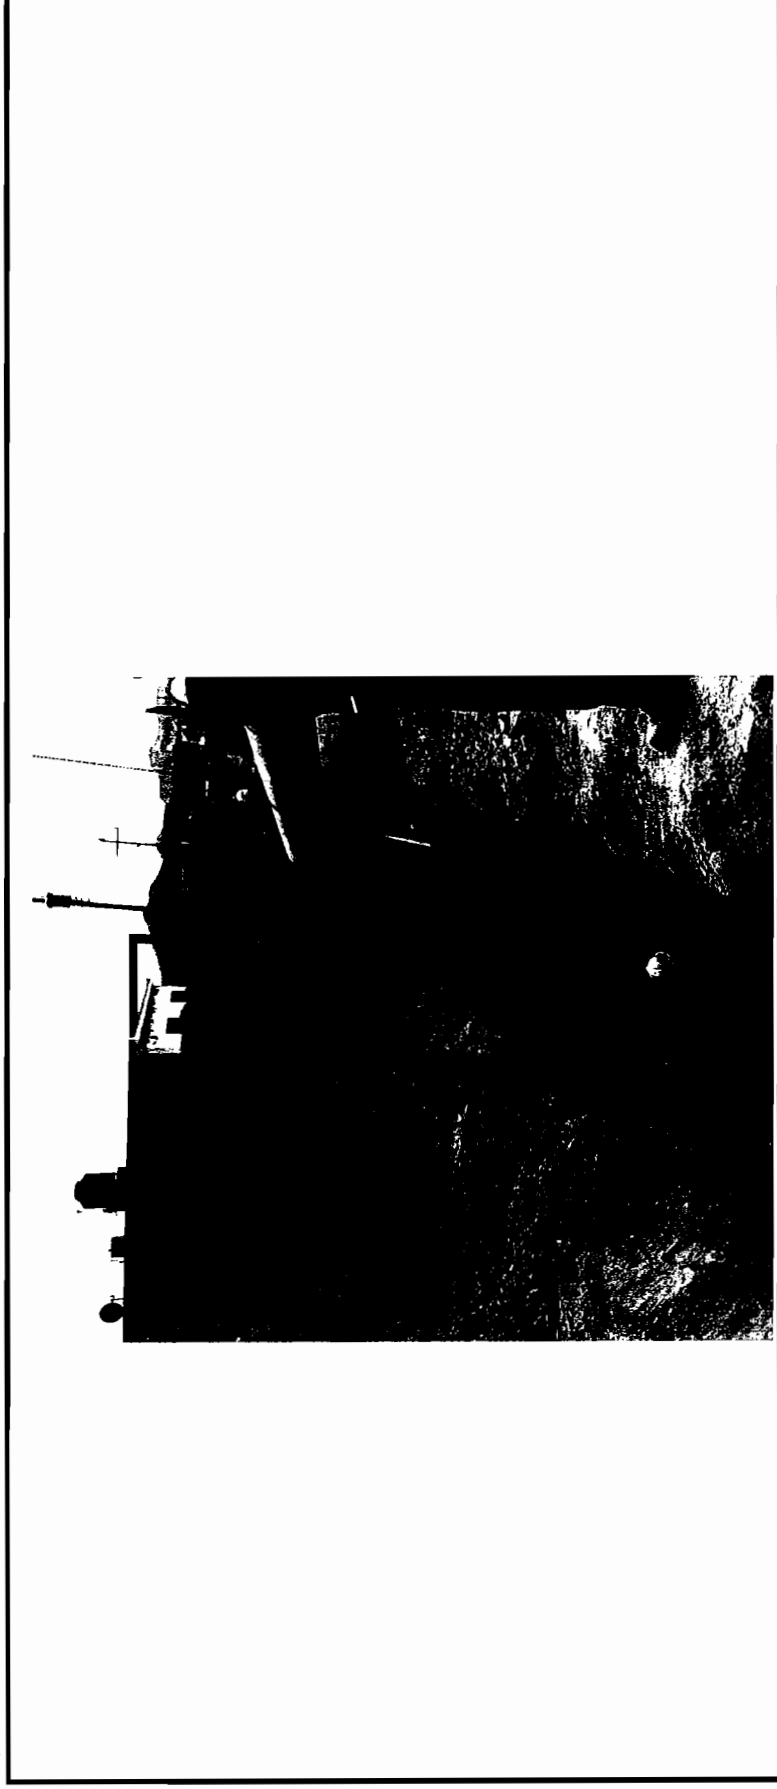

RESIDENTE
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS


CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

HOJA /

TRAMO:

MENTAL ORTEGA

MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

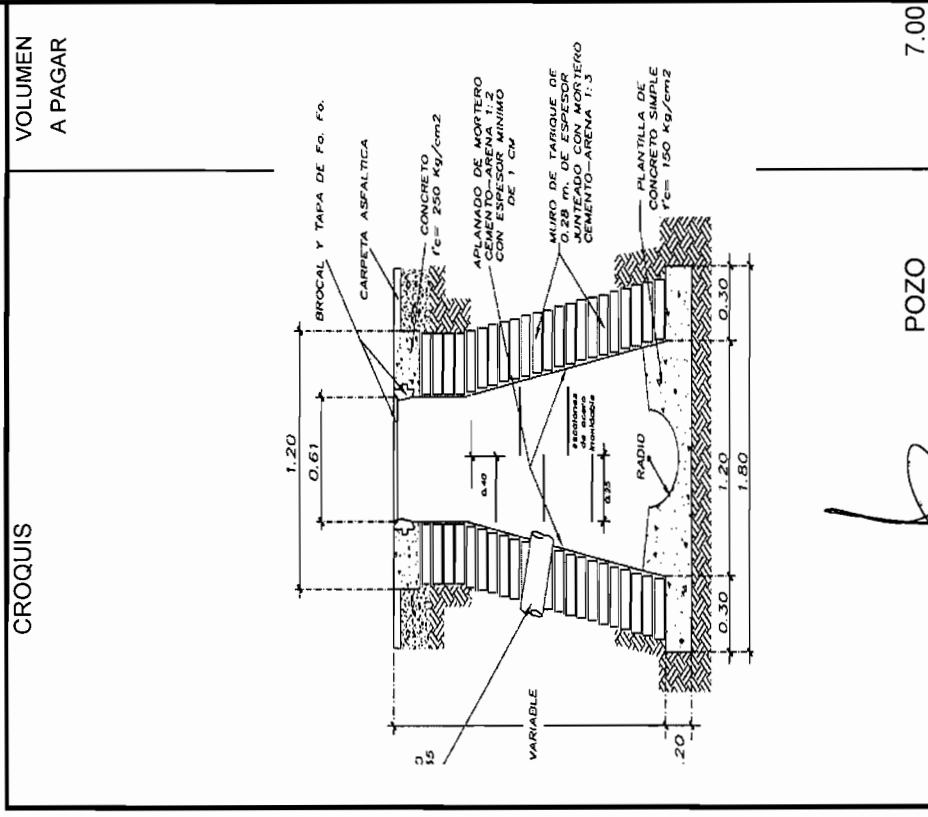[illegible]

~~CONTRATISTA~~

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION

CONTRATO : /2011 259/2016		TRAMO:	
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)		CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA	
No DE ESTIMACION: 7		PERIODC DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017	

CONCEPTO	6.12	12.90	12.10	12.13	10.90	10.10	10.11	POZO DE VISITA
----------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------



RESIDENTE
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

HOJA /

TRAMO:

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

CROQUIS	VOLUMEN
---------	---------

CROQUIS

VOLUMEN A PAGAR

Diagram illustrating the cross-section and plan view of a bridge structure, showing dimensions and material specifications.

Cross-section dimensions:

- Top width: 1.20
- Bottom width: 0.30
- Height: 0.61
- Radius: 0.20
- Variable dimension: VARIABLE

Plan view dimensions:

- Left side width: 0.30
- Right side width: 0.30
- Central width: 1.20
- Total width: 1.80

Material and Construction Specifications:

- BROCAL Y TAPA DE f_c, f_o
- CARPETA ASFALTICA
- CONCRETO $f_c = 250 \text{ Kg/cm}^2$
- APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 CON ESPESOR MINIMO DE 1 CM
- MURO DE TARIQUE DE 0.28 m. DE ESPESOR CEMENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3
- PLANTILLA DE COMENTARIO DE $f_c = 150 \text{ Kg/cm}^2$

~~CONTRATISTA~~

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION

CONTRATO : /2011 259/2016		TRAMO:	
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)		CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA	
No DE ESTIMACION: 7		PERIODC DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017	

CONCEPTO	6.12	12.90	12.10	12.13	10.90	10.10	10.11	POZO DE VISITA
								

RESIDENTE
ING. SERGIO GARCIA GARDENAS


CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

HOJA /

TRAMO:

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

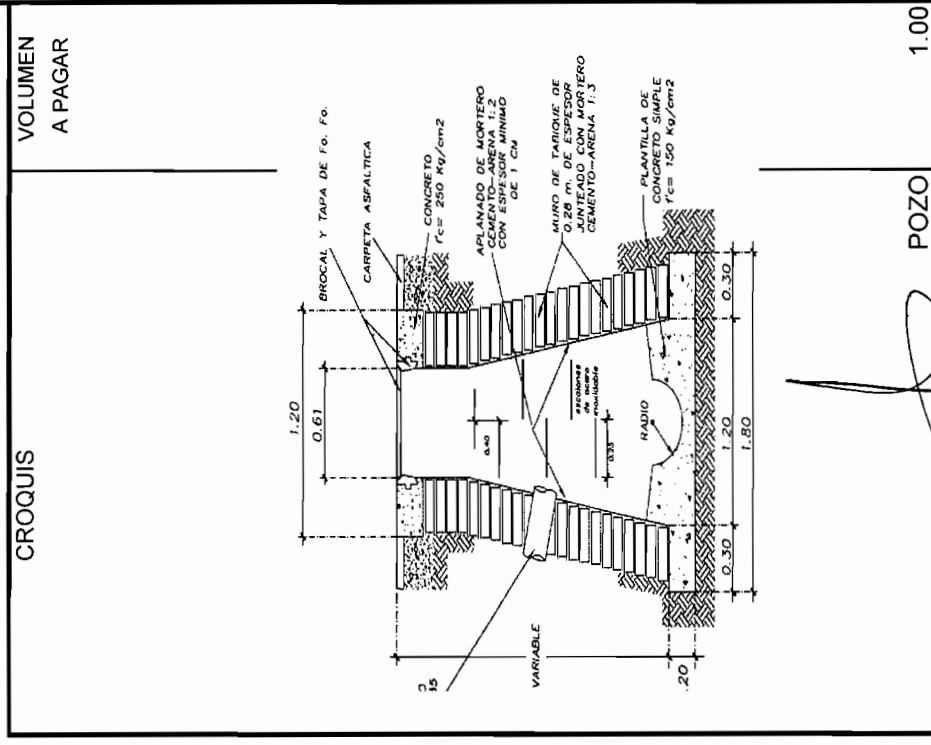[illegible]

~~CONTRATISTA~~

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION

CONTRATO : /2011 259/2016		TRAMO:	
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)		CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA	
Nº DE ESTIMACION: 7		PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017	

CONCEPTO	6.12	12.90	12.10	12.13	10.90	10.10	10.11	POZO DE VISITA
----------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------



RESIDENTE
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

CONTRATO: 259/2016

OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA


Nº DE ESTIMAC	7 periodo	DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017
---------------	-----------	---------------------------------------

7 periodo

DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

**VOLUMEN
A PAGAR**

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			
	POZO	ANCHO	ALTO	TOTAL
12.15 Instalación de Brocal redondo de Polietileno de alta resistencia (marco y tapa) de 32 kg. de peso mínimo, para pozo de visita; L.A.B. Obra: Según plano anexo.	31			1.00
	32			1.00
	33			1.00
	35			1.00
	2			1.00
	3			1.00
	4			1.00
	15			1.00

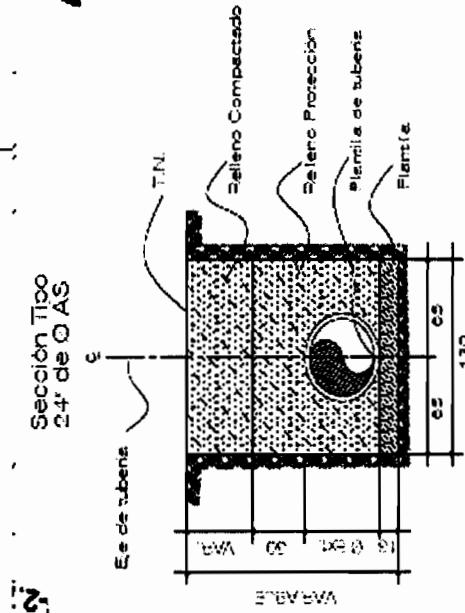

PZA 8.00

8.00

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO/AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"


~~RESIDENTE~~

~~CONTRATISTA~~

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION

CONTRATO : /2011 259/2016		TRAMO:
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)		CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
No DE ESTIMACION:		7 PERIODC DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO 6.16 12.15 10.15 INSTALACION DE BROCAL

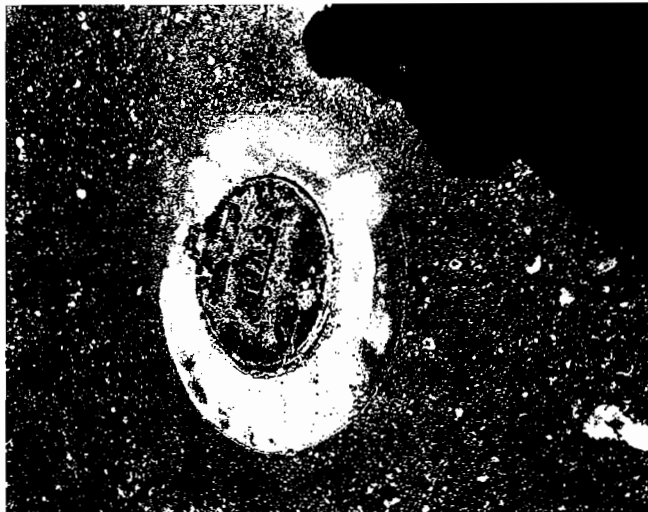

RESIDENTE
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

HOJA /

TRAMO:

OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A E CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

Technical drawing of a bridge pier cross-section. The drawing includes the following labels and dimensions:

- Labels:**
 - BROCAL Y TAPA DE Fg. Fo.
 - CARPETA ASFALTICA
 - CONCRETO $f_c = 250 \text{ Kg/cm}^2$
 - ACABADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ESPESOR MINIMO DE 1 CM
 - MURO DE TABIQUE DE 0.28 m. DE ESPESOR JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3
 - PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE $f_c = 150 \text{ Kg/cm}^2$
 - REVOLVER de todo el tabique
 - RADIO
 - VARIABLE
- Dimensions:**
 - Overall height: 1.20
 - Top section height: 0.61
 - Base section height: 0.40
 - Base width: 0.35
 - Base radius: RADIO
 - Base dimensions: 0.30, 1.20, 1.80
 - Base width: 0.30
 - Base width: 0.30
 - Base width: 0.20

~~CONTRATISTA~~

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION

CONTRATO : /2011 259/2016		TRAMO:
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)		CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
No DE ESTIMACION:		7 PERIODC DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	12.17	INCREMENTO AL POZO DE VISITA
		

RESIDENTE
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

[illegible]

~~"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"~~

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION

CONTRATO : /2011 259/2016		TRAMO:	
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)		CONTRATISTA:	ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
Nº DE ESTIMACION:		7	PERIODC DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	6.18	12.21	RELLENO DE PROTECCION
----------	------	-------	-----------------------



RESIDENTE
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS


CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

HOJA /

TRAMO:

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

7 periodo DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

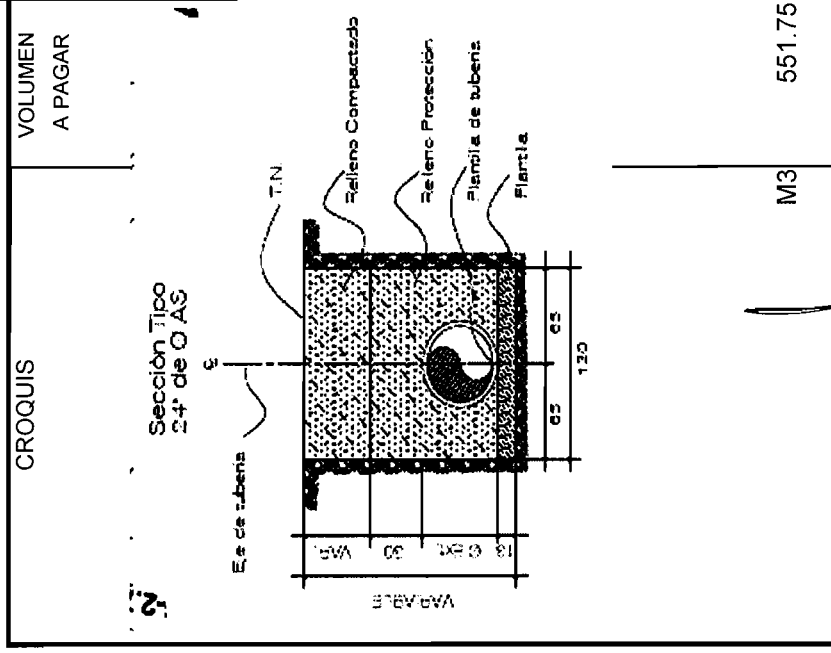[illegible]


~~CONTRATISTA~~

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION

CONTRATO : /2011 259/2016		TRAMO:	
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)		CONTRATISTA:	ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
Nº DE ESTIMACION:		7	PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	6.19	12.22	RELLENO COMPACTO	RELLENO
----------	------	-------	------------------	---------

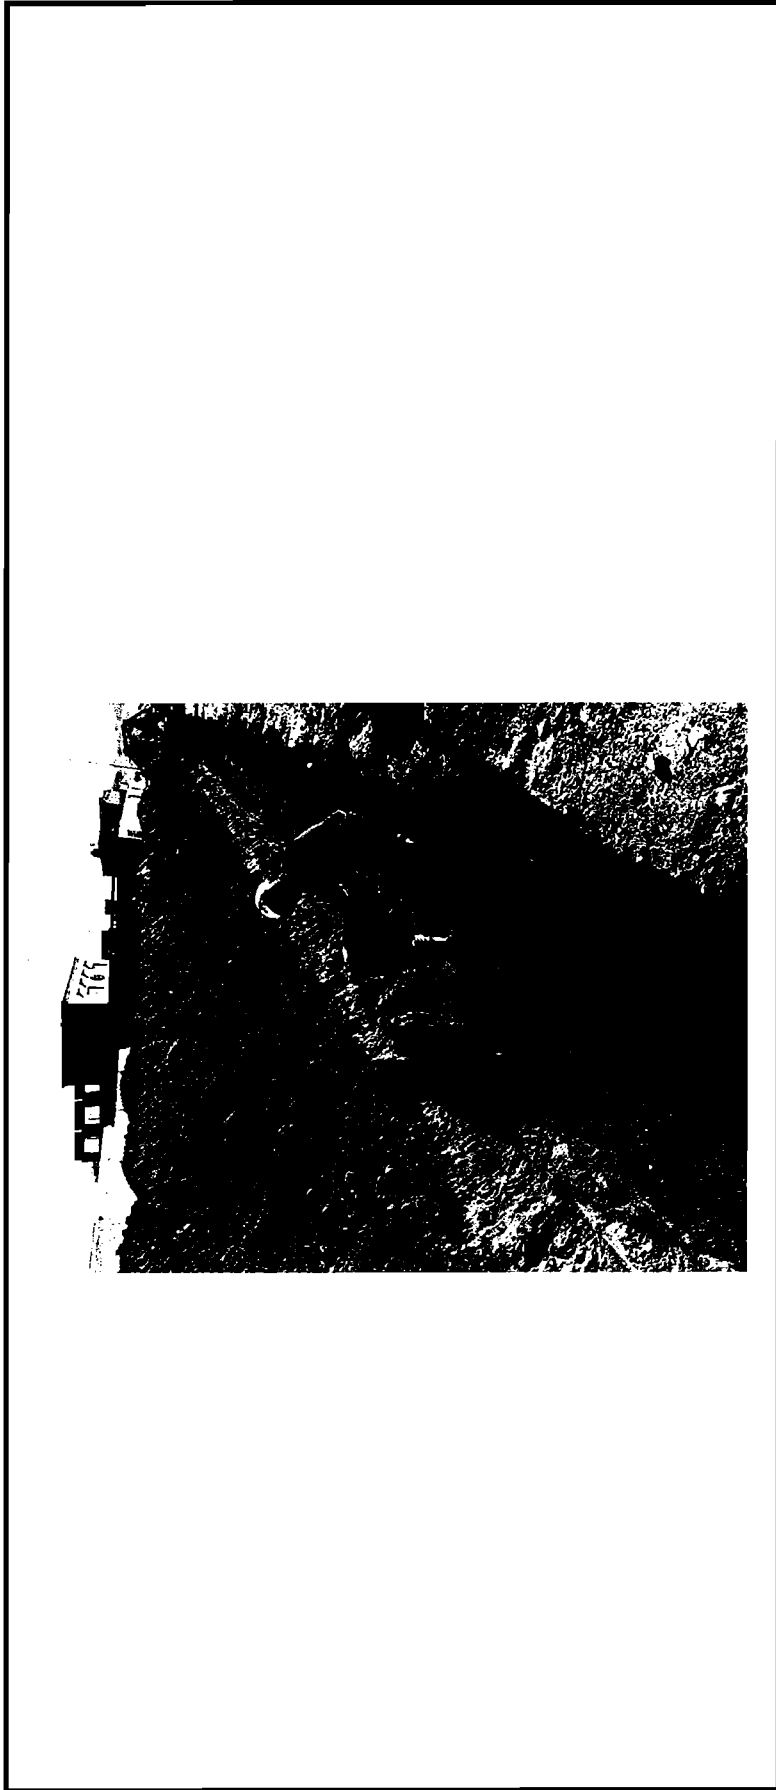

RESIDENTE
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS


CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

HOJA /

TRAMO:

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

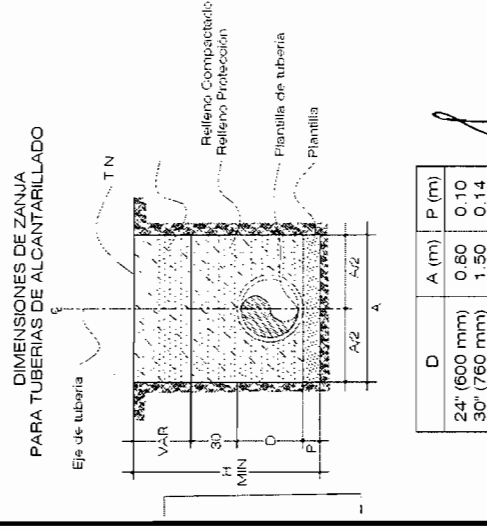
[illegible]

lote

CONTRATISTA

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

HOJA /


[illegible]

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION

CONTRATO : /2011 259/2016		TRAMO:
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)		CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
No DE ESTIMACION: 7		PERIODC DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO 6.21 12.24 ACARREO PRIMER KM

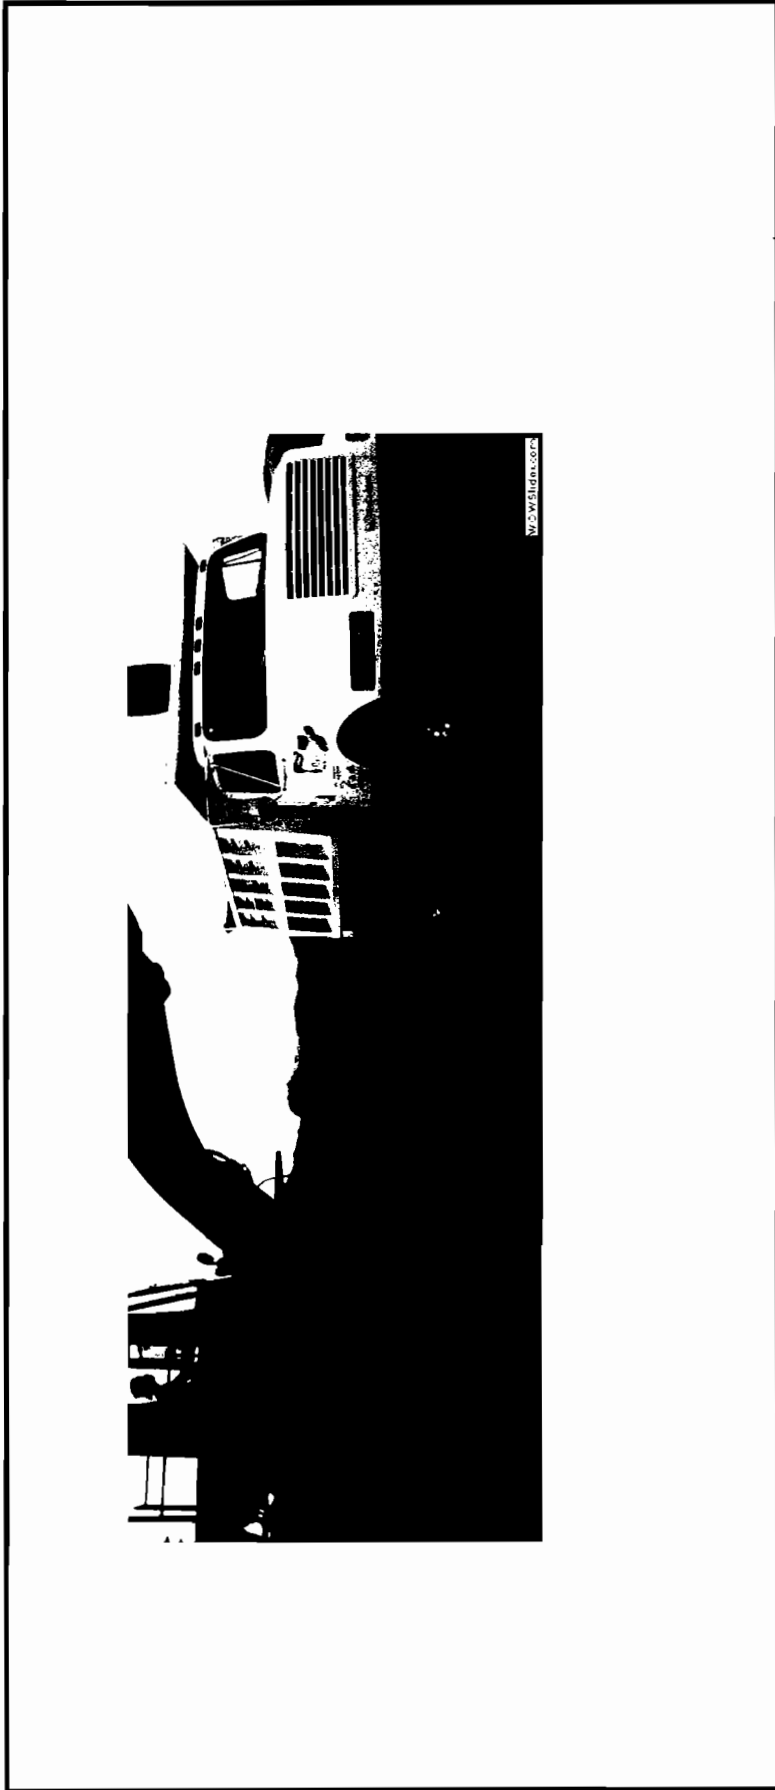

RESIDENTE
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

HOJA /

RESIDENTE

CONTRATISTA


"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION

CONTRATO : /2011 259/2016	TRAMO:
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)	CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
No DE ESTIMACION: 7	PERIODC DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO 6.22 12.25 ACARREO KM SUBSECUENTE

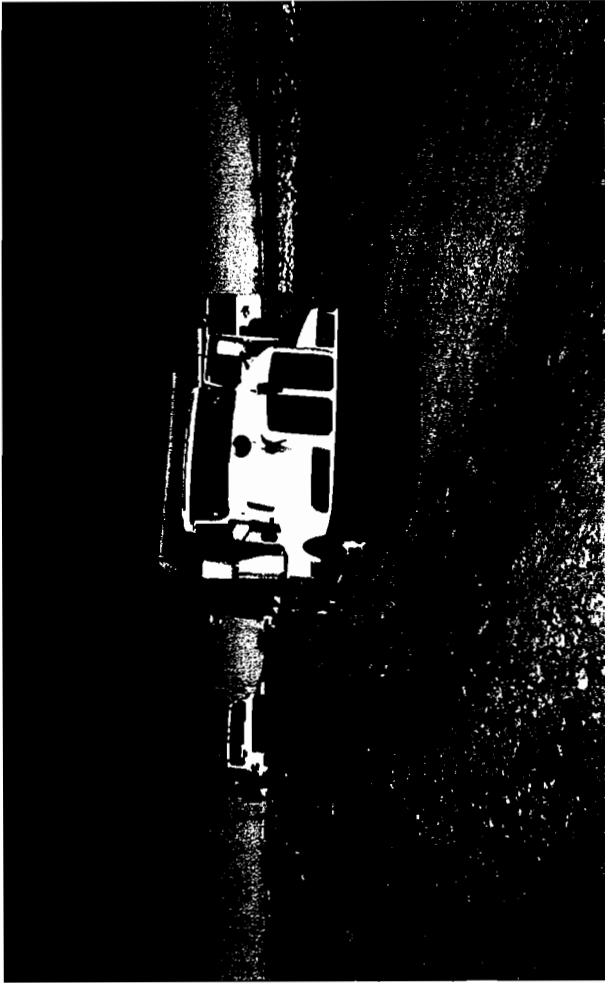

RESIDENTE
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA /


CONTRATO : 259/2016	TRAMO:
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A E	CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

No DE ESTIM.	7 periodo	DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017
--------------	-----------	---------------------------------------

CONCEPTO	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
EXT-2				
Acarreo en carretilla a primer estación (20.00 m), de material producto de excavación o de banco dentro de la obra sin pendiente. Incluye carga y descarga del material.				32.08
RELLENO DE PROTECCION				169.13
				201.21

DIFERENCIA GENERADA ESTIMACIONES PASADAS

ANALISIS ANEXO "A"	2593.87
SUMA	2,795.08
ABUNDAMIENTO 20 %	559.02
TOTAL	3,354.10

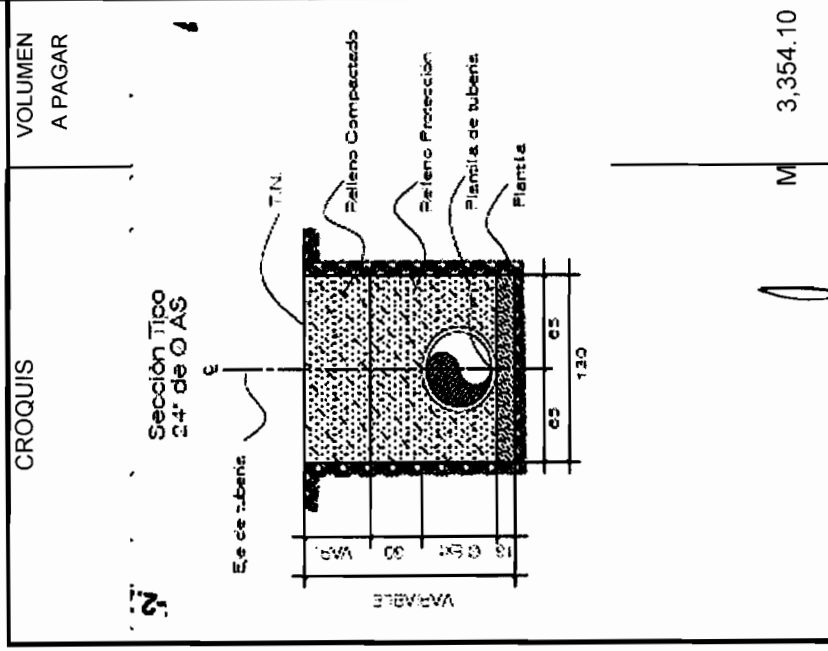

RESIDENTE

CONTRATISTA

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

CONTRATO : 259/2016	OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)
CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA	

POZO	PROF	pozo	prof	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
3	2.96				
46	2.95				
47	2.80				
44	3.05				
45	3.05				
43	3.45				
42	3.75				
	22.01				
		total	22.01		

M3

58.11

~~CONTRATISTA~~


"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION

CONTRATO : /2011 259/2016	TRAMO:
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)	CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
No DE ESTIMACION: 7	PERIODC DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

EXCAVACION

CONCEPTO 6.40 12.4 10.4

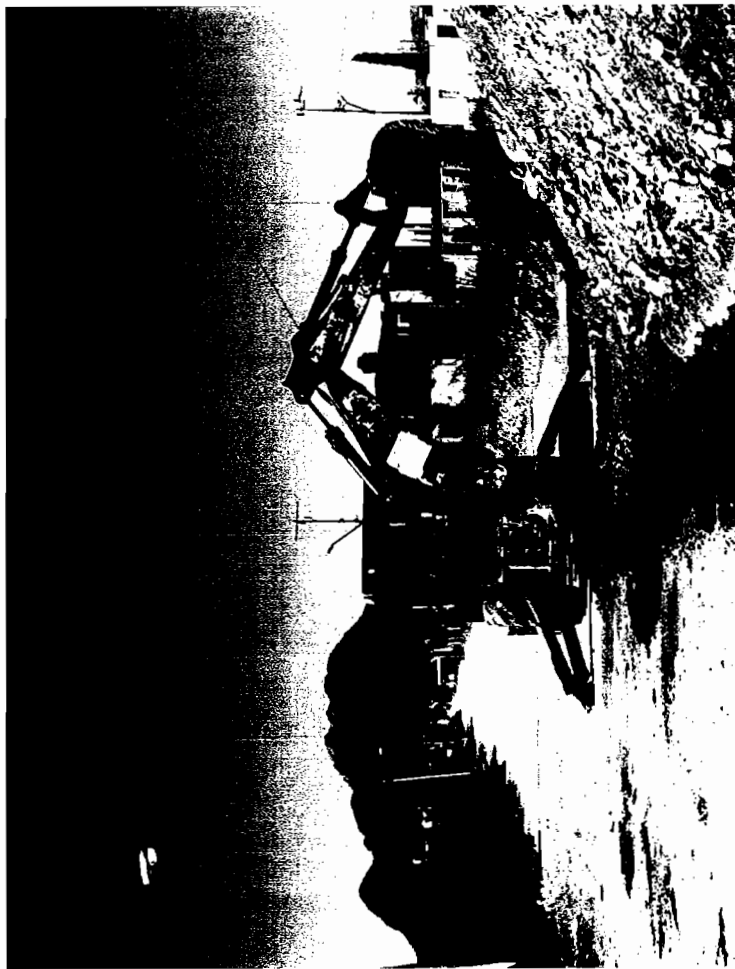


RESIDENTE
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

TRAMO:

OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA C

No DE ESTIMAC	7	periodo DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017
---------------	---	---

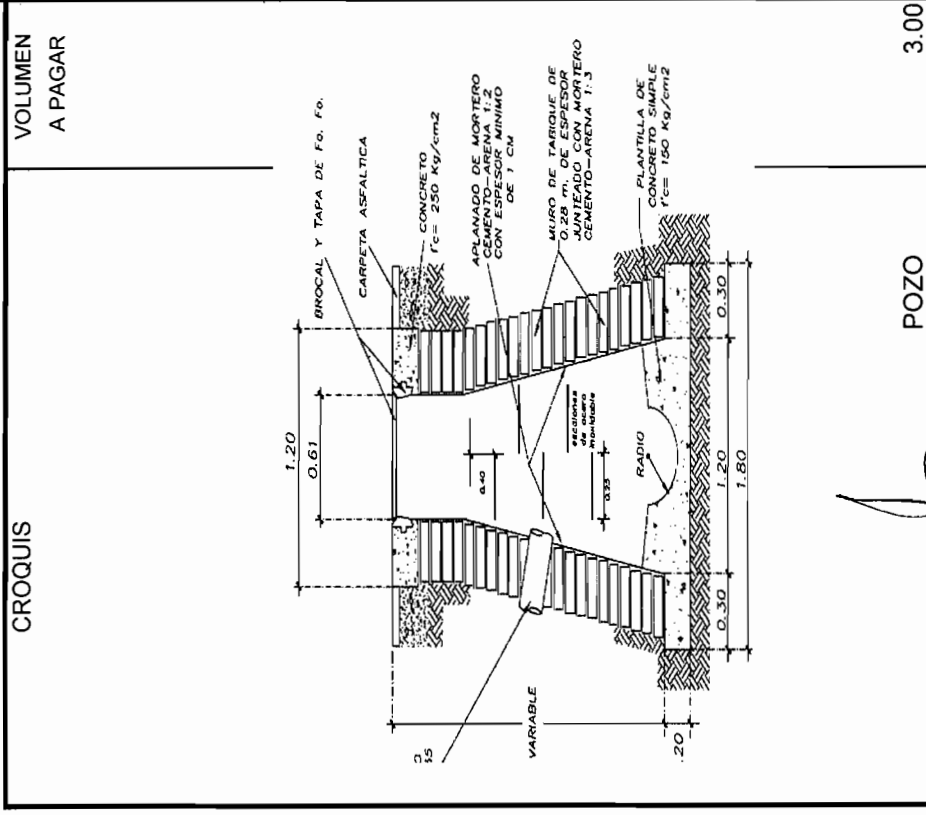[illegible]

RESIDENTE

CONTRATISTA

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION

CONTRATO : /2011 259/2016		TRAMO:	
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)		CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA	
Nº DE ESTIMACION: 7		PERIODC DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017	

CONCEPTO	6.12	12.90	12.10	12.13	10.90	10.10	10.11	POZO DE VISITA
								

RESIDENTE
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS


CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

HOJA /

TRAMO:

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

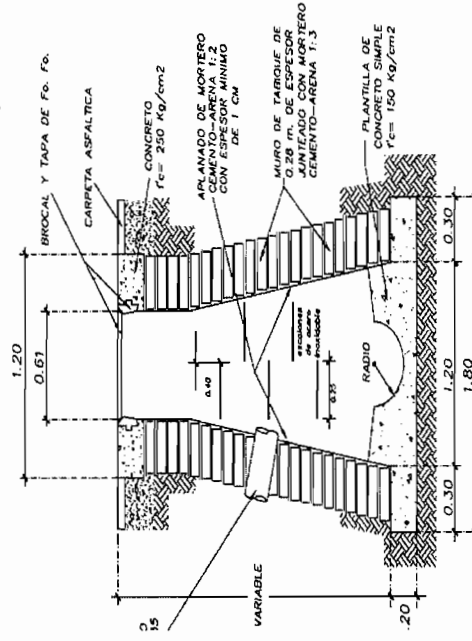[illegible]

300

~~CONTRATISTA~~

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION

CONTRATO : /2011 259/2016		TRAMO:	
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)		CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA	
No DE ESTIMACION:		7 PERIODC DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017	

CONCEPTO	6.12	12.90	12.10	12.13	10.90	10.10	10.11	POZO DE VISITA
----------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------



RESIDENTE
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

HOJA /

TRAMO:

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

CROQUIS

VOLUMEN A PAGAR

The drawing illustrates a drainage structure with the following components and dimensions:

- CROQUIS (Sketch):** A side view of the structure showing a sloped concrete wall with a vertical height of 1.20 m. The base width is 0.61 m. The structure is supported by a concrete base with a width of 0.30 m. The top width is 1.20 m. The structure is labeled with "BROCAL Y TAPA DE Fc. Fc." (Manhole cover and frame of reinforced concrete).
- VOLUMEN A PAGAR (Volume to be paid):** A plan view of the structure showing a circular opening with a radius of 0.30 m. The structure is labeled with "CARPETA ASFÁLTICA" (Asphalt pavement) and "CONCRETO Fc = 250 Kg/cm²" (Concrete Fc = 250 Kg/cm²). The structure is also labeled with "APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2 CON ESPESOR MÍNIMO DE 1 CM" (Mortar leveling cement-sand 1:2 with minimum thickness of 1 cm).
- Other labels:** "LAIRO DE TAPAJUE DE 0.28 m. DE ESPESOR" (Tapajue of 0.28 m. thickness), "CANTARILLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2" (Cantarrillo with cement-sand mortar 1:2), "PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE Fc = 150 Kg/cm²" (Simple concrete template Fc = 150 Kg/cm²), "RADIO" (Radius), "ESPESOR DE MORTERO DE 1 CM" (Mortar thickness of 1 cm), "VARIABLE" (Variable), and "20" (likely a scale or unit).

~~CONTRATISTA~~

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION

CONTRATO : /2011 259/2016		TRAMO:	
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)		CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA	
No DE ESTIMACION:		7 PERIODC DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017	

CONCEPTO	6.12	12.90	12.10	12.13	10.90	10.10	10.11	POZO DE VISITA
----------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------




RESIDENTE
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

HOJA /

TRAMO:

OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD 2A E CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

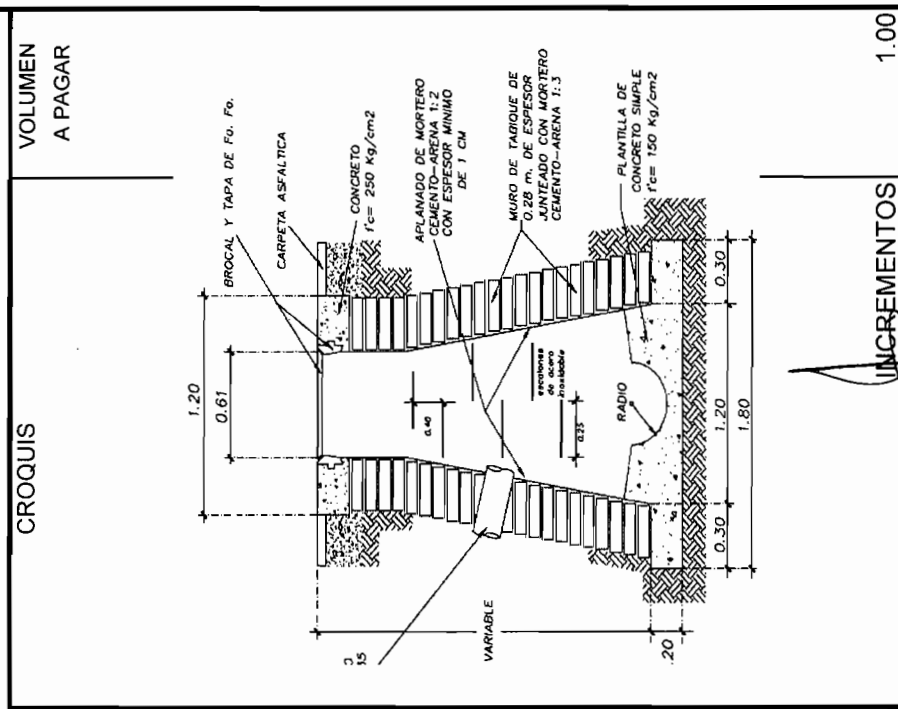[illegible]

RESIDENTE

~~CONTRATISTA~~

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUÉDA PROHIBIDO EL USO PARA

CONTRATO: 259/2016

CONTRATO: 259/2016

OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD


No DE ESTIMAC	7 periodo	DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017
---------------	-----------	---------------------------------------

TRAMO:

OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

CROQUIS

**VOLUMEN
A PAGAR**

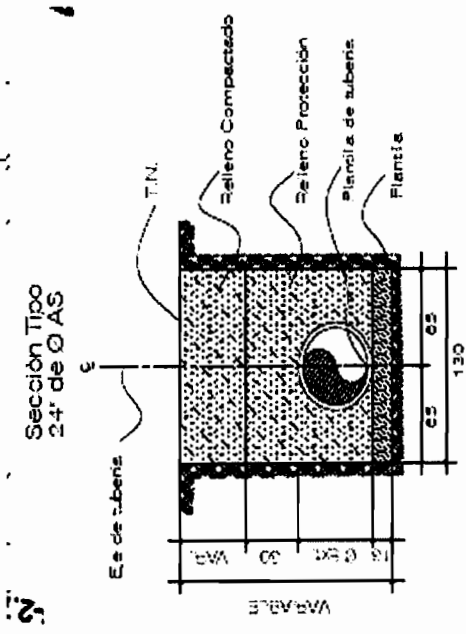[illegible]

PZA	9.00
-----	------

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A


RESIDENTE

~~CONTRATISTA~~

FOTOGRAFIA DE ESTIMACION

CONTRATO : /2011 259/2016		TRAMO:	
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)		CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA	
No DE ESTIMACION:		7	PERIODC DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO 6.16 12.15 10.15 INSTALACION DE BROCAL

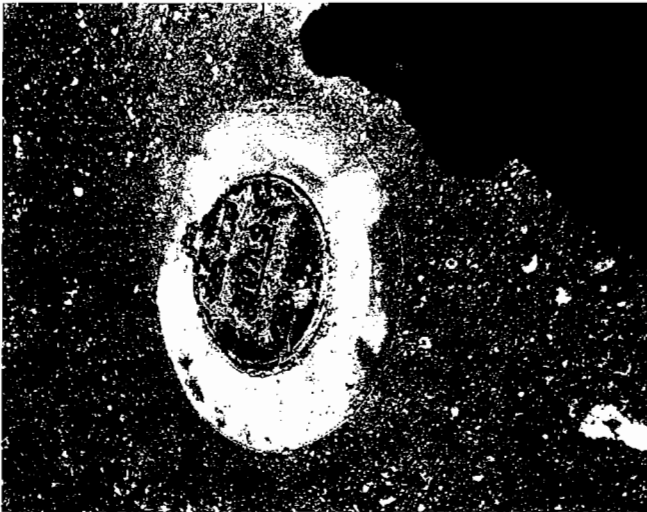

RESIDENTE
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

CONTRATISTA
ING IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA


HOJA /

CONTRATO : / 259/2016

PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

**DIMENSIONES DE ZANJA
PARA TUBERIAS DE ALCANTARILLADO**

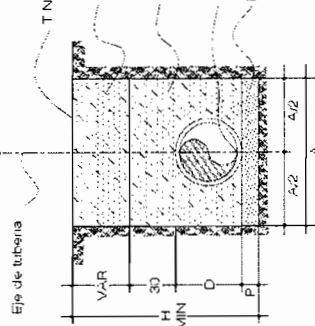

D	A (m)	P (m)
24" (600 mm)	0.80	0.10
30" (760 mm)	1.50	0.14

lote

~~CONTRATISTA~~

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO :	259/2016	TRAMO:	
OBRA :	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)	CONTRATISTA:	ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

Nº DE ESTIMACION:	7	PERIODO:	DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017
-------------------	---	----------	---------------------------------------

TUBERIA PULG	TRAMO	LARGO	PROF 1	PROF 2	PROF PROM	PROF + PLANTILLA	TUBERIA	ANCHO	SONDE OS	POZO	PROF POZO	POZO	ESTIMACION	NOTAS
14 CMS														
30	1-2	35.30	3.00	3.10	3.05	3.19	33.80	1.50			3.25		3.25	
30	2-3	50.70	3.10	3.20	3.15	3.29	49.20	1.50		2	3.35		3.35	
30	3-4	16.30	3.20	3.10	3.15	3.29	14.80	1.50		3	3.45		3.45	
30	4-5	32.25	3.10	3.15	3.15	3.27	30.75	1.50		4	3.35		3.35	colonia
30	5-6	50.35	3.15	3.15	3.15	3.29	48.85	1.50		5	3.40		3.40	Praderas
30	6-7	45.55	3.15	3.15	3.15	3.29	44.05	1.50		6	3.40		3.40	
30	7-8	5.60	3.15	3.15	3.15	3.29	4.10	1.50		7	3.40		3.40	
30	8-9	51.15	3.15	3.10	3.13	3.27	49.65	1.50		8	3.40		3.40	
30	9-10	48.30	3.10	3.20	3.15	3.29	46.80	1.50		9	3.35		3.35	
30	10-11	23.20	3.20	3.15	3.18	3.32	21.70	1.50		10	3.45		3.45	
30	11-12	27.10	3.15	3.10	3.13	3.27	25.60	1.50		11	3.40		3.40	
30	12-13	49.10	3.10	3.15	3.13	3.27	47.60	1.50		12	3.35		3.35	
30	13-14	51.90	3.15	3.73	3.44	3.58	50.40	1.50		13	3.40		3.40	
SUMA		436.30					467.30		-		43.95		45.25	

13 CMS														
24	30-31	17.40	2.95	2.75	2.85	2.98	16.20	1.30		30	3.20		3.20	
24	31-32	67.90	2.75	2.70	2.73	2.86	66.70	1.30		31	3.00		3.00	colonia
24	32-33	10.00	2.70	2.65	2.68	2.81	8.80	1.30		32	2.95		2.95	Granjas del
24	33-34	40.30	2.65	2.80	2.73	2.86	39.10	1.30		33	2.90		3.00	sur
24	34-35	60.20	2.80	2.60	2.70	2.83	59.00	1.30		34	3.05		3.25	11 de febrero
SUMA		196.80					189.80		-		17.95		18.50	

RESIDENTE
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

POZOS FALTANTES DE ESTIMAR

POZO No.	GENERADO EN ESTIMACION No.	PROFUNDIDAD	ALTURA	SECTOR
3	2	2.96	3.00	LAS TORRES
2	3	2.85	3.00	11 DE FEB
3	3	2.85	3.00	11 DE FEB
4	3	2.85	3.00	11 DE FEB
42	3	3.75	3.75	LAS TORRES
43	3	3.45	3.50	LAS TORRES
44	3	3.05	3.25	LAS TORRES
45	3	3.05	3.25	LAS TORRES
46	3	2.95	3.00	LAS TORRES
47	3	2.80	3.00	LAS TORRES
15	4	4.05	4.25	11 DE FEB

FALTA DE GENERAR RELLENOS, EXCAVACION E INSTALACION DE BROCAL

GENERADORES DE ACARREOS EN CARRETILLA EN LAS 5 ESTIMACIONES				
NO. EST	ACARREO EN CARRETILLA	DEBIO SER	COBRADO	DIF
2	2,945.05 IVAN		5,109.56	
	2164.51 SAUL			
3	1,860.50 SAUL	1,014.82		845.68
	4,441.10 SAUL	2,422.42		2,018.68
	4,002.91 IVAN		9,730.87	
4	857.68 SAUL	Viene analisis por separado		
	305.96 SAUL			
	448.03 IVAN			
	673.52 IVAN			
5	805.38 IVAN			
	55.33 IVAN			
	1,738.69 SAUL			
				2,864.36
	20,298.66 GENERADO			
	2,864.36 MENOS DIF			
	17,434.30	17,434.30	14,840.43	2,593.87

ANEXO A

ANEXO A

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO: 259/2016

TRAMO:

OBRA :	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)	CONTRATISTA:	ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
--------	---	--------------	-------------------------------

No DE 7 PERIODO: DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017
ESTIMACION:

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS					
	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL		
EXT-2						
Acarreo en carretilla a primera estacion (20.00 m), de material producto de la excavación o de banco dentro de la obra sin pendiente. Incluye: carga y descarga del material.						
MATERIAL DE BANCO						714.73
SUMA						714.73
20% DE ABUNDAMIENTO						142.95
TOTAL						857.68

~~RESIDENTE~~
~~ING. SERGIO GARCIA CARDENAS~~

~~CONTRATISTA~~
~~ING. IVAN NOE SIMENTAL~~

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

Anexo 1

CONTRATO : 259/2016

TRAMO:

OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

No DE 7 PERIODO: DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

CROQUIS

VOLUMEN A PAGAR

CONCEPTO		OPERACIONES ARITMETICAS				
4.1		LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL	
Suministro de material de banco para plantilla y relleno de zanja (caliche cribado); L.A.B. OBRA.	TRAMO	PLANTILLA	20 PULG			
	11-12	10.50	1.15	0.11	1.33	
	12-13	20.80	1.15	0.11	2.63	
	12-13	13.80	2.60	0.11	3.95	
	12-13	11.80	1.15	0.11	1.49	
	13-14	54.30	1.15	0.11	6.87	
	SUMA	111.20				
		18 PULG				
	14-15	43.80	1.10	0.10	4.82	
	15-16	6.80	1.10	0.10	0.75	
	16-17	61.30	1.10	0.10	6.74	
	17-18	42.30	1.10	0.10	4.65	
	18-19	58.80	1.10	0.10	6.47	
	19-20	58.80	1.10	0.10	6.47	
20-21	59.80	1.10	0.10	6.58		
21-22	53.10	1.10	0.10	5.84		
22-23	44.50	1.10	0.10	4.90		
AREA DE TUBO DE 0.2027	20	67.50	1.10	0.10	7.43	
	24-25	30.10	1.10	0.10	3.31	
	25-26	79.80	1.10	0.10	8.78	
AREA DE TUBO DE 0.1642	18	68.30	1.10	0.10	7.51	
	26-27	48.80	1.10	0.10	5.37	
	27-28	45.30	1.10	0.10	4.98	
	28-29	45.30	1.10	0.10	4.98	
	SUMA	769.00	SUMA		100.87	
DESC TUBERIA	20	0.2027 =	(22.54)			
DESC TUBERIA	18	0.1642 =	(126.27)			
		SUMA 863.54				
		DESCUENTO TUBERIA (148.81)				
		SUMA				

CONTRATO : 259/2016

TRAMO:

OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

No DE 7 PERIODO: DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017


ESTIMACION:

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			
	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
4.5	TRAMO	PLANTILLA	20 PULG	
Plantilla de apoyo para tubería en zanjas, con material "A" y/o "B", Incluye: selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, apisonado con pisón de mano, formación de apoyo semicircular (conchas) en campanas y/o coples de tubería para dar apoyo completo a la misma, etc.	11-12	10.50	1.15	0.11
	12-13	20.80	1.15	0.11
	12-13	13.80	2.60	0.11
	12-13	11.80	1.15	0.11
	13-14	54.30	1.15	0.11
	SUMA	111.20		
	18 PULG			
	14-15	43.80	1.10	0.10
	15-16	6.80	1.10	0.10
	16-17	61.30	1.10	0.10
	17-18	42.30	1.10	0.10
	18-19	58.80	1.10	0.10
	19-20	58.80	1.10	0.10
	20-21	59.80	1.10	0.10
	21-22	53.10	1.10	0.10
	22-23	44.50	1.10	0.10
	23-24	67.50	1.10	0.10
	24-25	30.10	1.10	0.10
	25-26	79.80	1.10	0.10
	26-27	68.30	1.10	0.10
	27-28	48.80	1.10	0.10
	28-29	45.30	1.10	0.10
	SUMA	769.00	SUMA	100.87
	SUMA			

RESIDENTE
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

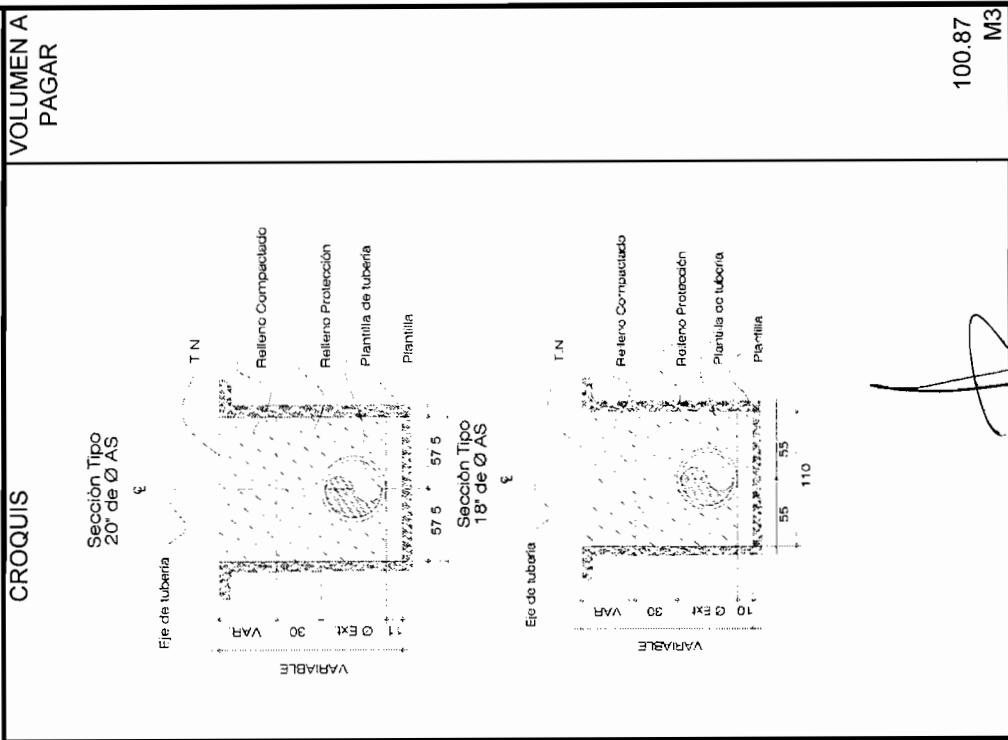

VOLUMEN A PAGAR
100.87 M3

CONTRATO: 259/2016

TRAMO:

OBRA :	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)	CONTRATISTA:	ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA
--------	--	--------------	-------------------------------

No DE	7	PERIODO: DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017
-------	---	--

[illegible]

~~RESIDENTE~~
~~ING. SERGIO GARCIA CARDENAS~~

CONTRATISTA

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

5A Anexo

613.86
POZO

Annexo 5

CONTRATO : 259/2016	TRAMO:
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)	CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

[illegible]

CROQUIS

**VOLUMEN
A PAGAR**

Sección Tipo
24" de Ø AS

DRGA

Eje de tubería

VARIALE

3.0 CM
30 VAR

CS 65 130

T.N.

Helena Compesado

Helena Protección

Planilla de tubería

Plancha

254.97
M3

RESIDENTE
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

CONTRATISTA
ING. VAN NOE SIMENTAL ORTEGA

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO ~~PARA~~ PARA FINES DISTINTOS A

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017

[illegible]

ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

Aveoxo F

TRAMO:

CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAI ORTEGA

**VOLUMEN A
PAGAR**

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				
	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
6.18					
Relleno de protección para tuberías en zanjas, con material "A" y/o "B", Incluye: selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, apisonado y compactado con pisón de mano en capas de 0.20 m. de espesor, etc.					
	RELLENO HASTA 30 CM ARRIBA DEL LOMO				
	35-36	38.80	1.30	0.91	45.90
	36-37	43.80	1.30	0.91	51.82
	37-38	50.80	1.30	0.91	60.10
	38-39	51.30	1.30	0.91	60.69
	39-40	55.80	1.30	0.91	66.01
				SUMA	284.52
				DESCUENTO TUBERIA	(70.20)
	PULGADAS				
	AREA DE TUBO DE 24				
	0.2919			TOTAL	

ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

Area = 8

GENERADOR DE ESTIMACION


CONTRATO: 259/2016																
OBRA : CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2a ETAPA)																
CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA																
RESIDENTE ING. SERGIO GARCIA CARDENAS																
No DE ESTIMACION 7 PERIODO: DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017																
TUBERIA	TRAM	PULG	O	LARGO	PROF 1	PROF 2	PROF PROM	PROF + PLANTILLA 13 CMS	TUBERIA	ANCHO	SONDEOS	POZO	PROF	POZO ESTIMACION	POZO INCREMENTO	NOTAS
24	35-36			40.00	2.58	2.53		2.69	38.80	1.30		35	2.83			
24	36-37			45.00	2.53	2.70		2.75	43.80	1.30	1.00	36	2.78			
24	37-38			52.00	2.70	3.09		3.03	50.80	1.30	1.00	37	2.95			
24	38-39			52.50	3.09	3.42		3.39	51.30	1.30	1.00	38	3.34			
24	39-40			57.00	3.42	2.97		3.33	55.80	1.30	3.00	39	3.67			
24					2.97							40	3.22			
SUMA									240.50		6.00		18.79		19.25	1.00
11 CMS																
20	11-12			11.70	2.65	2.71		2.79	10.50	1.15	3.00	12	2.96			
20	12-13			22.00	2.71	3.00		2.97	20.80	1.15						
20	12-13			15.00	2.71	3.00		2.97	13.80	2.60						
20	12-13			13.00	2.71	3.00		2.97	11.80	1.15	1.00	13	3.25			
20	13-14			55.50	3.00	3.65		3.44	54.30	1.15		14	3.90			
SUMA									111.20		4.00		10.11		9.50	3.00
10 CMS																
18	14-15			45.00	3.65	3.32		3.59	43.80	1.10		15	3.57			
18	15-16			8.00	3.32	3.37		3.45	6.80	1.10		16	3.62			
18	16-17			62.50	3.37	2.64		3.11	61.30	1.10		17	2.89			
18	17-18			43.50	2.64	2.62		2.73	42.30	1.10		18	2.87			
18	18-19			60.00	2.62	2.54		2.68	58.80	1.10		19	2.79			
18	19-20			60.00	2.54	3.02		2.88	58.80	1.10		20	3.27			
18	20-21			61.00	3.02	2.51		2.87	59.80	1.10		21	2.76			
18	21-22			54.30	2.51	2.46		2.59	53.10	1.10		22	2.71			
18	22-23			45.70	2.46	2.41		2.54	44.50	1.10		23	2.66			
18	23-24			68.70	2.41	2.54		2.58	67.50	1.10		24	2.79			
18	24-25			31.30	2.54	2.46		2.60	30.10	1.10		25	2.71			
18	25-26			81.00	2.46	2.93		2.80	79.80	1.10	5.00	26	3.18			
18	26-27			69.50	2.93	2.81		2.97	68.30	1.10	4.00	27	3.06			
18	27-28			50.00	2.81	2.59		2.80	48.80	1.10	3.00	28	2.84			
18	28-29			46.50	2.59	2.56		2.68	45.30	1.10		29	2.81			
SUMA									769.00		12.00		44.53		44.25	10.00

Arco

HOJA /

No de ESTIN	7 periodo	DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017
-------------	-----------	---------------------------------------

~~RESIDENTE~~



"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

HOJA /

No DE ESTIM	7	PERIODO	DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017
-------------	---	---------	---------------------------------------

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS		
	LARGO	ANCHO	TOTAL
10.1			
Suministro de material de banco para plantilla y relleno de zanja (caliche cribado), L.A.B. OBRA.			
	352.20	1.30	0.13
			59.52
	RELLENO HASTA 30 CM ARRIBA DEL LOMO		
	352.20	1.30	0.91
			416.65
	DESCUENTO TUBERIA		-102.81
			373.36

CROQUIS

Sección Tipo
2.4" de Ø AS

VARILLA

1.5" Ø Ø 1.5" 3.0" 4.5" 6.0" 7.5" 9.0" 10.5" 12.0" 13.5" 15.0" 16.5" 18.0" 19.5" 21.0" 22.5" 24.0" 25.5" 27.0" 28.5" 30.0" 31.5" 33.0" 34.5" 36.0" 37.5" 39.0" 40.5" 42.0" 43.5" 45.0" 46.5" 48.0" 49.5" 51.0" 52.5" 54.0" 55.5" 57.0" 58.5" 60.0" 61.5" 63.0" 64.5" 66.0" 67.5" 69.0" 70.5" 72.0" 73.5" 75.0" 76.5" 78.0" 79.5" 81.0" 82.5" 84.0" 85.5" 87.0" 88.5" 90.0" 91.5" 93.0" 94.5" 96.0" 97.5" 99.0" 100.5" 102.0" 103.5" 105.0" 106.5" 108.0" 109.5" 111.0" 112.5" 114.0" 115.5" 117.0" 118.5" 120.0" 121.5" 123.0" 124.5" 126.0" 127.5" 129.0" 130.5" 132.0" 133.5" 135.0" 136.5" 138.0" 139.5" 141.0" 142.5" 144.0" 145.5" 147.0" 148.5" 150.0" 151.5" 153.0" 154.5" 156.0" 157.5" 159.0" 160.5" 162.0" 163.5" 165.0" 166.5" 168.0" 169.5" 171.0" 172.5" 174.0" 175.5" 177.0" 178.5" 180.0" 181.5" 183.0" 184.5" 186.0" 187.5" 189.0" 190.5" 192.0" 193.5" 195.0" 196.5" 198.0" 199.5" 201.0" 202.5" 204.0" 205.5" 207.0" 208.5" 210.0" 211.5" 213.0" 214.5" 216.0" 217.5" 219.0" 220.5" 222.0" 223.5" 225.0" 226.5" 228.0" 229.5" 231.0" 232.5" 234.0" 235.5" 237.0" 238.5" 240.0" 241.5" 243.0" 244.5" 246.0" 247.5" 249.0" 250.5" 252.0" 253.5" 255.0" 256.5" 258.0" 259.5" 261.0" 262.5" 264.0" 265.5" 267.0" 268.5" 270.0" 271.5" 273.0" 274.5" 276.0" 277.5" 279.0" 280.5" 282.0" 283.5" 285.0" 286.5" 288.0" 289.5" 291.0" 292.5" 294.0" 295.5" 297.0" 298.5" 300.0" 301.5" 303.0" 304.5" 306.0" 307.5" 309.0" 310.5" 312.0" 313.5" 315.0" 316.5" 318.0" 319.5" 321.0" 322.5" 324.0" 325.5" 327.0" 328.5" 330.0" 331.5" 333.0" 334.5" 336.0" 337.5" 339.0" 340.5" 342.0" 343.5" 345.0" 346.5" 348.0" 349.5" 351.0" 352.5" 354.0" 355.5" 357.0" 358.5" 360.0" 361.5" 363.0" 364.5" 366.0" 367.5" 369.0" 370.5" 372.0" 373.5" 375.0" 376.5" 378.0" 379.5" 381.0" 382.5" 384.0" 385.5" 387.0" 388.5" 390.0" 391.5" 393.0" 394.5" 396.0" 397.5" 399.0" 400.5" 402.0" 403.5" 405.0" 406.5" 408.0" 409.5" 411.0" 412.5" 414.0" 415.5" 417.0" 418.5" 420.0" 421.5" 423.0" 424.5" 426.0" 427.5" 429.0" 430.5" 432.0" 433.5" 435.0" 436.5" 438.0" 439.5" 441.0" 442.5" 444.0" 445.5" 447.0" 448.5" 450.0" 451.5" 453.0" 454.5" 456.0" 457.5" 459.0" 460.5" 462.0" 463.5" 465.0" 466.5" 468.0" 469.5" 471.0" 472.5" 474.0" 475.5" 477.0" 478.5" 480.0" 481.5" 483.0" 484.5" 486.0" 487.5" 489.0" 490.5" 492.0" 493.5" 495.0" 496.5" 498.0" 499.5" 501.0" 502.5" 504.0" 505.5" 507.0" 508.5" 510.0" 511.5" 513.0" 514.5" 516.0" 517.5" 519.0" 520.5" 522.0" 523.5" 525.0" 526.5" 528.0" 529.5" 531.0" 532.5" 534.0" 535.5" 537.0" 538.5" 540.0" 541.5" 543.0" 544.5" 546.0" 547.5" 549.0" 550.5" 552.0" 553.5" 555.0" 556.5" 558.0" 559.5" 561.0" 562.5" 564.0" 565.5" 567.0" 568.5" 570.0" 571.5" 573.0" 574.5" 576.0" 577.5" 579.0" 580.5" 582.0" 583.5" 585.0" 586.5" 588.0" 589.5" 591.0" 592.5" 594.0" 595.5" 597.0" 598.5" 600.0" 601.5" 603.0" 604.5" 606.0" 607.5" 609.0" 610.5" 612.0" 613.5" 615.0" 616.5" 618.0" 619.5" 621.0" 622.5" 624.0" 625.5" 627.0" 628.5" 630.0" 631.5" 633.0" 634.5" 636.0" 637.5" 639.0" 640.5" 642.0" 643.5" 645.0" 646.5" 648.0" 649.5" 651.0" 652.5" 654.0" 655.5" 657.0" 658.5" 660.0" 661.5" 663.0" 664.5" 666.0" 667.5" 669.0" 670.5" 672.0" 673.5" 675.0" 676.5" 678.0" 679.5" 681.0" 682.5" 684.0" 685.5" 687.0" 688.5" 690.0" 691.5" 693.0" 694.5" 696.0" 697.5" 699.0" 700.5" 702.0" 703.5" 705.0" 706.5" 708.0" 709.5" 711.0" 712.5" 714.0" 715.5" 717.0" 718.5" 720.0" 721.5" 723.0" 724.5" 726.0" 727.5" 729.0" 730.5" 732.0" 733.5" 735.0" 736.5" 738.0" 739.5" 741.0" 742.5" 744.0" 745.5" 747.0" 748.5" 750.0" 751.5" 753.0" 754.5" 756.0" 757.5" 759.0" 760.5" 762.0" 763.5" 765.0" 766.5" 768.0" 769.5" 771.0" 772.5" 774.0" 775.5" 777.0" 778.5" 780.0" 781.5" 783.0" 784.5" 786.0" 787.5" 789.0" 790.5" 792.0" 793.5" 795.0" 796.5" 798.0" 799.5" 801.0" 802.5" 804.0" 805.5" 807.0" 808.5" 810.0" 811.5" 813.0" 814.5" 816.0" 817.5" 819.0" 820.5" 822.0" 823.5" 825.0" 826.5" 828.0" 829.5" 831.0" 832.5" 834.0" 835.5" 837.0" 838.5" 840.0" 841.5" 843.0" 844.5" 846.0" 847.5" 849.0" 850.5" 852.0" 853.5" 855.0" 856.5" 858.0" 859.5" 861.0" 862.5" 864.0" 865.5" 867.0" 868.5" 870.0" 871.5" 873.0" 874.5" 876.0" 877.5" 879.0" 880.5" 882.0" 883.5" 885.0


RESIDENTE

~~CONTRACT STATE~~

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

Anexo II


HOJA /

[illegible]

RESIDENTE

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

HOJA /

[illegible]

RESIDENT#


"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

HOJA /

CONTRATO	259/2016	TRAMO:
OBRA :	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2 CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA	

No DE ESTIV	7 periodo	DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017
-------------	-----------	---------------------------------------

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			
	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
EXT-2				
Acarreo en carretilla a primer estación (20.00 m), de material producto de excavación o de banco dentro de la obra sin pendiente. Incluye carga y descarga del material.	MATERIAL DE BANCO			561.27
	SUMA			561.27
	ABUNDAMIENTO 20 %			112.25
	TOTAL			673.52

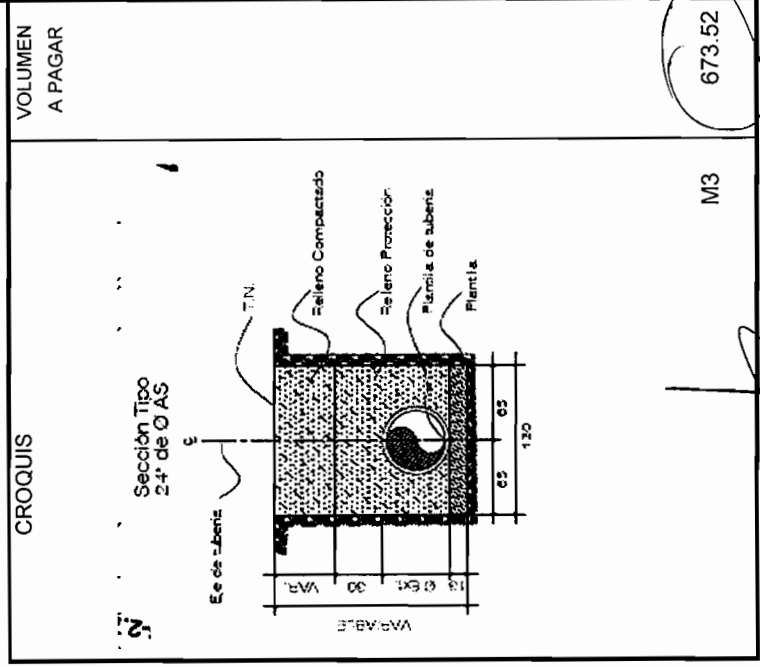

RESIDENTE

CONTRATISTA

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

HOJA /

M3

CONTRATISTA

QUEDA PROHIBIDO EL
GRAMATM


~~CENTRATISTA~~

Anexo 15

HOJA /

CONTRATO	259/2016
TRAMO:	
OBRA :	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIL CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

No DE ESTIN	7	PERIODO	DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017
-------------	---	---------	---------------------------------------

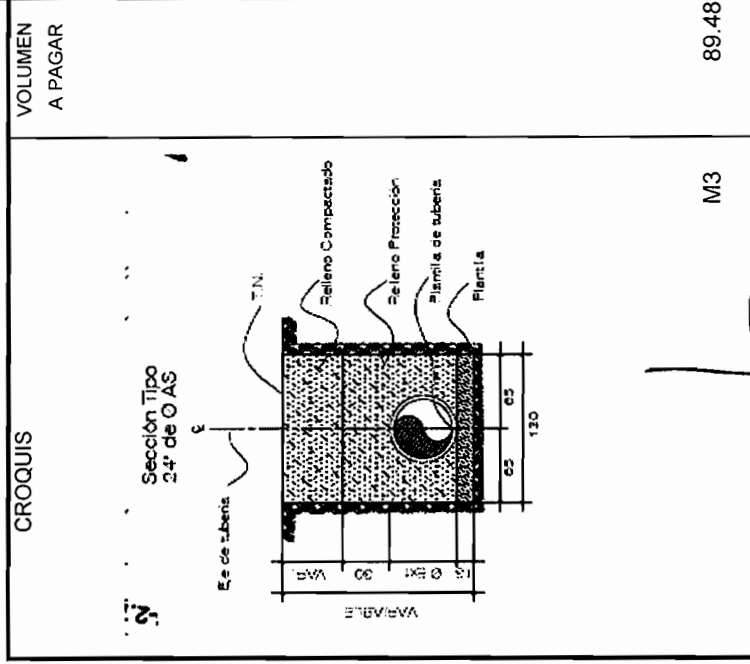[illegible]

RESIDENTE

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

Araxo 16

HOJA /

M3

CONTRATISTA

QUEDA PROHIBIDO EL GRAMA

CONTRATISTA

~~"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA".~~

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO :	259/2016	TRAMO:	
OBRA :	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN VARIAS COLONIAS AL SUR DE LA CIUDAD (2A ETAPA)	CONTRATISTA:	ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

No DE ESTIMACION:	7	PERIODO:	DEL 18 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2017
-------------------	---	----------	---------------------------------------

TUBERIA	PULG	TRAMO	LARGO	PROF 1	PROF 2	PROF PROM	PROF + PLANTILLA 13 CMS	TUBERIA	ANCHO	SONDE OS	POZO	PROF POZO	POZO ESTIMACION	NOTAS
24	34-35		52.30	2.75	3.40	3.08	3.21	51.10	1.30		34	3.00	3.00	
24	35-36		49.70	3.37	3.75	3.56	3.69	48.50	1.30		35	3.62	3.75	
24	36-37		52.70	3.75	4.10	3.93	4.06	51.50	1.30		36	4.00	4.00	
24	37-38		56.70	4.10	4.30	4.20	4.33	55.50	1.30		37	4.35	4.50	
24	38-39		6.00	4.21	4.25	4.23	4.36	4.80	1.30		38	4.46	4.50	
24	39-40		49.40	4.21	4.40	4.31	4.44	48.20	1.30		39	4.46	4.50	
24	40-41		47.70	4.40	3.90	4.15	4.28	46.50	1.30		40	4.65	4.75	
24	41-42		47.30	3.90	3.75	3.83	3.96	46.10	1.30		41	4.15	4.25	
	SUMA		361.80				3.96	352.20		-		32.69	33.25	
13 CMS														
24	5-6		56.70	2.55	2.60	2.58	2.71	55.50	1.30		5	2.80	3.00	
24	6-7		43.40	2.60	2.60	2.60	2.73	42.20	1.30		6	2.85	3.00	
24	7-8		60.00	2.60	2.70	2.65	2.78	58.80	1.30		7	2.85	3.00	
24	8-9		46.30	2.70	3.30	3.00	3.13	45.10	1.30		8	2.95	3.00	
24	9-10		81.15	3.30	3.50	3.40	3.53	79.95	1.30		9	3.55	3.75	
24	10-11		53.00	3.20	3.68	3.44	3.57	51.80	1.30		10	3.45	3.50	
24	11-12		48.40	3.25	3.95	3.60	3.73	47.20	1.30		11	3.50	3.50	
24	12-13		51.80	3.67	4.10	3.89	4.02	50.60	1.30		12	3.92	4.00	
24	13-14		53.20	3.80	4.10	3.96	4.08	52.00	1.30		13	4.05	4.25	
24	14-15		47.50	4.17	3.80	3.99	4.12	46.30	1.30		14	4.42	4.50	
	SUMA		541.45				4.12	529.45		-		34.34	35.50	

RESIDENTE
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

CONTRATISTA
ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA"

INFORME DE COMPACTACIONES

METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 2922, 3017 VIGENTES

OBRA: 259 OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CLIENTE: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

REPRESENTANTE: ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA: ING. IRIGOYEN

Fecha de muestreo: 2017-06-03

Fecha de Informe: 2017-06-05

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		% Compactación
					Del Lugar	Máxima	Óptima	Del Lugar	
258	Prueba: 1								
	% Especificado: 90								
	A		C	20	1785	1916	14,8	11,0	93,20
	B		C	20	1772	1916	14,8	11,0	92,50
							Promedio de Compactación:		92,85

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

OBS: COLECTOR CALLE JUDEA ING.SERGIO GARCIA

259	Prueba: 1								
	% Especificado: 90								
	A		C	20	1764	1916	14,8	11,0	92,10
	B		C	20	1751	1916	14,8	12,0	91,40
							Promedio de Compactación:		91,75

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

OBS: COLECTOR CALLE JUDEA ING.SERGIO GARCIA

260	Prueba: 1								
	% Especificado: 90								
	A		C	20	1748	1916	14,8	11,0	91,20
	B		C	20	1794	1916	14,8	11,0	93,60
							Promedio de Compactación:		92,40

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

OBS: COLECTOR CALLE JUDEA ING.SERGIO GARCIA

261	Prueba: 1								
	% Especificado: 90								
	A		C	20	1734	1916	14,8	12,0	90,50
	B		C	20	1788	1916	14,8	12,0	93,30
							Promedio de Compactación:		91,90

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

OBS: COLECTOR CALLE JUDEA ING.SERGIO GARCIA

262	Prueba: 1								
	% Especificado: 90								
	A		C	20	1796	1916	14,8	11,0	93,70
	B		C	20	1810	1916	14,8	11,0	94,50
							Promedio de Compactación:		94,10

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

OBS: COLECTOR CALLE JUDEA ING.SERGIO GARCIA

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TÉCNICO



LCO-COMP

Página 1 de 2

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

INFORME DE COMPACTACIONES

METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 2922, 3017 VIGENTES

OBRA: 259 OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CLIENTE: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

REPRESENTANTE: ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA: ING. IRIGOYEN

Fecha de muestreo: 2017-06-03


Fecha de Informe: 2017-06-05

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		% Compactación
					Del Lugar	Máxima	Optima	Del Lugar	
263	Prueba: 1				Tipo de Capa: 2A CAPA RELLENO				
	% Especificado: 90				Localización: ZANJA DEL POZO 4 AL 5				
	A		C	20	1784	1916	14,8	11,0	93,10
	B		C	20	1765	1916	14,8	11,0	92,10
							Promedio de Compactación:		92,60

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

OBS: COLECTOR CALLE JUDEA ING.SERGIO GARCIA


ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.



LCO-COMP
Página 2 de 2

INFORME DE COMPACTACIONES

METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 2922, 3017 VIGENTES

OBRA: 259 OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CLIENTE: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

REPRESENTANTE: ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA: ING. IRIGOYEN

Fecha de muestreo: 2017-06-05

Fecha de Informe: 2017-06-06

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		% Compactación
					Del Lugar	Máxima	Óptima	Del Lugar	
264	Prueba: 1				Tipo de Capa: 3A CAPA RELLENO				
	% Especificado: 90				Localización: ZANJA DEL POZO 2 AL 3				
	A		C	20	1768	1916	14,8	12,0	92,30
	B		C	20	1788	1916	14,8	12,0	93,30
Promedio de Compactación:									92,80

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

OBS: COLECTOR CALLE JUDEA ING.SERGIO GARCIA

265	Prueba: 1				Tipo de Capa: 3A CAPA RELLENO				
	% Especificado: 90				Localización: ZANJA DEL POZO 3 AL 4				
	A		C	20	1808	1916	14,8	12,0	94,40
	B		C	20	1793	1916	14,8	11,0	93,60
Promedio de Compactación:									94,00

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

OBS: COLECTOR CALLE JUDEA ING.SERGIO GARCIA

266	Prueba: 1				Tipo de Capa: 3A CAPA RELLENO				
	% Especificado: 90				Localización: ZANJA DEL POZO 4 AL 5				
	A		C	20	1782	1916	14,8	12,0	93,00
	B		C	20	1737	1916	14,8	12,0	90,70
Promedio de Compactación:									91,85

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

OBS: COLECTOR CALLE JUDEA ING.SERGIO GARCIA

267	Prueba: 1				Tipo de Capa: 1A CAPA RELLENO				
	% Especificado: 90				Localización: ZANJA DEL POZO 5 AL 6				
	A		C	20	1798	1916	14,8	11,0	93,80
	B		C	20	1745	1916	14,8	11,0	91,10
Promedio de Compactación:									92,45

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.


OBS: COLECTOR CALLE JUDEA ING.SERGIO GARCIA

268	Prueba: 1				Tipo de Capa: 1A CAPA RELLENO				
	% Especificado: 90				Localización: ZANJA DEL POZO 6 AL 7				
	A		C	20	1755	1916	14,8	11,0	91,60
	B		C	20	1767	1916	14,8	12,0	92,20
Promedio de Compactación:									91,90

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.


OBS: COLECTOR CALLE JUDEA ING.SERGIO GARCIA

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TÉCNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba:
Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.



LCO-COMP
Página 1 de 4

INFORME DE COMPACTACIONES

METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 2922, 3017 VIGENTES

OBRA: 259 OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CLIENTE: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Fecha de muestreo: 2017-06-05

Fecha de Informe: 2017-06-06

REPRESENTANTE: ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA: ING. IRIGOYEN

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		% Compactación
					Del Lugar	Máxima	Optima	Del Lugar	
269	Prueba: 1				Tipo de Capa: 1A CAPA RELLENO				
	% Especificado: 90				Localización: ZANJA DEL POZO 7 AL 8				
	A		C	20	1776	1916	14,8	12,0	92,70
	B		C	20	1786	1916	14,8	11,0	93,20
							Promedio de Compactación:		92,95

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

OBS: COLECTOR CALLE JUDEA ING. SERGIO GARCIA

270	Prueba: 1				Tipo de Capa: 2A CAPA RELLENO				
	% Especificado: 90				Localización: ZANJA DEL POZO 65 AL 64				
	A		C	20	1810	1947	17,0	13,0	93,00
	B		C	20	1787	1947	17,0	13,0	91,80
							Promedio de Compactación:		92,40

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

OBS: COLECTOR 11 DE FEBRERO ING. ESCARCEGA

271	Prueba: 1				Tipo de Capa: 2A CAPA RELLENO				
	% Especificado: 90				Localización: ZANJA DEL POZO 64 AL 63				
	A		C	20	1824	1947	17,0	13,0	93,70
	B		C	20	1792	1947	17,0	13,0	92,00
							Promedio de Compactación:		92,85

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

OBS: COLECTOR 11 DE FEBRERO ING. ESCARCEGA

272	Prueba: 1				Tipo de Capa: 2A CAPA RELLENO				
	% Especificado: 90				Localización: ZANJA DEL POZO 63 AL 62				
	A		C	20	1818	1947	17,0	12,0	93,40
	B		C	20	1805	1947	17,0	13,0	92,70
							Promedio de Compactación:		93,05

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

OBS: COLECTOR 11 DE FEBRERO ING. ESCARCEGA

273	Prueba: 1				Tipo de Capa: 3A CAPA RELLENO				
	% Especificado: 90				Localización: ZANJA DEL POZO 65 AL 64				
	A		C	20	1788	1947	17,0	13,0	91,80
	B		C	20	1821	1947	17,0	13,0	93,50
							Promedio de Compactación:		92,65

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

OBS: COLECTOR 11 DE FEBRERO ING. ESCARCEGA

ATENTAMENTE:

ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TECNICO

LCO-COMP
Página 2 de 4

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

INFORME DE COMPACTACIONES

METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 2922, 3017 VIGENTES

OBRA: 259 OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CLIENTE: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Fecha de muestreo: 2017-06-05

Fecha de Informe: 2017-06-06

REPRESENTANTE: ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA: ING. IRIGOYEN

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		% Compactación
					Del Lugar	Máxima	Optima	Del Lugar	
274	Prueba: 1								
	% Especificado: 90								
	A		C	20	1832	1947	17,0	13,0	94,10
	B		C	20	1824	1947	17,0	12,0	93,70
							Promedio de Compactación:		93,90

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

OBS: COLECTOR 11 DE FEBRERO ING. ESCARCEGA

275	Prueba: 1								
	% Especificado: 90								
	A		C	20	1815	1947	17,0	12,0	93,20
	B		C	20	1792	1947	17,0	12,0	92,00
							Promedio de Compactación:		92,60

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

OBS: COLECTOR 11 DE FEBRERO ING. ESCARCEGA

276	Prueba: 1								
	% Especificado: 90								
	A		C	20	1795	1947	17,0	12,0	92,20
	B		C	20	1818	1947	17,0	13,0	93,40
							Promedio de Compactación:		92,80

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

OBS: COLECTOR 11 DE FEBRERO ING. ESCARCEGA

277	Prueba: 1								
	% Especificado: 90								
	A		C	20	1826	1947	17,0	13,0	93,80
	B		C	20	1834	1947	17,0	13,0	94,20
							Promedio de Compactación:		94,00

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

OBS: COLECTOR 11 DE FEBRERO ING. ESCARCEGA

278	Prueba: 1								
	% Especificado: 90								
	A		C	20	1822	1947	17,0	13,0	93,60
	B		C	20	1790	1947	17,0	13,0	91,90
							Promedio de Compactación:		92,75

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

OBS: COLECTOR 11 DE FEBRERO ING. ESCARCEGA


Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TECNICO



INFORME DE COMPACTACIONES

METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 2922, 3017 VIGENTES

OBRA: 259 OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CLIENTE: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

REPRESENTANTE: ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA: ING. IRIGOYEN

Fecha de muestreo: 2017-06-05

Fecha de Informe: 2017-06-06

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		% Compactación
					Del Lugar	Máxima	Optima	Del Lugar	
279	Prueba: 1				Tipo de Capa: 2A CAPA RELLENO				
	% Especificado: 90				Localización: ZANJA DEL POZO 61 AL 60				
	A		C	20	1807	1947	17,0	13,0	92,80
	B		C	20	1820	1947	17,0	12,0	93,50
Promedio de Compactación:									93,15

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

OBS: COLECTOR 11 DE FEBRERO ING. ESCARCEGA

280	Prueba: 1				Tipo de Capa: 2A CAPA RELLENO				
	% Especificado: 90				Localización: ZANJA DEL POZO 60 AL 59				
	A		C	20	1794	1947	17,0	13,0	92,10
	B		C	20	1828	1947	17,0	12,0	93,90
Promedio de Compactación:									93,00

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

OBS: COLECTOR 11 DE FEBRERO ING. ESCARCEGA

281	Prueba: 1				Tipo de Capa: 2A CAPA RELLENO				
	% Especificado: 90				Localización: ZANJA DEL POZO 59 AL 58				
	A		C	20	1792	1947	17,0	12,0	92,00
	B		C	20	1813	1947	17,0	12,0	93,10
Promedio de Compactación:									92,55

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

OBS: COLECTOR 11 DE FEBRERO ING. ESCARCEGA

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TÉCNICO

