

EDUARDO RAYNAL PRIETO

RFC Emisor : RAPE830726QF6

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Guelatao de Juarez No. Exterior 2414 Colonia Margarita Maza de Juarez
Localidad Chihuahua Municipio Chihuahua Estado Chihuahua México CP.
31470

Sucursal- :

RFC Receptor : MC651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Calle MINA No. Exterior 408 Colonia CENTRO Localidad CHIHUAHUA
Municipio CHIHUAHUA Estado Chihuahua MEXICO CP. 31000

Folio Fiscal:

2E5791CB-B750-4F3A-9F23-76DB638D5148

No de Serie del CSD:

00001000000304971943

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CHIHUAHUA 2017-06-28T16:27:57

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

081 ERA

Régimen Fiscal:

Régimen de Actividad Empresarial y Profesional

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		ESTIMACION 1 CONTRATO 024/2017 REHABILITACION DE COMEDOR EL SAUZ, CHIH. (REFRENDO) RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO I.C.I.C. 2% \$681.71, DIF 2% \$681.71 TOTAL DE RETENCIONES \$1,363.42 SALDO NETO A RECIBIR \$394,028.07	340854.73	340854.73

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: 02 CHEQUE NOMINATIVO

Método de Pago: 02 CHEQUE NOMINATIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal: \$ 340854.73

Impuestos
Trasladados

IVA 16 % \$ 54536.76

TOTAL \$ 395391.49

EDUARDO RAYNAL PRIETO

RFC Emisor : RAPE830726QF6

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Guelatao de Juarez No. Exterior 2414 Colonia Margarita Maza de Juarez
Localidad Chihuahua Municipio Chihuahua Estado Chihuahua México CP.
31470

Sucursal- :

RFC Receptor : MC651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Calle MINA No. Exterior 408 Colonia CENTRO Localidad CHIHUAHUA
Municipio CHIHUAHUA Estado Chihuahua MEXICO CP. 31000

Folio Fiscal:

2E5791CB-B750-4F3A-9F23-76DB638D5148

No de Serie del CSD:

00001000000304971943

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CHIHUAHUA 2017-06-28T16:27:57

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

081 ERA

Régimen Fiscal:

Régimen de Actividad Empresarial y Profesional

Total con letra:

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS, 49/100 MN

Sello digital del CFDI:

eoU1H/YJ639/DyRN4MyKRsg7NcpAGBx/1hYXsPVpC0sQVJtyXKtMFab5e2zHqgLLJ0eqNyuW+p3QH4uuMCiQ3kTPkS34GwqyE/8ssF/C
+dRpBz3F0Qqv4n2ADK9OpHur2CbRJC7eBLvLH7WC2VpEu7QW0bAxiCvdQ6b2Q=

Sello del SAT:

TFN195vKrGEIMaxGcka2Hr8ZIJEP
+7nXHIVpdZPBElthdckAm6R5dLwreNpQR8chj87YjmBLkZ5M9qbzKsCeTbtk5WY2QcsJ8Ngcd12K8thAfhGSBoUdtvUaPythXSm4NglHvW9JITJJWbluywb7G9MZpc
+QMV0uNRP9IFB0hC3w8avWSXLCpCr4hVQWUHUSFb+WhuZOL1lqYg3kBXcnvK2us96eWBdsFAhSLd6Me3L7abXdW4E
+1YIGByaaNA5efszGb1nHlHu1zEBSeb2xdrPCSDZ9ayQj1pHv1n3G0q15UHycWUd4r71YO+ypPhkuAnYm8Zg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

!!1.O12E5791CB-B750-4F3A-9F23-76DB638D5148!2017-06-28T16:57:59!
eoU1H/YJ639/DyRN4MyKRsg7NcpAGBx/1hYXsPVpC0sQVJtyXKtMFab5e2zHqgLLJ0eqNyuW+p3QH4uuMCiQ3kTPkS34GwqyE/8ssF/C
+dRpBz3F0Qqv4n2ADK9OpHur2CbRJC7eBLvLH7WC2VpEu7QW0bAxiCvdQ6b2Q=i00001000000403258748!!

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000403258748

Fecha y hora de certificación:

2017-06-28T16:57:59



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
RAPE830726QF6	EDUARDO RAYNAL PRIETO	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
2E5791CB-B750-4F3A-9F23-76DB638D5148	2017-06-28T16:27:57	2017-06-28T16:57:59	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$395,391.49	ingreso	Vigente	

Cu

C

Handwritten signature

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



GOBIERNO MUNICIPAL

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA:	CONTRATO No. 024/2017	CONTRATADOS
OBRA: REHABILITACIÓN DE COMEDOR EL SAUZ, CHIH. (REFRENDO)	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	\$ 639,209.24 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 03 AL 17 DE MAYO 2017	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 395,391.49 CON IVA
CONTRATISTA: ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC RAPE830726QF6	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 395,391.49 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>PRELIMINARES</u>	\$ 53,810.81	
<u>INSTALACIONES</u>	\$ 140,576.47	
<u>EXCEDENTE</u>	\$ 146,467.45	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 340,854.73

DESCUENTOS		
0.2% CMIC	\$	681.71
0.2% D.I.F.	\$	681.71
SUMA DESCUENTOS	\$	1,363.42
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	340,854.73
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	340,854.73
I.V.A.	\$	54,536.76
TOTAL	\$	395,391.49
(CON LETRA)		
(TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 49/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	1,363.42
SALDO NETO A RECIBIR	\$	394,028.07

AUTORIZO	ELABORO
ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO	ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. JAVIER VILLARREAL POSADA	ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL
Vo. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	



CHIHUAHUA, CHIH.,

18 de mayo de 2017

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE:
(TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.)
ESTIMACIÓN NUM. 1 (UNO) CONTRATO No. 024/2017 POR LA CANTIDAD DE : \$ 639,209.24
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 24/100 M.N.
REHABILITACIÓN DE COMEDOR EL SAUZ, CHIH. (REFRENDO)

\$ **340,854.73**
COMO PAGO A LA
INCLUYE CONVENIO
POR TRABAJOS EN LA OBRA:

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ **340,854.73**

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ **340,854.73**

IVA \$ **54,536.76**

TOTAL \$ **395,391.49**

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

C.M.I.C. 0.2%	681.71
D.I.F. 0.2%	681.71
SUMA	1,363.42

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO	
\$	639,209.24
\$	-
\$	-
\$	395,391.49
\$	395,391.49
\$	243,817.75

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO	
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

D.I.F. 2%


0.2% C.M.I.C.

ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 681.71
ACUMULADO ACTUAL	\$ 681.71

\$ -
\$ 681.71
\$ 681.71

R E C I B I M O S

ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO
RAPE830726QF6

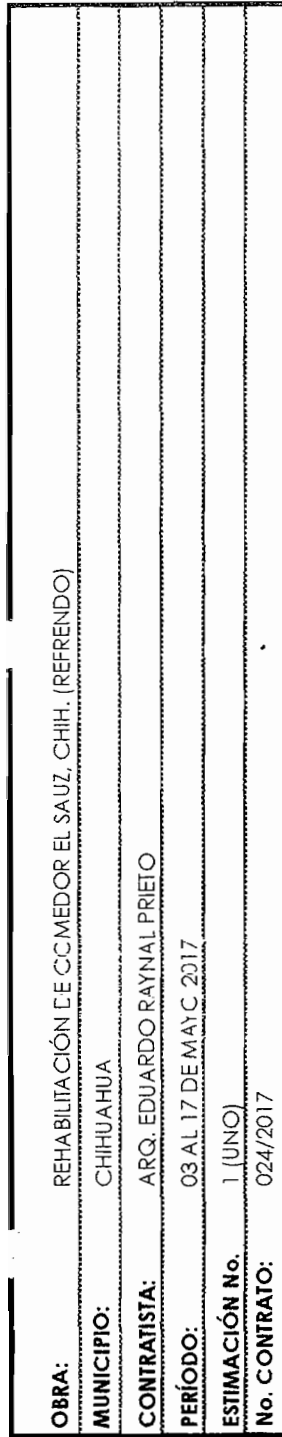[illegible]

EDUARDO RANGEL

ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

OBJETO: REHABILITACIÓN DE COMEDOR EL SA... CHIH. (REFERENDO)

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

CONTRATISTA: ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO

PERIODO: 03 AL 17 DE MAYO 2017

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)

No. CONTRATO: 024/2017

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIO	VOL. ESTIMADO		
30	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE MARCA OSEL PLATA EN MUROS, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	200	438.24	200.00	238.24	\$ 92.38	\$ 22,008.61
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA CERAMICAINTERCERAMIC LINEA ELEGANCE DE 31.5 * 31.5 CM INC. PEGAZULEJO, BOQUILLA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	M2	82	395.47	82.00	313.47	\$ 287.06	\$ 89,984.70
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS METALICAS INC. PUERTA PASADOR, ANCLAJE Y PINTURA ESMALTE ALTURA DE 2 MTS	M2	13.4	18.26	13.40	4.86	\$ 1,254.82	\$ 6,098.43
48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE OVALIN MARCA ORION INC LLAVE MEZCLADORA, ALIMENTADORES, TRAMPA DE PVC Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	4	2.00	4.00	2.00	\$ 1,592.01	\$ 3,184.02
49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO MARCA ORION INC. PIJAS, CUELLO DE CERA, ALIMENTADOR, VALVULA, FLOTADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	4	1.00	4.00	1.00	\$ 1,705.63	\$ 1,705.63
65	RENIVELACION DE PISO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1 - 5 DE 5 CM DE ESPESOR INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y ACABADO A VUELTA DE PLANA	M2	300	371.28	300.00	71.28	\$ 134.08	\$ 9,557.22
69	SUMINISTO Y COLOCACION DE VIDRIO DE 3MM DE ESPESOR CLARO INC. MATERIAL DE SELLADO	M2	38	38.70	38.00	0.70	\$ 385.64	\$ 269.95
SUBTOTAL							\$	340,854.73
IVA							\$	54,536.76
TOTAL							\$	395,391.49

POR EL CONTRATISTA:

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION

ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO

Pag 3 de 3

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO

OBRA:				GENERADOR			
REHABILITACIÓN DE COMEDOR EL SAUZ, CHIH. (REFRENDO)				1			
02/2017				CONTRATISTA:			
PERIODO DE EJECUCION				ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO			
03 AL 17 DE MAYO 2017							
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD TOTAL		
5	DESMONTAJE DE PUERTA METALICA INCLUYE DEMOLICIONES Y	PZA			9.00		
9.00	RETIRO DE CERAMICA INCLUYE ACARREO DE MATERIAL PARA SU	M2	2.95	2.45	7.23		
18.00	PICADO EN PISO DE CONCRETO PARA APLICACION DE CAPA DE RENOVACION DE PISO.	M2	34.7	3	104.10		
			12.72	3	38.16		
			34.7	6.3	218.61		
					360.87		
30.00	SUMISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE MARCA OSEL PLATA EN MUROS, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	3	3.55	10.65		
			0.89	2.05	-1.82		
			13.02	2.95	38.41		
			34.7	3.58	124.23		
			3.95	0.5	-13.83		
					-18.40		
			15.7	3.58	56.21		
			6.3	2.62	16.51		
			34.7	2.3	79.81		
			6.15	2.39	14.70		
			0.94	2	-1.88		
			34.7	1.56	54.13		
			3.95	0.5	-13.83		
			0.92	2.05	9.43		
			5.93	1.59	47.14		
			2.95	2.4	14.16		
			2.45	2.4	11.76		
			0.8	1.1	-0.88		
			1.33	0.76	-1.01		
			2.5	2.1	10.50		
			2.45	2.03	-4.97		
			2.45	2.95	7.23		
					438.24		
35	SUMISTRO Y COLOCACION DE LOSETA CERAMICA INTERCERAMIC LINEA ELEGANCE DE 31.5 * 31.5 CM INC. PEGAZULEJO, BOQUILLA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	M2	3.65	2.95	10.77		
			4.55	2.95	13.42		
			34.7	3	104.10		
			12.7	3	38.10		
			34.7	6.3	218.61		
			2.45	2.95	7.23		
			0.6	0.45	3.24		
					396.47		

ERA

Construcción y Diseño

OBRA: REHABILITACIÓN DE COMEDOR EL SAUZ, CHIH. (REFRENDO)

024/2017

PERIODO DE EJECUCION

03 AL 17 DE MAYO 2017

CONTRATISTA:

ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO

GENERADOR


1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	REPETICION	CANTIDAD TOTAL
68.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO MULTIPANEL LISA DE 0.90 * 2.03 MTS. INCLUYE MARCO BISAGRAS CHAPA DE PARCHEMARCA PHILIPS	PZA				9.00
69.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO DE 3MM DE ESPESOR CLARO INC. MATERIAL DE SELLADO	M2	0.925	0.695	28	18.00
			0.96	0.77	28	20.70
					TOTAL	38.70
59.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA SATINADA MARCA OSEL O SIMILAR INCLUYE REPARACION DE SUPERFICIE Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION	M2				
		BANOS HOMBRERES				
		MURO A	2.95	2.4	2	14.16
		MURO B	3.95	2.4	2	17.52
		puerta	0.9	2.04		-1.838
		ventana	1.5	0.59		-0.895
		plafon	2.95	3.95		10.77
						39.73
		BANO MUJERES				
		MURO A	2.95	2.4	2	14.16
		MURO B	4.55	2.4	2	21.84
		puerta	0.95	2.05		-1.95
		ventana	0.56	0.56		-0.31
		plafon	2.95	4.55		13.42
						47.16
		CUARTO UNO				
		MURO A	2.95	2.4	2	14.16
		MURO B	5.95	2.4	2	28.70
		puerta	0.95	2.05		-1.95
		ventana 1	1.9	1.35		-2.57
		ventana 2	1.6	1.56		-1.95
		plafon	2.95	5.95		17.84
						54.56
		TAQUILLA				
		MURO A	2.95	2.4	2	14.16
		MURO B	2.05	2.4	2	9.84
		puerta	0.89	2.05		-1.82
		ventana	0.8	1.1		-0.88
		plafon	2.05	2.95		6.05
						27.34
		CUARTO DOS				
		MURO A	2.95	2.4	2	14.16
		MURO B	2.17	2.4	2	10.43
		puerta	0.96	2.05		-1.74
		ventana	1.53	0.78		-1.81
		ventana 2	1.14	0.87		-0.99
		plafon	2.95	2.17		6.40
						27.24
		CUARTO TRES				
		MURO A	2.95	2.4	2	14.16
		MURO B	3.45	2.4	2	16.56
		puerta	0.89	2.03		-1.81
		ventana	1.14	0.87		-0.99
		ventana 2	1.47	1.05		-1.54
		plafon	3.45	2.95		10.18
						36.56
					TOTAL	232.69

CONTRATISTA
ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO

RESPONSABLE DE OBRA
ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO


APLICACIÓN DE PINTURA
VINÍLICA EN INTERIORES

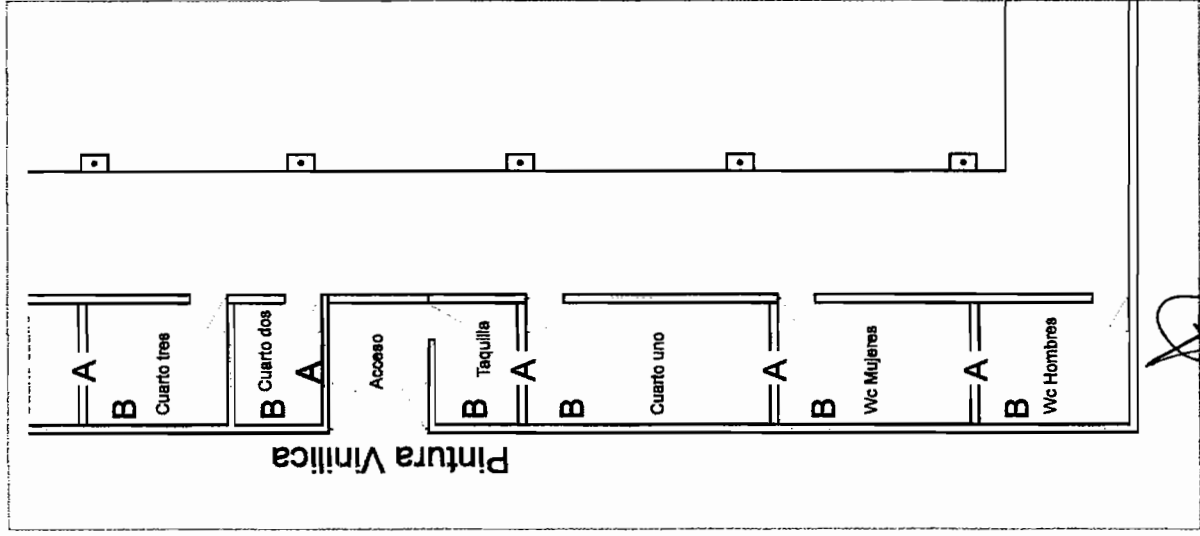

ARQ. EDUARDO ~~RAMAL~~ P.

CROQUIS

ESTIMACION 1
SALON USOS MÚLTIPLES
EL SAUZ
DESMONTAJE DE PUERTAS
Y COLOCACION DE PUERTAS

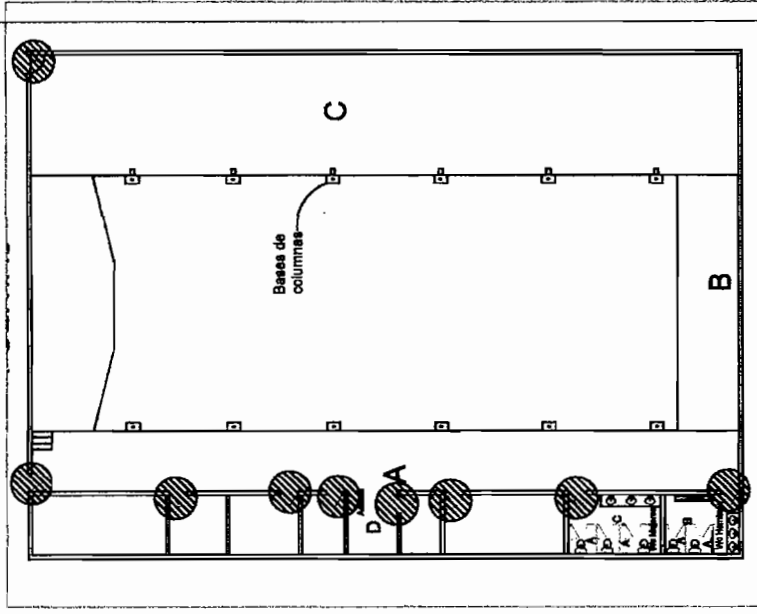


SECCION DE VIDRIOS


Vidrios por ventana = 4 / total de ventanas = 14

Vidrio Grande

Vidrio Chico



BAÑOS

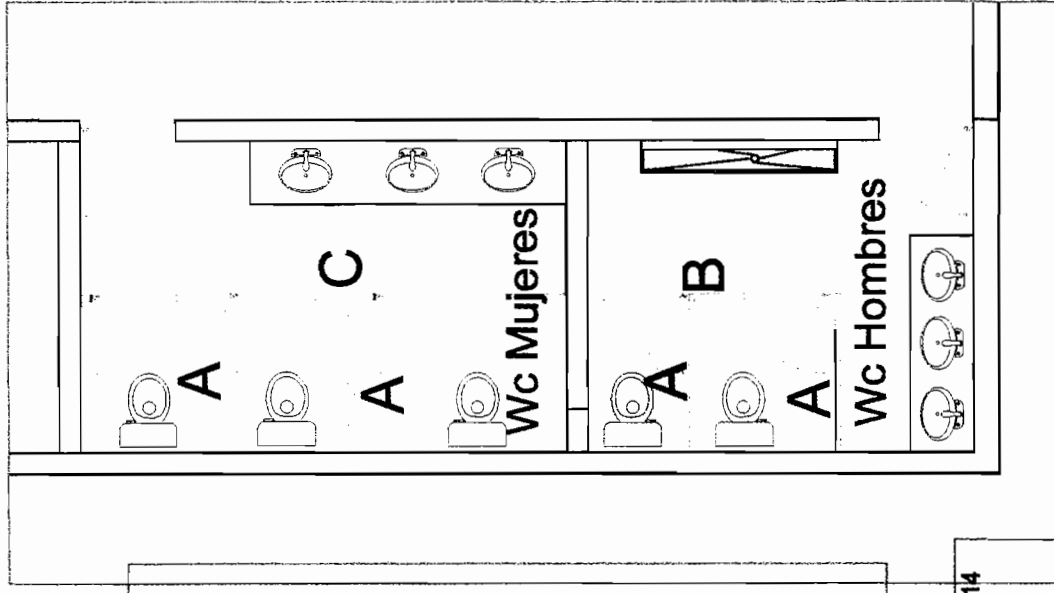


ING. ADRIAN BARRAZA C.

PINTURA ESMALTE

CROQUIS


ESTIMACION 1
SALON USOS MULTIPLES
EL SAUZ

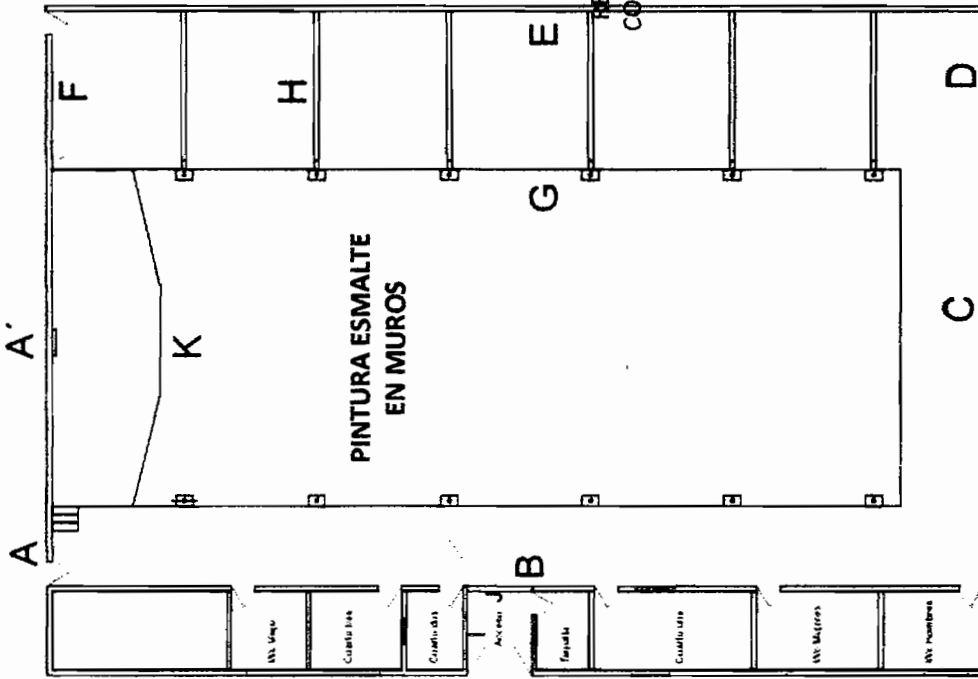

ARQ. EDUARDO RAYNAL P.



CERAMICA Y PICADO DE PISO

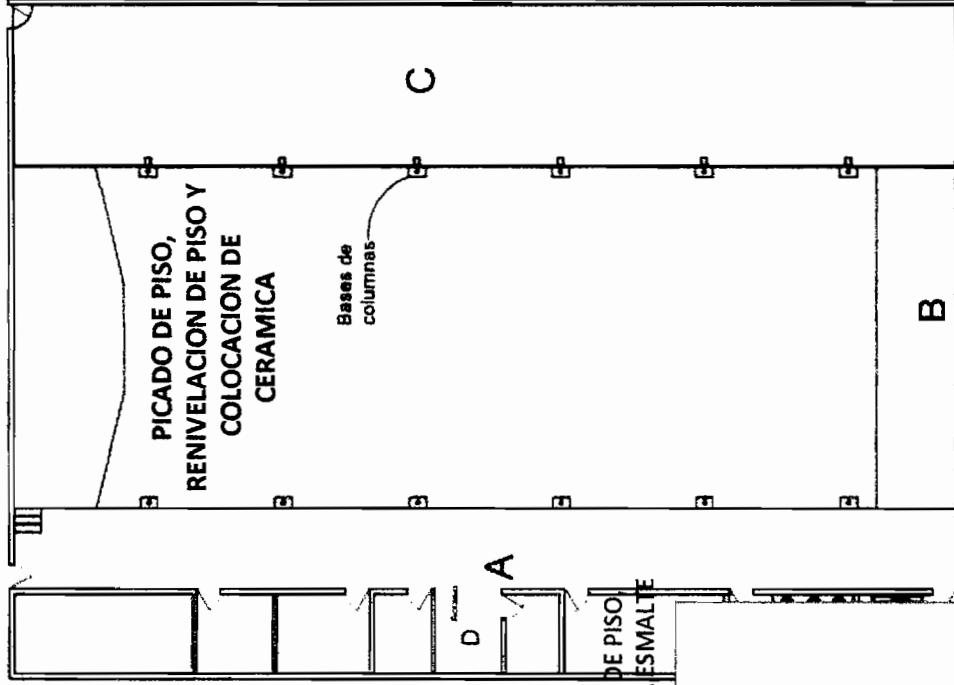

ING. ADRIAN BARRAZA C.



