



OPS100218LX5
OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V.
SIERRA MAGISTRAL 5719 LOS NOGALES
Chihuahua Chihuahua Chihuahua México 31150

FACTURA

Página 1 de 1

FOLIO FISCAL

4C1DFF32-37B2-4048-8104-50030F33B1B9

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT / NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD / LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
00001000000405535779 00001000000403873861 Chihuahua, Chihuahua 2017-06-05T14:55:16

SERIE Y FOLIO

1027

FORMA DE PAGO

Pago en una sola exhibición

RÉGIMEN FISCAL

General de Ley P. M

DATOS DEL RECEPTOR

MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA 408 COL. CENTRO, Chihuahua, Chihuahua, México 31000

LUGAR DE ELABORACIÓN

SIERRA MAGISTRAL 5719 LOS NOGALES Chihuahua
Chihuahua Chihuahua México 31150

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-06-05T16:03:33

MÉTODO DE PAGO: 03= Transferencia electrónica de fondos

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	ESTIMACION	ESTIMACION NUMERO 1, REFERENTE A TRABAJOS DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CAMINO A MAJALCA, SEGÚN CONTRATO No. 028/2017	\$ 108,700.00	\$ 108,700.00
RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO:		SUMA: \$434.80	Importe	\$ 108,700.00
C.M.I.C. DEL 0.2%: \$217.40		NETO A RECIBIR: \$125,657.20	Subtotal	\$ 108,700.00
D.I.F. DEL 0.2%: \$217.40			IVA (16%):	\$ 17,392.00
TOTAL CON I.E.T.R.A.				
CIENTO VEINTISEIS MIL NOVENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN				
Este documento es una representación impresa de un CFDI				
TOTAL				MXN \$ 126,092.00



Sello Digital del CFDI:

NeSBWpQI4iHbeKcDY3FV19e02jG1MyXihU0ZYUDd87g+rfsYiUJ2STOWxtCCFKWnFno4dVhYJLO+RrC1fG8QJdVZAUA8qVbNNHDWkm3Zr...
hEFLeFlLqIEUAFVoN82QmVRtaPrGAIUdpnjRk8NzgnUDKbTt5KBmEZ31iWOHL3HANREnUm3yRpDBRtgU98XxOf9tGm/H0y6bhMzJ4RtbA...
4vHkZJzfEwop8z+Q7ORUsCpYqeoEV4w2OCq6ogO9ViNkFkFifjDFyrQ32puB/xad9GTTg==

Sello del SAT:

ikwM7EgEzZ4zJrk4Mw6opgwkpmxpVHbh1MSdMowjJ70nh/DNn+1JNKGnQ3eXB1RmDwC3GQVNIWNy8MFVNq6ggYjdclYkRI4b6MzdWw7+P1UHVsbGBteuK3VgGboBukpeZ...
DaKdnJTv3I3DuoakicgrpOU1VbwA8AV3VzNOZjgZ8X++v6p/8uIAIag29r/3QIFi2LclExv7wUHvZBZP+tw9o94liOHpVsm+8adraOqBwkJKNT+DBkOHDxEftsGC8VkdWd7qPkB7

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1j1.0j4C1DFF32-37B2-4048-8104-50B60F33B1B9|2017-06-05T16:03:33|NeSBWpQI4iHbeKcDY3FV19e02jG1MyXihU0ZYUDd87g+rfsYiUJ2STOWxtCCFKWnFno4dVhYJLO+RrC1fG8QJdVZAUA8qVbNNHDWkm3Zr...
O+RrC1fG8QJdVZAUA8qVbNNHDWkm3ZrY0QWwOu+igUwXwL5DvcLkdhEFLqIEUAFVoN82QmVRtaPrGAIUdpnjRk8NzgnUDKbTt5KBmEZ31iWOHL3HANREnUm...
3yRpDBRtgU98XxOf9tGm/H0y6bhMzJ4RtbWuExgkLEfSajwRF5tgZpp0kYfQ4vHkZJzfEwop8z+Q7ORUsCpYqeoEV4w2OCq6ogO9ViNkFkFifjDFyrQ32puB/xad9GTTg==|
00001000000405535779||



Folios



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI






RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
OPS100218LX5	OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
4C1DFF32-37B2-4048-8104-50B60F33B1B9	2017-06-05T14:55:16	2017-06-05T16:03:33	FMD100205,S7
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$126,092.00	ingreso	Vigente	

Imprimir

PROGRAMA: INVERSION DIRECTA 2017						CONTRATO No.- 028/2017		CONTRATADO \$ 156,155.00	
OBRA : "SEÑALAMIENTO VERTICAL CAMINO A MAJALCA"						ESTIMACION No. 1(UNO)			
CONTRATISTA: OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V.						PERIODO : DEL 21 AL 30 DE ABRIL DEL 2017			
R.F.C.: OPS100218-LX5						IMPORTE ESTIMADO		\$ 108,700.00	
C O N C E P T O						I M P O R T E		O B S E R V A C I O N E S	
PAVIMENTOS									
OBRA: "SEÑALAMIENTO VERTICAL CAMINO A MAJALCA"						\$ 108,700.00			
IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION						\$ 108,700.00			
DESCUENTOS:								ACEPTO: EL CONTRATISTA OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V. 	
0.2% D.I.F.						\$ 217.40		Vo Bo:	
0.2% C.M.I.C.						\$ 217.40		SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	
SUMA DESCUENTOS						\$ 434.80		JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO VIAL	
RESUMEN:								REVISO:	
SUMA ESTA ESTIMACION						\$ 108,700.00		ING. JESUS GARCIA REYES 	
AMORTIZACION ANTICIPO						\$ 0.00		ING. RAMIRO ARTEAGA GOMEZ BALLONA 	
DESCUENTOS						\$ 434.80		AUTORIZO: ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA 	
SUB - TOTAL						\$ 108,265.20		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO 	
I.V.A.						\$ 17,392.00		ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	
SALDO NETO PARA PAGO						\$ 125,657.20			
CON LETRA: CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.									

[illegible]




OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V.

OPS-100210-LX5

OBRA: "SEÑALAMIENTO VERTICAL
CAMINO A MAJALCA"


CONTRATO No.- 028/2017


ESTIMACION No. 1(UNO)

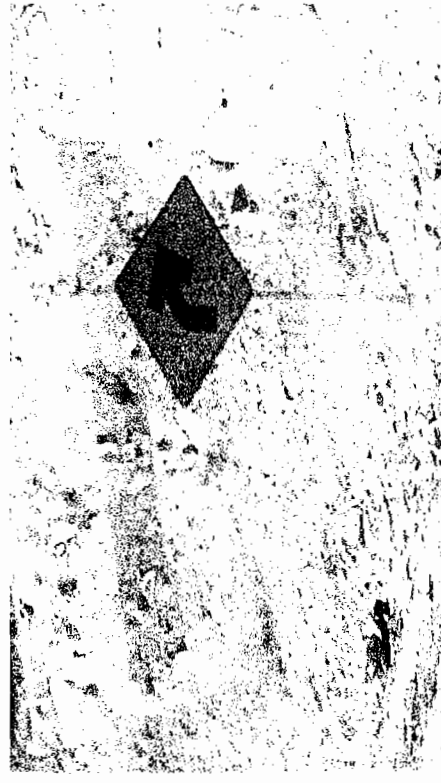

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





PS-100218-LX5


OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V.

OBRA: "SEÑALAMIENTO VERTICAL
CAMINO A MAJALCA"

CONTRATO No.- 028/2017

ESTIMACION No. 1(UNO)






GPS-100218-LX5

OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V.

OBRA: "SEÑALAMIENTO VERTICAL
CAMINO A MAJALCA"


CONTRATO No.- 028/2017

ESTIMACION No. 1(UNO)

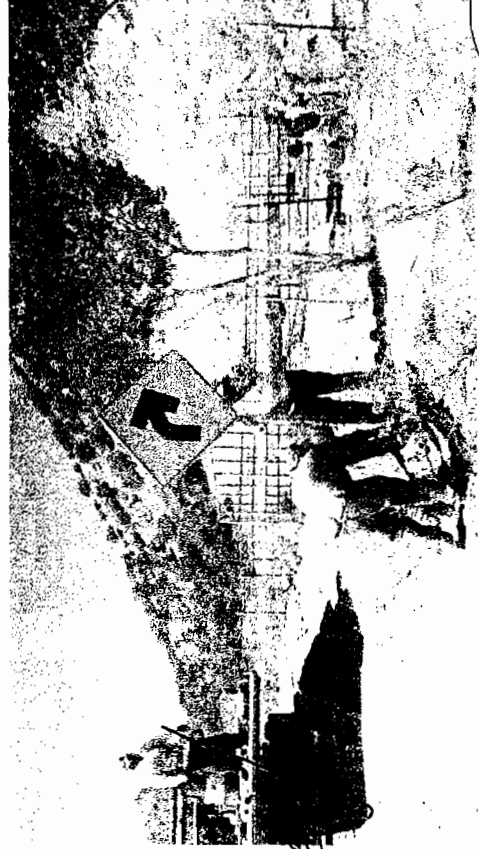

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V.

OPS-100218-LX5

OBRA: "SEÑALAMIENTO VERTICAL
CAMINO A MAJALCA"

CONTRATO No.- 028/2017

ESTIMACION No. 1(UNO)

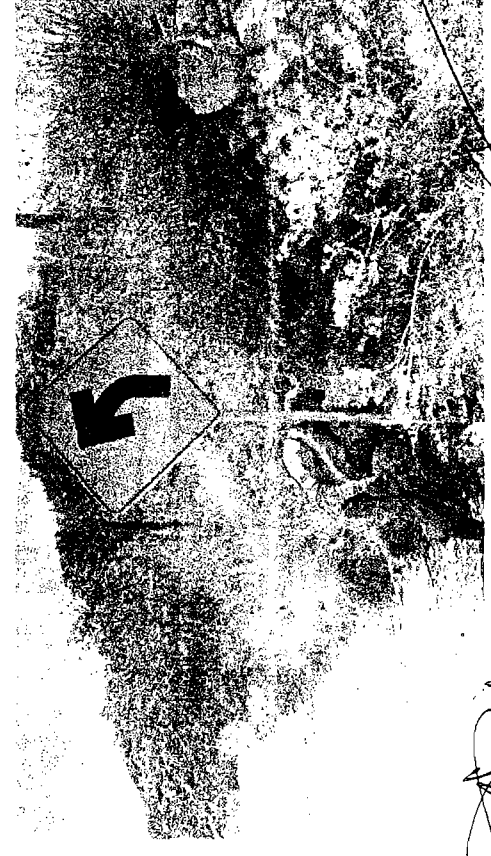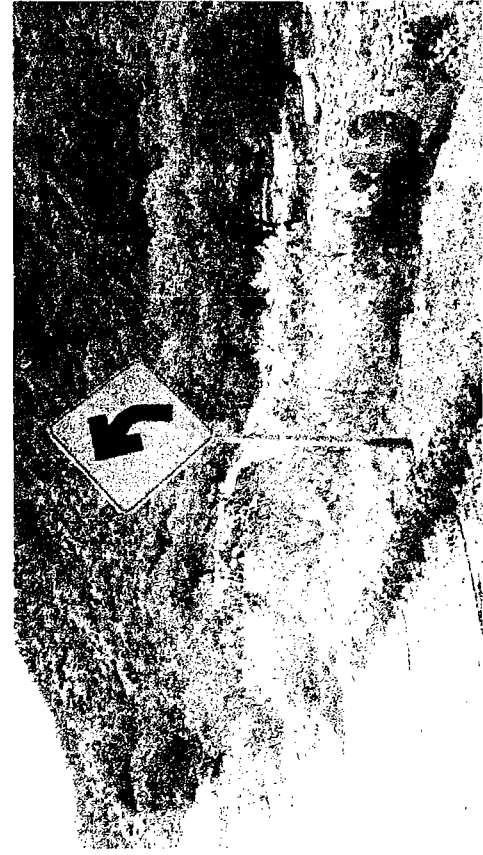

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Tel: (614) 435 24 61

Calle Sierra Magistral #5719

opsdelta10@hotmail.com



①

CONTRATO NO. 026/2017

CONTRATO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL CAMINO A MATALCA

PERIODO DE EJECUCION: 21 ABRIL AL 05 MAYO, 2017



CONTRATISTA: PARMUNIS Y SEÑALAMIENTOS DELTA S.A. DE C.V.



24 ABRIL 2017

ESTA FECHA SE INICIA EL TRABAJO DEL PROYECTO
CONTRATO, CON LA FUNDACION DEL SEÑALAMIENTO
VERTICAL DE LA CUA RELATIVO LA DIRECCION DE "DESARROLLO
RURAL"
SIENDO LAS SEÑALES QUE FIDIERON SIEMPRE:

- 1 UNAL VAPC DE C. H. ...
- 5 ZONA DE RUMORES ✓
- 10 FONDOS TRABAJANDO ✓
- 60 CULVAS ✓
- 5 ALLOS ✓






2º PASO 2017

SE INICIA CON LA INSTALACION DEL SEÑALAMIENTO VERTICAL,
EL CUAL COMIENZA EN EL KM. 27+000 Y TERMINA APROX.
EN EL KM. 27+100, DONDE SE ERIGE LA CASITA DE COBRO
PARA INGRESAR AL TUNEL SAGUA.

SE INSTALO EN EL TRAMO DE TERRACERIA, LAS SEVALE
CONDICIONANTES CON UNA ANTICIDAD DE 2

- 4 VADO
- 2 ZONAS DERRUMBES
- 8 MUJERES TRABAJANDO
- 10 CURVAS


(27)



ABRIL 2017

SE INSTALARON LAS SEÑALES SIGUIENTES:

20 P.A.S. SEÑAL DE CURVA



26 ABRIL 2017

SE INSTALARON LAS SEÑALES SIGUIENTES:

9 P.A.S. SEÑAL DE CURVA

2 P.A.S. SEÑAL ALTO JUNTO CASITA COBBRETE
1 P.A.S. SEÑAL ALTO JUNTO CASITA COBBRETE

