

COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV
RFC960423N15
Domicilio Fiscal
TRASVIÑA Y RETES 5304
Col. PANAMERICANA 31210
CHIHUAHUA CHIHUAHUA Chihuahua México
Tel. 6144266056

Factura No: 202
FOLIO FISCAL (UUID):
386A45DA-BBE6-453B-BBC0-B384C6316815
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000403161827
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-06-22T13:35:32
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-06-22T13:30:31

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MC1651010V22
DIRECCIÓN: CALLE MINA 408
CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIHUAHUA Chihuahua
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: CHIHUAHUA, Chihuahua
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 02-Cheque nominativo

Fecha de Expedición: 22 junio 2017
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONTRATO: 029/2017 ESTIMACIÓN 1 (UNO)UNICA OBRA COMPLEMENTARIA PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ. ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN: \$68,968.76 AMORTIZACIÓN ANTICIPO: \$0.00 SUBTOTAL: \$68,968.76 IVA: \$11,035.00 TOTAL: \$80,003.76 RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO: C.M.I.C. DEL 0.2% \$137.94 DIF DEL 0.2% \$137.94 SUMA RETENCIONES: \$275.88 NETO A RECIBIR: \$79,727.88	\$ 68,968.76	\$ 68,968.76

IMPORTE CON LETRA: OCHENTA MIL TRES PESOS, 76/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 68,968.76
IVA(IVA 16.00%): \$ 11,035.00
TOTAL: \$ 80,003.76

SELLO DIGITAL DEL CFDI

386A45DA-BBE6-453B-BBC0-B384C63168152017-06-22T13:35:321651010V22MUNICIPIO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

SELLO DIGITAL DEL SAT

386A45DA-BBE6-453B-BBC0-B384C63168152017-06-22T13:35:321651010V22MUNICIPIO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

386A45DA-BBE6-453B-BBC0-B384C63168152017-06-22T13:35:321651010V22MUNICIPIO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO



www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son
obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 66710



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal


X

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

RFC960423N15

Folio Fiscal

386A45DA-BBE6-453B-BBC0-
B384C6316815

Total del CFDI

\$80,003.76

Nombre o Razón Social del
Emisor

COMPAÑIA RIO FLORIDO
CONSTRUCTORA SA DE CV

Fecha de Expedición

2017-06-22T13:30:31

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2017-06-22T13:35:32

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del
Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

FMD100203JS7

Imprimir

[Handwritten signatures and marks]

COMPAÑÍA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

TRASVIÑA Y RETES #5304 COL. PANAMERICANA. CP 31200. CHIHUAHUA, CHIH.

TELEFONO: 4-26-60-56 TELEFAX: 4-26-60-57

CHIHUAHUA, CHIH. 22 DE JUNIO DE 2017


ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No. 1 (UNO) UNICA CON FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
OBRA COMPLEMENTARIA DE PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA
VILLA, COL. RANCHERIA JUÁREZ

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 21/ABRIL/2017 AL
POR UN SALDO NETO FACTURADO DE \$80,003.76 CON IVA INCLUIDO


ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE



COMPAÑÍA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V

RECIBE



ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA:	PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2017	CONTRATO No.	029/2017	CONTRATADOS
OBRA:	OBRA COMPLEMENTARIA DE PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUÁREZ	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) UNICA	\$ 80,003.76 CON IVA
UBICACIÓN:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	PERÍODO EJEC.	21/ABRIL/2017 AL 20/MAYO/2017	
CONTRATISTA:	COMPAÑÍA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$	80,003.76 CON IVA
RFC	RFC-960423-N15	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$	-
		IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$	80,003.76 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 67,538.53	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ 1,430.23	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 68,968.76	

DESCUENTOS		
0.2% C.M.I.C.	\$	137.94
0.2% DIF.	\$	137.94
SUMA DESCUENTOS	\$	275.88
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	68,968.76
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	68,968.76
I.V.A.	\$	11,035.00
TOTAL	\$	80,003.76
(CON LETRA)		
(OCHENTA MIL TRES PESOS 76/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	275.88
SALDO NETO A RECIBIR	\$	79,727.88

AUTORIZO	ELABORO
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS	COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA	ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
Vo. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	



CHIHUAHUA, CHIH.,

22/MAYO/2017.

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS , LA CANTIDAD DE: \$ **79,727.88**
(SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 88/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 (UNO) UNICA CONTRATO No. 029/20:7 POR LA CANTIDAD DE: \$ 80,003.76
OCHENTA MIL TRES OPESOS 76/100 POR TRABAJOS EN LA OBRA:
OBRA COMPLEMENTARIA DE PARQUE PLAN DE AYALA,UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUÁREZ

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	68,968.76
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$ 68,968.76
	IVA	\$ 11,035.00
	TOTAL	\$ 80,003.76
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		
C.M.I.C. DEL 0.2%	137.94	
DIF 0.2%	137.94	
SUMA	275.88	

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 80,003.76
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 80,003.76
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 80,003.76
POR EJERCER	\$ (0.00)

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% C.M.I.C.	0.2% D.I.F.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 137.94	\$ 137.94
ACUMULADO ACTUAL	\$ 137.94	\$ 137.94

RECIBIMOS

COMPañÍA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V
RFC-960423-N15



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

OBRA: OBRA COMPLEMENTARIA DE PARQUE PLAN DE AYALA UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA,
COL. RANCHERIA JUÁREZ
MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CONTRATISTA: COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V
PERÍODO: 21/ABRIL/2017 AL 20/MAYO/2017
ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) UNICA
No. CONTRATO: 029/2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS	
No.	IMPORTE
DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	

<u>NORMALES</u>	\$	67,538.53
<u>EXCEDENTES</u>	\$	1,430.23
<u>EXTRAS</u>	\$	-

SUBTOTAL	\$	68,968.76
I.V.A.	\$	11,035.00
TOTAL	\$	80,003.76

POR EL CONTRATISTA

COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
ING. CARLOS H. ZARAZUA RODRIGUEZ

POR EL DEPARTAMENTO
DE CONSTRUCCION.

ARG. JORGE PALACIOS CEBALLOS
RESIDENTE



OBRA:	OBRA COMPLEMENTARIA DE PARQUE PLAN DE AYALA UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUÁREZ			
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA			
CONTRATISTA:	COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.			
PERIODO:	21/ABRIL/2017 AL 20/MAYO/2017			
ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) UNICA			
No. CONTRATO:	029/2017			

No.	DESCRIPCIÓN	VOLÚMENES				PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO	

OBRA NORMAL \$ 67,538.53

1.-	OBRA CIVIL						\$ 26,205.39
1.1	Suministro y colocación de hule negro en el área de areneros. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	387.04	387.04	-	387.04	\$ 20.31 \$ 7,860.78
1.2	Aplicación de pintura de esmalte en postes en colores blanco y azul en tonos indicados por la Residencia de obra. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	6.00	6.00	-	6.00	\$ 904.71 \$ 5,428.26
1.3	Dentellon de concreto f'c=150 kg/cm2 de 15 cm ancho y 30 cms de altura acabado con orillero en esquinas superiores, inc. aline de superficie, cimbra y membrana de curado.	ml	76.64	64.00	-	64.00	\$ 113.15 \$ 7,241.60
1.4	Piso de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cms. De espesor, acabado a vuelta de plana, incluye: aline, cimbra y membrana de curado	m2	25.00	25.00	-	25.00	\$ 226.99 \$ 5,674.75

2.-	ALUMBRADO PÚBLICO						\$ 5,022.18
2.1	Suministro e instalación de cable de aluminio monopolar calibre 6 marca viakon o similar	ml	72.00	72.00	-	72.00	\$ 23.58 \$ 1,697.76
2.2	Refito y traslado de luminarias punta poste de alumbrado público existente para su sustitución.	pza	6.00	6.00	-	6.00	\$ 554.07 \$ 3,324.42
3.-	MURO PORTA-PLACA						\$ 36,310.96

POR EL CONTRATISTA
ING. CARLOS HUMBERTO TRAZA RODRIGUEZ
COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION
ANO. JORGE PALACIOS CERRILLOS
RESPONDIENTE



OBRA:	OBRA COMPLEMENTARIA DE PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUÁREZ
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
CONTRATISTA:	COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V
PERIODO:	21/ABRIL/2017 AL 20/MAYO/2017
ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) UNICA
No. CONTRATO:	029/2017

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO		IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO			
3.1	Muro de 3.10 mts. de altura y 2.24 mts. de ancho de forma irregular con zapata de cimentación, (ver plano) a base de tabique y castillos de concreto f'c=150 kg/cm2 de 15x20 cms., aplanado, pintura vinilica, placas de 2.50 x 1.40 mts. a ambos lados de muro, con remetimiento de 120 x 95 cms. en una de ellas para recibir placa conmemorativa. Incluye primer y laca automotiva de color.	pza	1.00	1.00	-	1.00	\$	31,784.56	\$ 31,784.56
3.2	Suministro y colocación de placa de 120 x 95 cms. con logotipos e información según secretaría de desarrollo agrario, territorial y urbano. (señal), para espacios publicos (ver asero). Incluye fijación con tornillos a muro porta-placa, así como lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	1.00	-	1.00	\$	4,526.40	\$ 4,526.40
OBRA EXCEDENTE									

1.-	OBRA CIVIL						\$	1,430.23	
1.1	Suministro y colocación de hule negro en el área de areneros. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	387.04	457.46	387.04	70.42	\$	20.31	\$ 1,430.23

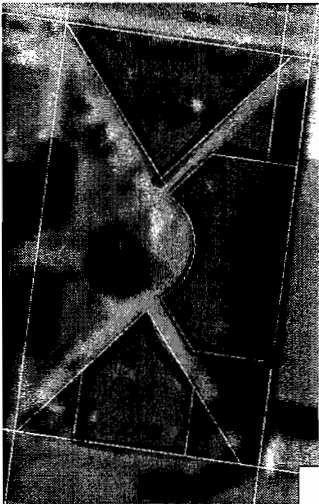
SUBTOTAL	\$	68,968.76
IVA	\$	11,035.00
TOTAL	\$	80,003.76

ING. CARLOS HUMBERTO TARAZUA RODRIGUEZ
COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS
RESIDENTE




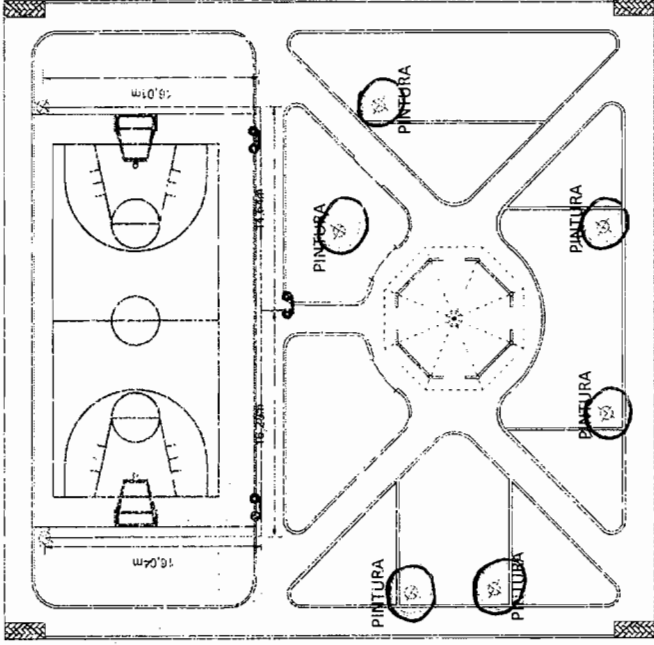
No DE ESTIMACION:	1(UNICA)	PERIODO :	21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2017
-------------------	----------	-----------	-----------------------------------


CROQUIS 	VOLUMEN A PAGAR
	457.46

ARQ. JORGE PALACIOS C. BALLOS
RESIDENTE DOPM

ING. GUILLERMO AMADOR LARA
SUPERINTENDENTE CONTRATISTA

	Contratista: COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	Localidad: CHIHUAHUA	Fecha: 22/05/2017
		Periodo: 21 de Abril al 20 de Mayo	No. De Estimacion: 1 (UNO) UNICA
Numero de Contrato: No.029/2017		Obra: OBRA COMPLEMENTARIA DE PARQUE PLAN DE AYALA UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ	No. De Estimacion: 1 (UNO) UNICA

CONCEPTO	UNIDAD	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS
OBRA CIVIL 1.2.- Aplicación de pintura de esmalte en postes en colores blanco y azul en tonos indicados por la Residencia de obra. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PIEZA	6 00 PIEZAS	
TOTAL		6.00	

Elaboró:  Ing. Guillermo Amador Lara Residente Compañia Rio Florido Constructora	Revisó:  Arq. Jorge Paezlos Cepallos Residente D.O.P.M.
VOLUMEN A PAGAR: 6.00 PIEZA	
REFERENCIA DE DOCUMENTACION:	




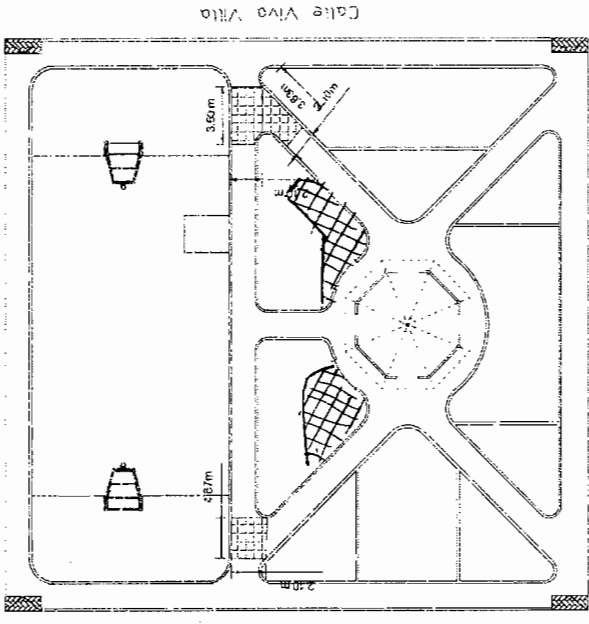


HOJA /


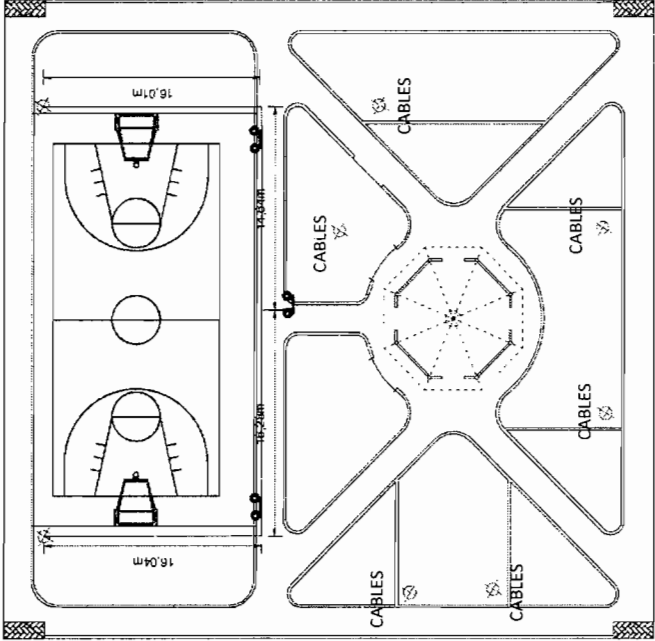
CONTRATO :029 /2017 P.D.	TRAMO:
OBRA :	CONTRATISTA:
OBRA :	COMPANIA RIO FLORIDO S.A. DE C.V.

[illegible]

~~ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS~~
RESIDENTE DORM

ING. GUILLERMO AMADOR LARA
SUPERINTENDENTE CONTRATISTA

	Contratista:	Localidad: CHIHUAHUA	Fecha:
	COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	Periodo: 21 de Abril al 20 de Mayo	22/05/2017
		Numero de Contrato:	No. De Estimacion. :
		No.029/2017	1 (UNO) UNICA
Obra:		Obra:	
OBRA COMPLEMENTARIA DE PARQUE PLAN DE AYALA UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA COL. RANCHERIA JUAREZ		OBRA COMPLEMENTARIA DE PARQUE PLAN DE AYALA UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA COL. RANCHERIA JUAREZ	
CROQUIS			
			
CONCEPTO		UNIDAD	OPERACIONES ARITMETICAS
OBRA CIVIL		M2	
1.4 - Piso de concreto $f_c=150$ kg/cm2 de 10 cms. De espesor, acabado a vuelta de plana, incluye: afine, cimbra y membrana de curado			Area= $4.67m \times 2.10m = 9.81 m^2$ $3.60m \times 2.10m = 7.56 m^2$ $3.63m \times 2.10m = 7.63 m^2$ Area total= 25.00 m2
		TOTAL	25.00
Elaboró:		Revisó:	
 Ing. Guillermo Amador Lara Residente Compañia Rio Florido Constructora		 Arq. Jorge Palacios Caballos Residente D.O.B.M.	
VOLUMEN A PAGAR:		25.00 M2	
REFERENCIA DE DOCUMENTACION:			

	Contralista:	Localidad: CHIHUAHUA	Fecha:
	COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V	Periodo: 21 de Abril al 20 de Mayo	22/05/2017
Numero de Contrato:		Obra:	No. De Estimacion. :
No.029/2017		OBRA COMPLEMENTARIA DE PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ	1 (UNO) UNICA
CONCEPTO	UNIDAD	CROQUIS	
ALUMBRADO PUBLICO	ML		
2.1.- Suministro e instalación de cable de aluminio	Longitud=		
monopolar calibre 6 marca viakon o similar	6 postes (6 mts de altura) por 2 cables c/u=		
	12 cables		
	Longitud de cable= 6 metros		
	12 cables por 6 metros= 72 mts		
	Longitud = 72.00 ml		
		TOTAL 72.00	
Elaboró:	Revisó:	VOLUMEN A PAGAR: 72.00 ML	
Ing. Guillermo Amador Lara Residente Compañía Río Florido Constructora	Arq. Jorge Palacios Ceballos Residente D.O.P.M	REFERENCIA DE DOCUMENTACION:	

COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.
TRASVIÑA Y RETES #5304 COL. PANAMERICANA. CP 31200. CHIHUAHUA, CHIH.
TELEFONO: 4-26-60-56 TELEFAX: 4-26-60-57

CHIHUAHUA, CHIH. A 08 DE DICIEMBRE DEL 2016.

A quien Corresponda
Presente.-

Dando seguimiento al contrato de obra pública No. 215/2016 correspondiente a la elaboración de los trabajos consistentes en:

"PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUÁREZ."

Le solicito de la manera más atenta la revisión y recepción del siguiente material que no se utilizo en la elaboración de los trabajos antes mencionados.


El material correspondiente es el siguiente:

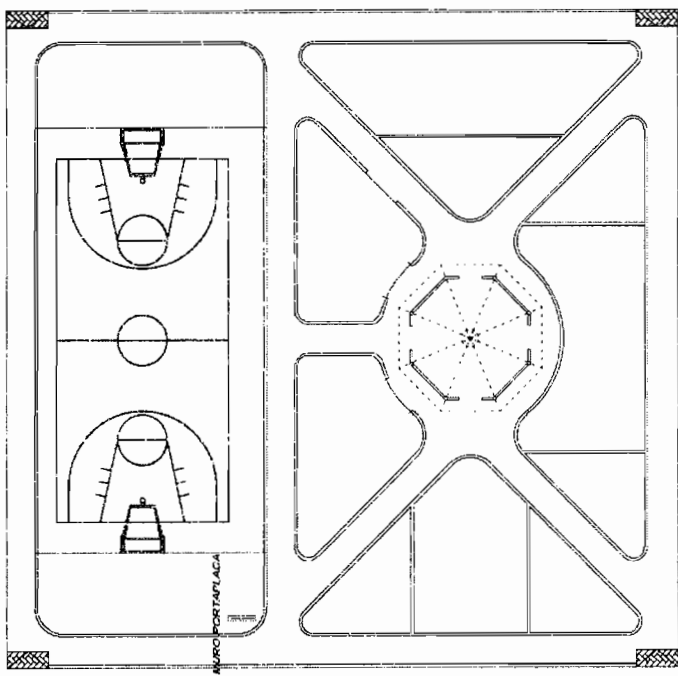
Material:	Cantidad:	Firma de entrega:
Banca metálica para pape	4 piezas	JUAN AGUILERA
Malla cubierta de 2.0m	91.50m (9 rollos)	JUAN AGUILERA
Luminarias esféricas porta poste	3.0 piezas	JUAN AGUILERA
Luminarias esféricas porta poste	3.0 piezas	JUAN AGUILERA
Coronas portales con listón	2.0 piezas	JUAN AGUILERA
Portales metálicos	2.0 piezas	JUAN AGUILERA



Sin otro en particular, agradeciendo su atención.

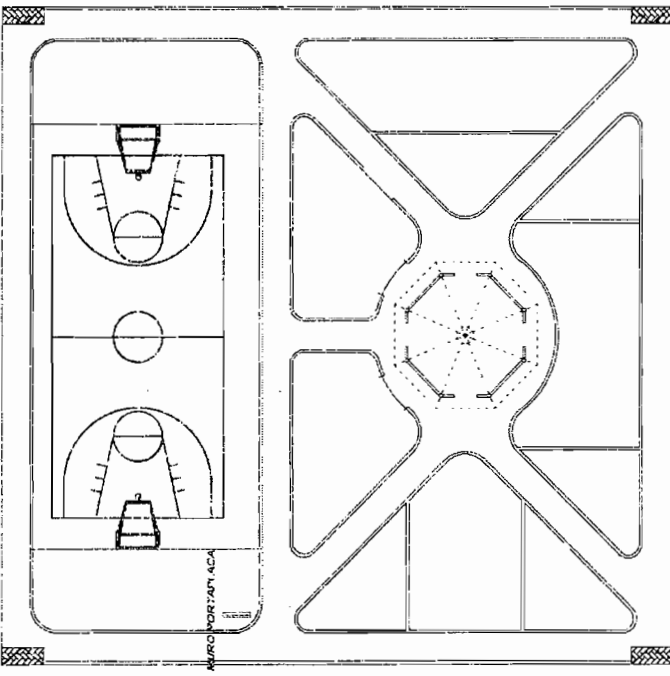
RECIBIDO EN AUMERÉN
DE MEDIDORAMIENTO
VIDAL C. JUAN ESCUTIN


ING. CARLOS H. ZARAZUA RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO
COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

	Contratista:	Localidad: CHIHUAHUA	Fecha:
	COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V	Periodo: 21 de Abril al 20 de Mayo	22/05/2017
Numero de Contrato:		Obra:	No. De Estimacion.:
No.029/2017		OBRA COMPLEMENTARIA DE PARQUE PLAN DE AYALA UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ	1 (UNO) UNICA

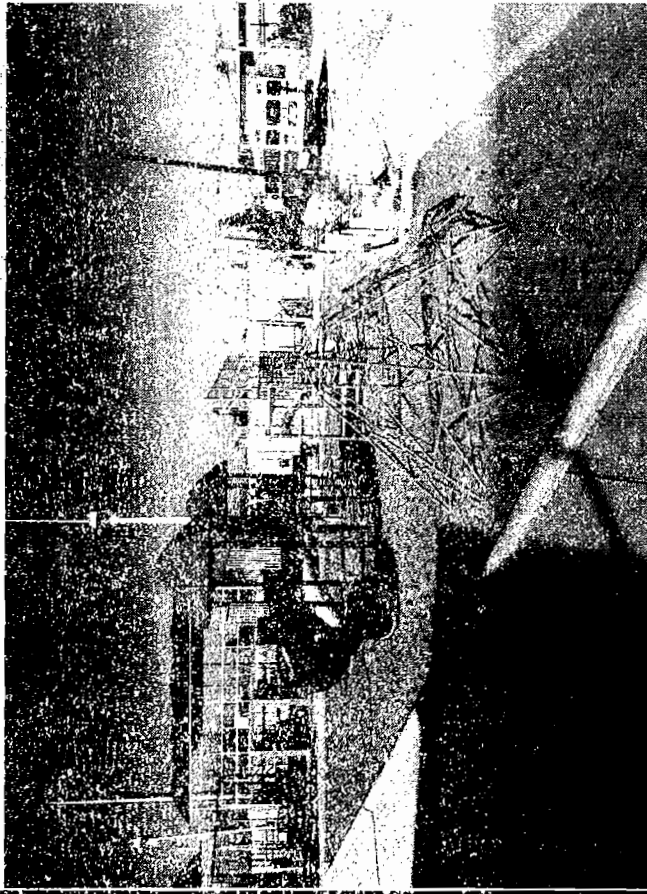
CONCEPTO	UNIDAD	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS
MURO PORTA-PLACA	PZA	1.00 PIEZA	
3.1.- Muro de 3.10 mts. de altura y 2.24 mts. de ancho de forma irregular con zapata de cimentacion, (ver plano) a base de tabique y castillos de concreto fc= 150 kg/cm2 de 15x20 cms., aplanado pintura vinilica, placas de 2.50 x 1.40 mts. a ambos lados de muro, con remetimiento de 120 x 95 cms. en una de ellas para recibir placa conmemorativa. incluye primer y laca automotiva de color.			
TOTAL			1.00



Elaboro:	Revisó:	VOLUMEN A PAGAR:
 Ing. Guillermo Amador Lara Residente Compania Rio Florido Constructora	 Arq. Jorge Palacios Cevallos Residente D.O.P.M	1.00 PZA
REFERENCIA DE DOCUMENTACION:		


	Contralista: COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	Localidad: CHIHUAHUA Periodo: 21 de Abril al 20 de Mayo Numero de Contrato: No.029/2017	Fecha: 22/05/2017 No. De Estimacion. : 1 (UNO) UNICA
Obra: OSRA COMPLEMENTARIA DE PARQUE PLAN DE AYALA UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA COL. RANCHERIA JUAREZ		CROQUIS	
CONCEPTO MURO PORTA-PLACA 3.2.- Suministro y colocacion de placa de 120 x 95 cms. con logolipos e informacion segun secretaria de desarrollo agrario, territorial y urbano. (sedatu). para espacios publicos (ver diseño). incluye fijacion con tornillos a muro porta-placa, asi como lo necesario para su correcta instalacion.	UNIDAD PZA	OPERACIONES ARITMETICAS 1.00 PIEZA	
TOTAL 1.00		REFERENCIA DE DOCUMENTACION:	
Elaboro: Ing Guillermo Amador Lara Residente Compania Rio-Florida Constructora		Revisó: Arq. Jorge Palacios Seballos Residente D.O.P.M.	
VOLUMEN A PAGAR:		1.00 PZA	

	Contratista:	Localidad: CHIHUAHUA		Fecha:
	COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V	Periodo: 21 de Abril al 20 de Mayo		
Numero de Contrato:		No.029/2017	Obra:	No. De Estimación :
			OBRA COMPLEMENTARIA DE PARQUE PLAN DE AYALA,UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ	1 (UNO) UNICA

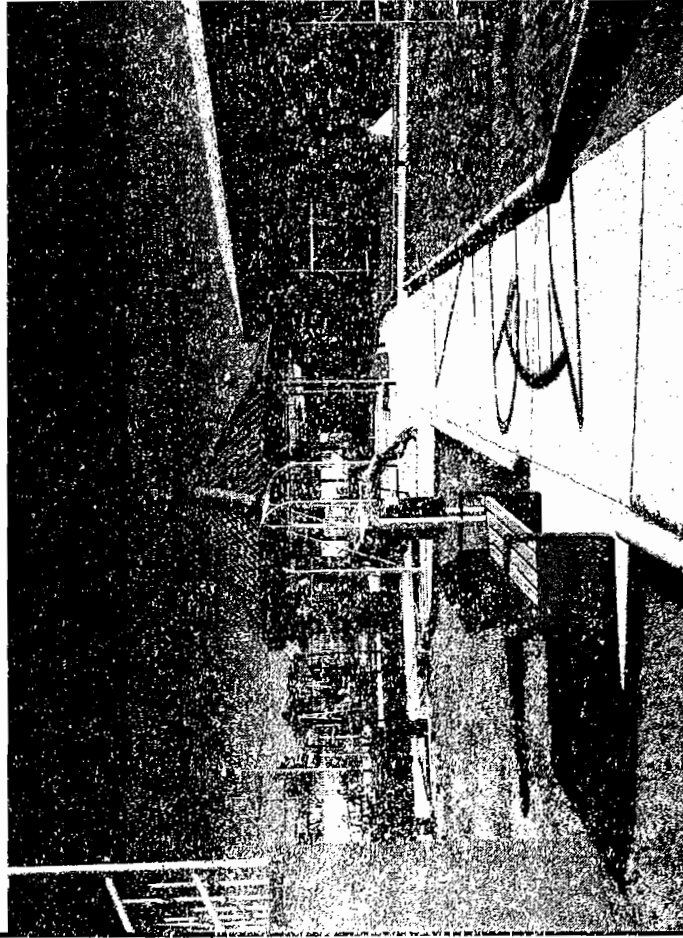
FOTOGRAFIAS





Elaboró:	Revisó:
 Ing. Guillermo Amador Lara Residente Compañia Rio Florido Constructora	 Arq. Jorge Palacios Ceballos Residente D.O.P.M

	Contratista:	Localidad: CHIHUAHUA	Fecha:
	COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V	Periodo: 21 de Abril al 20 de Mayo	22/05/2017
		Numero de Contrato: No.029/2017	No. De Estimacion. : 1 (UNO) UNICA
		Obra:	
		OBRA COMPLEMENTARIA DE PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ	

FOTOGRAFIAS



Elaboró:	Revisó:
 Ing. Guillermo Amador-Lara Residente Compañía Río Florido Constructora	 Arq. Jorge Palacios Ceballos Residente D.O.P.M



Contratista:

COMPANIA RIO FLORIDO
CONSTRUCTORA S.A DE
C.V

Localidad: CHIHUAHUA

Periodo:

21 de Abril al 20 de Mayo

Numero de Contrato:

No.029/2017

Obra:

OBRA COMPLEMENTARIA DE PARQUE PLAN DE AYALA UBICADO EN
CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUAREZ

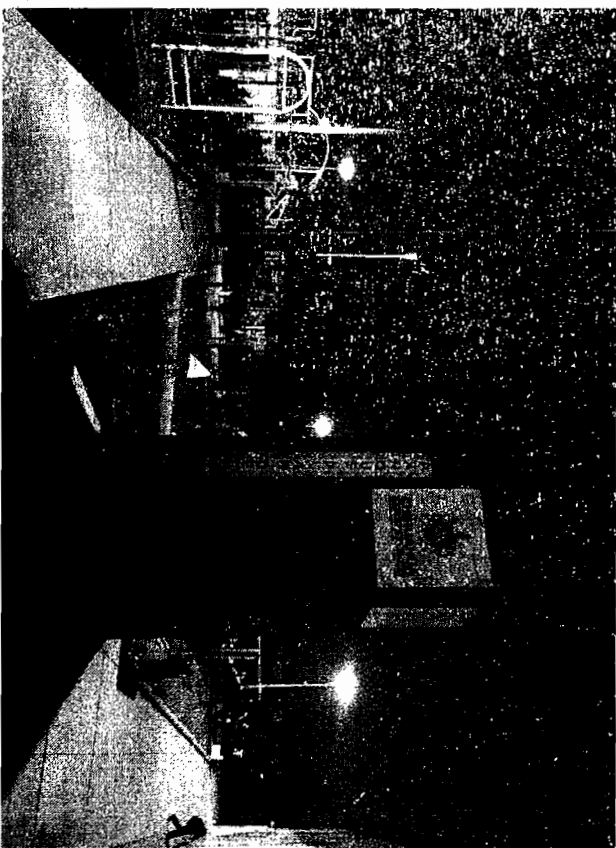
Fecha:

22/05/2017

No. De Estimacion.:

1 (UNO) UNICA

"FOTOGRAFIAS"



Elaboro:

Ing. Guillermo Arriaga
Residente Compañía Rio Florido Constructora

Revisó:

Arq. Jorge Palacios Ceballos
Residente D.O.P.M

COMPAÑÍA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

TRASVIÑA Y RETES #5304 COL. PANAMERICANA. CP 31200. CHIHUAHUA, CHIH.

TELEFONO: 4-26-60-56 TELEFAX: 4-26-60-57

CHIHUAHUA, CHIH. A 08 DE DICIEMBRE DEL 2016.

A quien Corresponda
Presente.-

Dando seguimiento al contrato de obra pública No. 215/2016 correspondiente a la elaboración de los trabajos consistentes en:

"PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUÁREZ."

Le solicito de la manera más atenta la revisión y recepción del siguiente material que no se utilizo en la elaboración de los trabajos antes mencionados

El material correspondiente es el siguiente:

Material:	Cantidad:	Firma de entrega:
Reflector 400w 80x60x50cm	300 piezas	Eduardo Espino Lorenz
Cable redido Nema 3P	1000 piezas	



LABORATORIO DE MATERIALES DEL NOROESTE S. DE R. L. MI.

CONTROL DE CALIDAD EN TERRACERIAS, CONCRETO, ASFALTO Y ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS
Reg. Fed. de Caus. LMN-090518-VA3 E-mail: labortega4301@hotmail.com

INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO HIDRAULICO

Normas empleadas: NMX-C161, 160, 156, 109, 083 vigentes.

OBRA:	PARQUE PLAN DE AYALA EN COLONIA RANCHERIA JUAREZ	ENSAYE No.	
LOCALIZACION:	CALLE VIVA VILLA Y CALLE LUCHA OBRERA	FECHA DE RECIBO	
		FECHA DE INFORME	

IDENTIFICACION	ENSAYE No.	1	2	3	4	5	
	MUESTRA No.	1					
	TOMADA DE	COLADO DE FIRME DE CONCRETO EN AREA DE JUEGOS					
DATOS PREVIOS	PROPORCIONAMIENTO	f'c (kg/cm²) 200 Kg/cm²					
	REV.PROY.	10±2 CMS.					
	CEMENTO	CHIHUAHUA CPC -30R					
	CONSUMO	24,0 m³					
	DE FECHA						
DATOS DE LA OBRA	ADICIONANTE, MARCA Y TIPO	CANTIDAD					
		FINALIDAD					
	CEMENTO	MARCA CPC -30R					
		CONSUMO					
DATOS DEL ESPECIMEN	ADICIONANTE	CANTIDAD					
		FINALIDAD					
	EQUIPO DE MEZCLADO Y CAP.	CAMIÓN REVOLVEDOR DE 7 M³ GCC					
	TIPO DE VIBRADOR UTILIZADO	MECÁNICO DE DE INMERSIÓN					
	AGUA CONSUMO POR SACO	10,0					
DATOS DEL ESPECIMEN	REVENIMIENTO (cm)	10,0					
	DIAMETRO (cm.)	15,0	15,1	15,0	15,1	15,0	
	SECCION (cm²)	176,7	179,1	176,7	179,1	176,7	
	FECHA DE COLADO						
	FECHA DE RUPTURA						
DATOS DEL ENSAYE	EDAD (días)	7	14	14	28	28	
	TIPO DE PRUEBA	C O M P R E S I O N A X I A L					
	PROCEDIMIENTO DE CURADO	I N M E R S I O N E N A G U A					
	CARGA DE RUPTURA (kg.)	18750	23500	24000	28100	27900	
	RESISTENCIA (kg/cm²)	106,05	131,85	135,75	157,05	157,95	
% DE RESISTENCIA DE PROYECTO	70,7	87,9	90,5	104,7	105,3		

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

LA RESISTENCIA OBTENIDA A LOS 28 DIAS DE EDAD, CUMPLE CON LA RESISTENCIA DE PROYECTO

ESTE PROGRAMA ES

PROPIEDAD DEL LABORATORIO

NO SE PERMITE EL

USO PARA FINES

DISTINTOS A

LOS ESTABLECIDOS

EN EL PROGRAMA

REVISO

ING. BERNARDINO ORTEGA IBARRA

CONTROL DE TRAMITE DE ESTIMACIONES

DATOS GENERALES			
FOLIO	NUMERO DE ESTIMACION	1 (UNO) UNICA	SALDO NETO 80,003.76
OBRA	OBRA COMPLEMENTARIA DE PARQUE PLAN DE AYALA, UBICADO EN CALLE CLASE OBRERA Y CALLE VIVA VILLA, COL. RANCHERIA JUÁREZ		
CONTRATISTA:	COMPANÍA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V	UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
RESIDENTE	ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS	CONTRATO No.	029/2017

RESUMEN DE AUTORIZACIONES				
AUTORIZACION DE:	FECHA Y FIRMA RECIBIDO	FECHA Y FIRMA ENTREGA	CONTROL DE OBRA	
			FECHA Y FIRMA RECIBIDO	FIRMA Y FECHA ENTREGA
☒ RESIDENTE				
☐ JEFE DE OFICINA				
☐ JEFE DEPARTAMEN				
☒ DIRECTOR				
☐ DEP. SERV. ADM.				

EN CASO DE 1ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	

EN CASO DE 2ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	

EN CASO DE 3ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	



Dirección de Obras Públicas Municipales
Subdirección de Infraestructura Social
Departamento de Conservación de la Infraestructura Urbana

NOMBRE Y FECHA DE ENTREGA EN CONTROL DE OBRA
