

Folio Fiscal

300529eb-25ae-4ed6-9ec9-7d509f912acb

Serie: C**Folio: 43****Número de Certificado del Emisor**

00001000000301653590

Lugar y Fecha de Emisión

CHIHUAHUA CHIH., 2017-07-15T08:44:46

GARMEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

GCO7911283P3

CALLE PINO No. 509 1 TEL. 417-68-01

COL. LAS GRANJAS CHIHUAHUA CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31100

Rég. Fiscal: PERSONA MORAL GENERAL DE LEY

FACTURA**Lugar y Fecha de certificación**

México Distrito Federal, 2017-07-15T09:44:47

Proveedor de Certificación de CFDI

AURORIAN S.A. DE C.V.

www.konesh.com.mx

Número Certificado del SAT: 00001000000404624465

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Dirección del Cliente

MINA 408

CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA

CHIHUAHUA MEXICO C.P. 31000

RFC del Cliente

MCI651010V22

CANT./UNIDAD**CLAVE****CONCEPTO****P. UNITARIO****IMPORTE**

1.00 N/A

RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON CONCRETO LANZADO EN RAMPA DE
ESTACIONAMIENTO EN CALLE ANGEL TRIAS Y CALLE NOVENA

\$ 111,306.26

\$ 111,306.26

ESTIMACION 1 (UNO)
SEGUN CONTRATO NUM. 047/2017
FIRMA DEL CONTRATISTA
ALCANCE DE LA ESTIMACION \$111,306.26
AMORTIZACION DEL ANTICIPO
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO
D.I.F. DEL 0.2% \$222.61
CMIC DEL 0.2% \$222.61
SUMA \$445.22
NETO A RECIBIR \$128,670.04

IMPORTE EN LETRAS

CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO QUINCE PESOS 26/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HE8Vhp1JldGrGMyFSQooz/coaX5sFkEZ99b0TD042k+oRpVkoisK4yHalNM6LNhPTcqQ2rsr1shCKUQAKUZ5G5UqwQNSiVQ/JfX2xlpzYjncv
O+KBAI6AyK8yrNXIEH/yqZJ3dsuTtWh2/A4uElb14Fn/8vYYQqjb5gxMZBu20=

SELLO DIGITAL DEL SAT

vHZ5Tn8pKIA+78LAW7imZ+aMrGedyROI6t3qlxldyrb1TRBAC3qcN4NbTh9J9UZzfjSTxvBTdKVzm+sk70IV/k1oSDNOmkCmOxv4EFBhEDLr
HAj6EM0BNXskiuLzDBU9jhx6A+ASbeDSS0xcHdWZZFJxBk2xpLHnulpT6k535Eaaw/66DfQVcczPWvMkEbvM7nGUsJPXYl0boQteESmnl+4KZ6s0evfLlrYbP9YMLwSu0fivYo0uhiRts8y

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|300529eb-25ae-4ed6-9ec9-7d509f912acb|2017-07-15T09:44:47|HE8Vhp1JldGrGMyFSQooz/coaX5sFkEZ99b0TD042k+oRpVkoisK4yHalNM6LNhPTcqQ2rsr1shCKUQAKUZ5G5U
qwQNSiVQ/JfX2xlpzYjncvO+KBAI6AyK8yrNXIEH/yqZJ3dsuTtWh2/A4uElb14Fn/8vYYQqjb5gxMZBu20=|00001000000404624465||

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

**SUB-TOTAL**

\$ 111,306.26

Total de Impuestos

\$ 17,809.00

Trasladados**Total de Impuestos**

\$ 0.00

Retenidos**IVA 16.00 %**

\$ 17,809.00

TOTAL

\$ 129,115.26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor

GC07911283P3

Nombre o razón social del emisor

GARMEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

RFC del receptor

MCI651010V22

Nombre o razón social del receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio fiscal

300529EB-25AE-4ED6-9EC9-7D509F912ACB

Fecha de expedición

2017-07-15T08:44:46

Fecha certificación SAT

2017-07-15T09:44:47

PAC que certificó

AUR100128NN3

Total del CFDI

\$129,115.26

Efecto del comprobante

ingreso

Estado CFDI

Vigente



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 047/2017	CONTRATADO
OBRA: RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON CONCRETO LANZADO EN RAMPA DE ESTACIONAMIENTO EN CALLE ANGEL TRIAS Y CALLE NOVENA	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	\$ 227,708.00 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 3 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2017	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 129,115.26 CON IVA
CONTRATISTA: GARMEL CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC GCO-791128-3P3	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 129,115.26 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 111,306.26	
<u>0.00</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 111,306.26	

DESCUENTOS

0.2% D.I.F. \$ 222.61

0.2% C.M.I.C. \$ 222.61

SUMA DESCUENTOS \$ 445.22

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION \$ 111,306.26

AMORT ANTICIPO \$ 0.00

SUB-TOTAL \$ 111,306.26

I.V.A. \$ 17,809.00

TOTAL \$ 129,115.26

(CON LETRA)

(CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO QUINCE PESOS 26/100 M.N.)

DESCUENTOS \$ 445.22

SALDO NETO A RECIBIR \$ 128,670.04

AUTORIZO

ELABORO

ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
RESIDENTE D.O.P.M

GARMEL CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.
CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

ING. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE
DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. EDNA LIZOTTE DEL RIO SIGALA
JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH.,

31 de mayo de 2017

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA / DIR. OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO., LA CANTIDAD DE: \$ 128,670.04-
(CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 4/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 (UNO) CONTRATO No. 047/2017 POR LA CANTIDAD DE : \$ 227,708.00
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON CONCRETO LANZADO EN RAMPA DE ESTACIONAMIENTO EN CALLE ANGEL TRIAS Y CALLE
NOVENA

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 111,306.26

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 111,306.26

IVA \$ 17,809.00

TOTAL \$ 129,115.26

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

D.I.F. DEL 0.2% 222.61

CMIC. DEL 0.2% 222.61

SUMA 445.22

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 227,708.00
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 129,115.26
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 129,115.26
POR EJERCER	\$ 98,592.74

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% C.M.I.C.

0.2% D.I.F.

ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 222.61	\$ 222.61
ACUMULADO ACTUAL	\$ 222.61	\$ 222.61

RECIBIMOS

GARMEL CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.
GCO-791128-3P3

OBRA: RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON CONCRETO LANZADO EN RAMPA DE ESTACIONAMIENTO EN CALLE ANGEL TRIAS Y CALLE NOVENA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

No. CONTRATO: 047/2017

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)


PERÍODO: 3 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2017

CONTRATISTA: GARMEL CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
	NORMALES	111,306.26

SUBTOTAL \$	111,306.26
I.V.A. \$	17,809.00
TOTAL \$	129,115.26


RESIDENTE


CONTRATISTA

OBRA: RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON CONCRETO LANZADO EN RAMPA DE ESTACIONAMIENTO EN CALLE ANGEL TRIAS Y CALLE NOVENA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

No. CONTRATO: 047/2017

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)

CONTRATISTA:

GARMEL CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.

PERIODO: 3 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2017

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR		
	TOTAL DE LA ESTIMACION						111,306.26
	OBRA NORMAL					\$	111,306.26
1	EXCAVACION EN MATERIAL "B" DE TALUD VERTICAL A MANO INCLUYE AFINE	m3	114.32	114.32	0.00	\$168.00	19,205.76
2	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. ZAPATA A BASE DE MAMPOSTERIA DE 20 CMS. DE ESPESOR, UTILIZANDO MORTERO CEMENTO-ARENA DE RESISTENCIA DE 60 KG/CM2	m3	186.62	148.61	0.00	\$110.24	16,382.77
3	ZAMPEADO A BASE DE MAMPOSTERIA DE 30 CMS. DE ESPESOR HASTA UNA ALTURA DE 2.50 MTS., UTILIZANDO MORTERO CEMENTO-ARENA DE RESISTENCIA DE 60 KG/CM2	m2	20.00	17.76	0.00	\$649.00	11,526.24
4		m2	106.73	91.57	0.00	\$701.01	64,191.49

[Signature]

RESIDENTE

CONTRATISTA

[Signature]

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 047/2017

OBRA : RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON CONCRETO LANZADO EN RAMPA DE ESTACIONAMIENTO EN CALLE ANGEL TRIAS Y CALLE NOVENA

CONTRATISTA:

GARMEL CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.

No DE ESTIMACION: 1 (UNO) PERIODO : 3 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2017

CROQUIS VOLUMEN A PAGAR UNIDAD

CONCEPTO

OPERACIONES ARITMETICAS

1 EXCAVACION EN MATERIAL "B" DE TALUD VERTICAL A MANO INCLUYE AFINE

AREA ACAD	ESPOSOR PROM	TOTAL
18.39	0.5	9.195
20.01	0.5	10.005
10.38	0.5	5.19
15.64	0.5	7.82
15.65	2.2	34.43
17.78	0.5	8.89
17.79	1.35	24.0165
12.19	0.15	1.8285
2.02	4.65	9.393
17.4	0.16	2.784
4.8	0.16	0.768
		114.32

114.32 M3

2 RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

AREA ACAD	ESPOSOR PROM	TOTAL
18.39	0.5	9.195
20.01	0.5	10.005
10.38	0.5	5.19
15.64	0.5	7.82
15.65	2.2	34.43
17.78	0.5	8.89
17.79	1.35	24.0165
12.19	0.15	1.8285
2.02	4.65	9.393
17.4	0.16	2.784
4.8	0.16	0.768
		114.32
		148.61

3 ZAPATA A BASE DE MAMPOSTERIA DE 20 CMS. DE ESPESOR, UTILIZANDO MORTERO CEMENTO-ARENA DE RESISTENCIA DE 60 KG/CM2

LONG	ANCHO	AREA
17.4	0.8	13.92
4.8	0.8	3.84
		17.76



Garmel construcciones

S.A. de C.V.
R.F.C. GCO-791128-3P3 148.61 M3
C. PINO No. 509 INT. 1
COL. GRANJAS C.P. 31100
TEL. 417-6801

17.76 M2

RESIDENTE *[Signature]*

CONTRATO: 047/2017

RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON CONCRETO LANZADO EN RAMPA DE ESTACIONAMIENTO EN CALLE ANGEL TRIAS Y CALLE NOVENA

CONTRATISTA: GARMEL CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.

1 (UNO) PERIODO: 3 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2017

[illegible]

Editorial, contributors

S.D. de C.V.
R.F.C. GCO-791128-SP3
C. PINO No. 508 INT. 1
COL. GRANJAS C.P. 31100
TEL. 417-6801







RESIDENTE Juarez A.

2 de 2

CONTRATISTA

EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL

CONCEPTO 1 Y 2

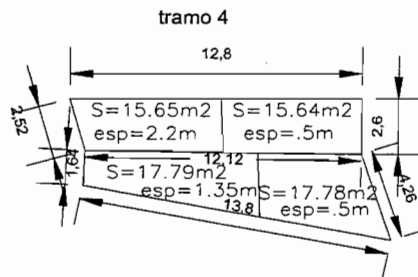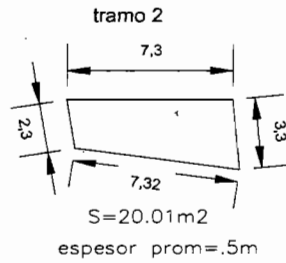


Germel construcciones

S.A. de C.V.
R.F.C. GCO-791128-3P3
C. PINO No. 509 INT. 1
COL GRANJAS C.P. 31100
TEL. 417-6901

Jafer

ZAPATA A BASE DE MAMPOSTERIA
CONCEPTO 3






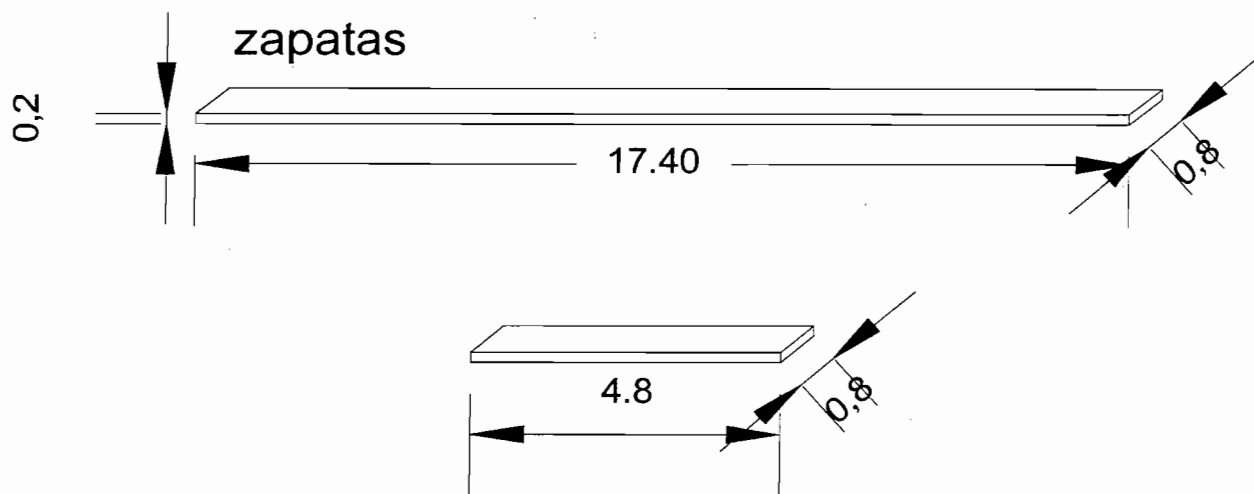


GA
Garmel, construcciones
S.O. de C.V.
R.F.C. GCO-791128-3P3
C. PINO No. 509 INT. 1
COL. GRANJAS C.P. 31100
TEL. 417-6801

zapata

ZAMPEADO A BASE DE MAMPOSTERIA

CONCEPTO 4

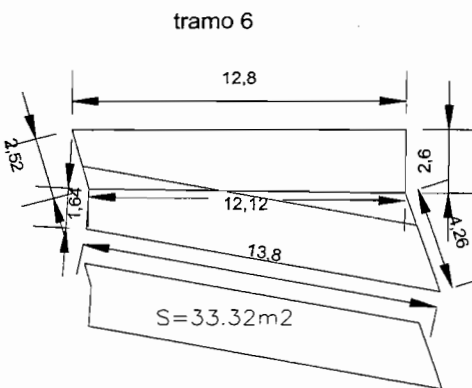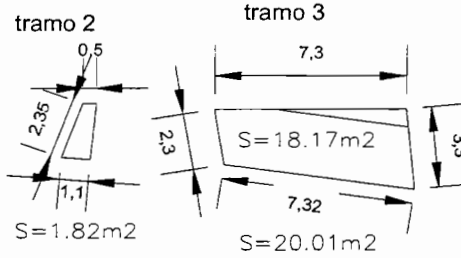

Garmel, construcciones

S.O. de C.V.
R.F.C. GCO-791128-3P3
C. PINO No. 509 INT. 1
COL. GRANJAS C.P. 31100
TEL. 417-6801

Jafoya

ESTIMACION 1



EXCAVACION EN MATERIAL "B" EN TALUD



RETIPO DE MATERIAL

Granitel, Construcciones

S. de C. de C. de C. de C.

R.F.C. GCO-791128-3P3

C. PINO No. 509 INT. 1

COL. GRANJAS C.P. 31100

TEL. 417-6801

Ja Top

[Handwritten signature]

ESTIMACION 1



CONSTRUCCION DE ZAPATA A BASE DE MAMPOSTERIA



ZAMPEADO A BASE DE MAMPOSTERIA HASTA UNA ALTURA DE 2.50 M.

S.D. de C.V.
R.F.C. GCO-791128-3P3
C. PINO No. 509 INT. 1
COL. GRANJAS C.P. 31100
TEL. 417-6801

J. A. Lopez

[Handwritten signature]
