

Fecha:

000

001

FECHA: 22 MAYO 2017

NOTA N. 001

CON ESTA FECHA Y NOTA SE DA APERTURA A LA PRESENTE BITÁCORA DE OBRA, CON EL FIN. DE ASENTAR TODOS LOS ASUNTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE SE GENEREN DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA:

CONSTRUCCION DE LAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y AV. LA CANTERA.

CONTRATO N.º: 057/2017 IMPORTE \$60'146,704.03
MAS IVA.

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
DPTO. DE CONST'N, DEL MUNICIPIO DE CHIA. CHIA

CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS
S.A. DE C.V.

PERIODO DE EJECUCION: 22 MAYO 2017 - 17 DE
DICIEMBRE 2017.

EL DOMICILIO QUE SEÑALA EL CONTRATISTA ES EL
SIG: C. ESTRADA BOCANTEGRA N.º 1702, COL. SAN
FELIPE, CD DE CHIHUAHUA CHIA,

LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: OBRAS PRELIMINA
RES, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y OBRAS DE
DRENAJE, TRABAJOS DIVERSOS, PAVIMENTOS,
SEÑALAMIENTO Y ALUMBRADO.

N.º OFICIO PRESUPUESTAL:

- LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, NOTIFICA QUE
EL RESIDENTE DE OBRA NOMBRADO ES EL
ING. RODOLFO ARMONDARIZ RONQUILLO, CON N.º DE

Fecha:

No.

002

CONTINUAR NOTA No 001
Y AUTORIZANDO A REALIZAR DNOTACIONES Y
SUSCRIBIR LAS MISMAS EN ESTA BITÁCORA
FIRMAS

POR LA DEPENDENCIA,

POR LA CONTRATISTA

C. ING. EDNA DEL RÍO SUGALA
JEFE DEL DPTO. DE CONST'N
D. D. F.

C. ING. JULIO CESAR MORAÑO R
REPRESENTANTE LEGAL
MTRP ODE Y TERRAL S.A. DE C.V.

C. ING. RODOLFO ARRENDARIZ R.
PRESIDENTE DE OBRA D.O.P.

NOTA No 002

22 MAYO 2017

CON ESTA FECHA Y NOTA SE ESTABLECE, QUE LA
PRESENTE BITÁCORA PERMANECERÁ EN EL SITIO DE
LA OBRA PARA SU CONSULTA Y ASENTAR
NOTAS DIARIAMENTE, EN UN HORARIO DE
8:00 AM A 6:00 PM

NOTA No 003

22 MAYO 2017

CON ESTA FECHA Y NOTA, SE ESTABLECE QUE UNA
VEZ ASENTADA LA NOTA, LA CONTRAPARTE ESTARÁ
OBLIGADA A FIRMARLA EN UN PLAZO DE NO
MAYOR A 72 HRS, EN CASO CONTRARIO SE DARÁ
POR ACEPTADO EL CONTENIDO DE LA MISMA

Fecha:

800 003

NOTA No. 005

22 MAYO 2017

- CON ESTA NOTA Y FECHA, SE ESTABLECE LA OBLIGACION DE AMBAS PARTES DE ASENTAR EN LA BITÁCORA LOS ASPECTOS RELATIVOS A LA REMISION Y AUTORIZACION DE ESTIMACIONES Y NÚMEROS, CIENTENAJEROS, CANTIDADES DE OBRA ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO, ASI COMO LO RELACIONADO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCION AL AMBIENTE QUE DEBAN IMPLEMENTARSE.

NOTA N, 006

22 MAYO 2017

- CON ESTA FECHA SE HACE ENTREGA OFICIAL DEL PROYECTO CIONOTRICO Y ESTRUCTURAL, ASI COMO LOS PUNTOS DE CONTROL Y COORDENADAS Y ELEVACION EN FORMA ELECTRONICA (C.D.) E IMPRESAS (POSTERIORMENTE SE DARA LA EMPLEA FISICA).

- SE RECORDA EL EL TRAMO CON EL FIN DE PLANTAR ESTRATEGIA DE INICIO DE LOS TRABAJOS PRELIMINARES.

NOTA No. 007

22 MAYO 2017

- SE NOTIFICA AL CONTRATISTA QUE SE ENVIO OFICIO C/ INFORMACION DE LA OBRA A DEPENDENCIAS E INSTALACIONES, AEREAS Y SUBTERRANEAS, LAS CUALES, SE PUEDEN VER AFECTADAS Y EL DESARROLLO DE ESTA OBRA. (C.FE, JMAS, TELMEX, SZZT, ETC).

NOTA N, 008

23 MAYO 2017

Fecha:

No.

004

NOTA N. 009

24 MAYO 2017

- SE ORDENA AL CONTRATISTA REANUZAR LA PAVIMENTACION DE TRAMO DE CAMINO P/ DESVIAR EL TRAFICO EN LA LAT. DEL PERIF DE LA JUVENTUD FRENTE A LA GASOLINERA Y LA LLANTERA, LO CUAL PERMITIRA INICIAR TRABAJOS DE LA SUBESTRUCTURA DE LOS MARCOS N. 2 Y N. 3 (LOS DATOS DEL TERRENO YA DITIZON SU APROXIMACION P/ DICHO DESVIO PROVISIONAL).
- SE REALIZO REUNION Y PERSONAL DE TUNEX P/ REUBIR SUS INST AERIAS Y SUBTERRANEAS Q' ESTORBAN EN EL MARCO N. 1, N. 4 Y N. 3.
- SE REALIZO REUNION CON PERSONAL DE LA JMAS P/ VER LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN LA LAT. DE PERIF (AREA DE DESPLANTE DEL MARCO N. 1 N. 2 Y N. 3), EXISTE LINEA DE DRENAGE 12", AGUA TRATADA, 8" y A.P. DE 3", (LOS POSARAN DATOS POR MEDIO PLANOS Y SE RECONSTRUYAN SONDEOS P/ UBICARLAS C/ PRECISION).

NOTA N. 010

25 MAYO 2017

- SE INICIARON TRABAJOS DE EXCAVACION LORTE P/ DESVIO PROVISIONAL EN LA LATERAL DEL PERIF JUV. - CANTERA - NORTE-SUR, SE COLARARA BASE 20 CMS DE ESPESOR, CARPOTA 2 CMS T.M.A 3/8"
- SE PLATICA C/ PERSONAL DEL CONALEP PARA INICIAR TRABAJOS PILAS N. 5, 6, 7 Y ESTR. 8 (SE REALIZAN LOS Trazos P/ EXCAVACIONES).
- SE VERIFICA EN LAMPA QUE HAY UNA CANALIZACION DE C.F.C. DE ALTA TENSION EN

Fecha:

No.

005

NOTA No 011

26 MAYO 2017

- SE TRABAJA EN LA EXCAVACIÓN DE CORTE PARA EL DESLIZ PROVISIONAL EN LA LATERAL FRENTO A LA GASOMERA.

NOTA No 012

27 MAYO 2017

- SE CONTINUAN TRABAJOS EN LA CONST. DESLIZ PROVISIONAL (ESTO MUY INESTABLE EL TERRENO Y SE AUTORIZO AL CONTRATISTA SACAR EL MATERIAL MUDO CONTAMINADO APILADO Y MEJORAR CON PEDRAPLEN P/ ESTABILIZAR LA COLOC. DE LA BASE.)
- SE PAUSA EL PROYECTO GEOMÉTRICO Y ESTRUCTURAL P/ ENVIAR TRABAJOS DE INGENIERIA DE LAS VIGAS NOTALLAS.
- SE ENVIAN SECCIONES P/ PROYECTO MUROS MECANICAM. ESTABILIZADOS EN LA BANDA DE CAUDA

NOTA No 013

28 MAYO 2017

- A LA FECHA NO HA CONFIRMADO C.F.E (transmision) para que ubiquen sus instalaciones subterráneas existentes en la zona de la obra
- SE INICIÓ A LA C.F.E distribución el proyecto de reubicación de instalaciones de media tensión.
- SE SOLICITA A LA JMAS QUE TENGA UN REPRESENTANTE EN OBRA PERMANENTE PARA VER ASUNTOS RELACIONADOS CON SUS INSTALACIONES.

Fecha:

No.

006

NOTA N. 014

29 MAYO 2017

- SE CONTINUA MONTADO Y TENDIDO BASE HIDR. PARA EL DESLIZ PREVISIONAL, EN LA LAT. FRENTE A LA GASOMERA.
- SE ACORDO CON LOS DIRECTIVOS DEL CONALEP, COMO SE VA A TRABAJAR EN LAS DEMOLICIONES, REQUERIDAS DE BARRA, MUROS, ALCSOS, ETC P/ PODER INICIAR TRABAJOS CON LAS EXCAVACIONES.
- C.I.P.E. (transmisión) AUN NO CONTRASTA LA UBICACION DE SUS INSTALACIONES SUBTERRANEAS

NOTA No 015

30 MAYO 2017

- Hoy se reviso composition y se procedio a IMPRIMIR LA BASE PARA EL DESLIZ PREVISIONAL EN LA LAT. PERIF SUR (Frente a la gasomera).
- SE REVISARON GENERADORES P/ ESTAR No 1.
- SE INICIO EXCAVACIONES EN LA ZONA DE LA RAMPA DE SALIDA.
- SE INICIO DESMANTELAMIENTO DE LA CASOTA Y ALCSORIOS EN LA ENTRADA AL CONALEP, ASI COMO EL VESTIRO DE LA MUJER CICLONICA EN LA ZONA DEL ESTACIONAM. (PREVIA AUTORIZACION DE PERSONAL DEL CONALEP)

NOTA N. 016

03 JUNIO 2017

- SE CONTINUA DESMANTELAMIENTO DE MALLA DEL ESTACIONAM Y DEMOLICION DE CASOTA Y MUROS ALCSOS AL ESTACIONAM DEL CONALEP

Fecha:

No.

007



NOTA N. 017

05 JUNIO 2017

- SE COORDINA CON LA JMAS P/ PROYECTO DE REUBICACION MAS APROPIADO EN LA ZONA DE LA PIRA N. 6, 7 Y ESTRIBO N. 8 ASI COMO LA RAMPA DE SALIDA.

- SE REVISAN SECCIONES DE LA RAMPA DE SALIDA P/ PROYECTAR LOS MUROS MECANIC. ESTAB



(se ordenó al contratista considerar 1 m ± APROX APOYO DE LA CORONA DEL CANAL ADYACENTE

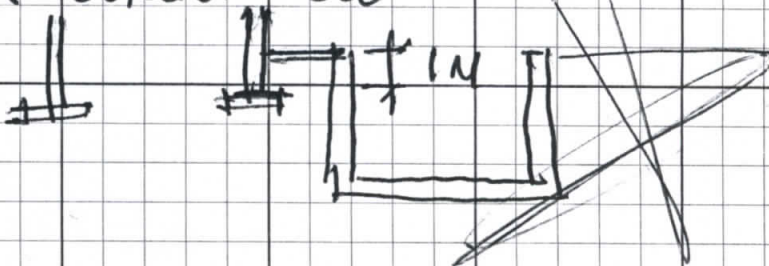

NOTA N. 018

06 JUNIO 2017

- AOR SE DIÓ BANDOZARZO OFICIAL POR PARTE DEL GOBERNADOR DEL ESTADO Y LA PRESIDENTA MUNICIPAL (INICIO DE TRABAJOS).



NOTA N. 019

08 JUNIO 2017

- SE CONTINUA EXCAVACION CORTE EN LA RAMPA DE SALIDA (se retira el material fuera de la obra).

- SE INICIO EXCAVACION P/ DESPUNTAZAR ZAPATA DEL ESTRIBO N. 8 CON LA SIG. OBSERVACION

(se tiene que CAMBIAR DRENAGE PRINCIPAL (CAJA), TUB. DE DRENAGE 8" 4

Fecha:


No.

008

NOTA N.º 020

03 JUNIO 2017

- Se acordó y la SUPERIORIDAD MODIFICAR EL ANCHO DE LOS MARCOS N.º 2 y 3, CON EL FIN. DE NO AFECTAR LA ZONA DE LA LÍNEA SUBTERRANEA DE TRASM. DE C.F.E (Se ordenó al PROYECTISTA REALIZAR LA ADJUSTACIÓN, SE LE ENTREGÓ EL GEOMOTRICO MODIFICADO)

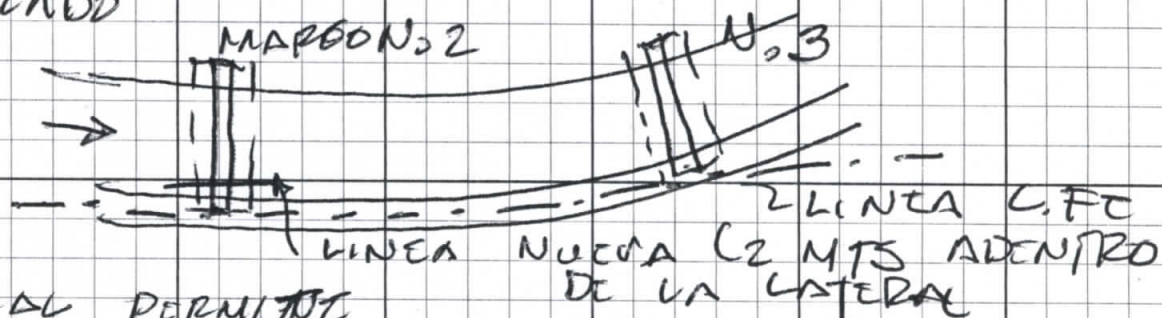

- LO CUAL PERMITE CONTINUAR TRABAJOS, DE NO SER ASÍ SERÍA INVIABLE Y MUY COSTOSO REUBICAR LAS LÍNEAS DE TRASM. C.F.E (115 KVA)
- Se revisó la DESVIACIÓN, Y SE INICIO TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE CARPETA ASF. Y SONDEOS P/UBICAR INSTALACIONES EN LA LATERAL

NOTA N.º 021

12 JUNIO 2017

- SE TRABAJA EN EL MARCO N.º 2 EN LA DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN P/ DESPL. RAPATA (Se ajustó el cincho y el proy. revisa)
- SE CONTINUAN SONDEOS DE LÍNEAS DE A.P., A.T Y ALICANT. EN LAT. PERIF P/ DESP MARCO N.º 2, N.º 3
- CON ESTA FECHA SE AJUSTO PROYECTO GEOMOTRICO DE LAS PILAS N.º 5, 6, 7 Y ESTRIBO N.º 8. SE CONTINUA EL ESQUEMA A LAS

Fecha:


No.

009

NOTA N.º 022

13 JUNIO 2017

MARCO N.º 2: SE UBICÓ LA PROFUNDIDAD DE LA TUBERÍA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO, (UBICÁNDOSE A APROX. 2.8 M LONJO); POR LO QUE SE TOMÓ LA DECISIÓN DE BAJAR LA ZAPATA DEL MARCO N.º 2 Y N.º 3, LIBRANDO LA LÍNEA DE 12" DE D.S.

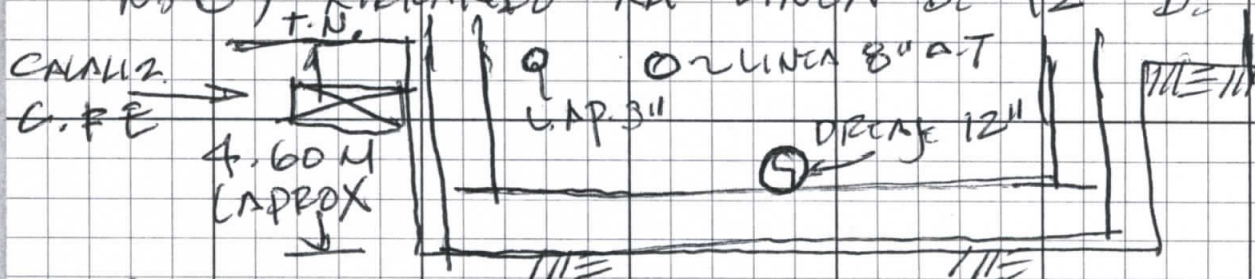

- CON ESTO SE INCREMENTARÁN LAS PROFUNDIDADES DE DESPLANTE, INCREMENTÁNDOSE, EXCAVACIONES, RELLENOS, LONG. DE ALERO Y CONCR. EN COLUMNAS.
- LA POSIBILIDAD DE RUBICAR NO ES FACTIBLE LA LÍNEA 12" DUC. POR SER ZAPATA CORRIJA Y TENER MURO N.E. L. JZG Y CANAL.
- C.F.E. LADO DERECHO.

NOTA N.º 023

14 JUNIO 2017

MARCO N.º 2: SE CONTINUA LA EXCAVACIÓN, SE SOPORTA PROVISIONALMENTE LÍNEA A S - 12" U DE AGUA T. DE 8".

- SE CONTINUA EXCAVACIÓN CORTE EN LA RAMPA DE SALIDA.
- SE INICIO EXC. P/DESPL. PILA N.º 5
- SE TRABAJA EXC. ZANJA P/REUBICAR DRENAGE 8" EN UNA ZONA PILA N.º 6, N.º 7 Y C-8, ASÍ COMO TAMBIÉN LOS DOLAS DE VISITA
- SE EXCAVA Y AFINA P/DESP. ZAPATA,

Fecha:

No.

010

NOTA N. 024

16 JUNIO 2017

- SE COLO' LA PLANTILLO - CICLOPEO' P/DESPLANTE DE LA ZAPATA DEL ESTRIBO N. 8.

- MARCO N. 2: SE CONTINUA LA EXCAVACION.

- PILA N. 5 SE CONTINUA LA EXCAVACION P/LA ZAPATA (SO AUTORIZA LA DEMOLICION DE PARTE DE LA BOVEDA DE MAMP EXISTENTE Y EL CANAL DE CONCRETO LA CANTERA Y SU POSTERIOR RECONSTRUCCION, ESTO CON EL FIN DE DESPLANTAR LA ZAPATA)

- MARCO N. 3: SE CONTINUA EXCAVACION.

NOTA N. 025

17 JUNIO 2017

- AUN NO SE LIBERA LA AFECTACION DEL TEMPLO EN LA RAMPA DE SALIDA TRAMO 04480 - 04520, LIMITANDO EL ACCESO A LOS TRABAJOS DE LA R. SALIDA

- AUN NO SE DEFINE LA SITUACION DEL COLECTOR DE DRENAGE DE 36" Y EL DRENAGE PLUVIAL, ASI COMO SU CAJA EN MEDIO DE LA RAMPA DE SALIDA.

- AUN NO SE TIENE EL PROYECTO DE LA INCORPORACION A LA CUAZGEO - EJE 1.

NOTA N. 026

17 JUNIO 2017

ESTRIBO N. 8 - HOY SE REUSO ARMADO, CANTERA Y TIRAZO Y SE COLO' LA ZAPATA CONCRETO FIC=250 kg/cm²

Fecha:

No.

011

NOTA N.º 028

20 JUNIO 2017

- MAPA N.º 2: SE ESTABLECIO TERRENO C/PIEDRA Y SO COLD' CICLOPED EN DESPLANTE ZAPATA (Espesores Variables)
- MAPA N.º 3: SE CONTINUA LA EXCAVACION Y SOPORTE TUBERIAS
- SE COLOCARON 2 LONAS INFORMATIVAS DE OBRA VISIBLES.
- SE ESTA CONSTRUYENDO P.V. P/RECUERDAR INST. DRENJE P/PILA N.º 6 y N.º 7.
- ESTUDIO N.º 8: SE TERMINO DE CIMENTAR Y ARMAR 1ra Seccion MURO Y SE PROCEDE A COLARARLO
- PILA N.º 5: EN COORDINACION CON EL PROYECTISTA Y EL CONTROL DE LABORATORIO, SE AUTORIZO AL CONTRATISTA BAJAR LA EXCAVACION HASTA PASAR LA ABELLERA Y MEJORAR Y CICLOPED EL DESPLANTE.
- PILA N.º 6: SE INICIO EXCAVACION.
- SE TRABAJA EN EL DESPEJE DE PARAPETO Y DEMOLICIONES P/EXCAVACION PILA N.º 4 (Se esta revisando c/JMAS LA FORMA EN QUE SE UBICA EL ACUEDUCTO Y RELACION A LA ZAPATA (Se realizara un Sondeo y se vera la opcion de NO PILOTAR P/LA POSIBILIDAD DE GOLPEAR EL TUBO DE ACERO DE 36" DE 30 ANOS DE VIDA), Y UTILIZAR ZAPATA.

NOTA N.º 029

21 JUNIO 2017

- SE ORDENA AL CONTRATISTA RETIRAR TRABAJANTES Y LAMP S/EL PERIF DE LA JAR
- MAPA N.º 2: Se habilita y Arma Acero de

Fecha:

No.

012

NOTA N. 030

22 JUNIO 2017

MARCO N. 2: SE CONTINUA ARMADO DE ZAPATA Y COLUMNAS.

MARCO N. 3: SE CONTINUA EXC Y AFINES

- SE CONTINUA EXCAVACIONES PILA N. 5 Y 6
- SE REALIZAN DEMOLICIONES DE CARPETA ASF, CONCR. A.S Y REFORZADO P/DESP. PILA N. 4 (Primero se sondeara el acueducto 36" JMAS)
- ESTRIBO N. 8: CIMENTADO Y ARMADO MURO 2DA SECCION.
- POR SOLICITUD DEL DIRECTOR DE O. P Y VIABILIDAD, SE ORDENÓ AL CONTRATISTA COLOCAR BARRAS LOGARITMICAS, BOTANTES Y VIALETAS EN LA ZONA DE CIERRE DE CARRETERA AMBOS SENTIDOS EN PERIF DE LA JUVENTUD. bajar (la velocidad)

NOTA N. 031

23 JUNIO 2017

MARCO N. 2: SE CONTINUA CIMENTADO Y ARMADO P/ZAPATA.

MARCO N. 3: SE CONTINUA AFINEC, (se autoriza ciclopeo) P/ESTRIBULIZAR DESPLANTE

ESTRIBO N. 8: HOY SE COLO' LA SEGUNDA SECCION DE MURO Y CONCR F'C=250 kg/cm²

- SE CONTINUA RETIRO DE PARAPETO METALICO EN CAMBELLON DEL PERIF DE LA JUVENTUD

NOTA N. 033

24 JUNIO 2017

MARCO N. 2: SE REVISO ARMADO Y ALINEAMIENTO, SE PROCEDE A REALIZAR

Fecha:

No.


013

NOTA N. 034

26 JUNIO 2017

- PILA N. 4 - Hoy se realizó el sondeo y se ubicó la ubicación y profundidad del alcantarillado el SAU de LA JMAS, acordándose en conjunto, la dirección de O. PUBLICAS, PROYECTISTA ESTRUCTURAL, LABORATORIO y PERSONAL DE LA JMAS lo siguiente:

- 1) NO ES FACILIBLE PILOTAR POR EL RIESGO DE DAÑAR LA TUBERIA (PASAPILA ENTRE LOS PILOTES)
- 2) NO ESTA DE ACUERDO JMAS EN QUE LA SAPATA QUEDE ARRIBA DEL TUBO AUNQUE NO LE TRANSMITA CARGA. (POR UNA POSIBLE FALLA Y MANTENIMIENTO)
- 3) SE ACUERDA CAMBIAR SAPATA-PILOTE A SOLO SAPATA DE CONTACTO QUEDANDO ABAJO DEL TUBO



- 4) LABORATORIO VERIFICA LA CAPACIDAD DE CARGA A 7.50 M - 8.0 DE PROF. P/ DETERMINAR LA RESISTENCIA DEL SUELO
- 5) POR LO ANTERIOR SE TENDRIA Q' CERRAR OTRO CAPIL. (Se quedaria uno solo por sentido, se vera la coordinacion ciudadania y toda la logistica de acceso a la ciudadanía..)

NOTA N. 035

27 JUNIO 2017

-SE CONTINUA TRABAJOS ARMADO, CAMBIADO

Fecha:

No.

014

NOTA N. 036

28 JUNIO 2017

MARCO N. 2: SE INICIA ROLLERNO COMPACTADO
✓ N. 3: ARMADO PAZILLAS P/ ZAPATA

PILA N. 6: SE COLO' CICLOPED EN LA
CIMENTACION (ESPESES VARIABLE)

- RAMPA SALIDA: SE SOLICITA AL CONTRATISTA
INCLUIR UN PUENTE - PASO PEATONAL EN
FORMA TRANSV., P/ PROYECTO DE LOS
MUROS M.E., AUN NO SE SOLUCIONA
EL PROBLEMA DEL COLECTOR SANITARIO Y
PLUVIAL.

- PILA N. 4: EL PROYECTISTA ELABORA EL
CAMBIO DE CIMENTACION (NO SE
PUEDE TRABAJAR)

- SE CONTINUA RETIRO PARA PISO METALICO
EN CAM. CENTRAL

NOTA N. 037

29 JUNIO 2017

MARCO N. 3: SE REVISO EL ARMADO Y GEOMETRIA
Y SE AUTORIZO' A REALIZAR EL COCADO
DE LA ZAPATA Y CONCRETO $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$

- SE REALIZO' TRABAJOS DE RETIRO DE CARBONADO
ABIZO EN LA LATERAL P/ TRABAJAR
MARCO N. 2 y N. 3, SE PAGO'
PROBABLEMENTE A C.F.E (P.U. EXTRA),
Y SE RENTO' PLANTA GENERADORAS (ZIPAS)
P/LA SUBIDA Y LA CASCADERA Y LA
LANTERA (P.U. EXTRAORDINARIOS)

- PILA N. 6: SE INICIA COLOCACION DE
ALERO DE REFUERZO. P/LA ZAPATA.

Fecha:

No.

015

NOTA N. 038 30 JUNIO 2017

PILA N.º 6: SE TERMINO LIMBRADO Y ARMADO Y
SE COLO' LA ZAPATA Y CONCRETO $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$

MARCO N.º 3: COLADO SECCIONES COLUMNA

MARCO N.º 2: RELLENO COMPACTADO

SE ELABORA ESTIMACION N.º 2, POR UN MONTO
DE \$ 7'457,420.11 S/ IVA.

ESTA LUCIENDO PLACA Y PERFILES
P/ LA FABRICACION DE VIGA METALLA

SE TRABAJA EN LA CIMENTACION Y

ARMABILIDAD DE CAMAS P/ FABR DE VIGA

NOTA N.º 039

03 JULIO 2017

PILA N.º 6: CAMBRADO - ARMADO Y COLADO
1 SECCION DE COLUMNA.

MARCO N.º 3: CAMBRADO, ARMADO Y COLADO
SECCION COLUMNA L. DERECHO.

MARCO N.º 2: RELLENO COMPACTADO EN CAPAS

PILA N.º 4: AUN NO ENTREGA EL

PROYECTISTA LA MODIFICACION DE LA
CIMENTACION.

PILA N.º 5: SE ORDENA AL CONTRATISTA RECIBIR
C/O. FALSA LA BOVEDA DE NAMP ADYA -

CONTE A LA ZAPATA DE LA PILA N.º 5,
SE DEMUELE PISO Y MURO DE CANAL DE
CONCRETO, ASI COMO TUBO DE 90 CMS
P/ DRENAR PLUVIAL

SE ORDENA AL CONTRATISTA COLOCACION
TUBERIA DE 40" P/ DRENAR PLUVIAL DE
LA BOVEDA DE NAMP ADYA PILA N.º 5

Fecha:

No.

016

NOTA N.º 040:

04 JULIO 2017

PILA N.º 4 - AUN NO SE ENTREGA PROYECTO
P/SE INICIA EXCAVACION PIZCUA DE 5.0X5.0

- SE CONTINUAN COLINDAS DE SECCIONES DE
COLUMNAS EN MARCO N.º 3 Y PILA N.º 6

- PILA N.º 5: SE TRABAJA EN LA EXCAVACION
HASTA TERRENO BUENO, SE SE MEJORA
DESPLANTE C/ CICLOPEO. (LA ARRELLA
QUE SE ENCONTRO NO ES ADECUADA,
TAMBIEN LO RECOMENDADO LABORATORIO.

NOTA N.º 041

05 JULIO 2017

- SE ORDINA AL CONTRATISTA REFORZAR LA
MALLA CIRCUNFERENCIAL Q' SE COLOCO PROVISIONALM
P/ PROTECCION DEL CONALEP (TRAMO PILA N.º 5 - N.º 7)

- SE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE TODO EL
PERSONAL SIN EXCEPCION DEBE PORTAR
CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD ESTIPULADO
EN LAS NORMAS DE LA STPS.

- AUN NO DEFINE LA JMAS LO QUE SE
DEBE HACER P/ PROTEGER LA TUBERIA DEL
COLECTOR DE 36" JUNTO AL C-8, ADENTRO
DE LA RAMPA

- AUN NO TERMINA EL PROYECTISTA LA
MODIFICACION A LA CIMENTACION DE LA PILA N.º 4,
TAMBIEN A LA DEFINICION DEL TRAMO 0-1.

NOTA N.º 042

07 JULIO 2017

- MARCO N.º 2: SE CONTINUAN TRABAJOS DE
ARMADO CON LAS CUBIERTAS METALICAS

Fecha:

No.

017

Nota N. 043

11 Julio 2017

ESTRIBO N. 8 - HOY SE TERMINÓ CIMENTADO Y ARMADO SECCION DO APOYO (3ra) c/ CONCRETO $F'_{c}=250 \text{ kg/cm}^2$

PILO N. 5 - SE ENCONTRÓ TERRENO BUENO Y FIRME Y SE COLO' CICLOPED P/ MOJEAR DESPLANTE DE LA ZAPATA

- SE REALIZO LA 2da SECCION RETIRO DE CABLES AEREOS P/ PARTE DE C.F.C. Y LA CONEXION PROVISIONAL A LA SUBARL, CON ESTO SE PUEDE CONTINUAR TRABAJOS DE COLADO DE COLUMNA DE RECTA DE LOS MARCOS N. 2 y N. 3 (SE APROXIMO 5 DIAS).
- SE INICIO TRABAJOS DE HABILITADO ACERO DE REFUERZO Y LA CIMENTA METALICA P/ INICIAR LA FABRICACION DE LAS 24 TRABES PIECESFORZADAS MARATHO II.

Nota N. 044

12 Julio 2017

PILO N. 5 - SE TERMINO CIMENTADO Y ARMADO DE LA ZAPATA, Y SE PROCEDE A REALIZAR EL COLADO DE LA ZAPATA c/ CONCRETO $F'_{c}=250 \text{ kg/cm}^2$

ESTRIBO N. 8 - SE COLO' MURO PANTALLA

- VIGAS METALICAS: CONTINUA LLEGANDO PLACA AL LUAR DE FABRICACION
- PILA N. 7 - SE CONTINUA LA EXCAVACION
- SE COLO' CICLOPED' ESPESOR VARIABLE P/ DESPLANTE ZAPATA PILA N. 7.

Nota N. 045

12 Julio 2017

- EL DIA DE HOY POR EL MEDIODIA CAYO' UN FUERTE ALCANZERO EL

Fecha:

No.

018

NOTA N. 046

13 JULIO 2017

- MARCO N. 3: SE TRABAJÓ EN EL CIMENTADO Y COLADO COLUMNA LADO DERECHO
- HOY CAYÓ OTRO FUENTE MARCADO LO CUAL NO PERMITIÓ TRABAJAR.

NOTA N. 047

14 JULIO 2017

- PILA N. 7: SE TERMINÓ EL CIMENTADO Y ARMAZO DE LA ZAPATA Y SE PROCEDE A COLAR EL CONCRETO $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$
- PILA N. 8: SE CIMENTA, ARMA Y CUELTA MURO DE CANAL ADYACENTE

- PILA N. 4: SE CONTINUA EXCAVACION PRELIMINAR HASTA 2.0 MTS DE PROF. P/DESCUBRIR EL TUBO DE 36" Ø DE JMAS Y CUIDARLO P/LA EXCAVACION TOTAL
- HOY SE ENTREGÓ EL PROYECTO DEFINITIVO DE LA CIMENTACION DE LA PILA N. 4, SE ENTREGÓ AL CONTRATISTA

NOTA: EL DESPLAZE MARCADO ES 7800 MTS LO CUAL DERIVA EN LA NECESIDAD DE CERRAR UN 200 CARRIL P/SENTIDO POR SEGURIDA DEL TRAFICO, SE COORDINA CON VIAJADA Y SE PUBLICITARA EN LOS MEDIOS, SE PROGRAMAN P/ EL SABADO 15 (MAÑANA), CON TRABAJO CONTINUO.

NOTA N. 048

15 JULIO 2017

- EL CONTRATISTA COLOCÓ TODO EL SEÑALAMIENTO PROVISIONAL QUE PUEDE VIAJADA P/EL CIERRE A 1 SOLO CARRIL P/SENTIDO.
- SE SUSPENDIÓ TRABAJOS EN LA PILA N. 4 (PUBLICADA CANCELACION REALIZADA EN EL

Fecha:

019

NOTA N.º 049

16 JULIO 2017

- HOY AMANECIÓ SIN LUBIA Y SE INICIO CERRAR CARRILES (2) P/ SENTIDO EN EL PERIF. DE LA JUVENTUD EN COORDINACION CON VIAJADA
- SE INICIO TRABAJOS CON LA EXCAVACION HASTA LA PROFUNDIDAD SOLICITADA EN EL PROYECTO
- DURANTE, TODO EL DIA SE REALIZO LA EXCAVACION, Y SE CULO EL COLAPSO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 2 MTS, SE CUIDO EL ALBUEDUCTO. L PROF. TOTAL 8.0 M APROX
- SE ORDENO TENER UNA CARGA DE 50 TON P/ SOPORTAR EL TUBO DEL ALBUEDUCTO Y P/ ALERGIAR LA PARRILLA DEL ARMADO DE LA ZAPATA, ETC.

NOTA N.º 050

17 JULIO 2017

PILA N.º 4: HOY SE REALIZO LA COLOCACION DEL ARMADO DE LA ZAPATA Y US VERT DE LA COLUMNA, Y SE PROCEDEO A COLAR LA ZAPATA C/ CONCRETO P/C-400 KG/CM² AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS C/ EL FIN DE APOYAR EL TUBO ENTERRADO A LA PROFUNDIDAD (IGUAL LA COLUMNA)

- PAMPA SAUDA: LLEVARON MOLDES Y SE LUBRITO ALGO REF Y SE INICIO COLAR PANELES P/ MURAS M.E.
- COLAR 2 PMS TRABES DE CONCRETO PREST AASHTO TIPO II, (La fabrica G.C.C. en su planta)

Fecha:

No.

020

NOTA N.º 52

19 JULIO 2017

PILA N.º 4: SE DESCUBRIRÁ 1ra SECCIÓN DE COLUMNA,
SE ORDENÓ AL CONTRATISTA RELENAR C/
MATERIAL NO COMPACTABLE (PIEDRA)
DE LA SIG. MANERA 1 MTS C/PIEDRA
BUENA DE RIO, Y EL RESTO RELLENO C/MATERIA
TRITURADO $2'' - 1 \frac{1}{4}''$ DE GCL. P/DAK
RAPIDEZ Y NO TENER ASENTAMIENTOS

SE PROCEDE A REALIZAR EL TRABAJO EN
CAPAS Y HUNECTANDO DE (SE ACOMODA
C/ VIBROCOMPACTADOR) Y EL BOTE DE LA
EXCAVADORA CAT 385.

- SE CONTINUA COLADO DE TRAVES AASHTO
TIPO II EN GCL.
- SE CONTINUA COLADO DIARIO DE PANECES
P/MUROS M.E DE LA RAMPA SALIDA

NOTA N.º 53

19 JULIO 2017

- SE ABRIÓ POR LA NOCHE AL TRAFICO LOS 2
CARREILES POR SENTIDO, Y SE PROTEJO CON
SEÑALAMIENTO SUFICIENTE EL AREA DE LOS
TRABAJOS PILA N.º 4.

NOTA N.º 54

20 JULIO 2017

- MARCO N.º 3: SE CONTINUA COLADO SECCIONES
DE COLUMNA

PILA N.º 4 = SE ACOMODA LA PIEDRA DEL RELLENO

PILA N.º 5: SE COLoca MOLDE DE COLUMNA
Y SE COLA 2da SECCION, SE
ESTA DESBARRANCANDO TALUD
ADYACENTE

Fecha:

No.

021

NOTA N. 55

21 JULIO 2017

- HOY SE PRESENTO LUVIA DURANTE EL DIA Y LOS TRABAJOS FUERON LENTOS
- SOLO SE TRABAJA EN CIMENTACION DE MOLDAS

NOTA N. 56

22 JULIO 2017

- HOY TAMPOCO SE PUDO TRABAJAR POR LUVIA Y TERRENO SATURADO

NOTA N. 57.

24 JULIO 2017

- SE TRABAJA EN LA DEMOLICION DEL CAMELLON DE CONCRETO S/LOSA DEL P.S. PERIF. JUV. - CANTERA EXISTENTE (P/DAR EL 4to CAPIL)

PILA N. 4: RELENOS Y ACOMODO DE MATERIAL
NO COMPACTABLE

MARCO N. 3: RELENO Y MATERIAL COMPACTABLE
EN CAPAS

- SE INICIA COLOC. OBRA FALSA P/ CIMENTA
CABECAL PILA N. 6.

- COCADO PANECES P/ MUROS M.E

- * A LA FECHA AUN NO SE LIBERA
PRECIO DEL TEMPLO.

NOTA N. 58, 25 JULIO 2017

- LA JMAS DIO INFORMACION P/ LA
CONST'N CAJA DE CONCRETO ARMADO, EN
EL COLECTOR SANITARIO. JUNTO CANAL
EN LA R. SALIDA. ASIMILANDO TAMBIEN

Fecha:


No.

022

NOTA N° 59

26 Julio 2017


- HOY SE PRESENTO LLUVIA, TRABAJOS SUSPENDIDOS O LENTOS, LAS TRABAJOS DE CONCRETO NO SE PUDO TRABAJAR Y NO SE PERMITIO SOLDAR EN LAS VIGAS METALICAS



NOTA N° 60

27 Julio 2017

- SE CUBRIRA CABEZAL PARA LA PILA N° 6
- RELLENOS COMPACTADO Y PIEDRA EN LA PILA N° 5 Y N° 7.
- SE CONTINUA COCADO DE PANELES PARA MUROS M. 2
- SE TRABAJA CONTROL FLUJO DRENAGE P/LA R. SALIDA
- SE VE Y LOS SUPERIORES EL PROYECTO DEL PUENTE PEATONAL EN LA R. DE SALIDA
(Se recomienda no hacerlo p/la dificultad del montaje de Paneles y los Rellenos)



NOTA N° 61

28 Julio 2017

- SE HABILITA ALICATA DE REFUERZO P/CABEZAL DE LA PILA N° 6 Y MARCO N° 2
- SE CONTINUA SUMINISTRANDO PLACA P/FABRICAR VIGAS METALICAS
- SE CONTINUA FABRICACION VIGAS CONCRETO AASATO TIPO V

