

Fecha:

001

FECHA: 22 MAYO 2017

NOTA N. 001

CON ESTA FECHA Y NOTA SE DA APERTURA A LA PRESENTE BITÁCORA DE OBRA, CON EL FIN. DE ASENTAR TODOS LOS ASUNTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE SE GENEREN DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA:

CONSTRUCCION DE PLAZA EN EL PERIFORICO DE LA JUVENTUD Y AV. LA CANTERA.

CONTRATO N.º: 057/2017 IMPORTE \$60'146,704.03
MAS IVA.

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
DPTO. DE CONSTRUCCION, DEL MUNICIPIO DE CHIH. CACTA

CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS
S.A. DE C.V.

PERIODO DE EJECUCION: 22 MAYO 2017 - 17 DE
DICIEMBRE 2017.

EL DOMICILIO QUE SEÑALA EL CONTRATISTA ES EL
SIG: C/ ESTRADA BOCANIEGRA N.º 1702, COL. SAN
FELIPE, CD. DE CHIHUAHUA CACTA,

LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: OBRAS PRELIMINA-
RES, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y OBRAS DE
DISEÑO, TRABAJOS DIVERSOS, PAVIMENTOS,
SEÑALAMIENTO Y ALUMBRADO.

N.º OFICIO PRESUPUESTAL:

- LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, NOTIFICA QUE EL RESIDENTE DE OBRA NOMBRADO ES EL INGA RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO, CON N.º DE TEL 614 2170139 AUTORIZANDO A REALIZAR ANOTACIONES Y SUSCRIBIR LAS MISMAS (SERÁ NOTIFICANDO TAMBIEN POR MEDIO DE OFICIO)
- LA EMPRESA CONTRATISTA NOTIFICA QUE SU REPRESENTANTE EN OBRA, EN CALIDAD DE SUPERINTENDENTE SERÁ EL INGA JULIO CESAR MERCADO RODRIGUEZ

CONTINUA NOTA
SIG. HOJA →

Fecha:

No.

002


CONTINUA NOTA No 001
Y AUTORIZANDO A REALIZAR ANOTACIONES Y
SUSCRIBIR LAS MISMAS EN ESTA BITÁCORA
FIRMAS

POR LA DEPENDENCIA,


POR LA CONTRATISTA

C. ING. EDNA DEL RÍO SUGALA
JEFE DEL DPTO. DE CONSTN
D. O. P.

C. ING. JULIO CESAR MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL
MTRP ODI Y TERRAL S.A. DE C.V.




C. ING. RODOLFO ARIZANDAREZ R.
PRESIDENTE DE OBRA D.O.P.



NOTA No 002

22 MAYO 2017

CON ESTA FECHA Y NOTA SE ESTABLECE, QUE LA
PRESENTE BITÁCORA PERMANECERÁ EN EL SITIO DE
LA OBRA PARA SU CONSULTA Y ASENTAR
NOTAS DIARIAMENTE, EN UN HORARIO DE
8:00 AM A 6:00 PM





NOTA No 003

22 MAYO 2017

CON ESTA FECHA Y NOTA, SE ESTABLECE QUE UNA
VEZ ASENTADA LA NOTA, LA CONTRAPARTE ESTARÁ
OBLIGADA A FIRMARLA EN UN PLAZO DE NO
MAJOR A 72 HRS, EN CASO CONTRARIO SE DIRÁ
POR ACEPTADO EL CONTENIDO DE LA MISMA






NOTA No 004

22 MAYO 2017

CON ESTA FECHA Y NOTA, SE ESTABLECE QUE UNA
VEZ ASENTADA Y FIRMADA UNA NOTA, LA MISMA
NO SERÁ, NI PODRÁ SER MODIFICADA, NI POR
EL RESPONSABLE QUE REALIZÓ LA NOTA





Fecha:

No.

003

003

NOTA N° 005

22 MAYO 2017

- CON ESTA NOTA Y FECHA, SE ESTABLECE LA DELIGACION DE AMBAS PARTES DE ASENTAR EN LA BITÁCORA LOS ASPECTOS RELATIVOS A LA REVISION Y AUTORIZACION DE ESTIMACIONES Y NUMEROS, GENERADORES, CANTIDADES DE OBRA ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO, ASI COMO LO RELACIONADO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCION AL AMBIENTE QUE DEBAN IMPLEMENTARSE.

NOTA N° 006

22 MAYO 2017

- CON ESTA FECHA SE HACE ENTREGA OFICIAL DEL PROYECTO GEOMETRICO Y ESTRUCTURAL, ASI COMO LOS PUNTOS DE CONTROL Y COORDENADAS Y ELEVACION EN FORMA ELECTRONICA (CD) E IMPRESAS (POSTERIORMENTE SE DARA LA ENTREGA FISICA).
- SE RECORRE EL EL TRAMO CON EL FIN DE PLANTEAR ESTRATEGIA DE INICIO DE LOS TRABAJOS PRELIMINARES.

NOTA N° 007

22 MAYO 2017

- SE NOTIFICA AL CONTRATISTA QUE SE ENVIO OFICIO C/ INFORMACION DE LA OBRA A DEPENDENCIAS C/ INSTALACIONES, AEREAS Y SUBTERRANEAS, LAS CUALES, SE PUEDEN VER AFECTADAS Y EL DESARROLLO DE ESTA OBRA. (CFE, JMAS, TELMEX, IZZT, ETC)

NOTA N° 008

23 MAYO 2017

- SE ENTREGA AL CONTRATISTA LOS PUNTOS DE CONTROL Y COORDENADAS Y ELEVACIONES,
- SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE T.N P/ PARTE DEL CONTRATISTA.
- SE ESTA ADICIONANDO A LA OBRA CASETA, MAQUINARIA, ETC P/ INICIAR TRABAJOS.

Fecha:

No.

004

NOTA N. 009

24 MAYO 2017

- SE ORDENA AL CONTRATISTA REUNIR LA RAMIFICACION DE TRAMO DE CAMINO P/ DESUIAR EL TRAFICO EN LA LAT. DEL PERIF DE LA JUVENTUD FRENTE A LA GASOLINERA Y LA LLANTERA, LO CUAL PERMITIRA INICIAR TRABAJOS DE LA SUBESTRUCTURA 1 DE LOS MARCOS N. 2 Y N. 3 (LOS DATOS DEL TERRENO YA DIERON SU APROXIMACION P/ DICHO DESUJO PROVISIONAL)
- SE REALIZO REUNION Y PERSONAL DE TELMEX P/ REUBIR SUS INST AEREAS Y SUBTERRANEAS Q' ESTORBAN EN EL MARCO N. 1, N. 2 Y N. 3.
- SE REALIZO REUNION CON PERSONAL DE LA JMAS P/ VER LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN LA LAT. DEL PERIF (AREA DE DESPLANTE DEL MARCO N. 1 N. 2 Y N. 3), EXISTE LINEA DE DRENAGE 12", AGUA TRATADA, 8" y A.P. DE 3", (MAS POSARAN DATOS POR MEDIO PLANOS Y SE RECORRERAN SONDEOS P/ UBICARLAS C/ PRECISION).

NOTA N. 010

25 MAYO 2017

- SE INICIARON TRABAJOS DE EXCAVACION CORTO P/ DESUJO PROVISIONAL EN LA LATERAL DEL PERIF JUV. - CANTERA - NORTE-SUD, SE COLOCARA BASE 20 CMS DE ESPESOR, CARPETA 2 CMS T.M.A 3/8"
- SE PLATICA C/ PERSONAL DEL CONALEP PARA INICIAR TRABAJOS PIKAS N. 5, 6, 7 Y ESTE 8 (SE REALIZAN LOS TROZOS P/ EXCAVACIONES).
- SE VERIFICA EN LAMPA QUE HAY UNA CANALIZACION DE C.F.E. DE ALTA TENSION EN LA ZONA DE LA OBRA, (EN LA LATERAL DEL PERIF. Y JUNTO AL CONALEP.) ESTAMOS CONTAGANDO AL PERSONAL DE C.F.E. (TRANSMISION) C/ EL FIN DE UBICARLA Y VER SI NO AFECTA NUESTRO PROYECTO.

Fecha:

No.

005

NOTA No 011

26 MAYO 2017

- SE TRABAJA EN LA EXCAVACION DE CORTE PARA EL DESLIZ PROVISIONAL EN LA LATERAL FRONTO A LA GASOLINERA.

J. C. M.

NOTA No 012

27 MAYO 2017

- SE CONTINUAN TRABAJOS EN LA CONST. DESLIZ PROVISIONAL (ESTÁ MUY INESTABLE EL TERRENO Y SE AYUDÓ AL CONTRATISTA SALAR EL MATERIAL MUELDO CONTINUANDO ARRUJADO Y MEJORAR CON PEDRAPLEN P/ ESTABILIZAR LA COLC. DE LA BASE)
- SE PONE EL PROYECTO GEOMÉTRICO Y ESTRUCTURAL P/ EMPEZAR TRABAJOS DE INGENIERIA DE LAS VIGAS METÁLICAS.
- SE ENVÍAN SECCIONES P/ PROYECTO MUROS MECANICAM. ESTABILIZADOS EN LA RAMPA DE LA CARRERA

J. C. M.

NOTA No 013

28 MAYO 2017

- A LA FECHA NO HA CONFIRMADO C.F.E (transmision) para que ubiquen sus instalaciones subterráneas existentes en la zona de la obra
- SE INGRESO A LA C.F.E distribución el proyecto de reubicación de instalaciones de media tensión.
- SE SOLICITA A LA JMAS QUE TENGA UN REPRESENTANTE EN OBRA PERMANENTE PARA VER ASUNTOS RELACIONADOS CON SUS INSTALACIONES.
- SE TRABAJA EN LA COLOCACION BASE HIDRAULICA PARA EL DESLIZ PROV. EN LA LATERAL DEL PERIF (FRONTO A LA GASOLINERA) (P/ PODER TRABAJAR EN EL MARCO No 2, y No 3.

J. C. M.

Fecha:

Nº:

006

NOTA N. 014

29 MAYO 2017

- SE CONTINUA MOVILIZADO Y TENDIDO BASE HDR. PARA EL DESUO PROVISIONAL, EN LA LOT. FRENTE A LA GASOMERA.
- SE ACORDO CON LOS DIRECTIVOS DEL CONALEP, COMO SE VA A TRABAJAR EN LAS DEMOLICIONES, REQUERIDAS DE BARRA, MUROS, PUEBOS, ETC P/ PODER INICIAR TRABAJOS CON LAS EXCAVACIONES.
- C.I.F.E (transmisión) AUN NO CONTRASTA LA UBICACION DE SUS INSTALACIONES SUBTERRANEAS

NOTA No 015

30 MAYO 2017

- Hoy se reviso computacion y se procedio a IMPRIMIR LA BASE PARA EL DESUO PROVISIONAL EN LA LOT. PERIF Juv (Frente a la gasomera).
- SE REVISARON CONCORDANTES P/ ESTAR No 1.
- SE INICIO EXCAVACIONES EN LA ZONA DE LA RAMPA DE SALIDA.
- SE INICIO DESMANTELAMIENTO DE LA CASITA Y ACCESORIOS EN LA ENTRADA AL CONALEP, ASI COMO EL RETIRO DE LA MALLA CICLONICA EN LA ZONA DEL ESTACIONAM. (PREVIA AUTORIZACION DE PERSONAL DEL CONALEP)

NOTA N. 016

03 JUNIO 2017

- SE CONTINUA DESMANTELAMIENTO DE MALLA DEL ESTACIONAM Y DEMOLICION DE CASITA Y MUROS ACCESO AL ESTACIONAM DEL CONALEP
- SE CONTINUAN EXCAVACIONES ZONA RAMPA DE SALIDA
- SE HABILITA ALERO DE REF P/ ESTRIBO No 8
- SE DEMOLIO BARRA EN ZONA DEL CANAL (CIMA No 5 - E-8) DEL CONALEP, P/ PODER INICIAR TRABAJOS DE EXCAVACIONES
Se colocara Malla Ciclonica Provisional

Fecha:

No.

007


NOTA N. 017

05 JUNIO 2017

- SE COORDINA CON LA JMAS P/ PROYECTO DE REUBICACION MAS APROPIADO EN LA ZONA DE LA PILA N. 6, 7 Y ESTRIBO N. 8 ASI COMO LA RAMPA DE SALIDA.

- SE REVISAN SECCIONES DE LA RAMPA DE SALIDA P/ PROYECTAR LOS MUROS MECANIC. ESTAB

(Se ordenó al contratista considerar 1 m ± APROX APOYO DE LA CORONA DEL CANAL ADYACENTE

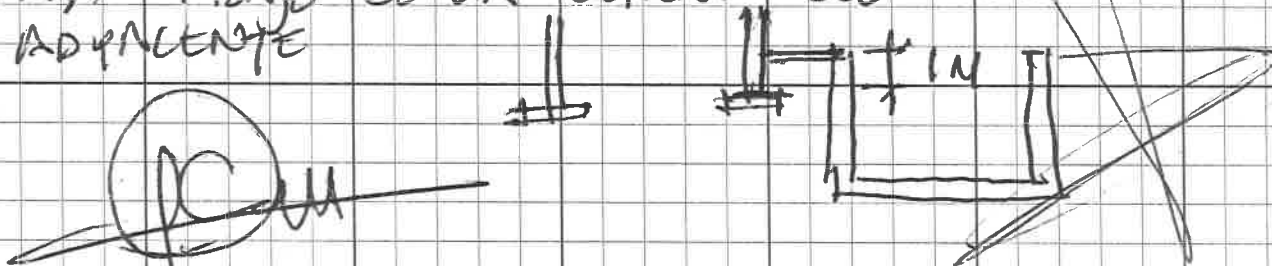

NOTA N. 018

06 JUNIO 2017

- HOY SE DIO MANDATO OFICIAL POR PARTE DEL GOBERNADOR DEL ESTADO Y LA PRESIDENTA MUNICIPAL (INICIO DE TRABAJOS).

NOTA N. 019

08 JUNIO 2017

- SE CONTINUA EXCAVACION CORTE EN LA RAMPA DE SALIDA (Se retira el material fuera de la obra).

- SE INICIO EXCAVACION P/ DESPUNTAZAR LA PATA DEL ESTRIBO N. 8 CON LA SIG. OBSERVACION (SE TIENE QUE CAMBIAR DRENAJE PLUVIAL (CAJA), TUB. DE DRENAJE 8" y AGUA POT. DE 3", ASI COMO 4 POZOS DE VISITA (P.U. EXTRAORDINARIOS).

- SE REUSA PROYECTO DE LOS MARIOS N. 2, 4 N. 3, (POR LA LINEA DE TRANSM DE C.F.E), AFECTA A LA POSIBLE UBICACION DE LAS ZAPATAS

Fecha:


No.

008

NOTA N.º 020

09 JUNIO 2017

- SE ACORDO CON LA SUPERIORIDAD MODIFICAR EL ANCHO DE LOS MARCOS N.º 2 Y 3, CON EL FIN DE NO AFECTAR LA ZONA DE LA LÍNEA SUPERIOR DE TRANSM. DE C.F.E. [SE ORDINO AL PROYECTISTA REHUIZAR LA ADJUNCIÓN, SE LO ENTREGO EL GEOMETRICO MODIFICANDO

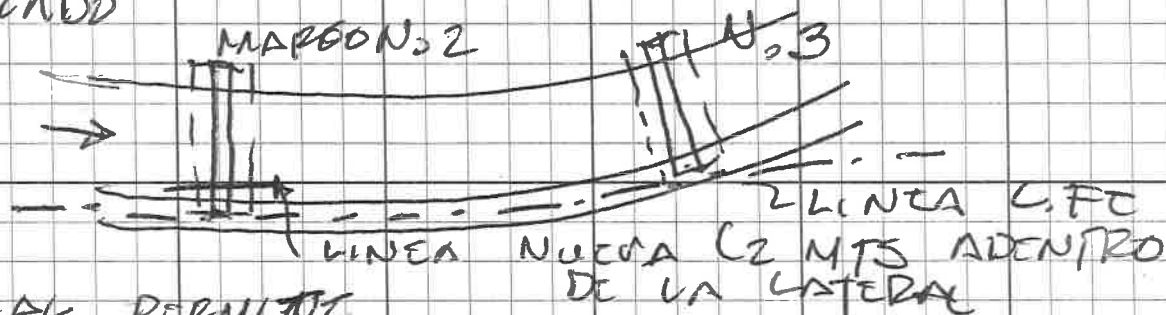

- LO CUAL PERMITE CONTINUAR TRABAJOS, DE NO SER ASI SERIA INVIABLE Y MUY COSTOSO REHUIZAR LAS LÍNEAS DE TRANSM. C.F.E. (HIS KUA)
- SE REHUIZO LA RESOLUCION, Y SE INICIO TRABAJOS DE DEMOLICION DE CARPETA ASF. Y SONDEOS P/UBICAR INSTALACIONES EN LA LATERAL

NOTA N.º 021

12 JUNIO 2017

- SE TRABAJA EN EL MARCO N.º 2 EN LA DEMOLICION Y EXCAVACION P/ DESPL. ZAPATA (Se ajusto el cincho y el proy. reuise)
- SE CONTINUAN SONDEOS DE LÍNEAS DE A.P., A.T. Y ALICANT. EN LAT. PERIF. P/ DESP MARCO N.º 2, N.º 3
- CON ESTA FECHA SE AJUSTO PROYECTO GEOMETRICO DE LAS PILAS N.º 5, 6, 7 Y ESTRIBO N.º 8, SE QUITO EL ESQUEJE A LAS PILAS N.º 6, 7, Y ESTRIBO 8 (LAS TRABES DEL CLARO 5-6 SE HARAN A MEDIDAS DIFERENTES Y LOS CLAROS 6-7 Y 7-8 (iguales 35.0m.), LA PILA N.º 5 SE REHUIZO P/ QUEDAR AFUERA DE LA TRAYECTORIA DE LA CANALIZACION DE C.F.E. (Ubicada dentro Canal de la Cantera), SE REALIZARAN LOS AJUSTES ESTRUCTURALES NECESARIOS.

Fecha:


No:

009

NOTA N. 022

13 JUNIO 2017

MARCO N. 2: SE UBICÓ LA PROFUNDIDAD DE LA TUBERÍA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO, (UBICÁNDOSE A APROX. 2.8 M LONJO); POR LO QUE SE TOMÓ LA DECISION DE BAJAR LA ZAPATA DEL MARCO N. 2 Y N. 3, LIBRANDO LA LINEA DE 12" DE D.S.

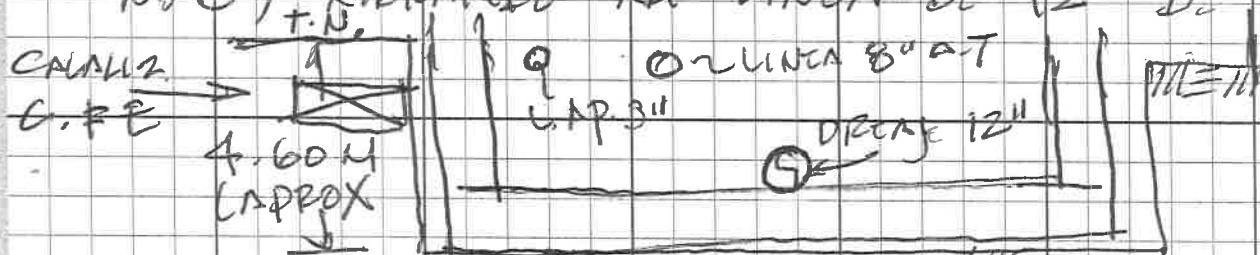

- CON ESTO SE INCREMENTARÁN LAS PROFUNDIDADES DE DESPLANTE, INCREMENTÁNDOSE, EXCAVACIONES, RELLENOS, LONG. DE ALERO Y CONCR. EN COLUMNAS.
- LA POSIBILIDAD DE RUBICAR NO ES FACTIBLE LA LINEA 12" DUC. POR SER ZAPATA CORRIDA Y TENER MURO N.E. L. 520 Y CANAL C.F.E. LADO DERECHO.

NOTA N. 023

14 JUNIO 2017

MARCO N. 2: SE CONTINUA LA EXCAVACION, SE SOPORTA PROVISIONALMENTE LINEA AS - 12" U DE AGUA T. DE 8".

- SE CONTINUA EXCAVACION CORTE EN LA RAMPA DE SALIDA
- SE INICIO EXC. P/DESPL. PILA N. 5
- SE TRABAJA EXC. ZANJA P/RUBICAR DREN 8" EN UNA ZONA PILA N. 6, N. 7 Y C- 8, ASI COMO TAMBIEN LAS PIZAS DE VISITA
- SE EXCAVA Y AFINA P/DESP ZAPATA DEL ESTILLO N. 8 (SE COLARA CICLOPEO EN FORMA PARCIAL.)
- SE REVISÓ C/O JMAS LA SITUACION DEL COLECTOR DE 36" ϕ , EN LA RAMPA DE SALIDA, CRUZA!!

Fecha:

No.

010

NOTA N. 024

16 JUNIO 2017

- SE COLO' LA PLANTILLA - CICLOPEO' P/DESPLANTE DE LA ZAPATA DEL ESTRIBO N. 8.

- MARCO N. 2: SE CONTINUA LA EXCAVACION.

- PILA N. 5: SE CONTINUA LA EXCAVACION P/LA ZAPATA (SE AUTORIZA LA DEMOLICION DE PARTE DE LA BOVEDA DE MAMP EXISTENTE Y EL CANAL DE CONCRETO LA CANTERA Y SU POSTERIOR RECONSTRUCCION, ESTO CON EL FIN DE DESPLANTAR LA ZAPATA)

- MARCO N. 3: SE CONTINUA EXCAVACION.

NOTA N. 025

17 JUNIO 2017

- AUN NO SE LIBERA LA AFECTACION DEL TEMPLO EN LA RAMPA DE SALIDA TRAMO 04480 - 04520, LIMITANDO EL ACCESO A LOS TRABAJOS DE LA R. SALIDA

- AUN NO SE DEFINE LA SITUACION DEL COLECTOR DE DRENAJE DE 36" Y EL DRENAJE PLUVIAL, ASI COMO SU CAJA EN MEDIO DE LA RAMPA DE SALIDA.

- AUN NO SE TIENE EL PROYECTO DE LA INCORPORACION A LA CARRERA 20 - EJE 1.

NOTA N. 026

17 JUNIO 2017

ESTRIBO N. 8: HOY SE REUNIO ARMADO, CANTERA Y TIRAZO Y SE COLO' LA ZAPATA DE CONCRETO FIC-250 kg/m³

NOTA N. 027

19 JUNIO 2017

- SE TRABAJA EN EXC, COLOC PLANTILLA ARCO Y COLOC TUBERIA 8" Y 3" P/REUBICACION INST P/ PILA N. 6, 7 Y E-8.

- EN COORDINACION Y VIABILIDAD Y PREVIA COLOC DE SEÑALAMIENTO, SE CERRADO LOS 2 CARRILES CENTRALES P/INICIAR TRABAJOS DE RETIRO PAPAPELO, DEMOLICIONES, GUAR EN CAMERON CENTRAL. P/ DESPL PILA N. 4

Fecha:

No.

011

NOTA N.º 028

20 JUNIO 2017

- MURD N.º 2: SE ESTABLECIO TERRENO C/ PIEDRA Y SO COLO' CICHOPED EN DESPLANTE ZAPATA (Espesores Variables)
- MURD N.º 3: SE CONTINUA LA EXCAVACION Y SOPORTE TUBERIAS
- SE COLOCACION 2 LONAS INFORMATIVAS DE OBRA VISIBLES.
- SE ESTA CONSTRUYENDO P.V. P/RECUERDO INST. DRENAGE P/ PILA N.º 6 y N.º 7
- ESTRIBO N.º 8: SE TERMINO DE LIMPIAR Y ARMAR 1ra SECCION MURO Y SE PROCEDE A COLARARLO
- PILA N.º 5: EN COORDINACION CON EL PROYECTISTA Y EL CONTROL DE LABORATORIO, SE AUTORIZO' AL CONTRATISTA BAJAR LA EXCAVACION HASTA PASAR LA ARILLA Y MEJORAR Y CICHOPED EL DESPLANTE.
- PILA N.º 6: SE INICIO EXCAVACION.
- SE TRABAJA EN EL DESPEJE DE PARAPETO Y DEMOLICIONES P/EXCAVACION PILA N.º 4 (Se esta revisando C/JMAS LA FORMA EN QUE SE UBICA EL ACUEDUCTO Y RELACION A LA ZAPATA (Se realizara un Sondeo y se vera la opcion de NO PILOTAR P/LA POSIBILIDAD DE GOLPEAR EL TUBO DE ALERO DE 36" DE 30 ANOS DE VIDA), Y UTILIZAR ZAPATA.

NOTA N.º 029

21 JUNIO 2017

- SE ORDENA AL CONTRATISTA RETIRAR ARBOTANTES Y LAMP S/EL PERIF DE LA JUV
- MURD N.º 2: Se habilita y Arma Acero de refuerzo P/zapata y V's Vert de la Columna.
- SE SUSPENDE TRABAJOS EN PILA N.º 5, DE EXC. HASTA DEMOLER CAISCOZOTE Y SOPORTAR LA BOVEDA DE MAMPPOSTERIA.
- EL TRAFICO SE COMPORTA LENTO EN EL URBIO DE CARILES

Fecha:

No.

012

NOTA N.º 030

22 JUNIO 2017

MAPA N.º 2: SE CONTINUA ARMADO DE ZAPATA Y COLUMNAS.

MAPA N.º 3: SE CONTINUA EXC Y AFINES

- SE CONTINUA EXCAVACIONES PILA N.º 5 y 6
- SE REALIZAN DEMOLICIONES DE CARPETA ASF. CONCR. A.S. Y REFORZADO P/D-ESP. PILA N.º 4 (Primero se sondeara el acueducto 36" JMAS)
- ESTRIBO N.º 8: CIMENTADO Y ARMADO MURO 2DA SECCION.
- POR SOLICITUD DEL DIRECTOR DE O. P. Y VIABILIDAD, SE ORDENÓ AL CONTRATISTA COLOCAR BARRAS LOGARITMICAS, BOJANTES Y VIALETAS EN LA ZONA DE CIERRE DE CARREL MZOS SENTIDOS EN PERIF DE LA J. J. P. bajar (la velocidad)

NOTA N.º 032

23 JUNIO 2017

MAPA N.º 2: SE CONTINUA CIMENTADO Y ARMADO P/ZAPATA.

MAPA N.º 3: SE CONTINUA AFINE, (SE AUTORIZA CICLOPEO' P/ESTABILIZAR DESPLANTE)

ESTRIBO N.º 8: HOY SE COLO' LA SEGUNDA SECCION DE MURO C/CONCR F'C=280 kg/cm²

- SE CONTINUA RETIRO DE PARAPETO METALICO EN CAMELLON DEL PERIF DE LA JUVENUD

NOTA N.º 033

24 JUNIO 2017

MAPA N.º 2: SE REVISÓ ARMADO Y ACERCAMIENTO, SE PROCEDE A REALIZAR

COLADO DE LA ZAPATA C/CONCRETO F'C=280 kg/cm²

MAPA N.º 3: SE REALIZO' EL COLADO DE LA PLANTILLA CICLOPEO'.

- A LA FECHA AUN NO SE LIBERA PREDIO DEL "TEMPLO"
- SE CONTINUAN REUBICACIONES INSTALAC.

Fecha:

No.

013

NOTA N. 034

26 JUNIO 2017

- PILA N. 4 - Hoy se realizó el sondeo y se ubicó la ubicación y profundidad del alcantarillado el saneamiento de la J.M.A.S., acordándose en conjunto, la dirección de O. Públicas, Proyectista Estructural, Laboratorio y Personal de la J.M.A.S. lo siguiente:

- 1) NO ES FACILIBLE PILOTEAR POR EL RIESGO DE DAÑAR LA TUBERÍA (PASAPILA ENTRE LOS PILOTES)
- 2) NO ESTA DE ACUERDO J.M.A.S. EN QUE LA SAPATA QUEDE ARRIBA DEL TUBO AUNQUE NO LE TRANSMITA CARGA. (POR UNA POSIBLE FALLA Y MANTENIMIENTO)
- 3) SE ACUERDA CAMBIAR SAPATA-PILOTE A SOLO SAPATA DE CONTACTO QUEDANDO ARriba DEL TUBO

7.80M
APROX

- 4) LABORATORIO VERIFICAR LA CAPACIDAD DE CARGA A 7.50 M - 8.0 DE PROF. P/ DETERMINAR LA RESISTENCIA DEL SUELO
- 5) POR LO ANTERIOR SE TENDRIA Q' CORRAR OTRO CARRIL (Se quedaria uno solo por sentido, se vera la coordinacion c/ viabilidad y toda la logistica de acceso a la ciudadanía.

NOTA N. 035

27 JUNIO 2017

- SE CONTINUA TRABAJOS ARMADO, LIMPIADO Y COLADO COLUMNAS MARCO N. 2

- MARCO N. 3: Habilitado y Armado acero de refuerzo

- SE ORDENA AL CONTRATISTA REPARAR MUROS COLUMNAS NO CUMPLE LA SECCION

- SE SALIO SONDEO P/ CAP CARGA

P/ PILA N. 4.

Fecha:

No.

014

NOTA N. 036

28 JUNIO 2017

MARCO N. 2: SE INICIO RELLENO COMPACTADO
 ✓ N. 3: ARMADO PAZARILLAS P/ ZAPATA

PILA N. 6: SE COLO' CILLOPED EN LA
 CIMENTACION (ESPESES VARIABLE)

- RAMPA SALIDA: SE SOLICITA AL CONTRATISTA
 INCLUIR UN PUENTE - PASO PEATONAL EN
 FORMA TRANSV., P/ PROYECTO DE LOS
 MUROS M.E., AUN NO SE SOLUCIONA
 EL PROBLEMA DE COLECTOR SANITARIO Y
 PLUVIAL.

- PILA N. 4: EL PROYECTISTA ELABORA EL
 CAMBIO DE CIMENTACION (NO SE
 PUEDE TRABAJAR)

- SE CONTINUA RETIRO PARA PISO METALICO
 EN CAM. CENTRAL

NOTA N. 037

29 JUNIO 2017

MARCO N. 3: SE REVISO EL ARMADO Y GEOMETRIA
 Y SE AUTORIZO' A REALIZAR EL COCADO
 DE LA ZAPATA C/ CONCRETO F'C = 250 kg/cm²

- SE REALIZO' TRABAJOS DE RETIRO DE CABLEADO
 ABIERTO EN LA LATERAL P/ TIRABAJAR
 MARCO N. 2 y N. 3, SE PAGO'
 PRESUMIAMENTE A C.F.C. (P.U. EXTRA),
 Y SE RENTO' PLANTA GENERADORAS (2 PWS)
 P/LA SUBIDA Y LA CASCADERA Y LA
 LANTERA (P.U. EXTRAORDINARIOS)

- PILA N. 6: SE INICIA COLOCACION DE
 ALERO DE REFUERZO. P/LA ZAPATA.

- AUN NO SE LIBERA EL PREDIO
 DEL "TEMPLO"

- SE TIENE NIVEL FREATICO EN LA EXC.
 DE LA PILA N. 5

- EL CONTRATISTA ESTA EN TRAMITE P/ ADQUIRIR
 LA PLACA P/ LAS VIGAS METALLAS

Fecha:

No.

015

NOTA N. 038 30 JUNIO 2017

PILA N. 6: SE TERMINO CIMENTADO Y ARMADO Y
SE COLO' LA ZAPATA Y CONCRETO $F'c=250 \frac{kg}{cm^2}$

- MARCO N. 3: COLADO SECCIONES COLUMNA

- MARCO N. 2: RELLENO COMPACTADO

- SE ELABORA ESTIMACION N. 2, POR UN MONTO
DE \$ 7'457,420.11 S/IVA.

- ESTA LOGRANDO PLACA Y PERFILES
P/LA FABRICACION DE VIGA METALLA

- SE TRABAJA EN LA CIMENTACION Y

- AMBILITADO DE CAMAS P/FABR DE VIGA

NOTA N. 039

03 JULIO 2017

PILA N. 6: CAMBRADO - ARMADO Y COLADO
1 SECCION DE COLUMNA.

MARCO N. 3: CAMBRADO, ARMADO Y COLADO
SECCION COLUMNA L. DERECHO.

MARCO N. 2: RELLENO COMPACTADO EN CAPAS

PILA N. 4: AUN NO ENTRECA EL
PROYECTISTA LA MODIFICACION DE LA
CIMENTACION.

PILA N. 5: SE ORDENA AL CONTRATISTA RECIBIR
C/O. FALSA LA BOVEDA DE NAMP ADOYA -
CENTE A LA ZAPATA DE LA PILA N. 5,
SE DEMUELE PISO Y MURO DE CANAL DE
CONCRETO ASI COMO TUBO DE 90 CMS
P/DRENAJE PLUVIAL

- SE ORDENA AL CONTRATISTA COLOCACION
TUBERIA DE 40" P/DRENAJE PLUVIAL DE
P.A.D. COLOCADA P/LA PILA N. 5
(P.U. EXTRAORDINARIO).

- AUN NO SE LIBERA AFECTACION
DEL TEMPLO. II

- SE FABRICAN CAMAS P/ARMADO DE
VIGAS METALLAS

Fecha:

No.

016

NOTA N.º 040:

04 JUNIO 2017

PILA N.º 4 - AUN NO SE ENTREGA PROYECTO
P/SE INICIA EXCAVACION PIZCUIA DE 5.0X5.0

- SE CONTINUAN COLADOS DE SECCIONES DE
COLUMNA EN MARCO N.º 3 Y PILA N.º 6

- PILA N.º 5: SE TRABAJA EN LA EXCAVACION
HASTA TERRENO BUENO, SE SE MEJORA
DESPLANTE C/ CILLOPEO. (LA ABERTURA
QUE SE ENCONTRO NO ES ADECUADA,
TAMBIEN LO RECOMENDADO LABORATORIO.

NOTA N.º 041

05 JULIO 2017

- SE ORDENA AL CONTRATISTA REFORZAR LA
MALLA CILLOPEO Q' SE COLOCO PROVISIONALMENTE
P/ PROTECCION DEL CONALEP (TRAMO PILA N.º 5 - N.º 7)

- SE RECUERDA AL CONTRATISTA QUE TODO EL
PERSONAL SIN EXCEPCION DEBE PORTAR
CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD ESTIPULADO
EN LAS NORMAS DE LA STPS.

- AUN NO DEFINE LA JMAS LO QUE SE
DEBE HACER P/ PROTEGER LA TUBERIA DEL
COLECTOR DE 36" Ø JUNTO AL C-8, ADENTRO
DE LA RAMPA

- AUN NO TERMINA EL PROYECTISTA LA
MODIFICACION A LA CIMENTACION DE LA PILA N.º 4,
TAMBIEN A LA DEFINICION DEL TRAMO 0-1.

NOTA N.º 042

07 JULIO 2017

- MARCO N.º 2: SE CONTINUAN TRABAJOS DE
ARMADO, COLOC. CIMENTA METALICA Y
COLADO DE SECCIONES DE COLUMNA

- PILA N.º 5: SE CONTINUA LA DEMOLICION DEL
MURO Y PISO DEL CANAL Y LA BOVEDA DE
MAMP ADYACENTE, ASI COMO LA
EXCAVACION P/ DESPLANTAR, HASTA
TERRENO BUENO (C/ BOV. DE LABORATORIO)

Fecha:

No.

017

NOTA N.º 043

11 JULIO 2017

ESTRIBO N.º 8: HOY SE TERMINÓ CAMBIZADO Y ARMADO SECCION DE APOYO (3ra) C/ CONCRETO $F'_{cd}=250 \text{ kg/cm}^2$

PILA N.º 5: SE ENCONTRÓ TERRENO BUEENO Y FIRME Y SE COLO' CICLOPEO P/ MOJEAR DESPLANTE DE LA ZAPATA

- SE REALIZO LA 2da SECCION RETIRO DE CABLES AEREO P/ PARTE DE C.F.E Y LA CONEXION PROVISIONAL A LA SUBARJ, CON ESTO SE PUEDE CONTINUAR TRABAJOS DE COLADO DE COLUMNA DE RECTA DE LOS MARGOS N.º 2 y N.º 3 (SE ADELAZÓ 5 DIAS).
- SE INICIO TRABAJOS DE HABILITADO ACERO DE REFUERZO Y LA CAMARA METALICA P/ INICIAR LA FABRICACION DE LAS 24 TRAPES P/ REFORZADAS BASILTO II.

NOTA N.º 044

12 JULIO 2017

PILA N.º 5: SE TERMINO CAMBIZADO Y ARMADO DE LA ZAPATA, Y SE PROCEDEO A REALIZAR EL COLADO DE LA ZAPATA C/ CONCRETO $F'_{cd}=250 \text{ kg/cm}^2$

ESTRIBO N.º 8: SE COLO' MURO PANTALLA

- VIGAS METALICAS: CONTINUA LLEVANDO PLACA AL MUAR DE FABRICACION
- PILA N.º 7: SE CONTINUA LA EXCAVACION
- SE COLO' CICLOPEO' ESPESOR VARIABLE P/ DESPLANTE ZAPATA PILA N.º 7.

NOTA N.º 045

12 JULIO 2017

- EL DIA DE HOY POR EL MEDIODIA CAYO' UN FUERTE AUVACERO EL CUAL PROVOCO' QUE SE SUSPENDIERAN ACTIVIDADES.

Fecha:

No:

018

NOTA N. 046

13 JULIO 2017

- MARCO N. 3: SE TRABAJÓ EN EL CIMENTADO Y COLADO COLUMNA LADO DERECHO
- HOY CAYÓ OTRO FUERTE VENTACERO LO CUAL NO PERMITIÓ TRABAJAR.

NOTA N. 047

14 JULIO 2017

- PILA N. 7: SE TERMINÓ EL CIMENTADO Y ARMA DO DE LA ZAPATA Y SE PROCEDIÓ A COLAR EL CONCRETO F'CE 280 kg/cm²

PILA N. 8: SE CIMENTÓ, ARMA Y CUELLO MURO DE CANAL ADYACENTE

PILA N. 4: SE CONTINUA EXCAVACION PRELIMINAR HASTA 2.0 MTS DE PROF. P/DESCUBRIR EL TUBO DE 36" Ø DE JMAS Y CUIDARLO P/LA EXCAVACION TOTAL

- HOY SE ENTREGÓ EL PROYECTO DEFINITIVO DE LA CIMENTACION DE LA PILA N. 4, SE ENTREGÓ AL CONTRATISTA

NOTA - EL DESPLAZE MARCADO ES 7800 MTS LO CUAL DERIVA EN LA NECESIDAD DE CERRAR UN 200 CARRIL P/SENTIDO POR SEGURIDA DEL TRAFICO, SE COORDINA CON VIAJADA Y SE PUBLICITARA EN LOS MEDIOS, SE PROGRAMAN P/EL SABADO 15 (MAÑANA), CON TRABAJO CONTINUO.

NOTA N. 048

15 JULIO 2017

- EL CONTRATISTA COLOCÓ TODO EL SEÑALAMIENTO PROVISIONAL QUE PIDIO VIAJADA P/EL CIERRE A 1 SOLO CARRIL P/SENTIDO.
- SO SUSPENDIÓ TRABAJOS EN LA PILA N. 4 (UBICADA CAMELLON CENTRAL DEL PERIF. DE LA JUVENTUD)

- LUVIA FUERTE Y CONSTANTE DURANTE TODO EL DIA, NO SE TRABAJÓ.

Fecha:

019

NOTA N° 049

16 JULIO 2017

- HOY AMANECIÓ SIN LUBIA Y SE INICIO CERRAR CARRILES (2) P/ SENTIDO EN EL PERIF. DE LA JUVENTUD EN COORDINACION CON VIACIDAD.
- SE INICIO TRABAJOS CON LA EXCAVACION HASTA LA PROFUNDIDAD SOLICITADA EN EL PROYECTO
- DURANTE TODO EL DIA SE REALIZO LA EXCAVACION, Y SE COLO EL CILINDRO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 2 MTS, SE CUIDO EL ACUEDUCTO. L PROF. TOTAL 8.0 M APROX
- SE ORDENO TENER UNA CUBA DE 50 TON P/ SOPORTAR EL TUBO DEL ACUEDUCTO Y P/ ALCANIZ LA PARRILLA DEL ARMADO DE LA ZAPATA, ETC.

NOTA N° 050

17 JULIO 2017

PILA N° 4: HOY SE REALIZO LA COLOCACION DEL ARMADO DE LA ZAPATA Y US VERT DE LA COLUMNA, Y SE PROCEDE A COLAR LA ZAPATA CONCRETO $f'c = 400 \text{ kg/cm}^2$ AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y EL FIN DE ABRIR EL TUBO INICIAL A LA PROVEEDAD (JGUAL LA COLUMNA)

- RAMPA SALIDA: LLEVARON MOLDES Y SE UNIBUITO ALGO REF Y SE INICIO COLAR PANELES P/ MUROS M.E.
- COLAR 2 PAS TRABES DE CONCRETO PROF AASHTO TIPO II, (La fabrica G.C.C. en su planta)

NOTA N° 051

18 JULIO 2017

PILA N° 4: CUBRADO, ARMADO Y COLAR P/ LA SECCION DE LA COLUMNA CONCRETO $f'c = 400 \text{ kg/cm}^2$, P/ ALCERAR DESCUBRADO Y RELLENO

- SE COLO COLUMNA 3ra SECCION MATEO N° 3

- TRAFICO MUY LENTO S/ PERIFERICO POR ESTAR SOLO CARRIL P/ SENTIDO OPERANDO

Fecha:

No.

020

NOTA No. 52

19 JULIO 2017

PILA No. 4 - SE DESMOLDO LA SECCION DE COLUMNA,
- SE ORDENÓ AL CONTRATISTA RELENAR C/
MATERIAL NO COMPACTABLE (PIEDRA)

DE UN SIG. MANERA 1 MTS C/PIEDRA
BUENA DE RIO, Y EL RESTO RELLENO C/MATERIAL
TRITURADO 2" - 1 1/4" DE G.C. P/DAK
RAPIDEZ Y NO TENER ASENTAMIENTOS

SE PROCEDE A RELENAR EL TRABAJO EN
CAPAS Y HUMECTANDO DE (SE ACOMODA
C/ VIBROCOMPACTADOR) Y EL BOTE DE LA
EXCAVADORA CAT 305.

- SE CONTINUA COLADO DE TRABES AASHTO
TIPO II EN G.C.
- SE CONTINUA COLADO DIARIO DE PANELES
P/MUROS N.E DE LA RAMPA SALIDA

NOTA No. 53

19 JULIO 2017

- SE ABRIÓ POR LA NOCHE AL TRAFICO LOS 2
CARRILES POR SENTIDO, Y SE PROTEJO CON
SEÑALAMIENTO SUFICIENTE EL AREA DE LOS
TRABAJOS PILA No. 4.

NOTA No. 54

20 JULIO 2017

- MARCO No. 3 - SE CONTINUA COLADO SECCIONES
DE COLUMNA

PILA No. 4 - SE ACOMODA LA PIEDRA DEL RELLENO

PILA No. 5 - SE COLA MOLDE DE COLUMNA
Y SE COLA CON SECCION, SE
ESTA DESBARRANCANDO TALUD
ADYACENTE

- SE CONTINUA COLADO PANELES P/MUROS N.E
- SE TRABAJA EN LA FABRICACION Y
SOLADURA DE VIGAS METALLICAS EN
CAMAS.

Fecha:

No.

021

NOTA N. 55

21 JULIO 2017

- HOY SE PRESENTO LUVIA DURANTE EL DIA Y LOS TRABAJOS FUERON LENTOS
- SOLO SE TRABAJO EN CIMENTADO DE MOLDOS

NOTA N. 56

22 JULIO 2017

- HOY TAMPOCO SE PUDO TRABAJAR POR LUVIA Y TIEMPO SATURADO

NOTA N. 57.

24 JULIO 2017

- SE TRABAJA EN LA DEMOLICION DEL CAMELLON DE CONCRETO SILOSA DEL P.S. PERIF. JUU - CANTERA EXISTENTE (P/DAR EL 4to CARRIL)

PILA N. 4: RELLENOS Y RECOMODO DE MATERIAL NO COMPACTABLE

MARCO N. 3: RELLENO Y MATERIAL COMPACTABLE EN CAPAS

- SE INICIA COLOC. OBRA FALSA P/ CIMENTA CARBOL PILA N. 6.
- COCADO PANECES P/MURDAS M.E

- * A LA FECHA AUN NO SE LIBERA PRECIO DEL TEMPLO.

NOTA N. 58, 25 JULIO 2017

- LA JMAS DIO INFORMACION P/LA CONST'N CAJA DE CONCRETO ARMADO, EN EL COLECTOR SANITARIO JUNTO CANAL EN LA R. SALIDA, ASIMISMO TAMBIEN SE VA A ENCOFFAR LA TUBERIA CON CONCRETO (P/U EXTRAORDINARIOS NECESARIOS)

- SE CONTINUA COCADO TIZAS MASATO TIPO II (en Patios de G.C.C.)
- FABRICACION UINAS METALICAS EN PATIOS EN LA CANTERA

Fecha:

No.

022

NOTA N° 59

26 Julio 2017

- HOY SE PRESENTO LUBIA, TRABAJOS SUSPENDIDOS O LENTOS, LAS TRABAJOS DE CONCRETO NO SE PUDE TRABAJAR Y NO SE PERMITIO SOLDAR EN LAS VIGAS METALICAS

NOTA N° 60

27 Julio 2017

- SE CAMBRA CABEZAL PARA LA PILA N° 6
- RELLENOS COMPACTADO Y PIEDRA EN LA PILA N° 5 Y N° 7.
- SE CONTINUA COCADO DE PANELES PARA MUROS M. 2
- SE TRABAJA CONTROL FLEJO DRENAJE P/LA R. SALIDA
- SE VE Y LOS SUPERVISORES EL PROYECTO DEL PUNTO PEATONAL EN LA R. DE SALIDA (Se recomienda NO hacerlo p/la dificultad del montaje de Paneles y los Rellenos)

NOTA N° 61

28 Julio 2017

- SE HABILITA ALGO DE REFUERZO P/CABEZAL DE LA PILA N° 6 Y MARCO N° 2
- SE CONTINUA SUMINISTRANDO PLACA P/FABRICAR VIGAS METALICAS
- SE CONTINUA FABRICACION VIGAS CONCRETO AASATO TIPO V

NOTA N° 62

31 Julio 2017

- SE CONTINUAN TRABAJOS DEMOLICION CAMELLON CONUR PERIF (Se ordena cuidar la losa)
- SE REVISARON GENERADORES Y SE ELABORO Y FIRMO ESTIMACION N° 3 POR UN MONTO DE \$ 9'923.028.15 S/JVA

Fecha:

No.

023

NOTA N.º 63

01 AGOSTO 2017

- MARCO N.º 2: SE CONTINUA CIMENTADO P/CABEZAL
- SE CONTINUAN COLADOS DE PANELES P/MUROS M.C. RAMPA DE SALIDA
- PILA N.º 6: SE PROCEDE A REVISAR GEOMETRIA, NIVELES Y ARMADO Y SE PROCEDE A REALIZAR EL COLADO DEL CABEZAL Y CONCRETO F' = 400 kg/cm² (con el fin de acelerar trabajos y desmoldar mas pronto)

NOTA N.º 64:

02 AGOSTO 2017

MARCO N.º 2: SE INICIO COLOCACION ACERO DE REFUERZO P/EL CABEZAL

PILA N.º 4: SE RETIRA PARAPETO METALICO EN ZONA DE INFLUENCIA DE LA ZAPATA, Y SE INICIA DEMOLICION DE CUARN. CENTRO, BANQ. ETC.

TRABAJOS CONCRETO PREESTR. AASHTO II: SE CONTINUAN TRABAJOS DE FABRICACION EN PATIOS DE C.C.

(ARMADO, COLOC ACERO PREST., TENSADO, CIMENTADO Y COLADO).

- SE DA DETALLE DE LA BARRERA CENTRAL A CONSTRUIR S/EL CAMELLON DEL PERIF DE LA JOVENUDAD Y EN EL PUNTO DONDE SE QUETARA EL PARAP METALICO, CONSENSADO EN LA SUPERIORIDAD, SE LO ENTREGA AL CONTRATISTA, NOTIFICANDOLE Q DEBERA PRESENTAR P.U EXTRAORDINARIO.

NOTA N.º 65

03 AGOSTO 2017

- SE CONTINUAN TRABAJOS DE FABRICACION DE VIGA METALICA, EN CAMAS, CONTINUA LLEGANDO PLACA AL LUGAR DE FABRICACION.
- SE CONTINUA COLADO DE PANELES P/MUROS M.C., EN LA R. DE SALIDA.
- MARCO N.º 2: SE CONTINUA COLOC. DE ACERO DE REFUERZO.
- SE CONTINUA DEMOLICION CAMELLON CONCRETO EN PUNTO EXIST S/ PERIF (P/AMPLIAR LA CARRE)

Fecha:

No.

024

NOTA N.º 66

04 AGOSTO 2017

PILA N.º 5: SE ORDENÓ AL CONTRATISTA, ACCELERAR TRABAJOS CONS'T COLUMNAS.

- SE INCLUIÓ TRABAJOS DE INCLIN. CUARN - EXISTENTE EN CAMELLON CENTRAL (DE acuerdo a detalle entregado)

- SE CONTINUA COLANDO TRABES ARMADO II

- SE CONTINUA FABRICACION VIGA METALICA TRAMO 2-3, 3-4

- SE CONTINUA ARMADO CUBETA MARCO N.º 2 (Se ordenó al contratista colocar triplax p/muesca en las caras verticales del caberal)

NOTA N.º 67

05 AGOSTO 2017

- HOY CAYÓ FUERTE LLUVIA, SE TRABAJÓ PERO MUY LENTO

- SE LLEVO EL PUA ANDAMIOS SOPORTE BOVEDON JUNTO PUA N.º 5.

NOTA N.º 68

07 AGOSTO 2017

EN COORDINACION CON LA JMAS, SE CONCLUYO QUE SE CONSTRUYA UNA BAJA P/COLECTOR 36"Ø DE CONCRETO PROFUNDIZANDO Y SE COLOCA EN ENCOFRADO CONCRETO EN LA ZONA DE LA RAMPA DE SALIDA (Se dio detalle al Contratista), DEBERA PRESENTAR P.V. EXTRAORDINARIO

NOTA N.º 69

08 AGOSTO 2017

MARCO N.º 2: SE TRABAJA UMBRADO DE LOS COSTADOS DEL CABEZAS, (SE COLÓCO' TRIPLAX P/ EL REFORZADO, SE PROBLEMA Y SE COLOCA ALERO DE LOS BANCOS DE APOYO.

- COLANDO TRABES CONCRETO

- COLANDO PANELES P/MUROS M. EN R. SALIDA

- SE CONTINUA FABRICACION VIGA METALICA

NOTA N.º 70

09 AGOSTO 2017

- HOY SE COLÓ' EL CUBETA DEL MARCO N.º 2 CON CONCRETO $F'c = 400 \text{ kg/cm}^2$, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DO D. P, CON EL FIN DE ACCELERAR EN TIEMPO DE MONTAJES.

Fecha:

No.

025

NOTA No 71

10 AGOSTO 2017

- SE CONTINUAN TRABAJOS DE FABRICACION (ARMADO, APLICACION DE SOLDADURA ETC) P/ VIGAS METÁLICAS TIPO 2-3 y 3-4

- POR SOLICITUD DEL PROYECTISTA SE ORDENA AL CONTRATISTA ADQUIRIR LOS PERNOS NUSOM DE 18 CMS DE LONG., Y COLAR A 20 CMS (P.U. EXTRAORDINARIO).

NOTA No 72

11 AGOSTO 2017

- SE CONTINUA LA DEMOLICION DEL CAMILLON EXIST. CO PUENTE SUPERIOR, PSI COMO EL REFUGIO DEL EXCOMISARIO

- MARCO No 2: SE COLA LA 2DA SECCION DEL CAIBICAL

- SE CONTINUA COLADO DE TRABES AASTHO TIPO II EN PATIOS LCC

- SE PROGRAMO CON VIALIDAD EL CIERRE DE LA LATERAL DEL PERIF. DE LA AV. LA CANTERA Hacia EL SUR (FRENTE A LA AGENCIA SUBA RA) SE PROGRAMO DEL 12-14 AGOSTO 17

- SE CONTINUA COLADO DE PANELES PANELES M.E

NOTA No 73


12 AGOSTO 2017

- SE CIERRO LA LAT. DEL PERIF DE LA AV. CANTERA Hacia EL SUR (EN COORDINACION CON VIALIDAD Y SE AVISO A LOS COMERCIANTES DE LA ZONA), ESTO CON EL FIN. DE REALIZAR LOS TRABAJOS P/LA CIMENTACION DEL MARCO No 1.

- SE TRAZO LA ZAPATA, SE DEMOLIO LA CARPETA Y SE INICIO LA EXCAVACION
- SE COORDINA CON LA JMAS P/UBICAR INSTALACIONES DE A.P., A.T. Y ALCANTEJILLADO.

+

4.6

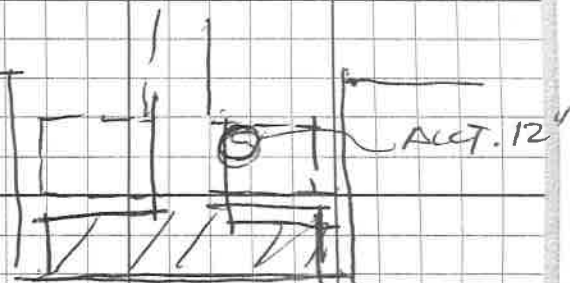3.0 MTS
PROYECTONIVEL
DESPLANTE P/ LIBRAR LINEA AL

- SE BAJO EL DESPLANTE P/ LIBRAR LA LINEA DE ALCANTEJILLADO QUE ESTORBA (1.6 M ADCC)

Fecha:

No.

026

NOTA N.º 74

13 AGOSTO 2017

MARCO N.º 1: SE CONTINUA LA EXCAVACION Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA (LOS TALUDES ESTAN MUY INESTABLES P/ER MATERIAL MUY CONTAMINADO Y SUELTO.)

- Se corto la linea alcantarillado 12" y se coloco tapon Provisional
- Se corto linea 8" Agua Tratada
- Se corto linea 4" Agua Potable (Se ordeno al contratista Suministrar agua Potable en Pipa a los Vecinos que lo Soliciten (P. EXTRAORDINARIA))
- Se afino piso a una Prof de 4.00m y se coloco la plantilla.

NOTA N.º 75

14 AGOSTO 2017

MARCO N.º 1: SE CONTINUAN TRABAJOS DE ARMADO DE Zapata y 2 columnas (Se han presentado varios derrumbes, se saca el material)

- SE COLO LA ZAPATA CONTRA BARRANCOS CON UNA RESISTENCIA DE $F'c = 300 \text{ kg/cm}^2$, P/ACELERAR LOS TRABAJOS, LAS COLUMNAS SE ARMAN DE $F'c = 400 \text{ kg/cm}^2$

NOTA N.º 76

15 AGOSTO 2017

- Hoy se presentaron lluvias constantes, lo q. provoco que se atrasaran trabajos MARCO N.º 1.

- Se cambio armado y colo los 2 tramos columna a NUEVO T.N y CONCR. $F'c = 400 \text{ kg/cm}^2$, Derrumbes
- cuando tramos AASTHO TIPO II EN PATIOS CIL
- Se suministra agua a convergencias de la zona (Hacia los Cedros, Gallito, a SORBO, Cuscul, etc)

NOTA N.º 77

16 AGOSTO 2017

MARCO N.º 1: SE DESMORO LOS DADOS DE COLUMNAS Y SE INICIO RELLENO Y MATERIAL NO COMPACTABLES, SE RECONECTA LINEAS DE 12" ALCANTARILLADO, AGUA TRAT. DE 8" y A. P. 4", (Se coloca Colchon con mat. cribado)

- Se tira capa S/R, C/P de BASE y se coloca PAVIMENTO CARPETA 8 CM ESP y se abrio LA LATERAL AL TRAFICO PARCE

Fecha:

No.

027

NOTA No. 78


17 AGOSTO 2017

- SE TRABAJA EN LA CONST'N DE LA CAJA REGISTRO DRENAJE SANITARIO (COLECTOR 36") JMAS
- SE CONTINUA A RAYNO ALCERADO FIBRILACION DE UNA METALLA P/LA SUPERESTRUCTURA
- P/LA No. 4: SE EMPEZO A COLOCAR O. FALSA Y ACCISO P/ LAIBERAL
- SE CONTINUA COLANDO PANELES P/ MUROS M.E., P. SALIDA
- SE TRABAJA EN LA CAJA P/ COLOC. ESTRUC. PAVIN EN ZONA CAMELLON NORTE.
- SE CONTINUA, ARMANDO LIMBRADO Y COLANDO BARRERA DE CONCRETO EN CAMELLON CENTRAL, PERIFERICO

NOTA No. 79

18 AGOSTO 2017

- SE ORDENO AL CONTRATISTA LA DEMOLICION DE LA CAJA DRENADO PLUVIAL DEL P.E. CANTERA - PERIF, QUE QUICHO ENMOLDO DE LA RAMPA DE SALIDA, SE CONSTRUIRA UNA NUEVA FUERA, SE COLOCARA NUEVA LINEA DE DRENAJE PLUVIAL P/ FUERA (TUBERIA P.V.C ADS DE 42" LEXO ZANJA, VELLEROS, TUBERIA ETC) P.U. EXTRAORDINARIOS



NOTA No. 80

21 AGOSTO 2017

- P/LA No. 4: SE TERMINO, LIMBRADO Y ARMANDO Y SE REALIZO' COLADO LAIBERAL Y CONCRETO $F'c = 400 \text{ kg/cm}^2$
- COLADO 22 ML. BARRERA SEPARADORO CENTRAL EN CAM PERIF. P/ PUENTE SUP EXIST $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$
- SE CONTINUA TRABAJOS CAJA DRENAJE SANITARIO 36" JUNTOS PAMPA
- SE INICIO TRABAJOS LIMBRADO FONDO LAIBERAL MARCO No. 3

NOTA No. 81

23 AGOSTO 2017

- SE CONTINUA COLADO COLUMNAS (SECCION) EN EL MARCO No. 1.
- SE COLOCA TUBERIA P/ DRENAJE PLUVIAL DEL CONALCEP JUNTO ESTUPO No. 8
- SE CONTINUA CONST'N CAJA P/ DRENAJE SANITARIO
- SE COLO' ENCOFRADO TUBERIA COLECTOR JMAS

Fecha:

No.

028

NOTA N° 82

24 AGOSTO 2017

- SE ORDENÓ AL CONTRATISTA MEDIR C/ PEDRA PLEN EN ZONA CAMOLLON NORTE - PERIF. DE LA JUV.
- SE CONTINUA CONSTN BARRERA CONCRETO 8/CM.
- SE CONTINUA FABRICACION VIGA METALLICA

NOTA N° 83

25 AGOSTO 2017

- SE ORDENA AL CONTRATISTA LO SIGUIENTE:
 - 1) LOS TRABAJADORES DEBERAN PORTAR CHALECO DE PL. Y CASCO SIEMPRE EN LA OBRA Y ARNES EN ALTURA
 - 2) EL SEÑALAM. DE LOS DESULOS DE DEBEN MANTENER EN OPERACION Y ALIMENTADOS
 - 3) LA OBRA DEBERA ESTAR LIMPIA SIEMPRE.

NOTA N° 84

28 AGOSTO 2017

- SE CONTINUA LA FABRICACION VIGA METALLICA
- SE COLOC. PIEDRA P/ESTABILIZAR PISO EN CAMOLLON CENTRAL NORTE

- SE TRABAJA EN LA CONSTN DE BARRERA CENTRAL PERIFERICO

- MARCO N° 3: SE CONTINUA CIMENTADO Y ARMADO DEL CAIBERAL

NOTA N° 85

29 AGOSTO 2017

- MARCO N° 3: SE COLOC. ALICATA Y CIMENTA P/BANCOS DE APORO, SE REALIZA GEOMETRIA Y NIVELES, SE CUOTA MAÑANA.

- MARCO N° 1: SE NOTIFICA AL CONTRATISTA QUE EL CAIBERAL SERA PROFUNDIZADO, CON EL FIN DE NO PARAR EL TRAFICO DE LA LATERAL C/ LA CUMBRA, LO DISEÑA EL PROYECTISTA Y SE LE ENTREGARA CUANDO ESTE LISTO (P.U. EXTRAORDINARIO).

NOTA N° 86

30 AGOSTO 2017

- MARCO N° 3: HOY SE REALIZÓ EL COLADO DEL CAIBERAL, CON CONCRETO $F'c=400 \text{ kg/cm}^2$

- SE TRABAJA CAJAS P/DIRECCION PLUVIAL EN LA 12 SALIDA.

Fecha:

No:

029

NOTA N.º 087

01 SEPTIEMBRE 2017

- AMPLIACION 4to CARRIL PERIF JULV (NORTE). SE TERMINO DE AFINAR Y COMPACTAR LA BASE Y SE PROCEDE A IMPREGNAR PILA N.º 7. SE TRABAJA EN LA TROQUELERA DE LA CIMENTA METALICA P/EL CABECAL Y SE COLOCA ACERO REFUECLO P/LOS BANCOS DE APOYO Y LA CIMENTA.

- CON ESTE DIA SE AUTORIZO LA DEMOLICION E INICIO TRABAJOS DE RETIRO MATERIAL ESCOMBRO P/EL TEMPLO EN LA R. SALIDA

- SE CONTINUA LA FABRICACION Y SOLDADURA VIGAS METALICAS

NOTA N.º 088

05 SEPTIEMBRE 2017

- SE COLO' EL CABECAL DE LA PILA N.º 7 C/ CONCRETO $f'c = 350 \text{ kg/cm}^2$ P/DESCARRIAR PLONTO

- SE TRABAJA DALA DESPL P/ PARAPETO EN CAMELLON CENTRAL

- SE COLOCA TUBERIA P/DRENAJE PLUVIAL EN R. SALIDA

- SE TERMINO' DEMOLICION DEL TEMPLO. R. SALIDA

NOTA N.º 089

07 SEPTIEMBRE 2017

- SE CUELA GUARDACION EN CAMELLON CENTRAL DEL PERIF.

- SE CONTINUA COLANDO PANELES P/MUROS M.T

- SE COLO' LA LOSA SUP DE LA DIV - REVESTIDO DRENAJE PLUVIAL RAMPA SALIDA

NOTA N.º 090

08 SEPTIEMBRE 2017

- PILA N.º 5: SE COLOCO FONDO CIMENTA Y SE COLOCA ACERO REF P/EL CABECAL

- SE CONTINUA FABRIC Y SOLDADURA VIGAS METALICAS Y SE SANDBLASTEAN, PINTURA PRIMARIA Y PINTURA ACABADO.

Fecha:

No.

030

NOTA N. 091

11 SEPTIEMBRE 2017

- YA ESTÁN EN LA OBRA LA TOTALIDAD DE LOS APOYOS TETRA P/ULAS METÁLICAS Y NEOPRENOS P/LAS DE CONCRETO
- SE RECORTA LA ORDEN AL CONTRAYENTA DEL PREFABRICADO DE CUBETA DEL MARCO N.º 1, PORQUE NO SE PUEDE COLOCAR IN SITU, POR EL ANCHO Y LA OBRA FINSA.

PILA N.º 5 SE REALIZÓ EL COCADO DEL CUBETA
C/CONCRETO $F'_{c}=400 \text{ kg/cm}^2$ (incluyendo
bancos bajos)

NOTA N.º 092

12 SEPT. 2017

- RAMPA DE SALIDA: SE CONTINUAN TRABAJOS DE COLOCACIÓN TUBERÍA P/DRENAJE PLUVIAL Y RELLENOS C/PIEDRA P/ESTABILIZAR DESPLANTES
- SE CONTINUA FABRICACIÓN SOLDADURA, SANDBLASTEO Y APLICACIÓN PINTURA FONDO Y FINAL P/ULAS METÁLICAS
- SE CONTINUA CONST'N GUARNICIÓN CANTONERA

CENTRAL

NOTA N.º 093

14 SEPTIEMBRE 2017

MARCO N.º 1: SE TIENE VISTA CUBETA MET. 1.20 M/ LA COLUMNA, SE COLOCÓ CUBETA P/HUCCO Y SE COLOCÓ C/CONCRETO $F'_{c}=400 \text{ kg/cm}^2$ T.M.N. 3/8 LADO DERECHO

- SE REALIZAN TRABAJOS EN EL CANTONERA CENTRAL LADO NORTE Y CONST'N GUARNICIONES, Y LAVADEROS DE CONCRETO
- SE DEMUELE BASE CONCRETO REFORZADA EN LA RAMPA SALIDA

NOTA N.º 094

15 SEPTIEMBRE 2017

CLARO PILA N.º 5 - PILA N.º 6: HOY SE ACERCARON Y SE REALIZÓ EL MONTAJE (PREVIA COLOCACIÓN DE NEOPRENOS) DE 6 PULAS DE VIGAS DE CONCRETO AASHTO TIPO II PREFABRICADAS PROTEGIDAS (TODO BIEN)

- SE COLOCÓ TUBO P/DRENAJE 36" P/DRENAJE PLUVIAL DEL CONALUP JUNTO E-8 (P.U. EXTRA)
- SE COMPACTA Y AFINA DESPLANTE EN R. SALIDA
- SE TUBO Q' DEMOLER MURO CANCHA FUTIBOL RAPIDO CONALUP P/ACOMODAR LA AGUA (SE REPARA C/LA OBRA (P.U. EXTRAORDINARIO))

NOTA No 095

18 SEPT 2017

- SE CONTINUAN TRABAJOS DE ARMADO LIMBRADO Y COLADO DE BARRERA CENTRAL CAMALLON DEL PERIF DE LA JUVENTUD (L. NORTE)

- LUVIA P/LA TARDE.

- SE CONTINUA COLADO COLUMNA 1ER MARCO No 1 y CONCRETO $f'_{c} = 400 \text{ kg/cm}^2$

MARCO PREFABR N.º 1 - SE TRABAJA EN EL HABILITADO Y ARMADO ALERO REFUEZO EN LA MESA DE PREFABR A UN VISO LATERAL

[Signature]

NOTA No 096

19 SEPTIEMBRE 2017

- HOY SE REALIZO EL MONTAJE DE LAS 6 PIRAS DE TRABES DE CONCRETO AASHTO TIPO II DE 35 M EN EL CLARO DE LA PIRA No 6 A LA

PIRA No 7 (TODO CORRECTO) PREVIAMENTE SE COLOCARON DOS APOYOS DE NEOPRENO MOVILES Y FIJOS

- SE CONTINUAN TRABAJOS ARMADO Y LIMBRADO CABEZAL PREFABRICADO P/EL MARCO No 1

[Signature]

NOTA No 097

20 SEPT. 2017

- SE CONTINUO EL MONTAJE DE TRABES DE CONCRETO, SE MONTARON LAS 6 PIRAS DEL CLARO DE LA PIRA No 7 AL ESTEIR No 8
- SE TRABAJA EN AFINES Y LIMBRADO

DADA DE DESPLANTE P/MOROS M.C EN LA RAMPA DE SALIDA.

- SE CONTINUA COLADO BARRERA CENTRAL EN CAMALLON PERIF JUU

[Signature]

NOTA No 098

21 SEPT 2017

- SE COLARON 2 TRABES AASHTO PIZIZAMO EJE 0 AL EJE 1

- SE CONTINUA ARMADO Y LIMBRADO CABEZAL PREFABRICADO P/EL MARCO No 1

- SE PINTAN 2 PIRAS VIGAS METALICAS

- SE COLOCARON APOYOS TETRA MARCO No 2 MARCO No 3

[Signature]

Fecha:

No.

032

NOTA N. 099, 23 SEPT 2017

- HOY SE RECIBIO EL ARMADO Y LIMPIADO Y SE PROCEDE A REUNIR EL COLADO DEL CABLEZAL PREFABRICADO PARA EL MURDO No 1 (P.U. EXTREMO)
- HOY SE APLAZARON A LA OBRA LAS 2 PRAS DE VIGA METALICA P/EL CLARO 2-3 VIGA 1 PARA REALIZAR LA CONEXION MECANICA PREVIA AL MONTAJE

NOTA No 100, 25 SEPT 2017

- HOY SE COLA TRAMO DADA P/ DESPL MURDO M.E. P SALIDA LADO IZQUIERDA
- SE CONTINUAN TRABAJOS FABRICACION DE VIGAS METALICAS EN TALLER.
- SE TRABAJA EN LA COLOCACION TENSIONES, ARMADO, LIMPIADO Y COLADO P/INFRAUMAS EN VIGAS CONCRETO CLARO 5-6, 6-7 y 7-8, SE COLOCAN LAMINA P/LIMPIAR MURDO

NOTA No 101, 27 SEPT 2017

- RAMPA DE SALIDA: SE CONTINUA COLADO DADA DESPLANTE P/M. M.E., SE COLOCAN PANELES P/MURDO M.E. LADO DERECHO SE TRABAJA EN RELLENOS COMPACTADOS
- SE CUELA DADA P/ BARRERA CONCR P/LA No 4
- SE TRABAJA CONEXION MECANICA VIGAS 2-3 No 1
- SE CONTINUAN RELLENOS Y IMPRESI BASE LADO NORTE

NOTA No 102, 29 SEPT 2017

- SE TRABAJA COLOCACION METALICA EN CLARO P/LA No 7 - ESTRIBO No 8
- P SALIDA: SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE PANELES P/MURDO M.E. Y FORMACION DE TERRAPLEN
- SE CONTINUAN TRABAJOS DE CONEXION MECANICA VIGA No 1 CLARO 2-3 (SE DETALLA PERFORA)

CONTINUA EN EL LIBRO No 2

Libro N. 2 : DE LA BITACORA DE OBRA DE
LA CUAZA CANTERA - PERIF. DE LA JUVENTUD

NOTA No 103:

02 OCTUBRE 2017

- RAMPA DE SALIDA - SE CONTINUAN TRABAJOS DE COLOCACION DE PANELES Y COLADO DE DALA DE DESPLANTE.
- SE COCOCO CARPETA ASFALTICA 8"cms T.M.A. 3/4" EN AMPLIACION 4ta CARRIL EN PERIF. JUV - NORTE
- SE CONTINUAN TRABAJOS DE ARMADO, SOLDADURA Y FONDEO PREVIU SAND BLASTEO EN VIGAS METALICAS CLARO 3-4.

NOTA No 104

04 OCTUBRE 2017

- SE CONTINUAN TRABAJOS DE COLOCACION DE LAMINA P/METALICA EN CLARO PILA No 7 - E - 8.
- RAMPA DE SALIDA: SE CONTINUAN TRABAJOS DE COLOCACION DE PANELES P/MURO M.E, Y SE RELENA Y MATERIAL CALIDAD SUBIZANTE
- CUBRADO, ARMADO Y COLADO DIAFRAGMAS CLARO (5-6). Y CONCRETO FIC=280 kg/cm²
- SE COLUBN LOS TENSORES EN DIAFRAGMAS
- SE CONTINUA LA FABRICACION DE VIGA METALICA

NOTA No 105

06 OCTUBRE 2017

- SE CONTINUAN TRABAJOS DE PAVIMENTACION P/4to carril en cañacion CENTRAL PERIF. LADO NORTE
- R. SALIDA: Se continua Colocación de Paneles y Formacion terraplen P/ MUROS M.E
- LOSA TIRAMO 7-8. SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE ALERO DE REFUERZO.
- SE CONTINUA FABRICACION VIGA METALICA (Se claufonza por parte del Suddirector tono de color de la Pintura de acabado de la Viga Metalica), se inicio el Pintado
- Se programa P/ la Proxima Semana montaje 1ra Viga CLARO 2-3.

NOTA N. 106

09 OCTUBRE 2017

- SE TRABAJA EN LA CONEXION VIGAS MET. CLARO 2-3 MECANICA DE
- SE TRABAJA EN COORDINACION CON LA CFE P LIBERAR CABLES SERVICIOS DE MEDIA TENSION P/ PODER COLOCAR LAS CURVAS P/MONTAJE
- SE TRABAJA EN UNA LINEA DESEA PROVISIONAL DE MEDIA TENSION P/ ALEJAR LAS LINEAS (P.D. EXTRAORDINARIO), Y SE AUTORIZA AL CONTRATISTA REALIZAR PUNTA LUZ P/NO INTERRUPTIR SERVICION DE ENERGIA A LA SUBARU Y A LA CLOSONERA (Ambas ubicadas en la lat. del Perif), frente a la zona del montaje.

NOTA N. 107

10 OCTUBRE 2017

- SE COLOCAN APOYOS TETRON EN MARCO No 2 y MARCO No 3.
- SE TRABAJA EN LINEA MEDIA TENSION PROVISIONAL P/ PODER REALIZAR MONTAJE VIGA No 2 TRAMO 2-3
- LOGO SUPERIOR CLARO: PILA No 7 - ESTR. 8 - Se termino de colocar acero de refuerzo y curvas, y se procedio a realizar el colado con concreto f' = 180 kg/cm². (PUNTEADO).
- PILA No 4: Se termino de compactar base y se imprimio tramos CARPETA S/ PERIF POR REPONER.
- ESTA TODO LISTO P/ MONTAR MAÑANA VIGA 1 - CLARO 2-3 (Curvas, Lineas, C.F.E., CABLES, ETC.)

NOTA N. 108

11 OCTUBRE 2017

- CLARO 2-3: Hoy SE REALIZO EL MONTAJE DE LA VIGA No 1, SE COLOCÓ S/ LAS PLACAS CURVA, SE PUNTEARON Y SE SOPORTO S/ MADERA, TAMBIEN SE LE COLOCÓ PUNTAL AL CENTRO P/ QUE NO CURTE LA VIGA POR LA CURVA
- SE TIRO CARPETA EN LOS 2 TRAMOS DEL PERIF ADYACENTE A LA PILA No 4

NOTA N. 109

12 OCTUBRE 2017

- CONTINUA SUMINISTRO DE PLACA A-SO PARA LA FABRICACION DE VIGA METALICA AL PATIO DE FABRICACION.

- SE CONTINUA HABILITADO Y ARMADO ACERO DE REFUERZO PARA LA LOSA SUPERIOR TRAMO APOYO 6-7.

- RAMPA DE SALIDA - SE CONTINUAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION M.E Y LA FORMACION DE TERRA PLEN

- SE TRABAJA EN LA APLICACION DE SOLDADURA EN PLACAS CUNA VIGA (1) TRAMO 2-3

- SE ORDENA AL CONTRATISTA QUE TODO EL PERSONAL QUE TRABAJE EN ALTURA DEBEA CONTAR CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD NORMAL MAS ARIAS DE SECC.

NOTA N. 110

13 OCTUBRE 2017

- SE TRANSFERIDA AL PIE DE OBRA VIGA N. 2 TRAMO 2-3 CON EL APOYO DE VEREDAS, EN SUS 2 SECCIONES PARA REFORZAR LA CONEXION MECANICA.

- SE ORDENA AL CONTRATISTA MANTENER EL SENSILLAMIENTO PREVENTIVO EN BUENAS CONDICIONES

- SE TERMINO ARMADO LOSA SUPERIOR TRAMO 6-7

NOTA N. 111

14 OCTUBRE 2017

- HOY SE REFORZO EL CORDO DE LA LOSA SUPERIOR TRAMO 6-7 CON CONCRETO $f'_{c} = 280 \text{ kg/cm}^2$

- SE ELABORO ESTIMACION Y SE FIRMO LICENCIADOS ESTIMACION N. 8 CON MONTO \$ 3'300,958.56 MAS IVA

NOTA N. 112

16 OCTUBRE 2017

- SE CONTINUAN TRABAJOS DE FABRICACION DE VIGA METALICA TRAMO 3-4. Y SE TRABAJA

- EN LA CONEXION MECANICA DE LA VIGA N. 2 TRAMO 2-3 (SECCION 1-2)

- A LA FECHA AUN NO SE DEFINE EL PROYECTO ESTRUCTURAL DEL TRAMO ENTREGA 0-1

Nota No 113

17 octubre 2017

- Se termino conexion mecanica y se realizo el montaje de la viga No. 2 del tramo 2-3 (previamente se colocaron las pls luna), se aludo con madera y tambien se coloco punta provisional por la curvatura de la viga, se solda a las pls luna.
- Pampa salda: se continua con paneles y bandos p/muros y.t. y se realiza formacion del terraplen.

Nota No 114

18 octubre 2017

- MARCO No 1: se trabaja en la preparacion de los huecos del caberal prefabricado y de las columnas previo al montaje del mismo.
- Viga METALICA tramo 2-3: se colocan los diafragmas en los apoyos No. 2 y No. 3, se ajustan y se puntean.
- Se continua la fabricacion de viga METALICA, SAND BLASTEO Y ANTICORROSIIVO, ASI COMO PINTURA ACABADO FINO.

Nota No 115

19 octubre 2017

- Hoy se cerro la lateral de la cancha y perfil de la juventud (frente a la Agencia SUBORCA) EN COORDINACION CON VIALIDAD, CON EL FIN DE REDUZIR EL MONTAJE DEL CABEZAL DE CONCRETO PREFABRICADO A SU POSICION EN LAS COLUMNAS DEL MARCO No. 1, se monto y se colo el hueco p/intercar - columna - cabzal en columna, con concreto $f'c = 400 \text{ kg/cm}^2$ TMA 3/8" terminandose hoy como a las 12:00 PM.

Nota No. 116

20 octubre 2017

- Losa superior tramo apoyo No 5 - No 6: se entrego al contratista el detalle del refuerzo en el volado del lado derecho (Realizado por proyectista Portulo y Young)

NOTA No 117 21 OCTUBRE 2017

CLARO TRAMO PILA N. 5 - PILA N. 6. SE TERMINO LA COLOCACION DE CIMBRAS Y ALERO DE REF, SE REVISO Y SE PROCEDE A COLAR LA LOSA

SUPERIOR Y CONCRETO $F'_{c} = 280 \text{ kg/cm}^2$

- SE CONTINUAN TRABAJOS DE FABRICACION VIGA METALLICA P/LA SUPERESTRUCTURA, SE FABRICAN C.V. PRINCIPALES P/ TRAMO VIGA 2-3

- SE PROCEDE A COORDINARSE CON VIALIDAD

P/EL CUERPO DEL CPO. PPA DEL PERIFERICO SENTIDO NORTE SUR, (ADENAS SE PUBLICA EN DIFS. MEDIOS DE COMUNICACION), SERA EL PROX DIA 26 OCT.)

- SE ENTREGA DISEÑO DE LONAS PROVISIONALES PARA INSTALARLAS EN SEÑALES ELEVADAS, CON EL FIN. DE ANUNCIAR DESVIOS PROVISIONALES (SOLICITADO POR VIALIDAD) AL CONTRATISTA PARA SU FABRICACION, COLOCACION Y RETIRO CUANDO SE LE ORDENE (P.U. EXTRAORDINARIO), EL CUERPO DE LOS CARRILES CENTRALES DEL PERIF SERA EN LOS SIG. PERIODOS

- DEL 27-29 OCTUBRE 17 (VIGA No 1) TRAMO 3-4

- DEL 2-05 NOVIEMBRE 17 (VIGA N. 2)

Y DIAFRAGMAS) ✓

SE FABRICAN LOS DIAFRAGMAS ADICIONALES CENTRALES SOLICITADOS POR EL PROYECTISTA (P.U. EXTRAORDINARIO).

- LAS LONAS SE COLOCARAN EN LOS LUGARES Y DISEÑO ENTREGADOS AL CONTRATISTA Y EN AMBOS SENTIDOS (P.U. EXTRAORDINARIO)

- EL C. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y EL DELEGADO DE VIALIDAD SOLICITARON SE COLOQUE SEÑALAM PROVISIONAS P/LOS CUERPOS, EL CUAL ES EL SIGUIENTE:

- SEÑAL DPC 30X122 METALLICO 130 PZAS

- BARRERAS DE PLASTICO NARANJAS - 80 PZAS

- LAMPARAS DE DESTELLO SOLAR - 30 PZAS


ESTE SEÑALAM, DEBERA ESTAR COLOCADO Y LISTO P/LOS CUERPOS DEL PROX 27 OCT. 17.


(CONCERTOS EXTRAORDINARIOS, PRESENTAR P.U. EXTR), SE SOLICITO AL CONTRATISTA.

- SE DINTAN Y DETALLAN VIGAS No 1 y 2

DEL TRAMO 3-4 (CRUCE DEL

Periferico de la Juventud).





NOTA No 118

23 OCTUBRE DEL 2017

- PANPA SALDA: se continua colocación de paneles y anclajes para muros M.E, se continúa el relleno o formación de terraplen en área de Muros.
- SE CONTINUAN TRABAJOS DE FABRICACION DE VIGAS METALICAS, ASI COMO SANDBLASTEO, APLIC. PINTURA ANTICORROSIVA Y LA PINTURA ESMALTE ACABADO FINAL.
- SE TRABAJA EN EL DETALLADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO (Chaleado).

NOTA No 119

24 OCTUBRE 2017

- SE COLO' CIRCUIT EN BASE DE LOS APOYOS TETRON DE LA PILA No 4, (Preula Instalacion de los Apoyos).
- SE PUBLICA Y NOTIFICA A LOS COMERCIANTES DE LA ZONA CERCANA A LA LATERAL NORTE SUR DE CANTERA AL SUR, EL CIERRE PARA MONTAR VIGAS DE CONCRETO AASTHO CLASO 1-2
- SE REALIZAN TRABAJOS DE LIMPIEZA 8/ CARRETES CENTRALES PERIF DE LA JUVENTUD
- SE PREPARAN LONAS, SEÑALAMIENTO Y SE PUBLICA EN MEDIOS CERRC PERIF. PROGRAM.

NOTA No 120

25 OCTUBRE 2017

- SE CERRA LATERAL NORTE SUR DE CANTERA, (frente a la SUBARU), AL TRAFICO VEHICULAR EN COORDINACION CON VIALIDAD.
- HOY SE REALIZO EL MONTAJE DE LAS 6 TIRAS DE CONCRETO AASTHO TIPO V, PREFABRICADAS, PARA EL CLASO 1-2, PREVIAMENTE SE COLOCARON LOS NEOPRENOS, SE TRABAJO TODO EL DIA Y SE ABRIÓ AL TRAFICO EN LA NOCHE.
- SE ALCARA QUE SE FABRICAN 8 PILAS DE CUÑAS SOBRE LOS APOYOS TETRON, POR MODIFICACION A LAS PENDIENTES TRANSVERSALES

Fecha

Folio

039

NOTA N. 121

26 OCTUBRE 2017

- CLARO 1-2: SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE TENSORES, CIMENTADO Y ARMADO DE DIAPHRAGMAS, SE COLO LAMINA P/CIMENTA MUERTO P/LA SUPERIOR
- RAMPA SALIDA: SE CONTINUA COLOCAR PANELES P/MUROS N.E Y FORMACION DE TERRAPLEN.
- SE COLOCA NUEVO DE REFORZO P/ARMADILLO PARA PISO EN CLARO 5-6
- ESTA VISTAS LAS ZONAS DE AVISO P/DESVIOS, ASI COMO EL SEÑALAMIENTO SOLICITADO P/CLAROS POR LA NOCHE EN COORDINACION CON LA UNIDAD.

NOTA N. 122

27 OCTUBRE 2017

- SE INICIO TRASLADO DE LA VIGA METALICA N. 2 DEL CLARO N. 3-4, EN 2 SECCIONES,
- SE CERRO EL PERIF DE LA JUVENTUD A LA ALTURA DE LA AD. DE LA CANTERA EN LOS 2 SENTIDOS A LAS 4:00 AM, AMANECIO YA CERRADO.
- SE REALIZARON HOY MANIOBRAS P/EMPATAR LAS 2 SECCIONES DE LA VIGA, SE INICIO LA CONEXION MECANICA ATORNILLADA EN PISO (PLACAS, Y TORNILLOS) DE ALMAS Y PATINES, LAS 2 PLAS JUNTAS ABREAN EL CUERPO N-S DEL PERIF Y PARTE DEL S-R, PERO POR LAS GRUAS Y POR SEGURIDAD SE DECIDIO CERRAR AMBOS SENTIDOS
- SE TRABAJO CORRIDO DURANTE EL DIA Y SE TRABAJARA IGUAL DURANTE LA NOCHE P/NOTAR TIEMPOS.
- EL TRAFICO ESTA CIRCULANDO POR LAS LATERALES DEL PERIF Y EN EL CRUCE C/ CANTERA ES UN CAOS, LA UNIDAD ESTA PROYANDO, PERO ES MUCHO EL TRAFICO

NOTA N. 122

28 OCTUBRE 2017

- MONTEJO VIGA N. 3, CLARO 3-4: SE CONTINUA CON EL CIERRE PERIF. AMBOS SENTIDOS EN CPO. PRAL,
- SE CONTINUA COLOCACION TORNILLOS, APLICACION TORQUE Y SOLDADURA OREJAS P/EL TRAJE,
- SE INICIO MANIOBRAS P/ACERCAR LA VIGA CONECTADA
- SE TRABAJA DIA Y NOCHE CORRIDO
- MAÑANA SE REALIZA EL MONTAJE

NOTA N.º 123

29 OCTUBRE 2017

- Se continúan trabajos de preparación p/montaje Ulan N.º 1 (2 secciones) tramo 3-4. Se trabaja torque tornillos de la conexión de campo, así como la coloc. y soldadura del WT. Se colocan y soldan orejas p/5mk. (Se hacen pruebas p/el balance, se utilizarán 3 alams de forma simultánea y coordinada, se colocó la placa cuña y se soldó al tetron.
- Se indicó al contratista revisar la seguridad en la maniobra (arneses al personal, chalecos, cascos etc.).
- Se acercó la Ulan a su posición y se realizó el montaje a las 11:40 AM APROX.
- Se trabaja en la conexión mecánica de la Ulan montada y la montada, así como, soldadura de la placa cuña a la Ulan. Se colocan soportes (cuñas provisionales de madera y puntal p/evitar el giro. Se trabaja corrido para abrir mañana antes de las 6:00 AM.

NOTA N.º 124

30 OCTUBRE 2017

- Se terminó la conexión mecánica en campo de la Ulan N.º 1, tramo 3-4. Se puso torque, se soldó el puntal, se dio N.º 80 para soldar arcos a las 5:00 AM. Se repintaron carriles sentido Norte-Sur.
- Se procedió a retirar arcos y se abrió al tráfico los carriles centrales del perf de la Juv. y cantera a las 6:00 AM.
- Se realizan preparativos p/el montaje de la Ulan N.º 2 tramo 3-4 (operativo igual a la N.º 1) (Cierre perf días 02-05 NOVI 18).
- Se trabaja detallado de soldadura y pintura acabado final Ulan N.º 2 tramo 3-4.
- Se trabaja cuando diáfanas en Ulan N.º 2.

NOTA N.º 125

31 OCTUBRE 2017

- CON ESTA FECHA SE FIRMAN GENERADORES Y SE EMBOCA ESTIMACION N.º 9, POR UN MONTO DE \$5'009 002.48

- SE COORDINA Y UNIFORMA CIERRE DEL PERIF. JUV. AMBOS SENTIDOS A PARTIR DEL 01 NOV POR LA NOCHE (SE INSTALAN LONAS ADICIONALES Y SE PUBLICA EN MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS), ASI COMO A LOS VECINOS DE LA ZONA VERBALMENTE)

- SE COLOCA CAMBIO MET. P/METALOSA TRAMO APOYO 1-2.

- SE CONTINUA LA COLOC. DE PANELES Y RECCIONES P/MUROS ME. EN RAMPA DESARROLLO

NOTA N.º 126

01 NOVIEMBRE 2017

- SE TRABAJA EN DETALLADO DE LAS 2 PISAS DE LA VIGA METALICA N.º 2 TRAMO APOYO 3-4

- SE REALIZAN PREPARATIVOS PARA MANIOBRAS CHUCAS EN LA NOCHE Y EL CIERRE DE AMBOS SENTIDOS DEL PERIF. DE LA JUVENTUD.

- SE DETALLA TETRA EN PILA 4 Y SU PLACA CUNA

- ESTAN LISTOS PERSONAL, MATERIALES, HERRAM. TORNILLERIA, MAR DE SOLDAR Y TODO LO NECESARIO.

- SE CERRO A LAS 10:00 PM. EL PERIF. EN AMBOS SENTIDOS EN COORDINACION Y UNIFORMIDAD

- SE TRANSLADAN 2 VIGAS AL FUERTE DE LA OBRA

NOTA N.º 127

02 NOVIEMBRE 2017

- EL DIA DE HOY SE TRABAJA EN EL ACORDADO DE LAS 2 PISAS VIGA N.º 2 TRAMO 3-4, SE INICIO LA CONEXION MECANICA DE CAMPO, SE COLOC. PLS DE CONEXION Y TORNILLO, SE TRABAJA CORRIDO,

- EL PERIFERICO ESTARA CERRADO HASTA EL DIA 05 NOV

- EL TRAFICO CIRCULA POR LAS LATERALES DE FORMA SATURADA, HAY APOYO DE UNIFORMIDAD

- EL TORQUE DE LAS CONEXIONES MECANICAS SE ESTA VERIFICANDO ANTES DEL MONTAJE

- SE COLOCA Y SOLDA WT DE LA CONEXION

- SE TRABAJA A RITMO ACCELERADO

NOTA No 128

03 NOVIEMBRE 2017

- SE CONTINUAN TRABAJOS EN LA CONEXION MECANICA DE CAMPO VIGA 2.1 SE TOCAUDA, SE VERIF. TORQUEO, SE COLOC. Y SUDO WT, SE SUDAN OPEANS EN DIFERENTES POSICIONES P/BALANCEAR LAS VIGAS UNIDAS, SE HACEN PRUEBAS PROVIAS DE BALANCE P/IRAJE.

- EN LA NOCHE SE REALIZO EL MONTAJE CON TODO CUIDADO, SE ADUNTA LA VIGA, SE ACUNTA C MADERA EN LA PIA N.4, SE INICIO TRABAJOS DE ALINEAMIENTO Y COLOC DE LA CONEXION MECANICA A LA VIGA YA MONTADA, SE TRABAJA CORRIDO Y DOBLE TURNO EN LA COLOC. PLS DE CONEXION Y TORQUEO, SE HAN LOS PONTALES

NOTA No 129

04 NOVIEMBRE 2017

- SE CONTINUAN TRABAJOS CON LA CONEXION MECANICA (Se torquea y Solder WT)

- SE COLOCA Y SODA DIAFRAGMA EN LA PIA N.4

- SE DA LA ORDEN AL CONTRATISTA QUE POR SOLICITUD DEL PROYECTISTA SE SE COLOCARAN DIAFRAGMAS INTERMEDIOS ENTRE VIGAS EN LOS 3 CLAROS, SE FABRICAN P/INSTALAR LOS DEL CLARO 2-4. ANTES DE LA APERTURA (P.U EXTRAORDINARIO)

- SE TRABAJA EN COORDINACION Y UNIDAD P/COLOCAR LAS Y BARRERAS P/DAR FLUIDEZ AL TRAFICO EN LAS RUTAS ALTERNAS (TRAFICO MAYOR POR LAS LATERALES)

NOTA No 130

05 NOVIEMBRE 2017

- CONTINUAN TRABAJOS EN VIGA MONTADA DE FORMA ALICARADA Y CONTINUA.

- SE TRABAJA EN LA SOLDADURA DE LOS DIAFRAGMAS ADICIONALES Y EN LA PLACA CUNTA

- SE ABRIÓ TRAFICO PERIF JUN SENTIDO SUR-NORTE A LAS 5:00 PM, SE CONTINUAN TRABAJOS

NOTA No 131 06 NOVIEMBRE 2017

- SE TRABAJO EN LA VIGA MONTADA CORRIDA Y SE TERMINO SOLDADURAS, TORQUE CONEX, APUNTALAMIENTOS, SE PROCEDE A DAR V.D. Y SE SOLTAN CIRCUAS SIN PROBLEMA, SE DESPEJO LOS 2 CARPILES EXISTENTES Y SE ABIERO AL TRAFICO EL PERIF JOV. SENTIDO NORTE-SUR A LAS 4:15 PM DE ADV (se cumplio el programa)

NOTA No 132

07 NOVIEMBRE 2017

- RAMPA SALIDA: SE CONTINUA LA COLOCACION DE PANELES Y ANCLAJES P/MUROS M.E, ADEMAS LA FORMACION DE TERRAPLEN.
- CLATO 1-2: SE TRABAJA COLOCACION DE LAMINA P/LOSA.
- SE PROGRAMA CUALIDAD Y SE ANUNCIA EN MEDIOS CIERRE PERIF DE LA JUVENTUD SENTIDO SUR-NORTE Y LATERAL SUR-NORTE P/MONTAJE VIGAS DEL APOYO 4-S.

NOTA No 133

08 NOVIEMBRE 2017

- SE CONTINUAN TRABAJOS DE FABRICACION Y PINTURA VIGAS METALLICAS P/TRAMO APOYO No 4 AL S.

- CONTINUAN TRABAJOS RAMPA SALIDA

NOTA No 134

09 NOVIEMBRE 2017

- SE CONTINUAN TRABAJOS DE APLICACION DE PINTURA EN LAS ZIGUAS METALLICAS DEL CIERRE TRAMO 4-S
- SE ESTABLECIDO CUALIDAD QUE SE CERRARAN SENTIDO AL SUR-NORTE PERIF (CPO PPAL Y LAT) MAÑANA A LAS 10:00 PM EL APOYO DE PATRULLAS.

NOTA N° 135

10 NOVIEMBRE 2017

- SE DA INFORMACION AL CONTRATISTA DEL MURO DE CONFINACION Y BARRANDA A CONSTRUIR EN LADO DETRÁS DEL TRAMO KM 0+540 AL 0+600
- SE ALCUMPA QUE EL TRAMO DE VALIDA DE SALIDA DE LA CARRETERA Y LA AMPULACION DE LA MV. LA CANTERA ENFRENTO, NO ESTABA CONTEMPLADO INCLUIRLOS EN ESTE CONTRATO, PERO SE ORDENA AL CONTRATISTA CONSTRUIRLO AL 100%
- SE CONTINUA CONSTRUYENDO MUROS N.E Y FORMACION TERAPIA EN R. SALIDA

- SE TERMINO ULTIMO 142 DEL CIERRE DEL PUENTE TRAMO 4-S, SE TRANSLOCARON A LA OBRA Y A LAS 10:00 PM DESPUES DEL CIERRE PERIF DEL SUR-NORTE, SE COLOCACION EN SU POSICION P/MAÑANA MANIOBRAS DE MONTAJE MAÑANA

NOTA N° 136

11 NOVIEMBRE 2017

- SE REALIZAN MANIOBRAS P/MONTAJE ULTIMO 142 TRAMO 4-S (CIERRE)
- SE REALIZO EL MONTAJE Y SE TRABAJA EN LA CONEXION MECANICA (PLS Y TORNILLOS) (se trabaja de forma continua) para poder montar mañana la No 1
- EL TRAFICO S/PERIF DE SUR A NORTE ES CAOTICO, PORQUE SE DESVIA S/MIRADOR Y AV. WASHINGTON, SIENDO INSUFICIENTE
- SE ESTUBO PUBLICANDO DIAS ANTES.
- VALIDAD SOLICITA MAS BARRERAS DE PLASTICO P/COLOCAR ANTES DEL LUGAR DE TRABAJOS
- SE ABRE RUTA PROVISIONAL P/CONALEY Y EL SALON BENESSI PARA SALIR A CANTERA RESULTANDO DE NOCHE ATRADA.
- SE TRABAJA HASTA NOCHE LA CONEXION MEC

NOTA No 137

12 NOVIEMBRE 2017

- SE TERMINO DE FORQUER LA CONEXION MOC DE LA VIGA No 2 TRAMO 4-S, SE SOLDÓ WT Y LA PLACA CUNA EN LA PLA No 5 Y SE PROCCEDIO A SALTAR CURVAS.

- SE TRABAJO EN MANIOBRAS DE MONTAJE DE LA VIGA No 1 TRAMO 4-S, SE COLOCÓ EN SU POSICION Y SE TRABAJO EN LA CONEXION MECANICA Y EN EL DIAFRAGMA PLA No 5.

- SE TRABAJA CORRIDO LAS 24 HRS

- TRAFICO MUY LENTO POR DESVIO

- SE ABRIÓ AL TRAFICO MAÑANA

NOTA No 138

13 NOVIEMBRE 2017

- SE CONTINUARON TRABAJOS EN LAS VIGAS NÚ 1 Y 2 ASI COMO EN DIAFRAGMAS TRAMO 4-S,

SE TORCUTO Y SOLDÓ WT Y DIAFR, SE

SALTARON CURVAS Y SE ABRIÓ AL TRAFICO

EL PERIF DE LA JUV (CPO PPOL Y LATERAL)

SENTIDO SUR - NORTE A LAS 5:38 AM.

- TRAFICO NORMALES A LAS 12 HRS DE CIRCULACION

PLA MAÑANA.

NOTA No 139

14 NOVIEMBRE 2017

- SE CONTINUAN TRABAJOS RAMPA SALIDA
- CONST'N MURO CONTENSION CONCR REFORZADO TRAMO 0+520 - 0+600

- SE CONTINUAN TRABAJOS VIGA MECANICA TRAMO 4-S, COLOC DIAFR Y SOLDADURA EN PLS CUNA.

NOTA No 140

15 NOV 2017

- SE FIRMAN AGENDERADORES Y SE ELABORA ESTIMACION No 10 POR UN MONTO DE \$2'336 515.71 ANS IVA

NOTA No 141

17 NOVIEMBRE 2017

- SE CONTINUAN TRABAJOS DE CONTIN RANPA SNUDA EN COLOP PANCLES PLUMOS M.E, ASI COMO LA FORMACION DE TERRAPLEN
- SE CONTINUAN TRABAJOS CIMENTADO Y COLADO (PREVIAMENTE) ZAPATA PLUMBO CONTENSION LADO DERECHO DESDE AL 0+600
- SE COLOCA NERO REFUERZO Y SE INICIA CIMENTADO GUARNICION PARAPETO TRAMO 7-8 LADO IZQUIERDO
- ULTIMA MENCION: SE CONTINUAN TRABAJOS APLICACION DE SOLDADURA EN DIAFRAGMA PILA 5 E INTERMEDIOS DEL 4-5 (Cerrado un carril de la lateral)
- SE CONSENTIRAN BARRERAS DE PLASTICO P/DESULOS, HAY FALTANTE Y MUCHAS DAÑADAS, ADENAS DE OTRO EQUIPAMIENTO PREVENTIVO FALTANTE (Cables met, lamp Destell)

NOTA No 142

20 NOVIEMBRE 2017

- DIA PERDIDO - (pero se trabajó)
- COLADOS MURO CONTENSION DESDE 0+600
- COLADO MURO PARAPETO L.S. DE PILA 7 - A E-8
- DEBIDO A LA NECESIDAD DE DEMOLIR MURO DE LA CANCHA DE FUTBOL RAMBIDO DE COMPLE, DICHA DEMOLICION FUE NECESARIA POR LA MANIOBRA P/MONTAR ULTIMA CONCR TRAMO 5-6, LA INSTITUCION PRESIONA P/SU RECONSTRUCCION, POR LO QUE SE ORDENÓ AL CONTRATISTA E INICIO LA RECONSTRUCCION DE DICHO MURO (P.U EXTRAORDINARIO)

NOTA No 143

21 NOVIEMBRE 2017

- PREVIAMENTE SE COORDINÓ C/VIALIDAD Y SE PUDIERON EL CIERPO TOTAL DE LA LATERAL N-S DEL PERIT DE CANTERA AL SUR (SE COLOCÓ SINTAM Y LONAS REQUERIDAS)
- SE CORPO A LOS 7:00 AM Y SE INICIO TRABAJOS EXCAVACION P/ EL DESPLANTE DE LOS APOYOS (A) Y (B) (ACCESO) Y EL PROYECTO MODIFICADO:
- SE TRABAJO TODO EL DIA EXC. Y SE COLOCA PLANTILLA DE APOYO (B)

NOTA N. 144

22 NOVIEMBRE 2017

- LATERAL CERRADA FRENTE A LA SUBIDA -

- SE TRABAJA EN APOYOS (A) Y (B) DEL

PUENTE

- SE COLO' PLANTILLA PARA (A)

- SE LIMPIA, ARMO Y COLO' ZAPATA PARA (B)

- SE CONTINUAN TRABAJOS SOLDADURA DIAPHRAGMAS

TRAMO 4-S



NOTA N. 145

23 NOVIEMBRE 2017

- SE INICIA TRABAJOS DE DEMOLICION DE GUARNICION

DE PARAPETO Y REMATE MURO M.C. EN EL

ACCESO AL PUENTE (TRAMO DE APOYO (A)

AL APOYO (B)

- SE CONTINUA TRABAJOS CONST'N APOYOS (A) Y (B)

A RITMO ACCELERADO



NOTA N. 146

24 NOVIEMBRE 2017

- SE ORDENA AL CONTRATISTA RELENAR EXCAVACIONES DE
LOS APOYOS A Y B / PIEDRA (MAT NO COMPACTABLE)
POR RAPIDEZ, POR LO CRITICO DE ABRIR A LA
BREVEDAD (EL TRAFICO ESTA MUY CRITICO) EN LA
ZONA DE CIERRE.

- COLO' ZAPATA APOYO (A)

- RELLENO / PIEDRA AP- (B)


- EL PROYECTISTA ESTRUCTURAL ENTREGO EL DETALLE
PLANTILLA LA VIGA METALICA C/LAS TRABES
DE CONCRETO EN EL APOYO MARCO 1 Y LA PLANTA N. 5
POR LA RASANTE RECTA DE LAS TRABES DE
CONCRETO. (P.L. EXTRAORDINARIO), SE LE
ENTREGO ASIMISMO AL CONTRATISTA.

- SE CONTINUAN TRABAJOS DE CONST'N

MUROS M.C. Y TERRAPLEO EN LA RAMPA

DE SALIDA

- SE ABRE LA LATERAL FRENTE A LA SUBIDA EN LA NOCHE



Fecha

048

NOTA No 147

25 NOVIEMBRE 2017

- SE CONTINUA LA RECONSTRUCCION DE MURO EN CANCHA FUTBOL RAPIDO DEL CONALEP. (JUNTO A LA PISO No 5)

- SE CONTINUAN TRABAJOS CONST'N. APOYOS A Y B

- SE TRABAJA DEMOLICIONES Y EXC P/CARPADOR EN ALISO A P.S (S/EN PUENTE EXISTENTE) (TRAMO APOYO A AL MARCO ①)

- SE INICIA TRABAJOS DE COLOCAR PLACAS EN ALMAS Y PANTO SUPERION P/NUCLAR 2017 TRAMO M2-M3

NOTA No 148

27 NOVIEMBRE 2017

- SE CONTINUAN TRABAJOS DE CONST'N. APOYOS A Y B, Y ADENAS EL CARPADOR EN DICHO TRAMO

- SE ACORDA QUE SE MODIFICO EL ARRENCAMIENTO DEL PUENTE EN EL ALISO PARA HACERLO MAS ILICHO Y SEGURO.

NOTA N. 149

30 NOV 2017

- SE FIRMO' GENERADORES ESTIMACION No 12 Y SE ELABORO' LA MISMA P/UN MONTO DE \$ 1'014.971.77

- SE CONTINUAN TRABAJOS TRAMO APOYO (A), (B) Y TRAMO M1-M2 (ALISO, CARPADOR)

- SE TRABAJA CIMENTADO, ARMADO Y COCADO CIMENTACION PARAPETO DEL TRAMO APOYO 6/8

NOTA No 150

01 DICIEMBRE 2017

- SE ELABORA CONVENIO POR MONTO Y PLAZO CON PERIODO HASTA EL 15 ENERO 2018 Y CON IMPORTE DE \$ 6'140.303.75. DE ACORDO A PRESUPUESTO PRESENTADO
