


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal *

RFC emisor *

RFC receptor *



Proporcione los dígitos de la imagen *

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CIA10122326A	CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA S DE RL DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
94A11E9C-0AD5-4D06-975F-DF8C63A68572	2017-07-14T11:08:18	2017-07-14T11:13:18	FMD100203JS7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$369,603.34	ingreso	Vigente	

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

"Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad de competente"



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 060/2017	CONTRATADOS
OBRA: CANALIZACION DE ARROYO Y AMPLIACION DE LA AVE CANTERA, TRAMO AV. WASHINGTON-PERIFERICO DE LA JUVENTUD	ESTIMACIÓN No. 1	\$ 14,531,231.21 CON IVA
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.	PERÍODO EJEC. DEL 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017	
CONTRATISTA: CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA S DE RL DE CV	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 369,603.34 CON IVA
RFC CIA101223 26A	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 369,603.34 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>OBRA NORMAL</u>	\$ 455,176.53	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 455,176.53	

--

DESCUENTOS	
0.2% D.I.F.	\$ 910.35
0.2% C.M.I.C.	\$ 910.35
SUMA DESCUENTOS	\$ 1,820.70
RESUMEN	
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 455,176.53
AMORT ANTICIPO	\$ 138,552.96
SUB-TOTAL	\$ 318,623.57
I.V.A.	\$ 50,979.77
TOTAL	\$ 369,603.34
(CON LETRA)	
(TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 34/100 M.N.)	
DESCUENTOS	\$ 1,820.70
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 367,782.64

AUTORIZO	ELABORO
ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS RESIDENTE D.O.P.M.	CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA S DE RL DE CV CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA JEFA DEL DEPARTAMENTO CONSTRUCCION URBANA	ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA SUB-DIRECTOR INFRAESTRUCTURA URBANA
Vo. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE: \$ 367,782.64
 (TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.) COMO PAGO A LA
 ESTIMACIÓN NUM. 1 CONTRATO No. 060/2017 POR LA CANTIDAD DE : \$ 14,531,231.21
 CATORCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 21/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
 CANALIZACION DE ARROYO Y AMPLIACION DE LA AVE CANTERA, TRAMO AV. WASHINGTON-PERIFERICO DE LA JUVENTUD

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 455,176.53

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 136,552.96

SUBTOTAL	\$ 318,623.57
IVA	\$ 50,979.77
TOTAL	\$ 369,603.34

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

I.C.I.C. DEL 0.2%	0.00
C.M.I.C. DEL 0.2%	910.35
D.I.F. DEL 0.2%	910.35
SUMA	1,820.70

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO	\$ 14,531,231.21
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 528,004.77
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 528,004.77
POR EJERCER	\$ 14,003,226.44

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 4,359,369.37
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 158,401.43
ACUMULADO ACTUAL	\$ 158,401.43
POR AMORTIZAR	\$ 4,200,967.94

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% D.I.F.

0.2% C.M.I.C.

ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 910.35	\$ 910.35
ACUMULADO ACTUAL	\$ 910.35	\$ 910.35

R E C I B I M O S

CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA S DE RL DE CV
 CIA101223 26A

Nº. CONTRATO:
080/2017

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.

OBRA: CANALIZACION DE ARROYO Y AMPLIACION DE LA AVE
CANTERA, TRAMO AV. WASHINGTON-PERIFERICO DE LA
JUVENTUD

CONTRATISTA: CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA S DE RL DE CV PERÍODO: DEL 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS	
Nº	IMPORTE

\$455,176.53

OBRA NORMAL

SUBTOTAL	455,176.53
I.V.A.	72,828.24
TOTAL	528,004.77



ARQ. EDUARDO ARBALLO M.
RESIDENTE



ING. VICTOR MIRELES VILLEGA
SUPERVISOR D.O.P.

OBRA: CANALIZACION DE ARROYO Y AMPLIACION DE LA AVE CANTERA, TRAMO AV. WASHINGTON-PERIFERICO DE LA JUVENTUD

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.

No. 060/2017
CONTRATO

CONTRATISTA: CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA S DE RL DE CV

ESTIMACIÓN No. 1
PERIODO: DEL 01/JUN/2017 AL 30/JUN/2017

No.	CONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
OBRA NORMAL									
									\$455,176.53

I.- PARTIDA									
1	PRELIMINARES								
1.3	E.P.-27	Retiro de defensa metálica de acero galvanizado calibre 12, de 3.81 m de longitud así como de los postes completos, incluye la recuperación del material y el traslado a la bodega del departamento de mejoramiento vial de la D.O.P. del municipio de chihuahua, maniobras, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	73	17.00	0.00	17.00	228.82	\$3,889.94
3	TERRACERIAS								
3.2	ESTRUCTURAS								
3.2.5	047-H-04-A)2	Suministro de acero de refuerzo, L.A.B. puesto en obra, varillas con límite elástico mayor o igual a 4200 Kg/cm² para los diferentes elementos estructurales del canal. Incluye: adquisición de materiales(Se pagaran volúmenes de proyecto puestos en almacén del lugar de la obra), volumen de desperdicio, cargas, descargas y almacenamientos dentro de la obra.	kg	141,640.00	25,583.14	0.00	25,583.14	17.64	\$451,286.59

ARQ. EDUARDO ARBALLO M.
RESIDENTE DE OBRA

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR

CONTRATO	060/2017
OBRA :	CANALIZACION DE ARROYO Y AMPLIACION DE AV. CANTERA, TRAMO DE AV. WASHINGTON-PERIFERICO DE LA JUVENTUD
CONTRATISTA:	
CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA S. DE R.L. C.V.	

Estimación	1 PERIODO	01/JUNIO/2017 AL 30/JUNIO/2017
------------	-----------	--------------------------------

[illegible]

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
CROQUIS 1.3	17
	
	TOTAL


ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR

ARQ. EDUARDO ARBALLO MALACHEVARRIA
RESIDENTE DE OBRA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 060/2017	
OBRA :	CANALIZACION DE ARROYO Y AMPLIACION DE AV. CANTERA, TRAMO DE AV. WASHINGTON-PERIFERICO DE LA JUVENTUD
CONTRATI:	
CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA S. DE R.L. C.V.	
No DE ESTIMACION:	1
PERIODO : 01/JUNIO /2017 AL 30/JUNIO/2017	
CROQUIS 1.3	

RETIRO DE DEFENSA METALICA		
CANTIDAD	UNIDAD	PZAS
17		

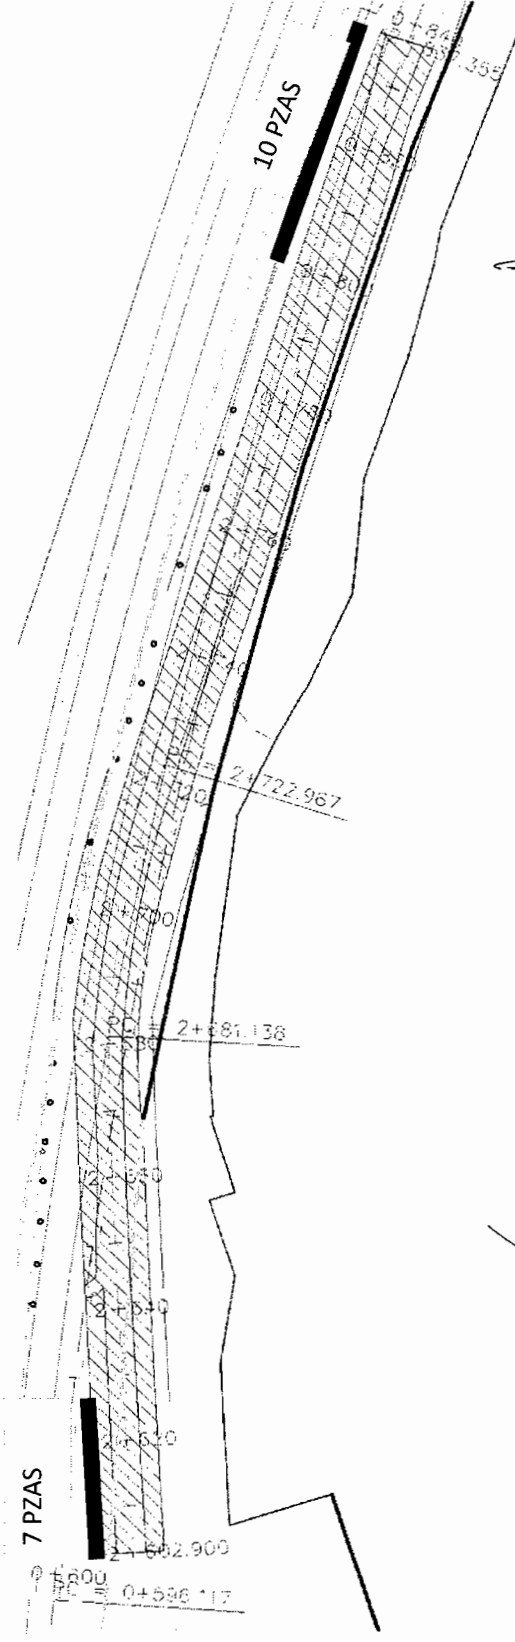


ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR

ARQ. EDUARDO ARBALLO MALACHEVARRI/
RESIDENTE DE OBRA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO :	060/2017	CONTRATISTA:	CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA S. DE R.L. C.V.
OBRA :	CANALIZACION DE ARROYO Y AMPLIACION DE AV. CANTERA, TRAMO DE AV. WASHINGTON-PERIFERICO DE LA JUVENTUD		

Estimación	1	PERIODO	01/JUNIO /2017 AL 30/JUNIO/2017
CONCEPTO	1.3		

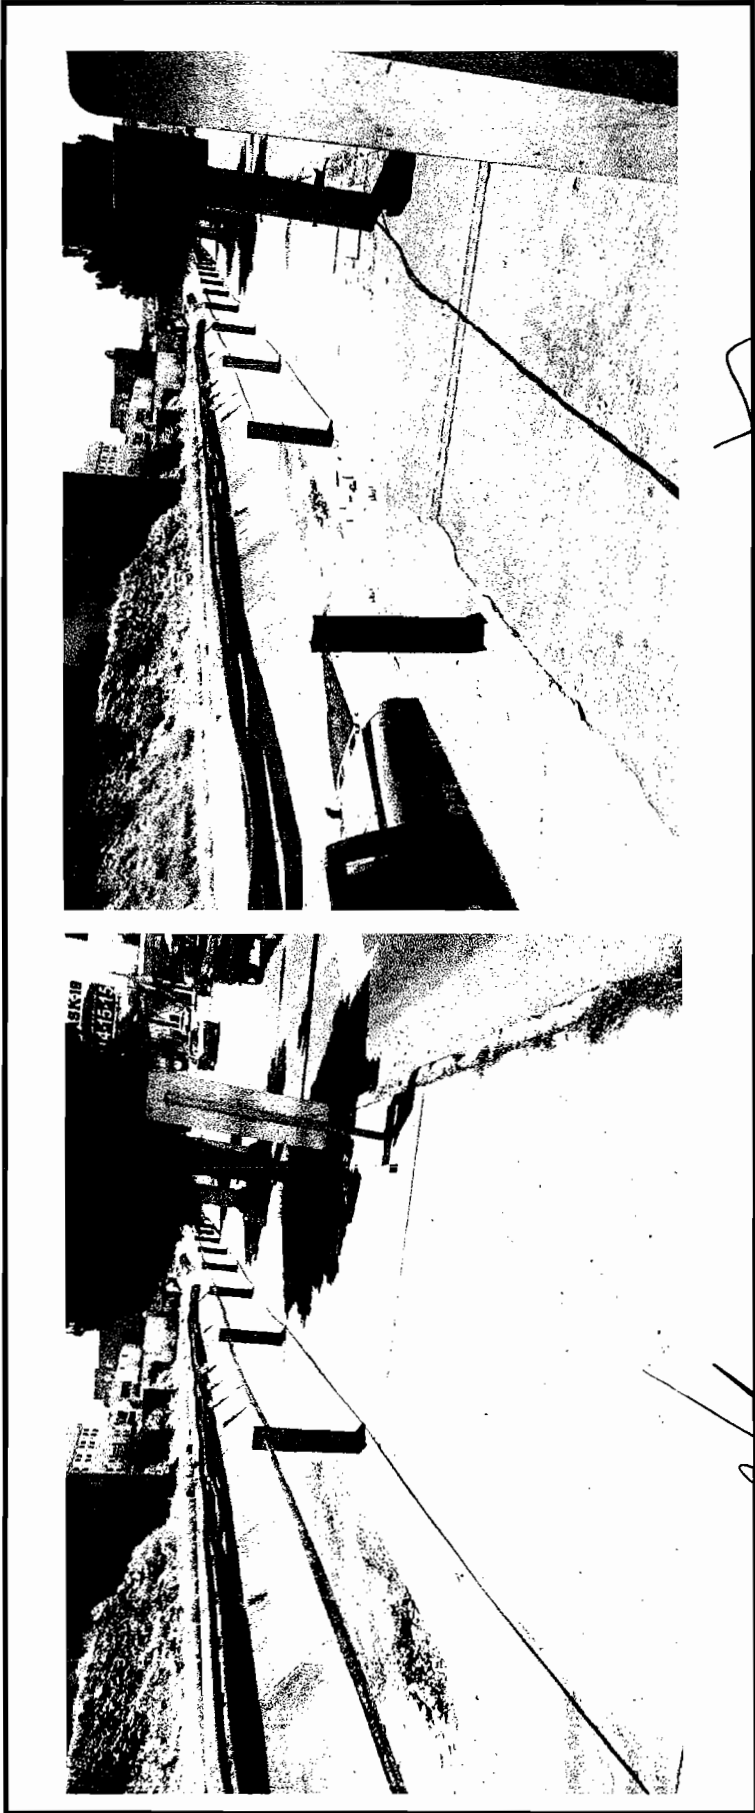


ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR

ARQ. EDUARDO ARBALLO MALACHEVARRIA
RESIDENTE DE OBRA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO :	060/2017
OBRA :	CANALIZACION DE ARROYO Y AMPLIACION DE AV. CANTERA, TRAMO DE AV. WASHINGTON-PERIFERICO DE LA JUVENTUD
	CONTRATISTA: CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA S. DE R.L. C.V.

Estimación	1	PERIODO	01/JUNIO/2017 AL 30/JUNIO/2017
CONCEPTO	1.3		

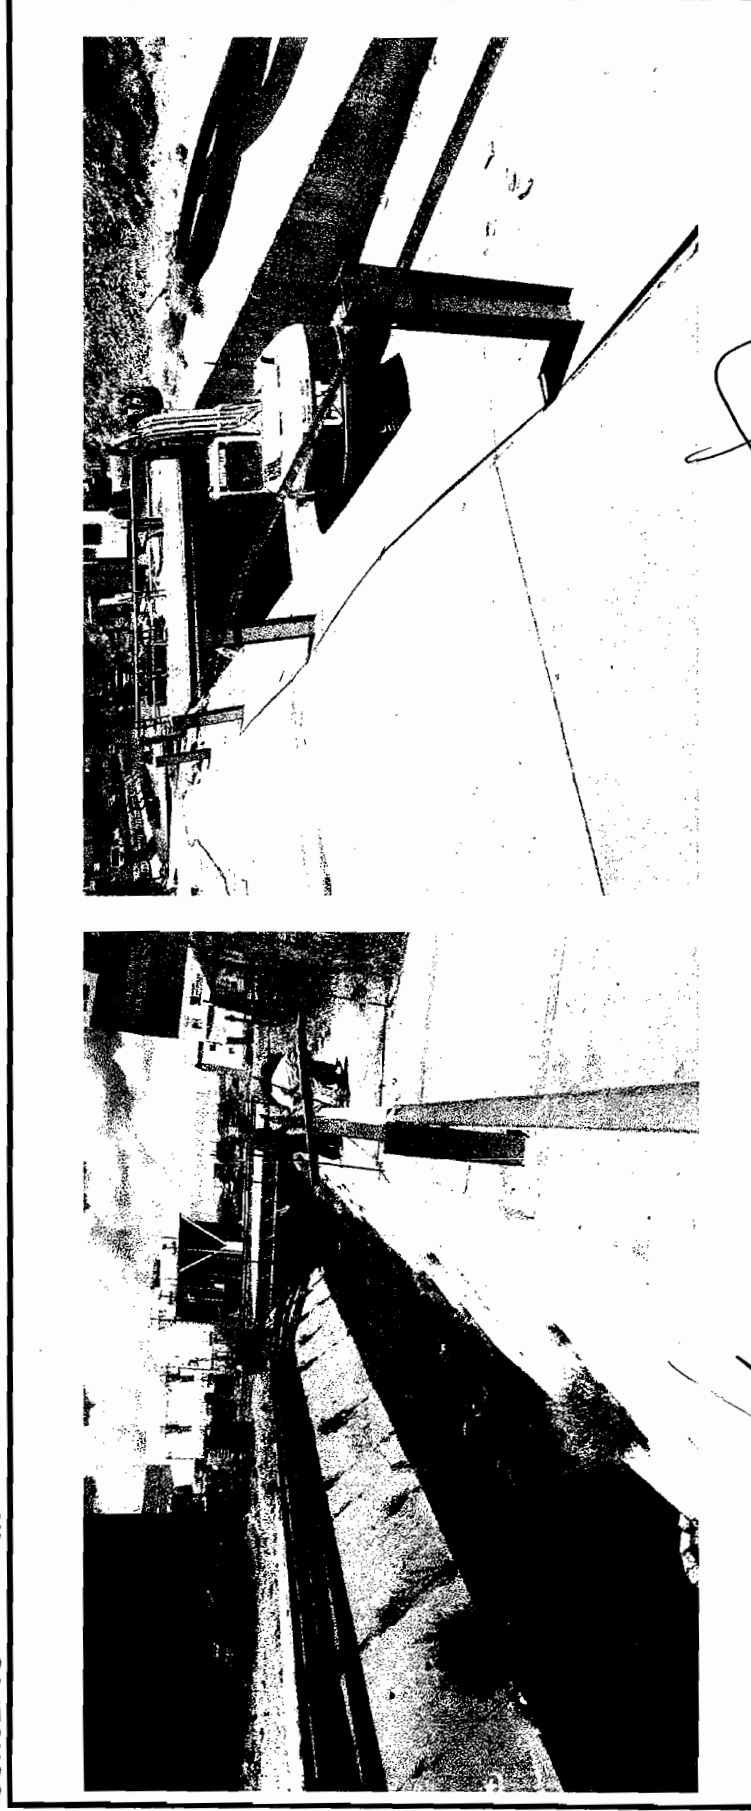

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR

ARQ. EDUARDO ARBALLO MALACHEVARRIA
RESIDENTE DE OBRA

CONTRATO	060/2017
OBRA :	CANALIZACION DE ARROYO Y AMPLIACION DE AV. CANTERA, TRAMO DE AV. WASHINGTON-PERIFERICO DE LA JUVENTUD
CONTRATISTA:	
CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA S. DE R.L. C.V.	

Estimación	1	PERIODO	01/JUNIO /2017 AL 30/JUNIO/2017
------------	---	---------	---------------------------------

[illegible]


~~ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR~~

ARQ. EDUARDO ARBALLO MALACHEVARRIA
RESIDENTE DE OBRA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO :	060/2017	CONTRATISTA:	CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA S. DE R.L. C.V.
OBRA :	CANALIZACION DE ARROYO Y AMPLIACION DE AV. CANTERA, TRAMO DE AV. WASHINGTON-PERIFERICO DE LA JUVENTUD		

Estimación	1	PERIODO	01/JUNIO/2017 AL 30/JUNIO/2017
CONCEPTO 3.2.5			

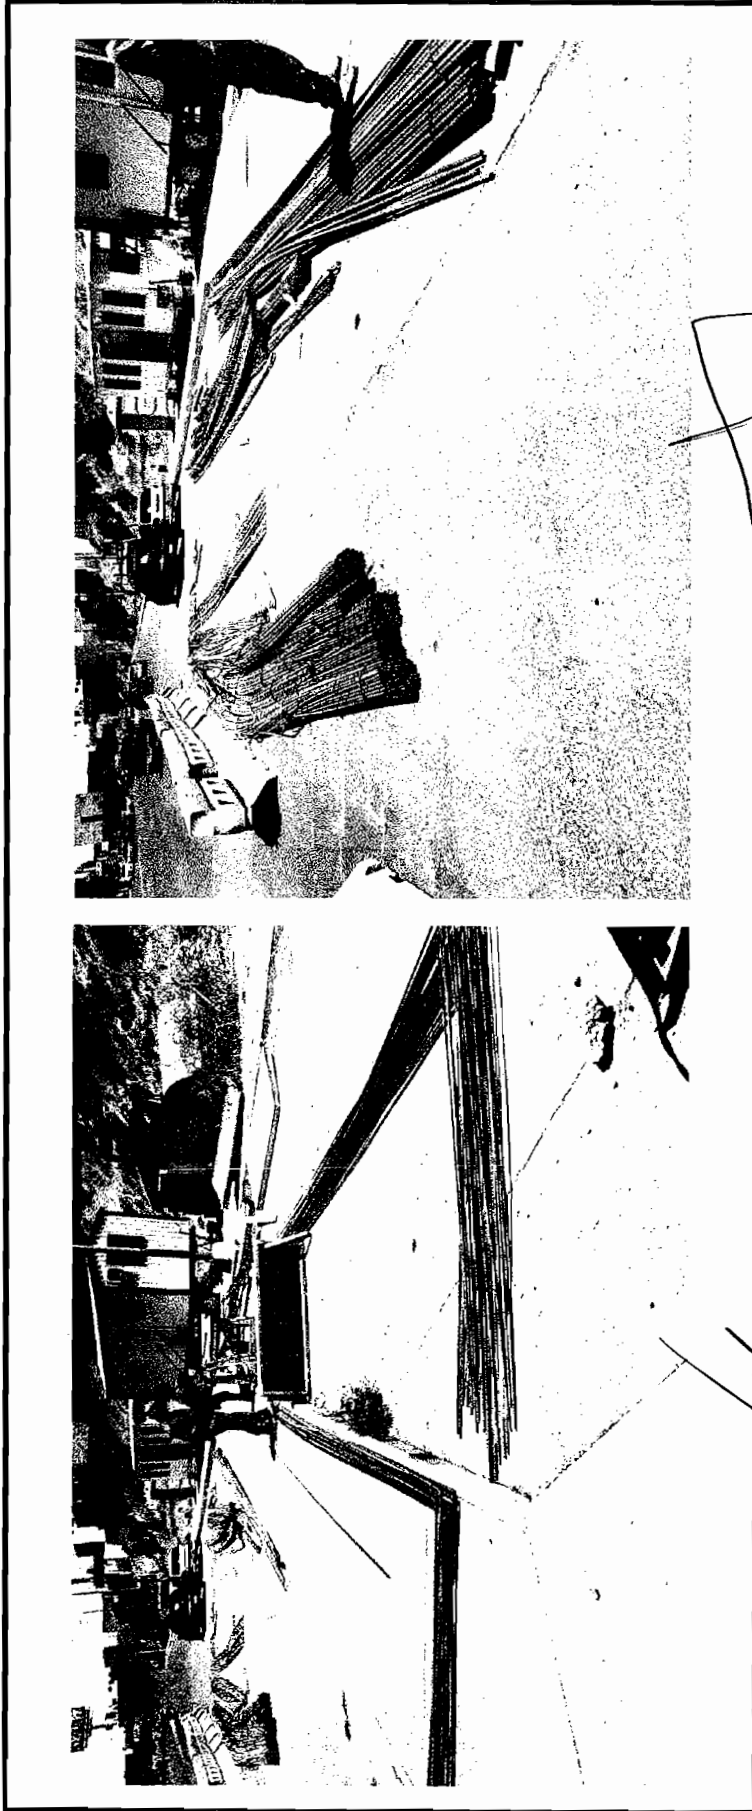

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR

ARQ. EDUARDO ARBALLO MALACHEVARRIA
RESIDENTE DE OBRA

Suc:CHIHUAHUA Dir. AVE. AGUSTIN MELGAR Col. Nombre de Dios
cp31150 Chihuahua, Chihuahua

Almacén: CHIHUAHUA

Documento: Factura - CHIFA150173

Nombre: CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA S DE RL DE CV

Dirección: PERIFERICO DE LA JUVENTUD SA Col. LA CANTERA Cp 31216

Forma de Envío: Entrega a Domicilio

Comentarios: OBRA CANALIZACION CANTERA.

Forma Pago: Ventas COD

RECIBE ING. JOSE MANUEL CARO DEL 614 1390860/ ING MARBELLA 614 3062054

Remision CHIA-212744

28-Jun-2017 10:36 a.m.

(CIA1012232)

Almacén	Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
1	12222243	7,156.00	kgs	VARILLA CORRUGADA AR/42 1 (15.9 mm)
1	12222253	6,367.90	kgs	VARILLA CORRUGADA AR/42 5/8 (15.9 mm)
1	12222273	5,058.00	kgs	VARILLA CORRUGADA AR/42 1 (20.4 mm)

Fecha vencimiento 26 de Junio del 2017

Bueno por : \$698609.7

Por este Pagaré prometo(amos) y me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a la orden de ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV en el domicilio de AVE. AGUSTIN MELGAR N 3705 de la ciudad de CHIHUAHUA, Chihuahua la cantidad de:

--- Seiscientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Nueve Pesos 70/100 M.N.---

A este Pagaré corresponde el num 1 de una serie de 1 de 1 y por el hecho de no ser cubierto a su vencimiento se dar por vencido los demás y serán exigibles de pago inmediato.

Si este Pagaré no fuera cubierto su vencimiento nos obligamos a pagar durante el tiempo que permanezca total parcialmente insóluto, intereses moratorio a razón de 4 % mensual sin que por esto se entienda prorrogado el plazo

Suscrito en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. A 3 de Julio del 2017

*** COPIA CLIENTE ***

JOSE CARO



Suc:CHIHUAHUA Dir. AVE. AGUSTIN MELGAR Col. Nombre de Dios
cp31150 Chihuahua, Chihuahua

Almacén: CHIHUAHUA

Documento: Factura - CHIFA150173

Nombre: CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA S DE RL DE CV

Dirección: PERIFERICO DE LA JUVENTUD SA Col. LA CANTERA Cp 31216

Forma de Envío: Entrega a Domicilio

Comentarios: OBRA CANALIZACION CANTERA.

Forma Pago: Ventas COD

RECIBE ING. JOSE MANUEL CARO DEL 614 1390860/ ING MARBELLA 614 3062054

Remision CHIA-212815

28-Jun-2017 09:36 p.m.

(CIA1012232)

Almacén	Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
1	12222253	3,000.00	kgs	VARILLA CORRUGADA AR/42 5/8 (15.9 mm)
1	12222273	4,058.00	kgs	VARILLA CORRUGADA AR/42 1 (20.4 mm)

Fecha vencimiento 26 de Junio del 2017

Bueno por : \$698609.7

Por este Pagaré prometo(amos) y me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a la orden de ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV en el domicilio de AVE. AGUSTIN MELGAR N 3705 de la ciudad de CHIHUAHUA, Chihuahua la cantidad de:

--- Seiscientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Nueve Pesos 70/100 M.N.---

A este Pagaré corresponde el num 1 de una serie de 1 de 1 y por el hecho de no ser cubierto a su vencimiento se dar por vencido los demás y serán exigibles de pago inmediato.

Si este Pagaré no fuera cubierto su vencimiento nos obligamos a pagar durante el tiempo que permanezca total parcialmente insóluto, intereses moratorio a razón de 4 % mensual sin que por esto se entienda prorrogado el plazo

Suscrito en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. A 3 de Julio del 2017

*** COPIA CLIENTE ***

JOSE CARO

