

SCO091026IPO
STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV

Folio Fiscal 312E69A8-2170-1443-2EBD-B40A4E0BE9B4

Serie 671

BLVD ANTONIO ORTIZ MENA, No. Ext 1605
CAMPESTRE RESIDENCIAL, C.P. 31213
CHIHUAHUA CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO

Fecha y Hora
31 / 10 / 2017 16:08:55

Datos Fiscales del Cliente

RFC: MCI651010V22
Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Domicilio: MINA, No. Ext 408, Col. CENTRO, C.P. 31000
Municipio: CHIHUAHUA
Estado: CHIHUAHUA
País: MEXICO

Tipo de Comprobante: Factura
Moneda: MXP
Tasa de Cambio: 1
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: 02 - Cheque nominativo, No. Cta. NO IDENTIFICADO
Certificado del Emisor: 00001000000403852726

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
		ESTIMACION No.3 POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLOGICO EN LA CD. DE CHIHUAHUA, SEGUN CONTRATO No. 061/2017		
1	NO APLICA	ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 62,985.58 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 18,895.67 RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO 0.2%C.M.I.C \$ 125.97 0.2%D.I.F. \$ 125.97 SUMA \$ 251.94 NETO A RECIBIR \$ 50,892.36	\$ 44,089.91	\$ 44,089.91
			Subtotal	\$ 44,089.91
			IVA TASA 16%	\$ 7,054.39
			Total	\$ 51,144.30

Cincuenta y un mil ciento cuarenta y cuatro pesos, 30/100 MXN

Expedido en: BLVD ANTONIO ORTIZ MENA 1605 CAMPESTRE RESIDENCIAL C.P. 31213 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO.

Lugar de Expedición: CHIHUAHUA Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|312E69A8-2170-1443-2EBD-B40A4E0BE9B4|2017-10-31T16:08:55|ScEdqglY5uwOgnwMvgGILFv+v2Qh9/x3Ar10icdquvnlby+4QUIWPB/FZlx1U/H5/4Wy1F4TLWFzqK3wbrioGCGMVxEVZLa9LdmkDEUOao86EPkJEN8CYHoHYT9NK8djr0YUNIS3ra6mqql7Hx3+qVWdjKstAdaUrcBb/777pGYS6HskHdpm2gs8PIR/bvOlJP41JVeMCKXY/ZhvWrOo9daghgbZd1bv5jTNUxL03ZpUXh5BUzsq1KCCMHx6OaoYQ2KXcy7b35dRMfv4SqGHqW9qUfD/dBr1grACuneH3EmyrO6anLEP4vN6Jwsl6vYL0onvRMKMznNVTzhGwP5gQ==|00001000000402636111|

Sello Digital del Emisor

ScEdqglY5uwOgnwMvgGILFv+v2Qh9/x3Ar10icdquvnlby+4QUIWPB/FZlx1U/H5/4Wy1F4TLWFzqK3wbrioGCGMVxEVZLa9LdmkDEUOao86EPkJEN8CYHoHYT9NK8djr0YUNIS3ra6mqql7Hx3+qVWdjKstAdaUrcBb/777pGYS6HskHdpm2gs8PIR/bvOlJP41JVeMCKXY/ZhvWrOo9daghgbZd1bv5jTNUxL03ZpUXh5BUzsq1KCCMHx6OaoYQ2KXcy7b35dRMfv4SqGHqW9qUfD/dBr1grACuneH3EmyrO6anLEP4vN6Jwsl6vYL0onvRMKMznNVTzhGwP5gQ==

Número de Cuenta: NO IDENTIFICADO

Expedido En: Calle BLVD ANTONIO ORTIZ MENA, No. Ext 1605 Col. CAMPESTRE RESIDENCIAL, C.P. 31213 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Estado CHIHUAHUA, MEXICO



Folio Fiscal: 312E69A8-2170-1443-2EBD-B40A4E0BE9B4 Certificado SAT: 00001000000402636111

Fecha y Hora de 2017-10-31T16:08:55

Sello Digital SAT

fkm+sTBzCS6M5g1TIK3jw9VhguENC54AsNR9lh10ycviDOJ2bvlCwBluO404KZouI8BYIqaUVaynSQUAPUCuHsrDZvS3EFTu6XDppkivlHTVZkD6Plo14257CGZR9TaO8Mlm6uHntaTMeVhZb1w2OCP2qJ003wqQpzdpa69IEEMSjEG/0Bux9MCwmRZ6PZX9vXtGIWS0Kf9JD/DFm4T4W5ypOY2nyLgwnH9cPFTWl0wd0LaKcSPZz6yY/39X9BqJ3qLmCXo0khH612J3hGZxBgnx+9Xjbsz/KoyYGJskBk7puPJSO7igbvCijNXMDuYJok10X0mP5UhRroQ==

CONTROL DE TRAMITE DE ESTIMACIONES

DATOS GENERALES			
FOLIO	NUMERO DE ESTIMACION	FACTURA	SALDO NETO
	3	671	51,144.30
OBRA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLOGICO DE LA CD. DE CHIHUAHUA.		
CONTRATISTA:	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH
RESIDENTE	ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ	CONTRATO No.	061/2017

RESUMEN DE AUTORIZACIONES				
AUTORIZACION DE:	FECHA Y FIRMA RECIBIDO	FECHA Y FIRMA ENTREGA	CONTROL DE OBRA	
			FECHA Y FIRMA RECIBIDO	FIRMA Y FECHA ENTREGA
RESIDENTE	31/10/2017	31/10/2017		
JEFE DE DEPARTAMENTO				
SUBDIRECTOR				
X DIRECTOR				
☐ DEP. SERV. ADM.				

EN CASO DE 1º DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	

EN CASO DE 2º DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	

EN CASO DE 3º DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	



Dirección de Obras Públicas
Subdirección de Infraestructura Urbana
Departamento de Construcción

NOMBRE Y FECHA DE ENTREGA EN CONTROL DE OBRA



CHIHUAHUA, CHIH. 31 DE OCTUBRE DE 2017

ING GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No. 3 CON FACTUR 671 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLOGICO
DE LA CD. DE CHIHUAHUA.

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 24 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
POR UN SALDO NETO FACTURADO DE \$51,144.30 CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y PRODUIS ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE
ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE

STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV

RECIBE

ING GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

(<http://www.gob.mx/>) Inicio

SAT




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SCO091026IPO	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MC0651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certifió
312E69A8-2170-1443-2EBD-B40A4E0BE984	2017-10-31T16:08:55	2017-10-31T16:08:55	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$51,144.30	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

[Declaración de accesibilidad](#)
[Política de privacidad](#)
[Términos y Condiciones](#)
[Marco Jurídico](#)
[Estados de Delegaciones de Inspección](#)
[Sistema de Vigilancia](#)
[Mapa de sitio](#)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana.
[¿Qué es gob.mx?](#)
[Política de privacidad](#)
[Términos y Condiciones](#)
[Marco Jurídico](#)
[Estados de Delegaciones de Inspección](#)
[Sistema de Vigilancia](#)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
[Mesa de ayuda](#)
[Denuncia contra servidores públicos](#)
[Denuncia contra servidores públicos](#)
[Denuncia contra servidores públicos](#)

Mantente informado. Suscríbete.

usuario@ejemplo.com

Síguenos en



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS






RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 061/2017	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLOGICO DE LA CD. DE CHIHUAHUA.	ESTIMACIÓN No. 3	\$ 1,677,590.40 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 24 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 73,063.27 CON IVA
CONTRATISTA: STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 126,508.95 CON IVA
RFC SCO 091026 IP0	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 199,572.22 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 38,449.54	
<u>EXTRAORDINARIOS</u>	\$ 24,536.04	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 62,985.58	

DESCUENTOS		
0.2% C.M.I.C	\$	125.97
0.2% D.I.F	\$	125.97
SUMA DESCUENTOS	\$	251.94
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	62,985.58
AMORT ANTICIPO	\$	18,895.67
SUB-TOTAL	\$	44,089.91
I.V.A.	\$	7,054.39
TOTAL	\$	51,144.30
(CON LETRA)		
(CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	251.94
SALDO NETO A RECIBIR	\$	50,892.36

AUTORIZO  ING GLORIA MARTINEZ RGUEZ RESIDENTE D.O.P.M Vo. Bo.  ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Vo. Bo.  ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ELABORO  STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV CONTRATISTA REVISO  ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.
---	---

CHIHUAHUA, CHIH.,

31 DE OCTUBRE DE 2017

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE:
(CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.)

\$ 50,892.36
COMO PAGO A LA

ESTIMACIÓN NUM. 3 CONTRATO No. 061/201 POR LA CANTIDAD DE : \$1,677,590.40

POR TRABAJOS EN LA OBRA:

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLOGICO DE LA CD. DE CHIHUAHUA.

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 62,985.58

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 18,895.67

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

SUBTOTAL \$ 44,089.91

0.2% C.M.I.C 125.97

IVA \$ 7,054.39

D.I.F.O. 2 % 125.97

TOTAL \$ 51,144.30

SUMA 251.94

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO
\$ 1,677,590.40 CON IVA
\$ 126,508.95 CON IVA
\$ 73,063.27 CON IVA
\$ 199,572.22 CON IVA
\$ 1,478,018.18 CON IVA

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO
\$ 503,277.11 CON IVA
\$ 37,952.70 CON IVA
\$ 21,918.98 CON IVA
\$ 59,871.68 CON IVA
\$ 443,405.43 CON IVA

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2 % C.M.I.C

ACUMULADO ANTERIOR \$ 218.12
ESTA ESTIMACION \$ 125.97
ACUMULADO ACTUAL \$ 344.09

0.2% D.I.F

\$ 218.12
\$ 125.97
\$ 344.09

RECIBIMOS

STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV
SCO 091026 YPO

OBRA:

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN
CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLOGICO DE
LA CD. DE CHIHUAHUA.

UBICACIÓN

No. CONTRATO: 061/2017

ESTIMACIÓN No.

CONTRATISTA: STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV

PERÍODO: 24 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
1	<u>NORMALES</u>	38,449.54
2	<u>EXTRAORDINARIO</u>	24,536.04
SUBTOTAL		62,985.58
I.V.A.		10,077.69
TOTAL		73,063.27

POR EL CONTRATISTA

STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLOGICO DE LA CD. DE CHIHUAHUA.

UBICACIÓN CHIH

No. CONTRATO: 061/2017

ESTIMACIÓN No. 3

CONTRATISTA:

STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV

PERIODO: 24 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
<u>OBRA NORMAL</u>							\$	38,449.54
1.6	Suministro y Colocacion de Base de Concreto de 1.70 ml de altura para pza arbotante metalico de 11 ml.		46.00	36.00	17.00	19.00	2,023.66	38,449.54
<u>OBRA EXTRAORDINARIO</u>							\$	24,536.04
EXT-10	Pago por concepto de elaboración de proyecto de alumbrado publico pza para subestaciones incluye: levantamiento de datos de campo, elaboración de planos,cálculo de niveles de iluminación,memoria técnica,elaboración de catalago de conceptos, tramite de autorización del proyecto ante alumbrado público del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.		0.00	1.00	0.00	1.00	24,536.04	24,536.04

POR EL CONTRATISTA

STAHL CONSTRUCCIONES S.A DE CV

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. GLORIA MARTINEZ RDGUEZ

GENERADOR

STAHL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV.
TECNOLOGICO DE LA CD. DE CHIHUAHUA.

FECHA:

31 DE OCTUBRE 2017

PERIODO:

24 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE
2017

No. CONTRATO:

No 061/2017

No. ESTIMACION:

3 (TRES)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
1.6	Suministro y Colocacion de Base de Concreto de 1.70 ml de altura para arbotante metalico de 11 ml.	19.00 PZA

MANO DE OBRA

CANTIDAD
28.00

ANEXO CROQUIS 2

SE COBRARA SOLO EL 70% CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO

TOTAL 19.00 PZA

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

STAHL CONSTRUCTORA S.A DE C.V
ING. CARLOS ALBERTO REYES FONG


T E S T I G O F O T O G R A F I C O

STAHL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO DE LA CD. DE CHIHUAHUA.	FECHA: 31 DE OCTUBRE 2017 PERIODO: 24 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2017 No. CONTRATO: No 061/2017 No. ESTIMACION: 3 (TRES)	31 DE OCTUBRE 2017 24 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2017 No 061/2017 3 (TRES)
--	---	---

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
1.6	Suministro y Colocacion de Base de Concreto de 1.70 ml de altura para arbotante metalico de 11 ml.	19.00 PZA

MANO DE OBRA

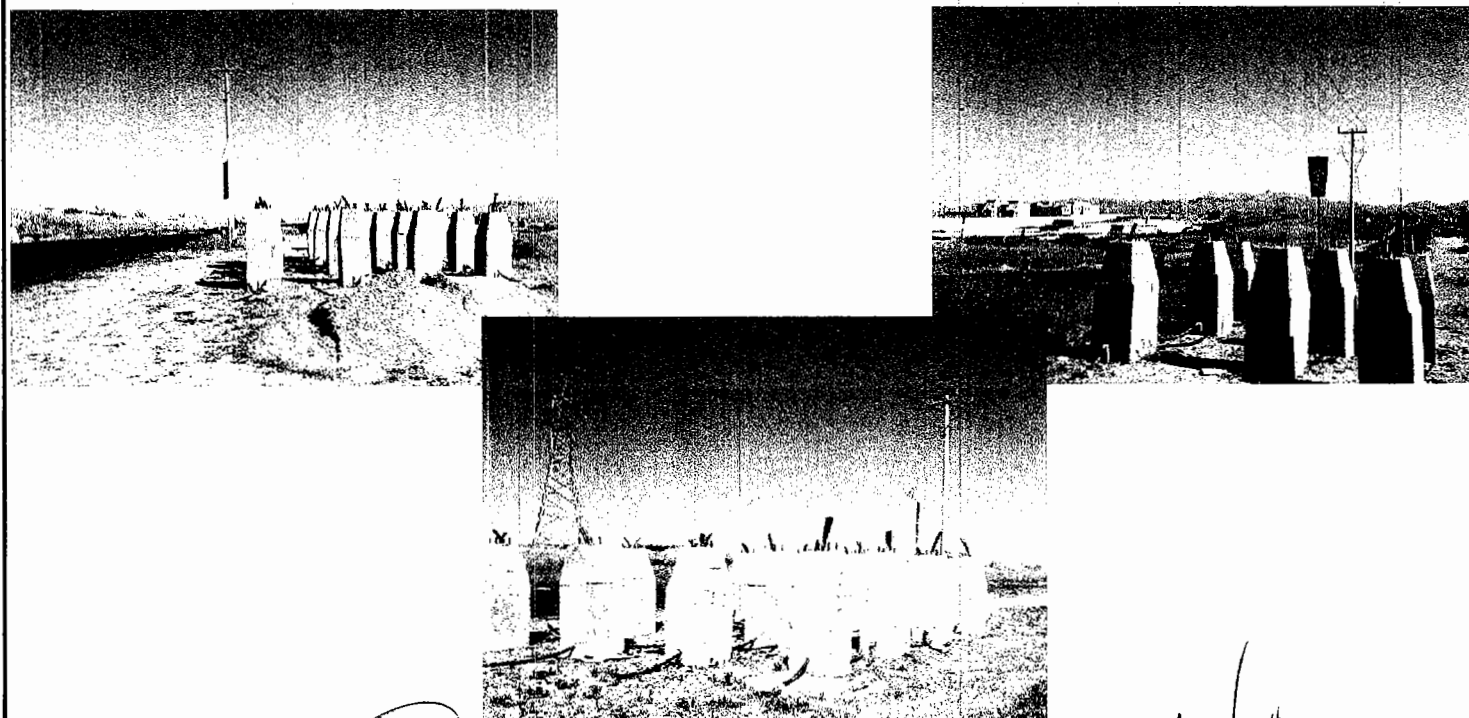

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

STAHL CONSTRUCTORA S.A DE C.V
ING. CARLOS ALBERTO REYES FONG

GENERADOR

STAHL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV.
TECNOLOGICO DE LA CD. DE CHIHUAHUA.

FECHA: 31 DE OCTUBRE 2017
PERIODO: 24 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2017
No. CONTRATO: No 061/2017
No. ESTIMACION: 3 (TRES)

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-10	Pago por elaboración de proyecto incluye: levantamiento de datos de campo, elaboración de planos, cálculo de niveles de iluminación, memoria técnica, elaboración de catalogo de conceptos, tramite de autorización del proyecto ante alumbrado público.	1.00 PZA

MANO DE OBRA
1 PZA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

STAHL CONSTRUCTORA S.A DE C.V
ING. CARLOS ALBERTO REYES FONG



27 de octubre de 2017

ING. JAIME JAVIER SOLIS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Con relación a su Escrito S/N de fecha 26 de octubre del presente, en los que solicita la revisión de los precios extraordinarios de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO, CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA"**, que al amparo del contrato No. **061/2017**, ejecuta su representada, al respecto, por este conducto le comunico, que una vez revisados y analizados los mismos, se autorizan los precios unitarios que a continuación se relacionan:

No.	CONCEPTO	VOL.	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EXT-10	Pago por concepto de elaboración de proyecto de alumbrado público para subestaciones: Incluye: levantamiento de datos de campo, elaboración de planos, cálculo de niveles de iluminación, memoria técnica, elaboración de catálogo de conceptos, trámite de autorización del proyecto ante el Departamento de Alumbrado Público del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	1	pza	\$24,536.04


IMPORTE MÁXIMO AUTORIZADO \$ 24,536.04 SIN IVA

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.- Arq. Carlos Aguilar Garcia.-Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-Ing. Edna Lizette Del Rio Sigala.-Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.-Ing. Gloria Martinez Rodriguez.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

CHCG/CAG/ELDS/gcn




ACUERDO DE SUSPENSIÓN
DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 061/2017

ACUERDO QUE EMITE EL C. ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, PARA HACER CONSTAR LA SUSPENSIÓN DE FORMA TOTAL Y DE MANERA TEMPORAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 061/2017, CONSISTENTES EN: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO DE LA CD. DE CHIHUAHUA.

En Chihuahua, Chih., siendo las 12:00 horas del día 24 de julio de 2017, el suscrito Director de Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 72 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma y 153 de su Reglamento, del Estado de Chihuahua y en el ejercicio de las facultades conferidas en el Artículo 71 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, así como la cláusula DECIMA SÉPTIMA del Contrato de Obra Pública No. 061/2017, emito el presente Acuerdo que suspende de manera temporal y de forma total la ejecución de los trabajos consistentes en la **CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO DE LA CD. DE CHIHUAHUA.**

ANTECEDENTES

I.- Con fecha 24 de mayo de 2017, se celebró con la empresa: **STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, el Contrato de Obra Pública No. 061/2017, el cual tiene como objeto la construcción de la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO DE LA CD. DE CHIHUAHUA.**, por un monto de \$ 1'677,590.39 (un millón seiscientos setenta y siete mil quinientos noventa pesos 39/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, estableciéndose un plazo de ejecución de 120 días naturales, en el periodo comprendido del 25 de mayo de 2017 al 21 de septiembre del 2017, pactándose que no se hará entrega de anticipo para el inicio de los trabajos,



ACUERDO DE SUSPENSIÓN
DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 061/2017

II.- Que se requiere suspender de manera temporal la totalidad de la obra, objeto del contrato aludido, en virtud, de que a la fecha, no se cuenta con el proyecto ejecutivo de la construcción de la ampliación de la prolongación de la vialidad los nogales en conjunto con la modificación del circuito universitario, que es un proyecto de largo alcance y hasta que se defina el alineamiento horizontal, se podrá continuar con los trabajos objeto del contrato de referencia.

ACUERDO


PRIMERO. - Con base en los antecedentes y motivos antes expuestos y con fundamento en 72 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma y 153 de su Reglamento, del Estado de Chihuahua y en la clausula DECIMA CUARTA del Contrato de Obra Pública No. 061/2017, **se suspenden de manera temporal y de forma total los trabajos del contrato en mención, a partir del día 25 de julio de 2017;** hasta que se resuelva el proyecto geométrico de la zona que incluye a propietarios de desarrolladores de vivienda.

SEGUNDO.- Notifíquese a la empresa STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., el contenido y alcance legal del presente acuerdo.

ACUERDO que se dicta y firma para constancia en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil diecisiete.

EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL




CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

ACUERDO DE SUSPENSIÓN
DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 061/2017

EL SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA


EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACUERDO DE SUSPENSIÓN DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°. 061/2017, RELATIVO A CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO DE LA CD. DE CHIHUAHUA.



**ACUERDO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 061/2017**

ACUERDO QUE EMITE EL ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SIENDO ASISTIDO POR EL ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y LA ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA, EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA HACER CONSTAR EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 061/2017 CONSISTENTES EN: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO DE LA CD. DE CHIHUAHUA., A PARTIR DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2017.

En Chihuahua, Chih., siendo las 14:00 horas del día 23 de octubre de 2017, el suscrito Director de Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 71 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y el artículo 71 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, emito el presente Acuerdo que levanta la suspensión decretada por acuerdo de fecha 24 de julio de 2017 de la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO DE LA CD. DE CHIHUAHUA.**, a partir del día 24 de octubre de 2017, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

- a) La Dirección de Planeación y Evaluación del Municipio de Chihuahua, autorizó mediante oficio de autorización de afectación presupuestal No. **2017-PDM-33FM-OP-030**, de fecha 22 de marzo de 2017, la cantidad de \$ 1'841,816.68 (un millón ochocientos cuarenta y un mil ochocientos dieciséis pesos 68/100 M.N.), para la ejecución de la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO DE LA CD. DE CHIHUAHUA.**



**ACUERDO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 061/2017**

- b) Que la adjudicación del contrato de obra en mención, se realizó previo procedimiento por invitación a cuando menos tres contratistas No. DOPM-07-2017, según fallo de fecha 23 de mayo de 2017 y de conformidad con lo establecido por el artículo 34 fracción II, 48 fracción II, 79 y 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.
- c) Derivado de lo anterior, 24 de mayo de 2017, se celebró con la empresa: **STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, el Contrato de Obra Pública No. **061/2017**, el cual tiene como objeto la construcción de la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO DE LA CD. DE CHIHUAHUA.**, por un monto de \$ **1'677,590.39 (un millón seiscientos setenta y siete mil quinientos noventa pesos 39/100 M.N.)**, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, estableciéndose un plazo de ejecución de 120 días naturales, en el periodo comprendido del 25 de mayo de 2017 al 21 de septiembre del 2017, pactándose que no se hará entrega de anticipo para el inicio de los trabajos,
- d) Que con fecha 24 de julio de 2017, se dictó acuerdo mediante el cual se ordenó la suspensión temporal de la totalidad de los trabajos objeto del contrato que nos ocupa a partir del 25 de julio del 2017, debido a no se cuenta con el proyecto ejecutivo de la construcción de la ampliación de la prolongación de la vialidad los nogales en conjunto con la modificación del circuito universitario, que es un proyecto de largo alcance y hasta que se defina el alineamiento horizontal, se podrá continuar con los trabajos objeto del contrato de referencia.
- e) Con fecha 20 de octubre de 2017, quedo definido el alineamiento horizontal de la ampliación de la prolongación de la Vialidad los Nogales, por lo que han cesado las causas que motivaron la Suspensión de forma total y de manera temporal de la obra en mención.



**ACUERDO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 061/2017**

ACUERDO

PRIMERO.- Con base en los antecedentes antes expuestos, se justifica levantar la suspensión de los trabajos del Contrato de Obra Pública N° 061/2017 consistente en los trabajos de **CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO DE LA CD. DE CHIHUAHUA.**, a partir del día 24 de octubre de 2017, quedando como fecha de conclusión de los trabajos el día 21 de enero de 2018.

SEGUNDO.- Notifíquese a **STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, el contenido y alcance legal del presente acuerdo.

TERCERO.- En cumplimiento a lo establecido por el artículo 71 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, gírese aviso por escrito a la Secretaría de la Función Pública del Estado, del contenido del presente Acuerdo.

Se dicta el presente ACUERDO y se firma para constancia en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a los veintitrés días del mes de octubre de 2017.

EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL



**ACUERDO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 061/2017**

EL SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACUERDO DE LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 061/2017, RELATIVO A TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO DE LA CD. DE CHIHUAHUA., A PARTIR DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2017.
