

SCO091026IPO
STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV

Folio Fiscal B7766ABE-C0F1-E88D-496E-BF5090E8EC99

BLVD ANTONIO ORTIZ MENA, No. Ext 1605
CAMPESTRE RESIDENCIAL, C.P. 31213
CHIHUAHUA CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO

Serie
Folio
710

Fecha y Hora
15 / 11 / 2017 12:41:11

Datos Fiscales del Cliente

RFC: MCI651010V22
Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Domicilio: MINA, No. Ext 408, Col. CENTRO, C.P. 31000
Municipio: CHIHUAHUA
Estado: CHIHUAHUA
País: MEXICO

Tipo de Comprobante: Factura
Moneda: MXP
Tasa de Cambio: 1
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: 02 - Cheque nominativo, No. Cta. NO IDENTIFICADO
Certificado del Emisor: 00001000000403852726

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	ESTIMACION No.4 POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLOGICO EN LA CD. DE CHIHUAHUA, SEGUN CONTRATO No. 061/2017 ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 126,558.90 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 37,967.67 RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO 0.2% C.M.I.C \$ 253.12 0.2% D.I.F. \$ 253.12 SUMA \$ 506.24 NETO A RECIBIR \$ 102,259.59	\$ 88,591.23	\$ 88,591.23
			Subtotal	\$ 88,591.23
			IVA TASA 16%	\$ 14,174.60
Ciento dos mil setecientos sesenta y cinco pesos, 83/100 MXN			Total	\$ 102,765.83

Expedido en: BLVD ANTONIO ORTIZ MENA 1605 CAMPESTRE RESIDENCIAL C.P. 31213 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO.

Lugar de Expedición: CHIHUAHUA Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|B7766ABE-C0F1-E88D-496E-BF5090E8EC99|2017-11-15T12:41:12|P9hNS9ArZ1FNV3JL+U67WKUoUdiwhBIJhHcoVpFb22aIJY14kLUd96oQgJaD+Td7fCw5D/RRdAmR4E6c/uvnqCQJB6qKOS3eYw4nQvOkHJA+JhfhBuay9O2Wa6X2h+6O4pVznWMJCK3UiN5QnHz+4gO5MLWomclHdcY0wGIHA0sEY+j2NfLaTBCGNa8Tgo1hMEK+VnU36ylb4Qn1p+qyldkZjU7pQ/N5oRA7Zyygb2Fhr1fSZhxpGuqDcZ5lpp3gkxkDYPJUhqDkWkxyFZi9nNdr2pW4YiqiZx7ZQZl/TmXc69iyA1do4GUyeF38lJah5D13JmjemfbaIWA==|00001000000402636111|

Sello Digital del Emisor

P9hNS9ArZ1FNV3JL+U67WKUoUdiwhBIJhHcoVpFb22aIJY14kLUd96oQgJaD+Td7fCw5D/RRdAmR4E6c/uvnqCQJB6qKOS3eYw4nQvOkHJA+JhfhBuay9O2Wa6X2h+6O4pVznWMJCK3UiN5QnHz+4gO5MLWomclHdcY0wGIHA0sEY+j2NfLaTBCGNa8Tgo1hMEK+VnU36ylb4Qn1p+qyldkZjU7pQ/N5oRA7Zyygb2Fhr1fSZhxpGuqDcZ5lpp3gkxkDYPJUhqDkWkxyFZi9nNdr2pW4YiqiZx7ZQZl/TmXc69iyA1do4GUyeF38lJah5D13JmjemfbaIWA==

Número de Cuenta: NO IDENTIFICADO

Expedido En: Calle BLVD ANTONIO ORTIZ MENA, No. Ext 1605 Col. CAMPESTRE RESIDENCIAL, C.P. 31213 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Estado CHIHUAHUA, MEXICO



Folio Fiscal: B7766ABE-C0F1-E88D-496E-BF5090E8EC99 Certificado SAT: 00001000000402636111

Fecha y Hora de 2017-11-15T12:41:12

Sello Digital SAT

LLSID12B4nw8nMvngpLR9BKW3O6Yygi34DeSIJ2GoiLE29H6feO24SvcdYF9UBqnXN/n2/PvYgbMnTrVwx2NLI8st/bP+ivOs7zycxQgmPlmPXAEUHG898qkPb7J+lm1EscS44UxnJdNGroEAam75xGhVjH8wli6UjvFHosyXjyu5nS1Ok6TaigSVHrFicp2V2TpTE7jnWZiCyeOdjaxqoAbQniXh0PcapjAljTB0i7L89W9iTzQAAYrDvv9mA47KUGlWAL0zaMnlgqulgtHlov9vTJBs1YLzXZUhhBkrba4UK+HN8AwmpKRMQwVrZR97METUsLZ/Ulflg==

[Handwritten signatures and stamps]

SHIP **GO EAST**

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

RFC receptor*:



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SCO091026IPO	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MO651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B7766ABE-C0F1-E88D-496E-BF5090EBEC99	2017-11-15T12:41:11	2017-11-15T12:41:12	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$102,765.83	ingreso	Vigente	

Imprinting

Contacto

Menú de ayuda: dudas e información
gobierno/funcion publica go b mx

[Denuncia contra servidores públicos](https://www.gob.mx/amp/funcion-publica/que-es-denuncia-pro-a-sfp/321241)
<https://www.gob.mx/amp/funcion-publica/que-es-denuncia-pro-a-sfp/321241>

Síguenos en

>

Síguenos en




CHIHUAHUA, CHIH. 15 DE NOVIEMBRE DE 2017

ING GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No. 4 CON FACTUR 710 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLOGICO
DE LA CD. DE CHIHUAHUA.

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 01 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2017
POR UN SALDO NETO FACTURADO DE \$102,765.83 CON IVA INCLUIDO

ACOMPÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE
ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE

STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV
RECIBE

ING GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 061/2017	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLOGICO DE LA CD. DE CHIHUAHUA.	ESTIMACIÓN No. 4	\$ 1,677,590.40 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 01 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2017	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 146,808.32 CON IVA
CONTRATISTA: STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 199,572.22 CON IVA
RFC SCO 091026 IPO	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 346,380.54 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 18,212.94	
<u>EXTRAORDINARIOS</u>	\$ 108,345.96	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 126,558.90	

DESCUENTOS		
0.2% C.M.I.C	\$	253.12
0.2% D.I.F	\$	253.12
SUMA DESCUENTOS	\$	506.24
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	126,558.90
AMORT ANTICIPO	\$	37,967.67
SUB-TOTAL	\$	88,591.23
I.V.A.	\$	14,174.60
TOTAL	\$	102,765.83
(CON LETRA)		
(CIENTO DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	506.24
SALDO NETO A RECIBIR	\$	102,259.59

AUTORIZO	ELABORO
 <u>ING GLORIA MARTINEZ RGUEZ</u> RESIDENTE D.O.P.M	 <u>STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV</u> CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
 <u>ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA</u> SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	 <u>ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA</u> JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.
Vo. Bo.	
 <u>ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL</u> DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

CHIHUAHUA, CHIH.,

08 DE NOVIEMBRE DE 2017

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE: \$ 102,259.59
(CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N.)
ESTIMACIÓN NUM. 4 CONTRATO No. 061/201 POR LA CANTIDAD DE : \$1,677,590.40
UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 40/100M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO DE LA CD. DE CHIHUAHUA.

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 126,558.90

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 37,967.67

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

SUBTOTAL

\$ 88,591.23

0.2% C.M.I.C 253.12

IVA 14,174.60

D.I.F.0, 2 % 253.12

TOTAL \$ 102,765.83

SUMA 506.24

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO

\$	1,677,590.40	CON IVA
\$	199,572.22	CON IVA
\$	146,808.32	CON IVA
\$	346,380.54	CON IVA
\$	1,331,209.86	CON IVA

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$	503,277.11	CON IVA
\$	59,871.68	CON IVA
\$	44,042.50	CON IVA
\$	103,914.18	CON IVA
\$	399,362.93	CON IVA

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2 % C.M.I.C

0.2% D.I.F

ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL

\$	344.09
\$	253.12
\$	597.21

\$	344.09
\$	253.12
\$	597.21

RECIBIMOS

STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV
SCO 091026 IP0

OBRA:

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALBERGUE PUBLICO EN
CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLOGICO DE
LA CD. DE CHIHUAHUA.

UBICACIÓN

No. CONTRATO: 061/2017

ESTIMACIÓN No 4

CONTRATISTA: STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV

PERÍODO: 01 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS			
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS		IMPORTE
1	<u>NORMALES</u>		18,212.94
2	<u>EXTRAORDINARIO</u>		108,345.96
		SUBTOTAL	126,558.90
		I.V.A.	20,249.42
		TOTAL	146,808.32

POR EL CONTRATISTA

STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLOGICO DE LA CD. DE CHIHUAHUA.

UBICACIÓN CHIH

No. CONTRATO: 061/2017

ESTIMACIÓN No. 4

CONTRATISTA:

STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV

PERIODO: 01 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2017

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
<u>OBRA NORMAL</u>							\$	18,212.94
1.6	Suministro y Colocacion de Base de Concreto de 1.70 ml de altura para pza arbotante metalico de 11 ml.		46.00	45.00	36.00	9.00	2,023.66	18,212.94
<u>OBRA EXTRAORDINARIO</u>							\$	108,345.96
EXT-03	Suministro e instalación de arbotante conico octagonal de 7.50mts. De pza alto con brazo metalico de 2.40mts de largo de acuerdo a lo indicado en plano con pintura de acuerdo a lo indicado por alumbrado publico del mpio. Incluye: , materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevacion, andamios y todo lo correcto para su correcta instalacion. P.U.O.T.		0.00	8.00	0.00	8.00	3,319.92	26,559.36
EXT-09	Instalacion de banco de ductos por medio de perforacion horizontal ml dirigida, en terreno tipo B, formado por un tubo de poliducto de alta densidad RD-13.5 DE 4", incluye: equipo, consumibles, limpieza, mao de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion p.u.o.t.		0.00	35.00	0.00	35.00	2,336.76	81,786.60

POR EL CONTRATISTA

STAHL CONSTRUCCIONES S.A.DEC.V

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

INS. GLORIA MARTINEZ RDGUEZ.

G E N E R A D O R
STAHL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV.
TECNOLOGICO DE LA CD. DE CHIHUAHUA.

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE 2017
PERIODO: 01 DE NOVIEMBRE AL 08 DE
NOVIEMBRE DE 2017
No. CONTRATO: No 061/2017
No. ESTIMACION: 4 (CUATRO)

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
1.6	Suministro y Colocacion de Base de Concreto de 1.70 ml de altura para arbotante metalico de 11 ml.	9.00 PZA

MANO DE OBRA

CANTIDAD
28.00

ANEXO VER CROQUIS 1

SE COBRARA EL 30% FALTANTE, EL RESTO SE COBRO EN ESTIMACION 3


TOTAL 9.00 PZA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

STAHL CONSTRUCTORA S.A DE C.V
ING. CARLOS ALBERTO REYES FONG

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

CROQUIS 1 UBICACIÓN DE BASES DE CONCRETO

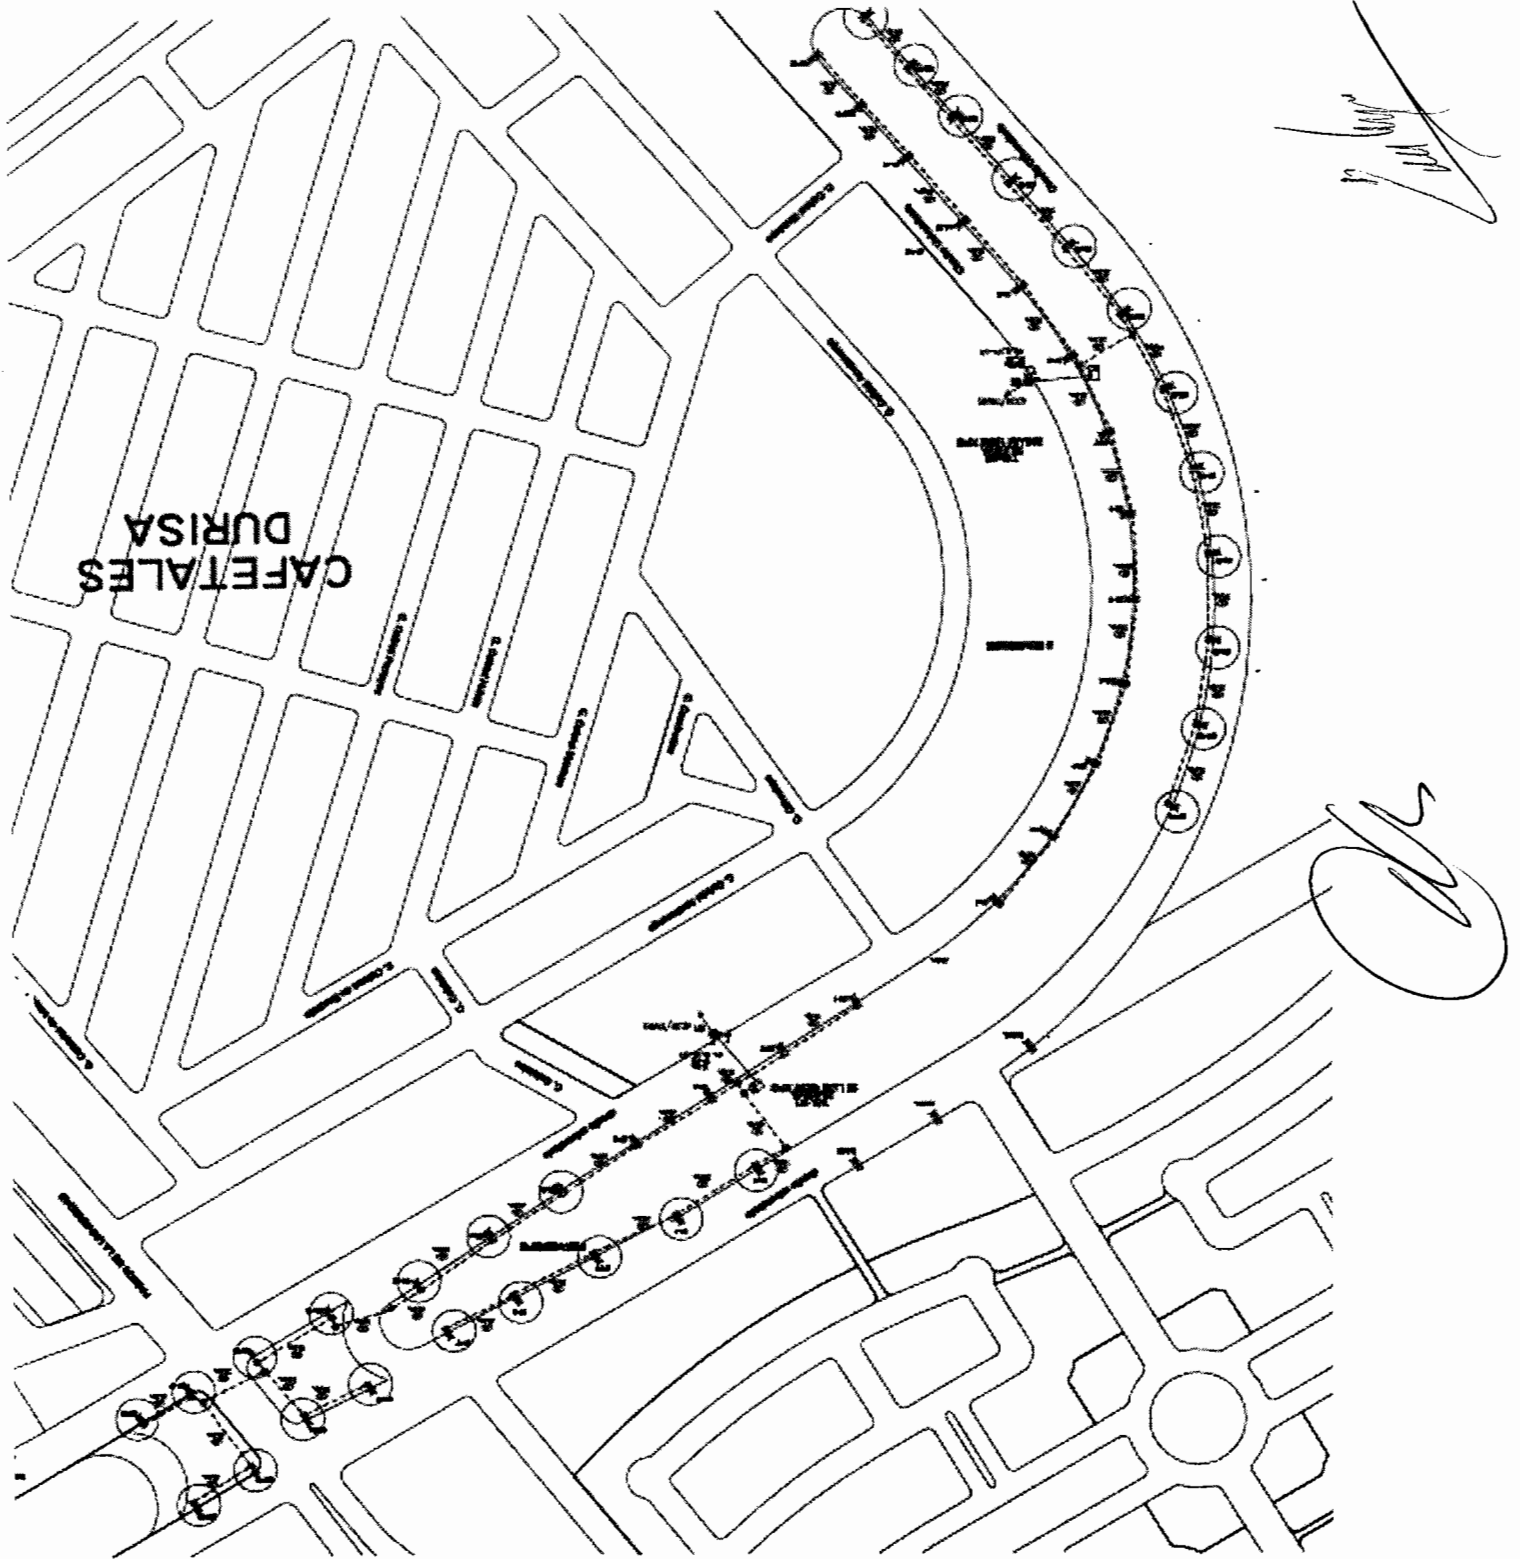

T E S T I G O F O T O G R A F I C O



STAHL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLOGICO DE LA CD. DE CHIHUAHUA.

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE 2017
PERIODO: 01 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2017
No. CONTRATO: No 061/2017
No. ESTIMACION: 4 (CUATRO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
1.6	Suministro y Colocacion de Base de Concreto de 1.70 ml de altura para arbotante metalico de 11 ml.	9.00 PZA

MANO DE OBRA

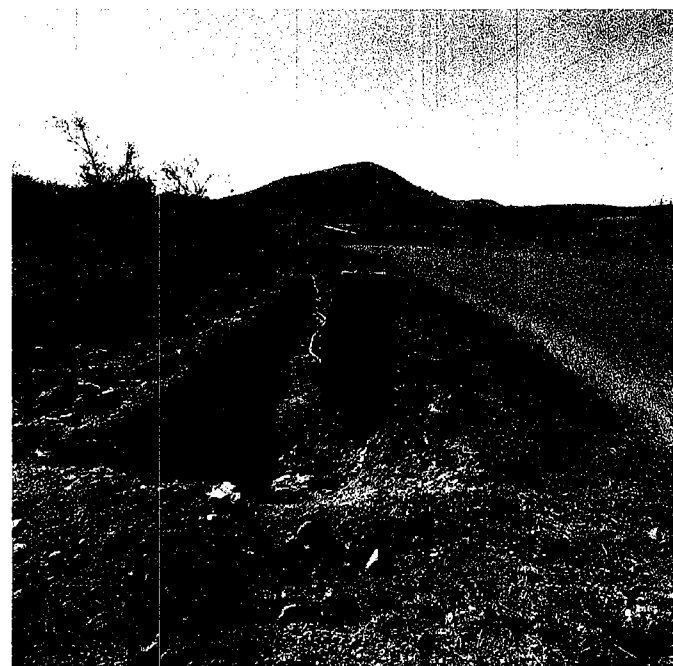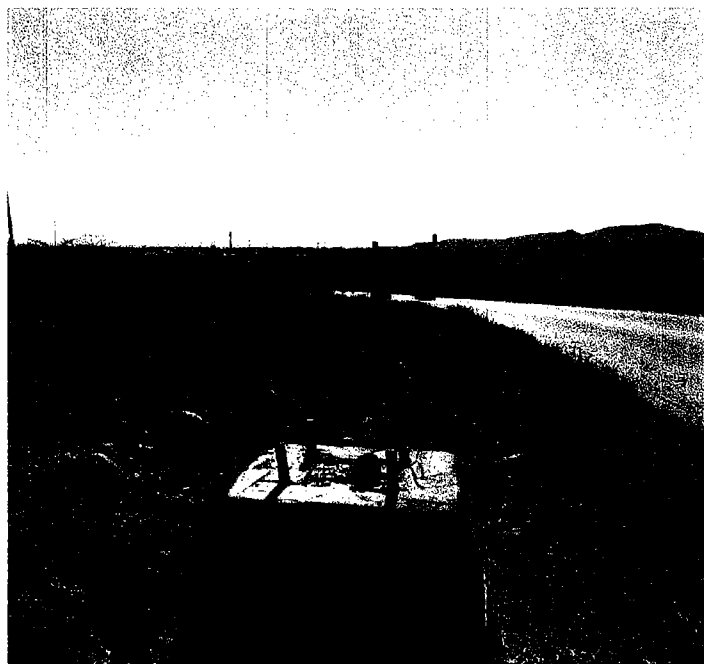

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

STAHL CONSTRUCTORA S.A DE C.V
ING. CARLOS ALBERTO REYES FONG

GENERADOR
STAHL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV.
TECNOLOGICO DE LA CD. DE CHIHUAHUA.

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE 2017
PERIODO: 01 DE NOVIEMBRE AL 08 DE
NOVIEMBRE DE 2017
No. CONTRATO: No 061/2017
No. ESTIMACION: 4 (CUATRO)


CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-03	Suministro e instalación de arbotante conico octagonal de 7.50mts. De alto con brazo metalico de 2.40mts de largo de acuerdo al indicado en plano con pintura de acuerdo a lo indicado por alumbrado publico del mpio. Incluye: , materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevacion, andamios y todo lo correcto para su correcta instalacion. P.U.O.T.	8.00 PZA

MANO DE OBRA	
	8.00 PZA
ANEXO VER CROQUIS 2	

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

STAHL CONSTRUCTORA S.A DE C.V
ING. CARLOS ALBERTO REYES FONG

CROQUIS 2 UBICACIÓN DE ARBOTANTES

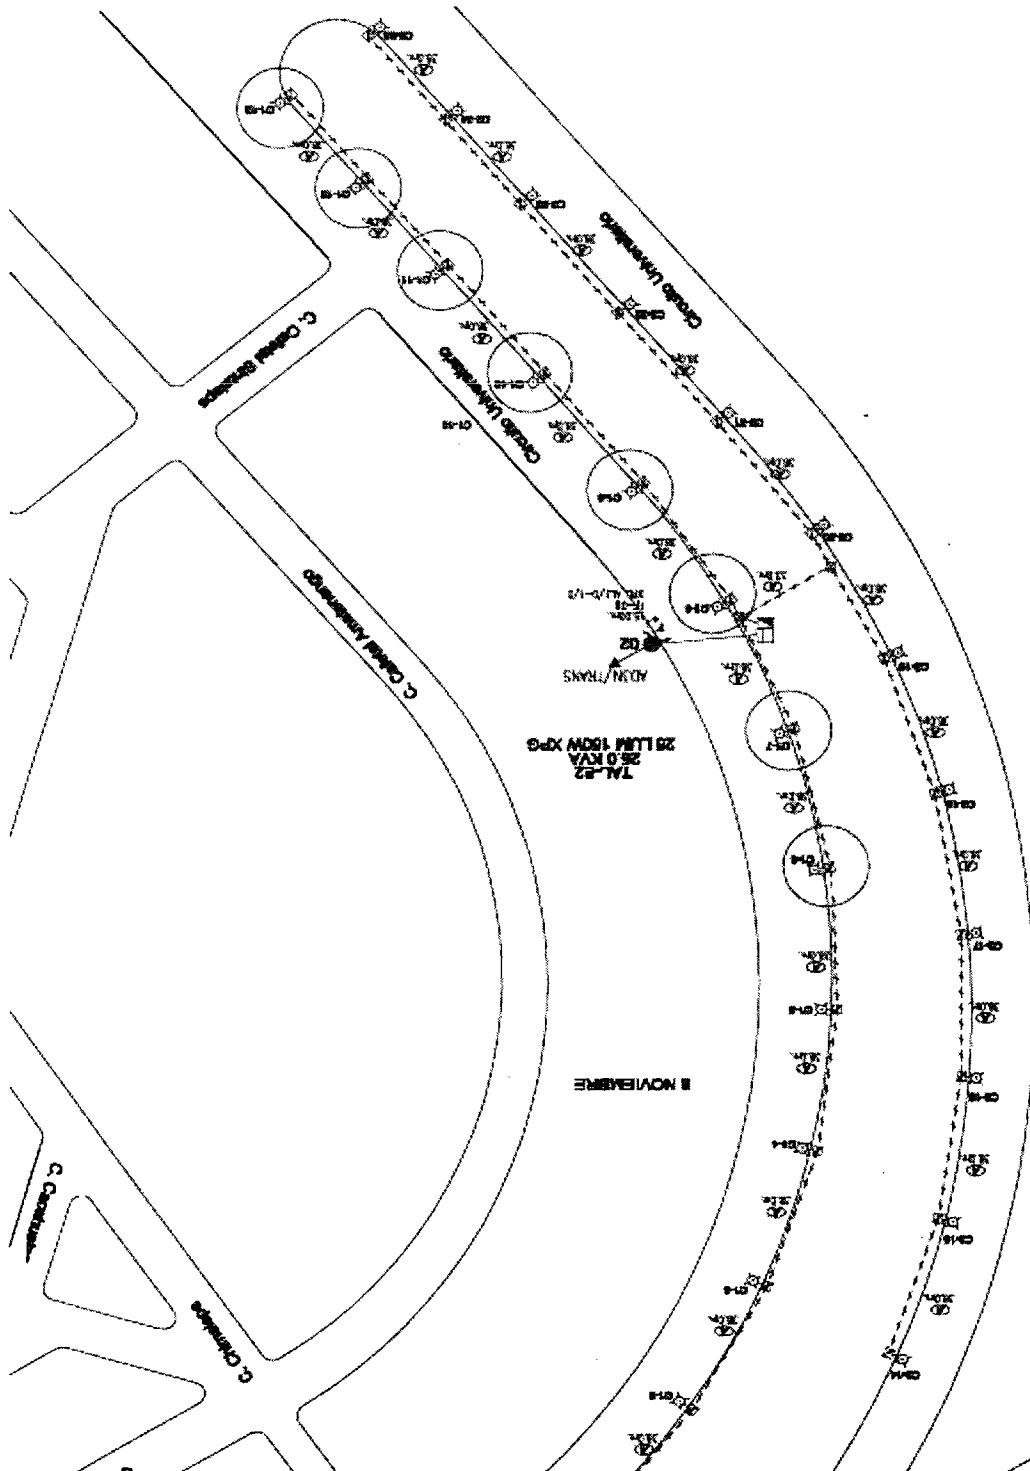

T E S T I G O F O T O G R A F I C O


STAHL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLOGICO DE LA CD. DE CHIHUAHUA.

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE 2017
PERIODO: 01 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2017
No. CONTRATO: No 061/2017
No. ESTIMACION: 4 (CUATRO)

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-03	Suministro e instalación de arbotante conico octagonal de 7.50mts. De alto con brazo metalico de 2.40mts de largo de acuerdo a lo indicado en plano con pintura de acuerdo a lo indicado por alumbrado publico del mpio. Incluye: , materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevacion, andamios y todo lo correcto para su correcta instalacion. P.U.O.T.	8.00 PZA

MANO DE OBRA

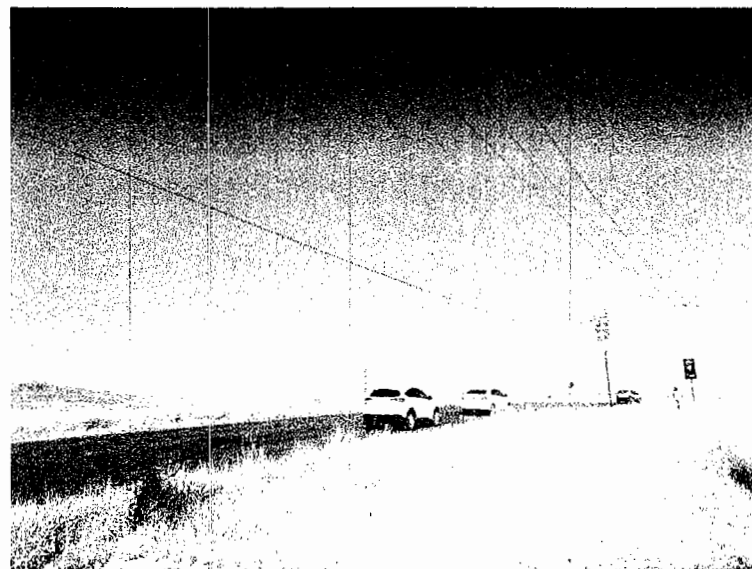

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

STAHL CONSTRUCTORA S.A DE C.V
ING. CARLOS ALBERTO REYES FONG



10 de julio de 2017

ING. JAIME JAVIER SOLIS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Con relación a su Escrito S/N de fecha 06 de julio del presente, en los que solicita la revisión de los precios extraordinarios de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO, CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA"**, que al amparo del contrato No. **061/2017**, ejecuta su representada, al respecto, por este conducto le comunico, que una vez revisados y analizados los mismos, se autorizan los precios unitarios que a continuación se relacionan:

No.	CONCEPTO	VOL.	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EXT-01	Suministro e instalación de luminaria marca Autobahn series ATBO ROADWAY LIGHTING DE 150 WATTS EN LED, 220-127 V. Incluye: materiales, equipo, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	46	pza	\$9,151.89
EXT-02	Suministro e instalación de poliducto de alta densidad para servicio pesado de 32 mm de diámetro tipo RD-9 9 kg/cm2 y/o 130 lbs/plg2. Incluye: excavación de 30 cms de ancho por 50 cms de profundidad, cama y colchón de arena, relleno de la zanja con material producto de excavación, traspaleo, retiro del de material sobrante fuera de la obra a banco autorizado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios. P.U.O.T.	1,894	m	\$35.02
EXT-03	Suministro e instalación de arbotante cónico octagonal de 7.50 m de altura con brazo metálico de 2.40 m de longitud, de acuerdo a lo indicado en plano de proyecto, aplicación de pintura de acuerdo a procedimiento establecido por el Departamento de Alumbrado Público del Municipio. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, elevaciones, plomeado, limpieza desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	46	pza	\$3,319.92

IMPORTE MÁXIMO AUTORIZADO \$640,031.14 SIN IVA

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.- Arq. Carlos Aguilar Garcia.-Subdirector de Infraestructura Urbana
C.c.p.-Ing. Edna Lizette Del Rio Sigala.-Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.-Ing. Gloria Martinez Rodriguez.-Residente de Obra
C.c.p.-Archivo.

CHCG/CAG/ELDS/gcn

"2018, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

G E N E R A D O R

STAHL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLOGICO DE LA CD. DE CHIHUAHUA.

FECHA:

10 DE NOVIEMBRE 2017

PERIODO:

01 DE NOVIEMBRE AL 08 DE
NOVIEMBRE DE 2017

No. CONTRATO:

No 061/2017

No. ESTIMACION:

4 (CUATRO)

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-09	Instalacion de banco de ductos por medio de perforacion horizontal dirigida, en terreno tipo B, formado por un tubo de poliducto de alta densidad RD-13.5 DE 4", incluye: equipo, consumibles, limpieza, mao de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion p.u.o.t.	35.00 ML

MANO DE OBRA

CRUCE 1	CALLE SINTALAPA	CALLE CHIMALAPA	18.60	ML	✓
CRUCE 2	CALLE CHIMALAPA	CALLE CAFETALES	16.40	ML	✓
			35.00		


35.00 ML

ANEXO VER CROQUIS 3


RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

STAHL CONSTRUCTORA S.A DE C.V
ING. CARLOS ALBERTO REYES FONG

CROQUIS 3 PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA

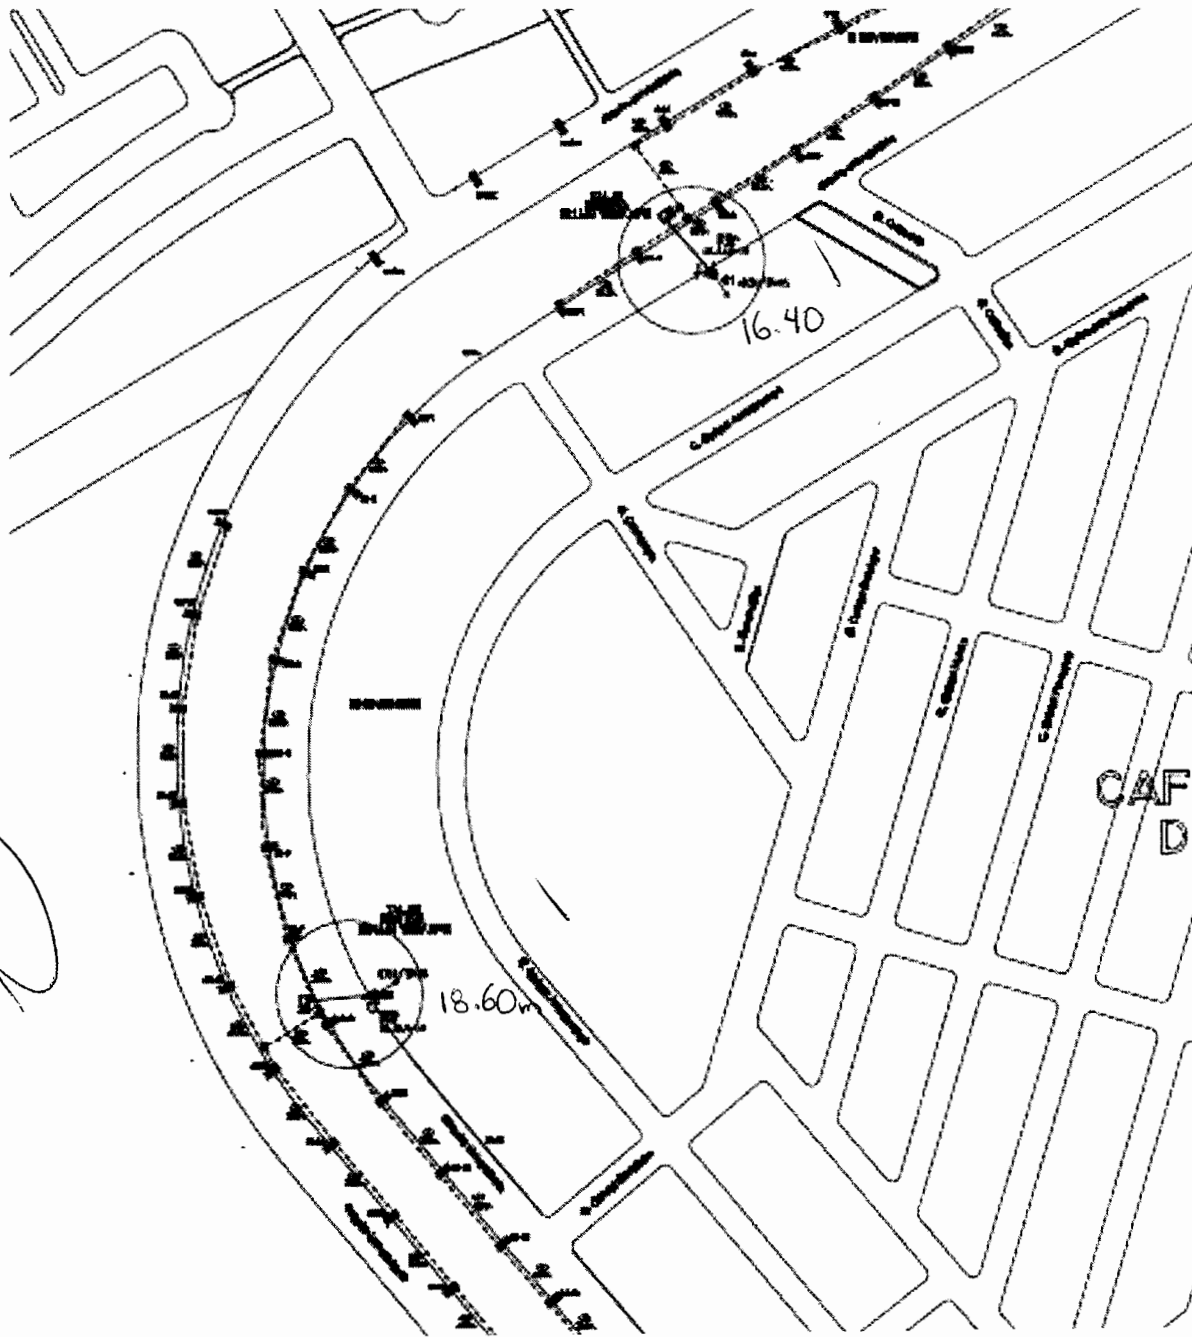

SEGUNDO CRUCE 16.40

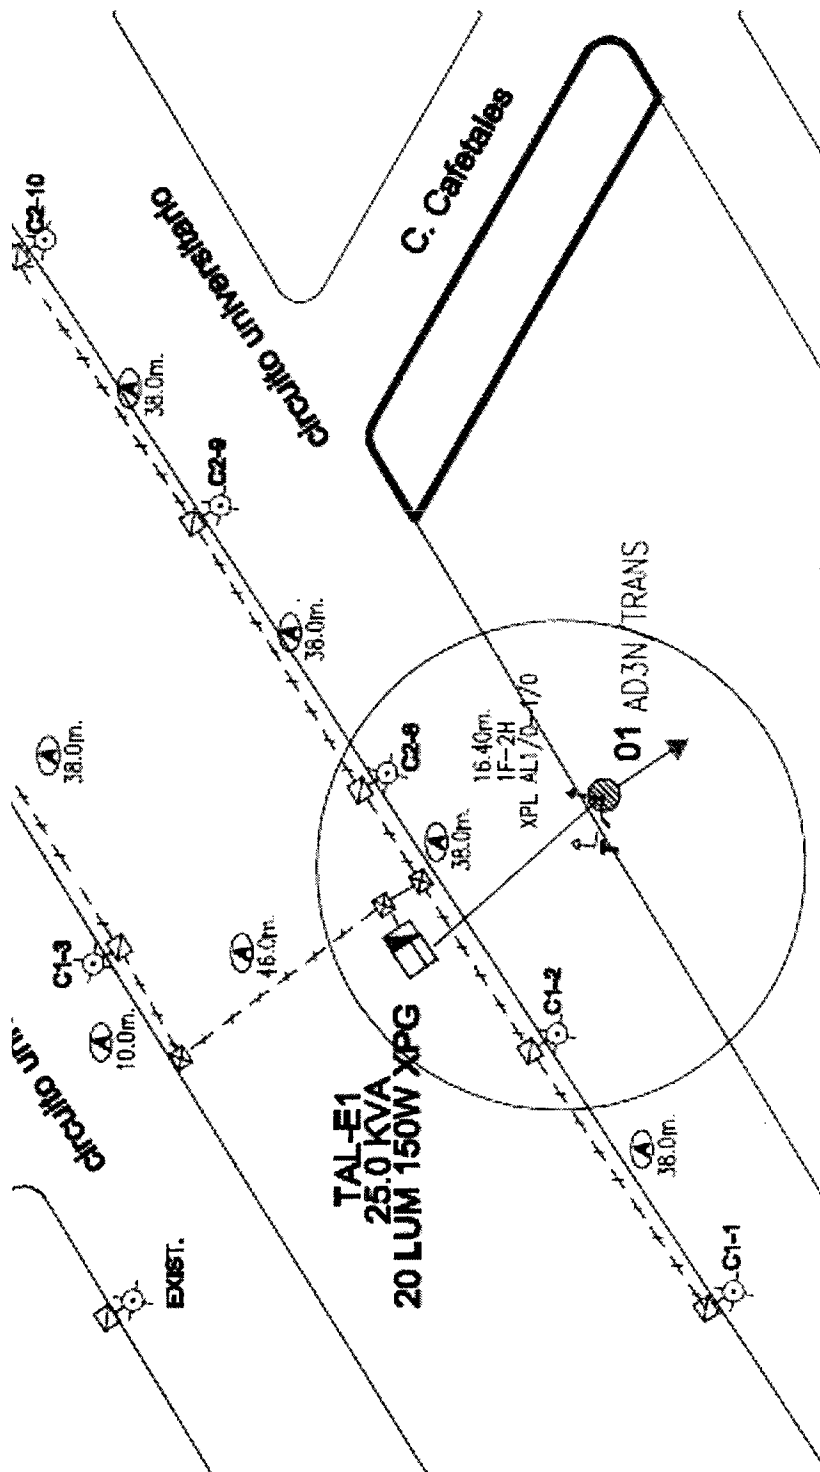





17 de agosto de 2017

ING. JAIME JAVIER SOLIS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Con relación a su Escrito S/N de fecha 15 de agosto del presente, en los que solicita la revisión de los precios extraordinarios de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO, CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA"**, que al amparo del contrato No. **061/2017**, ejecuta su representada, al respecto, por este conducto le comunico, que una vez revisados y analizados los mismos, se autorizan los precios unitarios que a continuación se relacionan:

No.	CONCEPTO	VOL.	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EXT-08	Pago a Comisión Federal de Electricidad, por concepto de aprobación de proyecto de alumbrado público para subestaciones. Incluye: costo por revisión, supervisión, pruebas de puesta en operación, maniobras y conexión a la red de media tensión y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	2	pza	\$26,094.37
EXT-09	Instalación de banco de ductos por medio de perforación horizontal dirigida, en terreno tipo "B", formado por un tubo de poliducto de alta densidad RD-13.5 de 4", incluye: equipo, consumibles, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	30	m	\$2,336.76

IMPORTE MÁXIMO AUTORIZADO \$ 122,291.54 SIN IVA

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.- Arq. Carlos Aguilar García.-Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-Ing. Edna Lizette Del Rio Sigala.-Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.-Ing. Gloria Martínez Rodríguez.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

CHCG/CAG/ELDS/gm
