

CONTROL DE TRAMITE DE ESTIMACIONES

DATOS GENERALES			
FOLIO	NUMERO DE ESTIMACION	FACTURA	SALDO NETO
	2	519	67,928.14
OBRA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLOGICO DE LA CD. DE CHIHUAHUA.		
CONTRATISTA:	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV		UBICACIÓN
RESIDENTE	ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ		CONTRATO No.
			061/2017

RESUMEN DE AUTORIZACIONES				
AUTORIZACION DE:	FECHA Y FIRMA RECIBIDO	FECHA Y FIRMA ENTREGA	CONTROL DE OBRA	
			FECHA Y FIRMA RECIBIDO	FIRMA Y FECHA ENTREGA
RESIDENTE	30/08/2017	30/08/2017		
JEFE DE DEPARTAMENTO				
SUBDIRECTOR				
X DIRECTOR				
☐ DEP. SERV. ADM.				

EN CASO DE 1º DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	

EN CASO DE 2º DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	

EN CASO DE 3º DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	



Dirección de Obras Públicas
Subdirección de Infraestructura Urbana
Departamento de Construcción

NOMBRE Y FECHA DE ENTREGA EN CONTROL DE OBRA

CHIHUAHUA, CHIH. 29 DE AGOSTO DE 2017

ING GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No. 2 CON FACTUR 519 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLOGICO
DE LA CD. DE CHIHUAHUA.

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 24 DE JUNIO 2017 AL 23 DE JULIO DE 2017
POR UN SALDO NETO FACTURADO DE \$67,928.14 CON IVA INCLUIDO

ACOMPÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE
ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN.

ATENTAMENTE
STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV
RECIBE

ING GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV

R.F.C.: SCO091026IPO
BLVD ANTONIO ORTIZ MENA 1605 CAMPESTRE RESIDENCIAL
31213 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO

FACTURA

Folio Fiscal

DA7B5C97-5DC2-8A51-5380-842BAE051BF0

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000402636111

Fecha y hora de certificación

2017-08-29T17:53:04

Fecha y hora de emisión	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
2017-08-29T17:53:03		519	00001000000403852726	MXP	1

FACTURAR A:

Razon Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Domicilio: MINA No. 408 Col. CENTRO
Ciudad: CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

RFC: MCI651010V22

C.P. 31000

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	ESTIMACION No.2 POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLOGICO DE LA CD. DE CHIHUAHUA, SEGUN CONTRATO No. 081/2017 ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 83,655.35 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 25,096.61 RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO 0.2% C.M.I.C. \$ 167.31 0.2% D.I.F. \$ 167.31 SUMA \$ 334.62 NETO A RECIBIR \$ 67,593.52	\$ 58,558.74	\$ 58,558.74

SUBTOTAL \$ 58,558.74

IVA 16% \$ 9,369.40

TOTAL \$ 67,928.14

IMPORTE CON LETRA: Sesenta y siete mil novecientos veinte y ocho pesos, 14/100 MXN

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición: CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Método de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Número de Cuenta: NO IDENTIFICADO

Expedido en: BLVD ANTONIO ORTIZ MENA 1605 CAMPESTRE RESIDENCIAL C.P. 31213 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO.



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YQNXnnN7MeEUsETwC0uZW+zeQyohGxAJNX57Xj57K3vpO+2NZ9jG6qak8gUs/gj38HD0MLwXShpWjNLbKwBzTx4tp68YDFFnTQhJ1ub9gyJ/L9JnQThZVX9z4hbYIScbhUGifp8CSi3HKbq4eHEIKK+ei7NEAsiurM45jEgqkuiVzr21069MQiL3EQvO0AoFBIFUp4mEbba1qupcVDFmwnBrY2VO5hMioJUIJ93wofBySiR1JHXu1ZUN8lfeTAOZldCMcyU5ajTQLG88sqG3EcPuMyTN15d56sObr2PumHYFIdgd4xec+dyNC3D62x0cDrCmhloQo4A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

duU21PnTiqK12ToA78Rg2uHkRer2ELtbCfV6VprJuKXN4LYBCavmp+GbKwwz3XhSxGRx4HNc4XSMgF8Ua8LU4z867fMSbs9vHcwoc67YypO5kb0+OZEY2Qij+aNGm5IV7rJBj+tol0jOE3SyYKKFFqDpGQTQmEH1zrnARsYFqdz8s5EAlFadiiz7P5zzXqW4yxR/1aP7581zh9poZfAvQ+wraLezzNZeLxLo3bcSiRfb5TIQulcPIziXUHXnnZx2qN1uZoWhwhzseIBC89CiaGAedlUYPTQqRwFbaA/6ary2FSWJyD2cb0hAB0qpbVUjHn9IKGOJn5b/Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|DA7B5C97-5DC2-8A51-5380-842BAE051BF0|2017-08-29T17:53:04|YQNXnnN7MeEUsETwC0uZW+zeQyohGxAJNX57Xj57K3vpO+2NZ9jG6qak8gUs/gj38HD0MLwXShpWjNLbKwBzTx4tp68YDFFnTQhJ1ub9gyJ/L9JnQThZVX9z4hbYIScbhUGifp8CSi3HKbq4eHEIKK+ei7NEAsiurM45jEgqkuiVzr21069MQiL3EQvO0AoFBIFUp4mEbba1qupcVDFmwnBrY2VO5hMioJUIJ93wofBySiR1JHXu1ZUN8lfeTAOZldCMcyU5ajTQLG88sqG3EcPuMyTN15d56sObr2PumHYFIdgd4xec+dyNC3D62x0cDrCmhloQo4A==|00001000000402636111|

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SCO091026IP0	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DA7B5C97-5DC2- 8A51-5380- 8428AE051BF0	2017-08-29T17:53:03	2017-08- 29T17:53:04	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$67,928.14	ingreso	Vigente	

Imprimir



Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- [Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

- [English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)
- [Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)
- [Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx


[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

Mantente informado. Suscríbete.



Síguenos en

<https://www.facebook.com/gobmx> <https://twitter.com/gobmx>



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 061/2017	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO DE LA CD. DE CHIHUAHUA.	ESTIMACIÓN No. 2	\$ 1,677,590.40 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 24 DE JUNIO 2017 AL 23 DE JULIO DE 2017	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 97,040.21 CON IVA
CONTRATISTA: STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 29,468.74 CON IVA
RFC SCO 091026 IP0	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 126,508.95 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 18,212.94	
<u>EXTRAORDINARIOS</u>	\$ 65,442.41	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 83,655.35	

DESCUENTOS		
0.2% C.M.I.C	\$	167.31
0.2% D.I.F	\$	167.31
SUMA DESCUENTOS	\$	334.62
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	83,655.35
AMORT ANTICIPO	\$	25,096.61
SUB-TOTAL	\$	58,558.74
I.V.A.	\$	9,369.40
TOTAL	\$	67,928.14
(CON LETRA)		
(SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 13/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	334.62
SALDO NETO A RECIBIR	\$	67,593.52

AUTORIZO	ELABORO
ING GLORIA MARTINEZ RGUEZ RESIDENTE D.O.P.M	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.
Vo. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

CHIHUAHUA, CHIH.,

23 DE JULIO DE 2017

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE: \$ 67,593.52
(SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.)
ESTIMACIÓN NUM. 2 CONTRATO No. 061/201 POR LA CANTIDAD DE : \$1,677,590.40
0.00 COMO PAGO A LA
POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLOGICO DE LA CD. DE CHIHUAHUA.

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	83,655.35
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	25,096.61
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		
0.2% C M I C	167.31	
D.I.F. 0, 2 %	167.31	
SUMA	334.62	
SUBTOTAL	\$	58,558.74
IVA	\$	9,369.40
TOTAL	\$	67,928.14

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO	
\$	1,677,590.40 CON /IVA
\$	29,468.74 CON IVA
\$	97,040.21 CON IVA
\$	126,508.95 CON IVA
\$	1,551,081.45 CON IVA

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO	
\$	503,277.11 CON /IVA
\$	8,840.63 CON /IVA
\$	29,112.07 CON /IVA
\$	37,952.70 CON /IVA
\$	465,324.41 CON /IVA

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2 % C.M.I.C
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 50.81
ESTA ESTIMACION	\$ 167.31
ACUMULADO ACTUAL	\$ 218.12

	0.2% D.I.F
\$	50.81
\$	167.31
\$	218.12

RECIBIMOS
STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV
SCO 091026 IP0

OBRA: No. CONTRATO: 061/2017

UBICACIÓN

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN
CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLOGICO DE
LA CD. DE CHIHUAHUA.

ESTIMACIÓN No.

CONTRATISTA: STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV

PERÍODO: 24 DE JUNIO 2017 AL 23 DE JULIO DE 2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS	
No.	IMPORTE
1	18,212.94
2	65,442.41
	83,655.35
	13,384.86
	97,040.21


1 NORMALES

2 EXTRAORDINARIO

SUBTOTAL

I.V.A.

TOTAL


POR EL CONTRATISTA

STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. GLORIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR		


OBRA NORMAL

1.6	Suministro y Colocacion de Base de Concreto de 1.70 ml de altura para pza arbotante metalico de 11 ml.	pza	46.00	17.00	8.00	9.00	2,023.66	\$	18,212.94	18,212.94
-----	--	-----	-------	-------	------	------	----------	----	-----------	-----------

OBRA EXTRAORDINARIO


EXT-02	Suministro e instalacion de poliducto de alta densidad para servicio m pesado de 32 mm de diam. Tipo RD-9 9 kg/ cm2 o 130 lbs/plg2 . incluye: excavacion de 30cms de ancho por 50cms de alto, cama y colchon arena, relleno de la zanja con material producto de excavacion, paleo de material, retiro de material sobrante fuera de la obra a un banco autorizado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza,desperdicios, elevacion, andamios y todo lo correcto para su correcta instalacion. P.U.O.T.		0.00	641.59	263.13	378.46	35.02			13,253.67
--------	--	--	------	--------	--------	--------	-------	--	--	-----------

EXT-08	Pago a C.F.E por aprobacion de proyecto de alumbrado público para pza subestación 1 y subestación 2.incluye: costo por revisión, supervisión,pruebas de puesta en operación, maniobras y conexión a la red de media tensión y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t		0.00	2.00	0.00	2.00	26094.37			52,188.74
--------	--	--	------	------	------	------	----------	--	--	-----------



FOR EL CONTRATISTA

STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ.

G E N E R A D O R

STAHL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO DE LA CD. DE CHIHUAHUA. 23 DE JULIO 2017
PERIODO: 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO 2017
No. CONTRATO: No 081/2017
No. ESTIMACION: 2 (DOS)

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
1.6	Suministro y Colocacion de Base de Concreto de 1.70 ml de altura para arbotante metalico de 11 ml.	9.00 PZA

MANO DE OBRA

CANTIDAD
9.00

TOTAL 9.00 PZA

ANEXO CROQUIS 2

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

STAHL CONSTRUCTORA S.A DE C.V
ING. CARLOS ALBERTO REYES FONG



TESTIGO FOTOGRAFICO

STAHL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO DE LA CD. DE CHIHUAHUA. PERIODO: 23 DE JULIO 2017
24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO 2017
No. CONTRATO: No 061/2017
No. ESTIMACION: 2 (DOS)

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
1.6	Suministro y Colocacion de Base de Concreto de 1.70 ml de altura para arbotante metalico de 11 ml.	9.00 PZA

MANO DE OBRA

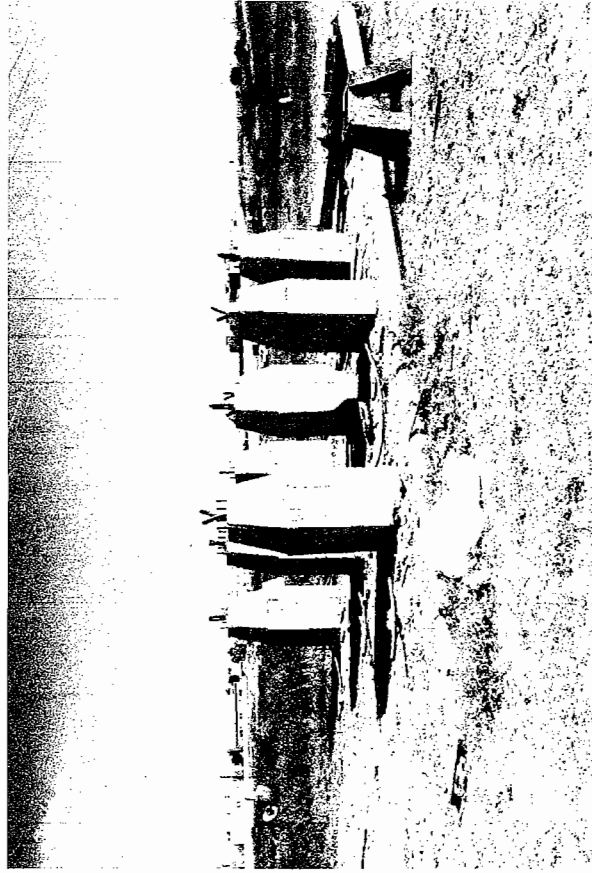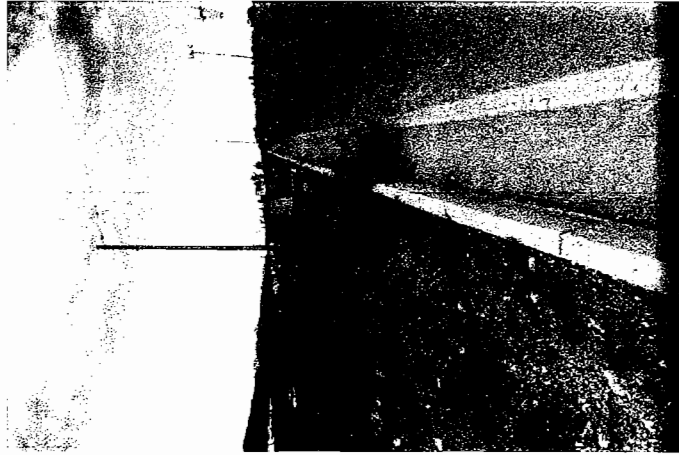

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

STAHL CONSTRUCTORA S.A DE C.V
ING. CARLOS ALBERTO REYES FONG

GENERAL

STAH CONSTRUCCIONES S.A DE C.V

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO DE LA CD. DE CHIHUAHUA. FECHA: 23 DE JULIO 2017
PERIODO: 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO 2017
No. CONTRATO: No 061/2017
No. ESTIMACION: 2 (DOS)

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-02	Suministro e instalación de poliducto de alta densidad para servicio pesado de 32 mm de diam. Tipo RD-9 9 kg/ cm2 130 lbs/plg2 , incluye: excavacion de 30cms de ancho por 50cms de alto, cama y colchon arena, relleno de la zanja con material producto de excavacion, paleo de material, retiro de material sobrante fuera de la obra a un banco autorizado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevacion, andamios y todo lo correcto para su correcta instalacion. P.U.O.T.	378.46 ML

MANO DE OBRA

TRAMO	LONGITUD
8 al 9	37.6
9 al 10	38.10
10 al 11	37.85
11 al 12	38.60
12 al 13	37.70
13 al 14	37.75
14 al 15	37.70
15 al 16	37.80
16 al 17	37.06
17 al 18	38.30
TOTAL	378.46

ANEXO CROQUIS 2

STAH CONSTRUCTORA S.A DE C.V
ING. CARLOS ALBERTO REYES FONG


RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

TESTIGO FOTOGRAFICO

STAHL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO DE LA CD. DE CHIHUAHUA. FECHA: 23 DE JULIO 2017
PERIODO: 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO 2017
No. CONTRATO: No 061/2017
No. ESTIMACION: 2 (DOS)

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-02	Suministro e instalación de poliducto de alta densidad para servicio pesado de 32 mm de diam. Tipo RD-9 9 kg/ cm2 o 130 lbs/plg2 , incluye: excavacion de 30cms de ancho por 50cms de alto, cama y colchon arena, relleno de la zanja con material producto de excavacion, paleo de material, retiro de material sobrante fuera de la obra a un banco autorizado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevacion, andamios y todo lo correcto para su correcta instalacion. P.U.O.T.	378.46 ML

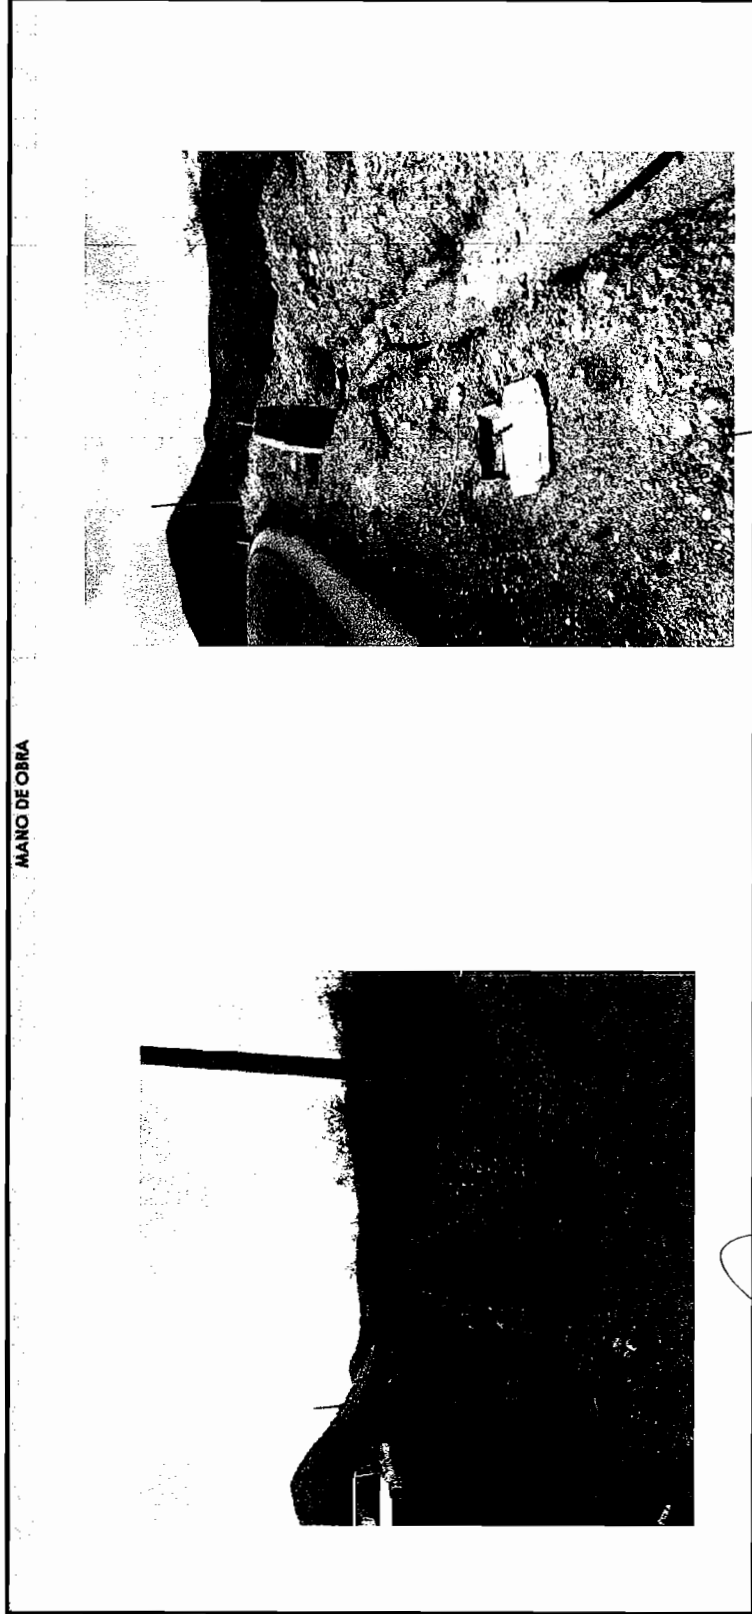

MANO DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

STAHL CONSTRUCTORA S.A DE C.V
ING. CARLOS ALBERTO REYES FONG

GENERADOR

STALH CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO DE LA CD. DE CHIHUAHUA. 23 DE JULIO 2017
24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO 2017
PERIODO: No. CONTRATO: No 061/2017
No. ESTIMACION: 2 (DOS)

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-08	Pago a C.F.E por aprobación de proyecto de alumbrado público para subestación 1 y subestación 2, incluye: costo p revisión, supervisión, pruebas de puesta en operación, maniobras y conexión a la red de media tensión y todo lo necesar para su correcta ejecución p.u.o.t	2.00 / PZA

MANO DE OBRA		
TRAMO	CANTIDAD	
	2	
TOTAL		2.00

ANEXO OFICIO DE COMISION Y COMPROBANTES DE PAGO

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

STALH CONSTRUCTORA S.A DE C.V

ING. CARLOS ALBERTO REYES FONG

TESTIGO FOTOGRAFICO

STAHL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO DE LA CD. DE CHIHUAHUA. 23 DE JULIO 2017
24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO 2017
PERIODO: No 06/2017
No. CONTRATO: 2 (DOS)
No. ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
EXT-08	Pago a C.F.E por aprobación de proyecto de alumbrado público para subestación 1 y subestación 2, incluye: costo por revisión, supervisión, pruebas de puesta en operación, maniobras y conexión a la red de media tensión y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t	2.00 / PZA

MANO DE OBRA



[Handwritten signature]

STAHL CONSTRUCTORA S.A DE C.V
ING. CARLOS ALBERTO REYES FONG

[Handwritten signature]

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

Asunto: Aprobación de Proyecto
Chihuahua, Chihuahua. 9 de Agosto de 2017

AURORA BLANCO OROZCO

En atención a su solicitud DC01031424572017, del 26 de Julio de 2017, en el que nos solicitaron la revisión y aprobación del proyecto eléctrico para el suministro de energía eléctrica a Ld Alumbrado Público, Subestacion 2, localizada(o) en Circuito Universitario Y Cafetales, Chihuahua, Chihuahua

En vista de que cumple con la normatividad vigente, otorgamos nuestra aprobación al proyecto para que se construya dentro de lo especificado en las normas y especificaciones aplicables.

Esta aprobación tiene vigencia de doce meses a partir de la fecha en que haga efectivo el pago por los conceptos abajo descritos, que ascienden a la cantidad de \$25,907.15 (veinte y cinco mil novecientos siete pesos con quince centavos)

Revisión de proyecto:	\$	1,212.00
Supervisión de Obra:	\$	151.23
Maniobras y conexión:	\$	1,155.52
Pruebas por puestas en operación:	\$	19,815.00
Subtotal:	\$	22,333.75
I.V.A.:	\$	3,573.40
Total:	\$	25,907.15

El presente presupuesto tiene vigencia de dos meses, contados a partir de la fecha en que haya sido entregado al solicitante para su revisión y aceptación, por lo que de no haberse cubierto la aportación en el plazo señalado quedará sin efecto.

El pago de ésta cantidad no implica que éste servicio se pueda contratar, sin antes haber realizado la entrega de las instalaciones requeridas por Comisión Federal de Electricidad, de lo cual el Depto. de Distribución o Planeación-Construcción dará aviso.

Es responsabilidad del titular del proyecto gestionar las autorizaciones por derechos de servidumbre de paso, cruzamiento con vías de comunicación (ferrocarriles, carreteras, etc.), estudios y acciones relativas al impacto ambiental que le sean aplicables al proyecto, debiendo presentar el original (cotejar y devolver) y copia de la autorización respectiva para ejecutar los trabajos a favor de Comisión Federal de Electricidad.

Atentamente

Alfredo Calderón Martínez
Jefe De Depto. De Planeación Zona Chihuahua Chihuahua






Asunto: Aprobación de Proyecto
Chihuahua, Chihuahua, 9 de Agosto de 2017

AURORA BLANCO OROZCO

En atención a su solicitud DC01031424602017, del 26 de Julio de 2017, en el que nos solicitaron la revisión y aprobación del proyecto eléctrico para el suministro de energía eléctrica a Ld Alcantarado Público Subestación L, localizada(o) en Curva Circuito Universitario, Chihuahua, Chihuahua.

En vista de que cumple con la normatividad vigente, otorgamos nuestra aprobación al proyecto, para que se construya dentro de lo especificado en las normas y especificaciones aplicables.

Esta aprobación tiene vigencia de doce meses a partir de la fecha en que haga efectivo el pago por los conceptos abajo descritos, que ascienden a la cantidad de \$25907.15 (veinte y cinco mil novecientos siete pesos con quince centavos)

Revisión de proyecto.	\$	1 212.00
Supervisión de Obras	\$	15 125.00
Maniobras y conexión.	\$	1 155.52
Pruebas por puestas en operación.	\$	19 815.00
Subtotal:	\$	22 333.75
I.V.A.:	\$	3 573.40
Total:	\$	25 907.15

El presente presupuesto tiene vigencia de dos meses, contados a partir de la fecha en que haya sido entregado al solicitante para su revisión y aceptación, por lo que de no haberse cubierto la aportación en el plazo señalado quedara sin efecto.

El pago de esta cantidad no implica que éste servicio se pueda contratar, sin antes haber realizado la entrega de las instalaciones requeridas por Comisión Federal de Electricidad, de lo cual el Depto. de Distribución o Planeación-Construcción dara aviso.

Es responsabilidad del titular del proyecto gestionar las autorizaciones por derechos de servidumbre de paso, cruzamiento con vías de comunicación (ferrocarriles, carreteras, etc.), estudios y acciones relativas al impacto ambiental que le sean aplicables al proyecto, debiendo presentar el original (colegar y devolver) y copia de la autorización respectiva para ejecutar los trabajos a favor de Comisión Federal de Electricidad.

Atentamente

Alfredo Calderon Martinez
Jefe De Depto. De Planeación Zona Chihuahua Chihuahua

IMPORTE DEL DEPÓSITO

IMPORTE DEL DEPÓSITO
IMPORTE DEL DEPÓSITO
IMPORTE DEL DEPÓSITO

CFE DISTRIBUCIÓN
DIVERSAS

BANCO BBVA BANCOMER

CONVENIO: 1227564

REFERENCIA: 47081710017014031246

FECHA LIMITE DE PAGO
CONCEPTO DE PAGO

TIPO DE DEPÓSITO

EFFECTIVO

CHEQUES

SUBTOTAL: 23,733.75
IVA: 3,573.40

TOTAL: \$ 25,907.15



47081710017014031246

PUEDE REALIZAR PAGO EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO BBVA BANCOMER

[Handwritten signature]

TIPO DE DEPÓSITO

TITULO DE DEPÓSITO
CÓDIGO DE DEPÓSITO
FECHA DE DEPÓSITO

CFE DISTRIBUCIÓN
DIVERSAS

BANCO BBVA BANCOMER

CONVENIO: 1227564

REFERENCIA: 47081710016914031249

FECHA LIMITE DE PAGO

CONCEPTO DE PAGO

TIPO DE DEPÓSITO

EFFECTIVO

EN CASH

SUBTOTAL: \$

IVA: \$

\$ 332.75

\$ 332.75

TOTAL: \$

25,907.15



47081710016914031249

PUEDE REALIZAR PAGO EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO BBVA BANCOMER

BBVA BANCOMER

- DEPOSITO CIE -

FECHA / HORA : 11-08-2017 / 17:00:28
SUCURSAL : 0273
MOVIMIENTO : 000082168
PLAZA : DELICIAS
EMPRESA : COMISION FEDERAL DE ELECTRICI
REFERENCIA : 47081710017014031246
CONCEPTO :
CONVENIO CIE : 1227564
GUIA CIE : 2678159

IMPORTE DEL SERVICIO	:\$	25,907.15
COMISION	:\$	0.00
IVA	:\$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:\$	25,907.15


>>IG>>47>>00>>MBX53X51X6 <<
>>00000000802010608<<

BBVA BANCOMER

- DEPOSITO CIE -

FECHA / HORA : 11-08-2017 / 17:00:01
SUCURSAL : 0273
MOVIMIENTO : 000082167
PLAZA : DELICIAS
EMPRESA : COMISION FEDERAL DE ELECTRICI
REFERENCIA : 47081710016914031249
CONCEPTO :
CONVENIO CIE : 1227564
GUIA CIE : 2676729

IMPORTE DEL SERVICIO	:\$	25,907.15
COMISION	:\$	0.00
IUA	:\$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:\$	25,907.15



BBVA Bancomer



10 de julio de 2017

ING. JAIME JAVIER SOLIS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Con relación a su Escrito S/N de fecha 06 de julio del presente, en los que solicita la revisión de los precios extraordinarios de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO, CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA"**, que al amparo del contrato No. **061/2017**, ejecuta su representada, al respecto, por este conducto le comunico, que una vez revisados y analizados los mismos, se autorizan los precios unitarios que a continuación se relacionan:

No.	CONCEPTO	VOL.	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EXT-01	Suministro e instalación de luminaria marca Autobahn series ATBO ROADWAY LIGHTING DE 150 WATTS EN LED, 220-127 V. Incluye: materiales, equipo, mano de obra, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	46	pza	\$9,151.89
EXT-02	Suministro e instalación de poliducto de alta densidad para servicio pesado de 32 mm de diámetro tipo RD-9 9 kg/cm2 y/o 130 lbs/plg2. Incluye: excavación de 30 cms de ancho por 50 cms de profundidad, cama y colchón de arena, relleno de la zanja con material producto de excavación, traspaleo, retiro del de material sobrante fuera de la obra a banco autorizado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios. P.U.O.T.	1,894	m	\$35.02
EXT-03	Suministro e instalación de arbotante cónico octagonal de 7.50 m de altura con brazo metálico de 2.40 m de longitud, de acuerdo a lo indicado en plano de proyecto, aplicación de pintura de acuerdo a procedimiento establecido por el Departamento de Alumbrado Público del Municipio. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, elevaciones, plomeado, limpieza desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	46	pza	\$3,319.92

IMPORTE MÁXIMO AUTORIZADO \$640,031.14 SIN IVA

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p. - Arq. Carlos Aguilar Garcia.-Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-Ing. Edna Lizette Del Rio Sigala.-Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.-Ing. Gloria Martinez Rodriguez.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

CHCG/CAG/ELDS/ecn

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



17 de agosto de 2017

ING. JAIME JAVIER SOLIS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Con relación a su Escrito S/N de fecha 15 de agosto del presente, en los que solicita la revisión de los precios extraordinarios de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO, CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA"**, que al amparo del contrato No. **061/2017**, ejecuta su representada, al respecto, por este conducto le comunico, que una vez revisados y analizados los mismos, se autorizan los precios unitarios que a continuación se relacionan:

No.	CONCEPTO	VOL.	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EXT-08	Pago a Comisión Federal de Electricidad, por concepto de aprobación de proyecto de alumbrado público para subestaciones: Incluye: costo por revisión, supervisión, pruebas de puesta en operación, maniobras y conexión a la red de media tensión y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	2	pza	\$26,094.37
EXT-09	Instalación de banco de ductos por medio de perforación horizontal dirigida, en terreno tipo "B", formado por un tubo de poliducto de alta densidad RD-13.5 de 4", incluye: equipo, consumibles, limpieza, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	30	m	\$2,336.76

IMPORTE MÁXIMO AUTORIZADO \$ 122,291.54 SIN IVA

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.p.- Arq. Carlos Aguilar García.-Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.p.-Ing. Edna Lizette Del Rio Sigala.-Jefe del Departamento de Construcción
C.p.-Ing. Gloria Martínez Rodríguez.-Residente de Obra.
C.p.-Archivo.

CHCG/CAG/ELDS/gcm

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

CROQUIS 2

