

SCO091026IP0
STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV

Folio Fiscal B75934CA-D48D-22CB-10B1-00C17E9166FC

BLVD ANTONIO ORTIZ MENA, No. Ext 1605
CAMPESTRE RESIDENCIAL, C.P. 31213
CHIHUAHUA CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO

Serie Folio
676

Fecha y Hora
02 / 11 / 2017 11:14:39

Datos Fiscales del Cliente

RFC: MCI651010V22
Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Domicilio: MINA, No. Ext 408, Col. CENTRO, C.P. 31000
Municipio: CHIHUAHUA
Estado: CHIHUAHUA
País: MEXICO

Tipo de Comprobante: Factura
Moneda: MXP
Tasa de Cambio: 1
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos, No. Cta. NO IDENTIFICADO
Certificado del Emisor: 00001000000403852726

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	ESTIMACION No.2(DOS) POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION DEL CAMINO EL SAUZ.NUEVAS DELICIAS,INCLUYE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM,DE ESPESOR Y GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA PRIMERA ETAPA DEL KM. 0+149.55 AL 1+050 SEGUN CONTRATO No. 063/2017 ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 191,348.24 AMORTIAZION DEL ANTICIPO \$ 57,404.47 DESCUENTOS 0.2% D.I.F. \$ 382.70 0.2% C.M.I.C. \$ 382.70 SUMA \$ 765.40 NETO A RECIBIR \$ 154,609.37	\$ 133,943.77	\$ 133,943.77
			Subtotal	\$ 133,943.77
			IVA TASA 16%	\$ 21,431.00
Ciento cincuenta y cinco mil trescientos setenta y cuatro pesos, 77/100 MXN			Total	\$ 155,374.77

Expedido en: BLVD ANTONIO ORTIZ MENA 1605 CAMPESTRE RESIDENCIAL C.P. 31213 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO.

Lugar de Expedición: CHIHUAHUA Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|B75934CA-D48D-22CB-10B1-00C17E9166FC|2017-11-02T11:14:40|I3V41yAFkOIAP7JT4y7MBpIsxJQBL|AXHe+SSwVpLiFDYmTYjBTnOBnvG/D+5HxVoD6+9AHG5h88jODxiF2j35KI22XVQzKfvm8BGdN3TgNu+cbTm96GdVxtmXfQxKN/X+dbjB7Be7jnhWXYQYx3++IUP110UG64L0TruQj0gs6QmDwzeJ0by99dJTTkgu0mFs66+wekLPMnJ+IvD1T7zheFJOLXfDCXUUKRYxZXQHazviFGJ3uT6NdpvPEs6aSDJLBCMJKmaRQArjuKEBKlk8aQ5DX7V17dwjXduUdi9MVgRQOx5trIgbpawociE18KX7vSAklpE2DdNr4Xrw==|00001000000402636111|

Sello Digital del Emisor

I3V41yAFkOIAP7JT4y7MBpIsxJQBL|AXHe+SSwVpLiFDYmTYjBTnOBnvG/D+5HxVoD6+9AHG5h88jODxiF2j35KI22XVQzKfvm8BGdN3TgNu+cbTm96GdVxtmXfQxKN/X+dbjB7Be7jnhWXYQYx3++IUP110UG64L0TruQj0gs6QmDwzeJ0by99dJTTkgu0mFs66+wekLPMnJ+IvD1T7zheFJOLXfDCXUUKRYxZXQHazviFGJ3uT6NdpvPEs6aSDJLBCMJKmaRQArjuKEBKlk8aQ5DX7V17dwjXduUdi9MVgRQOx5trIgbpawociE18KX7vSAklpE2DdNr4Xrw==

Número de Cuenta: NO IDENTIFICADO

Expedio En: Calle BLVD ANTONIO ORTIZ MENA, No. Ext 1605Col. CAMPESTRE RESIDENCIAL, C.P. 31213 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Estado CHIHUAHUA, MEXICO



Folio Fiscal: B75934CA-D48D-22CB-10B1-00C17E9166FC Certificado SAT: 00001000000402636111

Fecha y Hora de 2017-11-02T11:14:40

Sello Digital SAT

XHnXNFVAVKMgm8oZ7Zdc9TLIZ5EdooM4YmIH9FerAd9h8evXjdA1n/4b7m15q02aN7ve73RMGku2Qm2ceqto9k+d2LekJwLs6hWN0ICwo2pPID3UzlbOF9VXSuv0z1ZR7pLtnQ1H4ENQ1VRuU3ubpvg9HN8GTJoDxtXoS05rEXQNYAB7LAfHWXPpEWsibaWC1Gdw7/QKIQIV+D+DgSISW7hmGVqpadd4xLrXQ5B9ZelF1IQmSg77nTY7x2qfL056Jk+KD09EcTqMhp9EmdV1Msf8ZpABm87UXgT2+2000PadUtsadL+ahLm6ywCeww77ymIW9a19HzrbXSIJw==

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

* Datos obligatorios

Verificar CFDI

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SCO091026IPO	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B75934CA-D48D-22CB-10B1-00C17E9166FC	2017-11-02T11:14:39	2017-11-02T11:14:40	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$155,374.77	ingreso	Vigente	

Imprimir



Enlaces

[Declaración de Accesibilidad](#)
(<https://www.gob.mx/accesibilidad>)
[Política de privacidad](#)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más](#)
(<https://www.gob.mx/que-es>)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 063/2017	CONTRATADO
OBRA: *PAVIMENTACION DEL CAMINO EL SAUZ-NUEVAS DELICIAS, INCLUYE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR Y GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA PRIMERA ETAPA DEL KM. 0+049.55 AL 4+050	ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)	\$ 3,991,474.73 CON IVA
UBICACIÓN: CHIHUAHUA	PERÍODO EJEC. 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017	
CONTRATISTA: STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 1,036,061.48 CON IVA
RFC SCO-091026-IPO	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 1,650,534.86 CON IVA
	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 2,686,596.34 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 33,233.27	
<u>EXTRAORDINARIOS</u>	\$ 859,923.18	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 893,156.45	

--

DESCUENTOS		
0.2% D.I.F.	\$	1,786.31 ✓
0.2% C.M.I.C.	\$	1,786.31 ✓
SUMA DESCUENTOS	\$	3,572.62 ✓
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	893,156.45 ✓
AMORT ANTICIPO	\$	267,946.94 ✓
SUB-TOTAL	\$	625,209.51 ✓
I.V.A.	\$	100,033.52 ✓
TOTAL	\$	725,243.03 ✓
(CON LETRA)		
(SETECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 3/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	3,572.62 ✓
SALDO NETO A RECIBIR	\$	721,670.41 ✓

AUTORIZO	ELABORO
ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS RESIDENTE D.O.P.M	STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. CARLOS AGUILAR GARCIA SUBDIRECTOR DE DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.
Vo. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

CHIHUAHUA, CHIH.,

31 de agosto de 2017

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA / DIR. OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO., LA CANTIDAD DE: \$ 721,670.41
(SETECIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 41/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 3 (TRES) CONTRATO No. 063/2017 POR LA CANTIDAD DE : \$ 3,991,474.73
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
"PAVIMENTACION DEL CAMINO EL SAUZ- NUEVAS DELICIAS, INCLUYE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15
CM. DE ESPESOR Y GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA PRIMERA ETAPA DEL KM. 0+049.55 AL 1+050"

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 893,156.45

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 267,946.94

SUBTOTAL \$ 625,209.51

IVA \$ 100,033.52

TOTAL \$ 725,243.03

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

D.I.F. DEL 0.2% 1,786.31

CMIC. DEL 0.2% 1,786.31

SUMA 3,572.62

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 3,991,474.73
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 1,650,534.86
ESTA ESTIMACION	\$ 1,036,061.48
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 2,686,596.34
POR EJERCER	\$ 1,304,878.39

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 1,197,442.41
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 495,160.46
ESTA ESTIMACION	\$ 310,818.45
ACUMULADO ACTUAL	\$ 805,978.91
POR AMORTIZAR	\$ 391,463.50

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% C.M.I.C.

0.2% D.I.F.

ACUMULADO ANTERIOR	\$ 2,845.75	\$ 2,845.75
ESTA ESTIMACION	\$ 1,786.31	\$ 1,786.31
ACUMULADO ACTUAL	\$ 4,632.06	\$ 4,632.06

R E C I B I M O S

STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
SCO-091026-IPG

OBRA: "PAVIMENTACION DEL CAMINO EL SAUZ-NUEVAS DELICIAS, INCLUYE
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR Y
GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA PRIMERA ETAPA DEL KM. 0+049.55 AL
1+050"

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

No. CONTRATO: 063/2017

ESTIMACIÓN No.

3 (TRES)

CONTRATISTA: STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

PERÍODO: 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017


RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

	<u>NORMALES</u>	\$ 33,233.27
	<u>EXTRAORDINARIOS</u>	\$ 859,923.18

SUBTOTAL \$ 893,156.45

I.V.A. \$ 142,905.03

TOTAL \$ 1,036,061.48


RESIDENTE


CONTRATISTA

OBRA: "PAVIMENTACION DEL CAMINO EL SAUZ-NUEVAS DELICIAS, INCLUYE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR Y GUARNICIONES TIPO PECHO PALOMA PRIMERA ETAPA DEL KM. 0+049.55 AL 1+050"

MUNICIPIO: CHIHUAHUA No. CONTRATO: 063/2017

ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)

CONTRATISTA:

STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


PERIODO: 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO			VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
	TOTAL DE LA ESTIMACION							893,156.45
	OBRA NORMAL							\$ 33,233.27
	PAVIMENTOS							
4.2	Suministro y colocación de riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento medio tipo RL-2K, por unidad de obra terminada, a razón de 1.50 lt/m2. Incluye: material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, operación de calentamiento o recalentamiento, aplicación, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	7,975.00	6702.55	4207.56	2,494.99	\$13.32	33,233.27
	OBRA EXTRAORDINARIA							\$ 859,923.18
	EXTRAORDINARIOS							
EXT-1	Suministro y colocacion de Dentellon de 0.20 mts x .32 mts de altura, con concreto hidraulico MR=40 Kg/Cm2, Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.I.U.T	M		1520.00	800.00	720.00	\$181.29	130,528.80
EXT-3	Suministro y colocacion de concreto hiraulico en carpetas, por unidad de obra terminada de concreto simle MR=40 Kg/Cm2 con fibra (2 Lbs/m3) de 12 cm de espesor, acabado rastrillado, incluye materiales, silletas, pasa juntas, cimbra metalica, cimbrado y decimbrado, calafateo con sello isonometric, cola de rata, aserrado, cortes, acero de trasmision de esfuerzos de 1/2", mano de obra, herramienta, barrido de la base Impregnada, vibrado con regla vibratoria y por inmersión y todo lo necesario para su correcta	M2		5434.00	2860.00	2,574.00	\$283.37	729,394.38


RESIDENTE



CONTRATISTA

4.2 : RIEGO DE IMPREGNACION



Jadys

EXT.-1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DENTELLON




220 M
140 M

360 M

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EXT-3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO

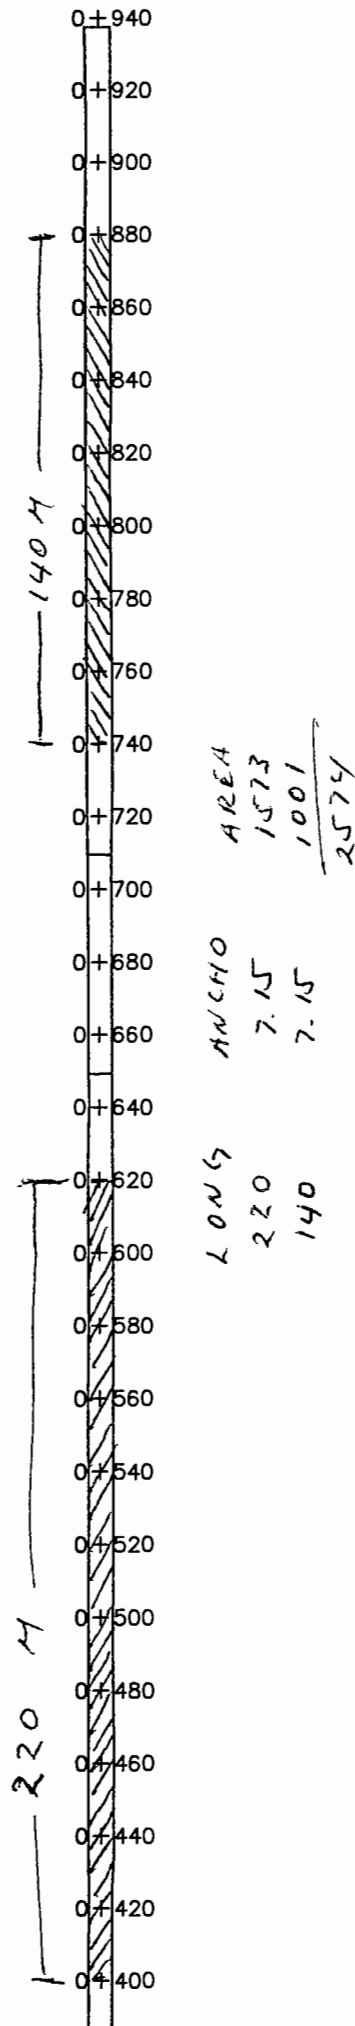

Ja Top

FOTOS DE ESTIM 3



SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION



SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FOTOS DE ESTIM 3



SUMINISTRO Y COLOCACION DE DENTELLON



SUMINISTRO Y COLOCACION DE DENTELLON

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FOTOS DE ESTIM 3



SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO



SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Factura

SERIE:

FOLIO: 296

FECHA: 26/10/2017 08:32:38

Documento Válido

GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CONMAAC S. DE R.L DE C.V

GIC130712697

RAMON DOMINGUEZ No. 104 DEPORTISTAS,

CHIHUAHUA 31125

CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Domicilio: CALLE: MINA No. 408

Teléfono:

Ciudad: CHIHUAHUA

Colonia: COL: CENTRO
Estado: CHIHUAHUAC.P.: 31000
País: MEXICO

Lugar de Expedición: RAMON DOMINGUEZ 104, DEPORTISTAS, 31125, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Régimen Fiscal: Persona Moral Régimen General de Ley

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	ESTIMACION No 1 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CALLES Y AVENIDAS EN ZONA NOR ORIENTE DE LA CIUDAD, NUMERO DE CONTRATO No 150/2017. MONTO DE LA ESTIMACION \$997,147.99 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$299,144.40 SUMA \$698,003.59 IVA \$111,680.57 TOTAL \$809,684.16 DESCUENTOS 0.2% D.I.F (AL MILLAR) \$1,994.30 0.2% C.M.I.C (AL MILLAR) \$1,994.30 SUMA \$3,988.60 NETO A RECIBIR \$805,695.56	698,003.59	698,003.59

Importe con letra
OCHOCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N.
Método de Pago
02 Cheque nominativo
Número de Cuenta:

SUBTOTAL:	698,003.59
I.V.A.:	111,680.57
TOTAL:	809,684.16

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301341784
Folio fiscal:	3EDB00B3-7589-42B5-9C47-FD071E0CB26D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Octubre 26 2017 - 09:38:10

Sello digital del CFDI
Znhqc86KCM5LJ91SdBianKYC4cE22jK2OKANTH5GnjTj4WzoY0uCRuMS3dtRshLgUlvJpryVQ1lw1oDUZh26BU Djz9BK1oRXqTV25issryLctgcycitTazm880WBOQ/MF2ztqx73Wu010NnsTYruwMxNipG7gG72EoEB0oLBo=

Sello del SAT
DUVinCgi+UwyS4ub38nbaeDgDwmDoC/3R00E/HqNkH22pds/Gh1hLQY5vc+DibQUupnu9y1Re2n1Tty MchSugq84KqChEdQ31N+McN08uH+fjWchj673LEZqKUMwep9dT4oIsJmvd8EjuiBOH86+MaAPaca3 w/0Pavtyw135qm2BFla+FdLgFxyWibJyT63RyZnuK1Cayc9117cyrunx9fruRvmo28nvQnd56c6k/k odMKpWxev3QY2YMFmGmJ10SAsCViqbN27d5M/R-5nec13He1W0UNV4c0N2oPWHGAI1X+*2fcd1 2xHEGAK7UHGZYludcawffg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 3EDB00B3-7589-42B5-9C47-FD071E0CB26D 2017-10-26T09:38:10 Znhqc86KCM5LJ91SdBianKYC4cE22jK2OKANTH5GnjTj4WzoY0uCRuMS3dtRshLgUlvJpryVQ1lw1oDUZh26BU Djz9BK1oRXqTV25issryLctgcycitTazm880WBOQ/MF2ztqx73Wu010NnsTYruwMxNipG7gG72EoEB0oLBo=10000100000404486074

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

5/1

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GIC130712697	GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CONMAAC S. DE R.L DE C.V	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3EDB00B3-7589-42B5-9C47-FD071E0CB26D	2017-10-26T08:32:38	2017-10-26T09:38:10	MAS0810247C0

Handwritten signature inside a circle, crossed out with a large 'X'.

Handwritten signature, crossed out with a large 'X'.

Total del CFDI

Efecto del comprobante

Estado CFDI

\$809,684.16

ingreso

Vigente

Imprimir

1/2

Enlaces

[Declaración de Accesibilidad](https://www.gob.mx/accesibilidad)
(<https://www.gob.mx/accesibilidad>)

[Política de privacidad](https://www.gob.mx/privacidad)
(<https://www.gob.mx/privacidad>)

[Términos y Condiciones](https://www.gob.mx/terminos)
(<https://www.gob.mx/terminos>)

[Marco jurídico](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
(<http://www.ordenjuridico.gob.mx>)

[Portal de Obligaciones de Transparencia](http://portaltransparencia.gob.mx)
(<http://portaltransparencia.gob.mx>)

[Sistema Infomex](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
(<https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action>)

[INAÍ](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
(<http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx>)

[Mapa de sitio](https://www.gob.mx/sitemap)
(<https://www.gob.mx/sitemap>)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)
(<https://www.gob.mx/que-es-gobmx>)

[English](https://www.gob.mx/en/index)
(<https://www.gob.mx/en/index>)

[Temas](https://www.gob.mx/temas)
(<https://www.gob.mx/temas>)
[Reformas](http://reformas.gob.mx) (<http://reformas.gob.mx>)


Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores públicos](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)
(<https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54>)

Mantente informado.
Suscríbete.

Síguenos en






PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

HOJA DE RESUMEN FINAL
No. 1


PROGRAMA:		CONTRATO No. 150/2017	CONTRATADO \$ 1,215,836.85
OBRA: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CALLES Y AVENIDAS EN ZONA NOR ORIENTE DE LA CIUDAD		ESTIMACION No. 1	
ING. MARIO ALBERTO GONZALEZ BERNAL		GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CONMAAC S. DE R.L. DE C.V.	
R.F.C. GIC-130712-697		PERIODO : DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2017.	
		IMPORTE ESTIMADO \$ 997,147.99	
		IMPORTE ACUMULADO \$997,147.99	
C O N C E P T O		I M P O R T E	O B S E R V A C I O N E S
PINTURA TRAFICO HULE CLORADO		\$394,866.69	
PINTURA TERMOPLASTICA		\$551,416.50	
PINTURA EN PASOS PEATONALES HULE CLORADO		\$10,864.80	
VIALETAS EN VIALIDADES		\$40,000.00	
IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION		\$ 997,147.99	
DESCUENTOS:		FORMULO:	
0.2 % DIF (AL MILLAR).		RESIDENTE DE OBRA	
\$ 1,994.30		ING. ALEJANDRO PEREZ PINEDO	
0.2 % CMIC (AL MILLAR).		REVISOR	
\$ 1,994.30		Jefe del DEPTO. DE MANTENIMIENTO VIAL	
SUMA DESCUENTOS		\$ 3,988.60	
		SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	
RESUMEN:		ING. VICTOR AMADOR PONCE DE LEÓN	
SUMA ESTA ESTIMACION		\$ 997,147.99	
AMORTIZACION ANTICIPO (30%)		\$ 299,144.40	
DESCUENTOS		\$ 3,988.60	
SUB - TOTAL		\$ 694,014.99	
I.V.A.		\$ 111,680.57	
SALDO NETO PARA PAGO		\$ 805,695.56	
CON LETRA:		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	
(OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.)		ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPTO. MEJORAMIENTO VIAL		CONTRATO No. 150/2017 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 OBRA: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CALLES Y AVENIDAS EN ZONA NOR ORIENTE DE LA CIUDAD			Km. A Km. ORIGEN:				
					EST. No. 1 HOJA No. 1 DE 1				
		CONTRATISTA: GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CONMAAC S. DE R.L. DE C.V.			PERIODO: DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2017.				
O B R A (ESTACION Y DESCRIPCION)	C O N C E P T O			C A N T I D A D E S				RECIO UNITARI (\$)	IMPORTE (\$)
	INCISO	DESCRIPCION	UNI	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION		
1		PINTURA TRAFICO DE HULE CLORADO, GUIONES, LINEAS CONTINUAS SOBRE VIALIDADES	ML	63,016.80	48,449.90	0	48,449.90	\$ 8.15	\$ 394,866.69
2		PINTURA TERMOPLASTICA GUIONES EN CARRILES LINEAS CONTINUAS SOBRE VIALIDADES	ML	12,253.70	12253.70	0	12253.70	\$ 45.00	\$ 551,416.50
3		PINTURA TRAFICO HULE CLORADO SOBRE PASOS PEATONES.	M2	108.00	108.00	0	108.00	\$ 100.60	\$ 10,864.80
4		COLOCACION DE VIALETAS SOBRE VIALIDADES	PZS	3,500.00	1,000.00	0	1,000.00	\$ 40.00	\$ 40,000.00
									\$ 997,147.99




N O T A S	(NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.)	
	LUGAR: CHIHUAHUA, CHIH. FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2017 ESTIMO: ING. ALEJANDRO PEREZ PINEDO REVISO:  Jefe Depto. ING. VICTOR AMOR PONCE DE LEON	ACEPTO:  Contratista GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CONMAAC S. DE R.L. DE C.V. Vo.Bo. 7-9-17 Subdirector: ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

PINTURA TRAFICO HULE CLORADO

CALLE	AV. LOS ARCOS DE AV. TECNOLOGICO Y AV. CHICOACEN			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	263	X4.5	1183.5
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	76.6		76.6
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	1116		1116
			TOTAL DE ML	2376.1

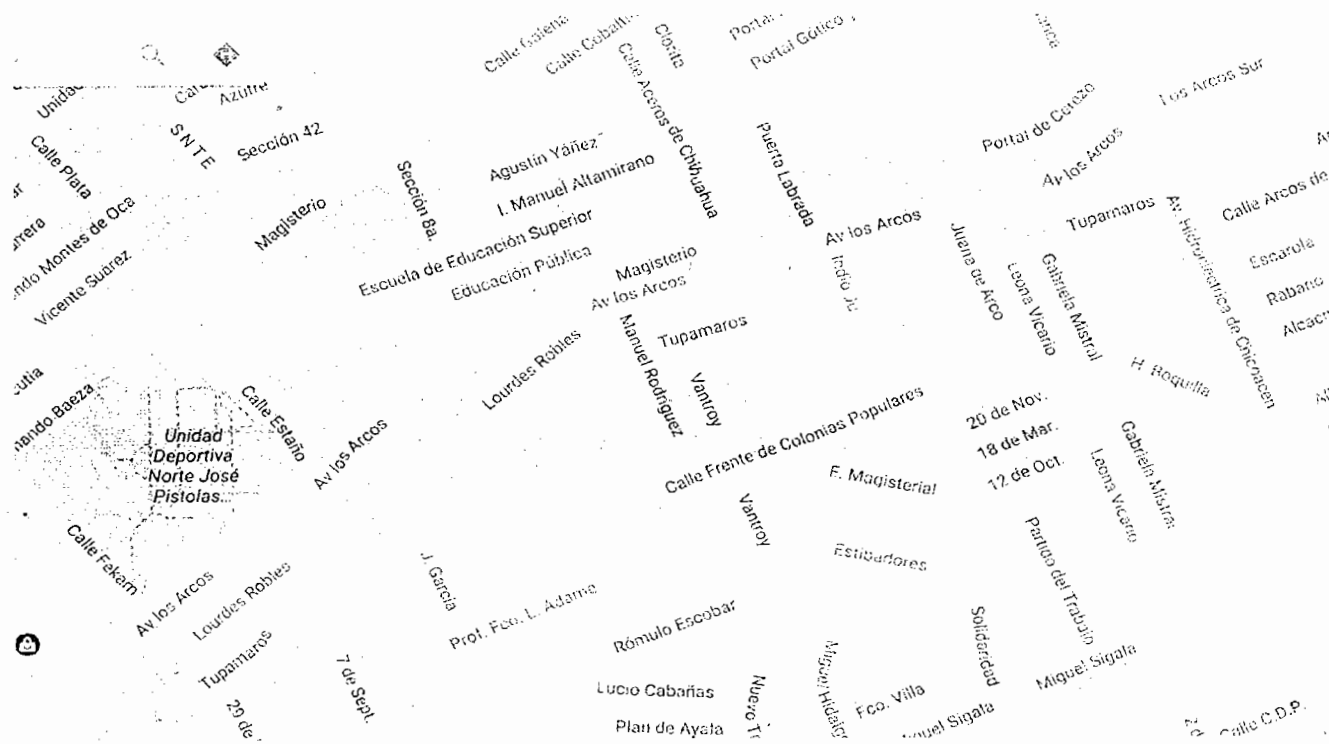

CALLE LOS ARCOS

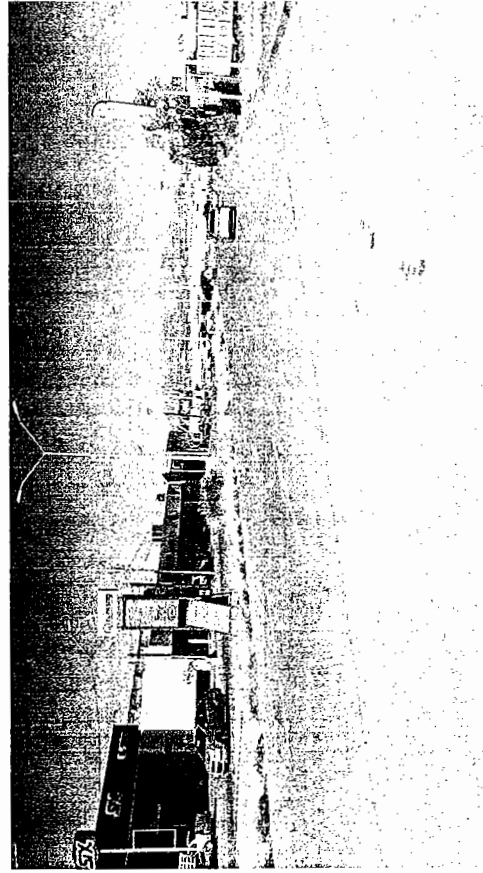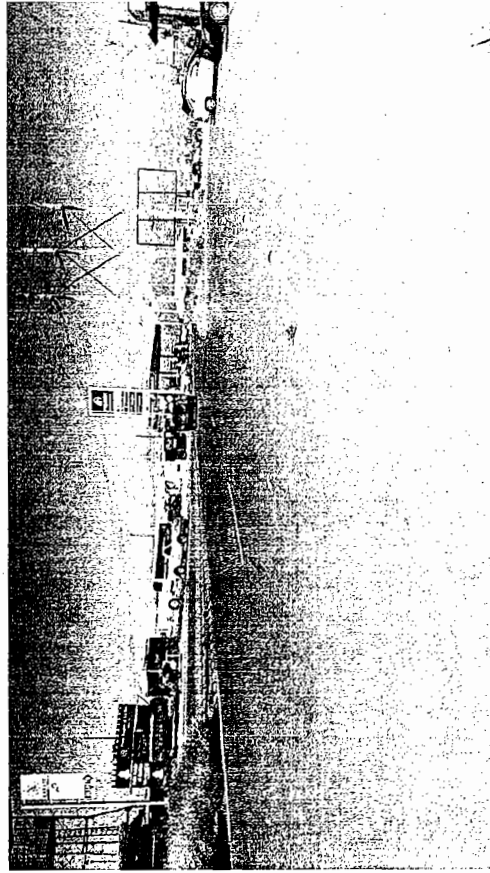


Q R

GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CONMAAC S. DE R.L. DE C.V.



PINTURA TRAFICO HULE CLORADO

CALLE	AV. TECNOLÓGICO DE NIÑOS HEROES A JUAN ESCUTIA			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	1675	X5	8375
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	5747		5747
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	2580		2580
VIALETAS	PZS	494		
			TOTAL DE ML	16702

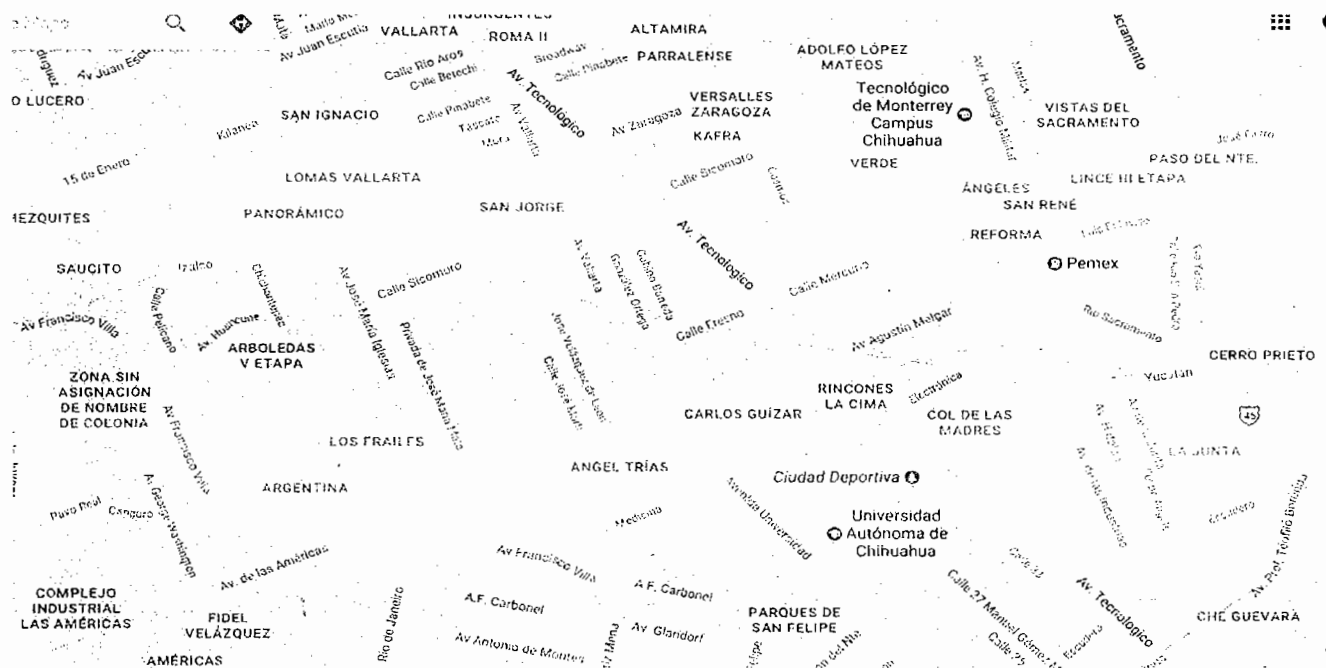

[Handwritten signature and initials]

AV. TECNOLÓGICO/COLON

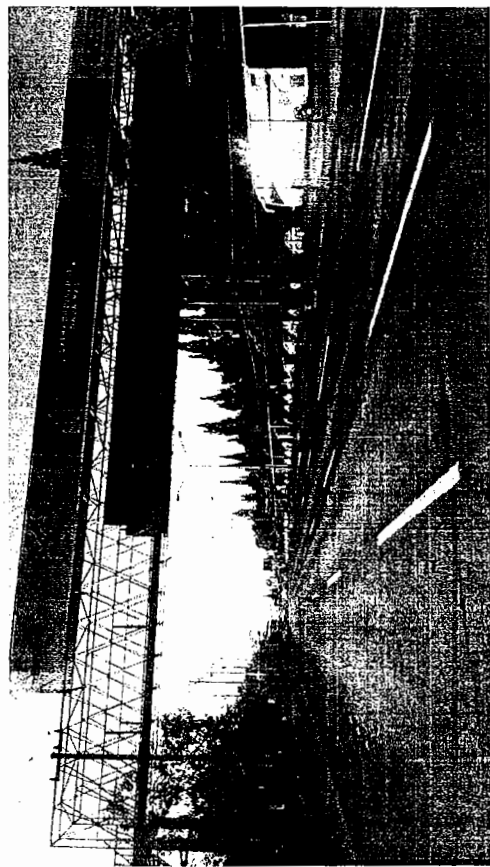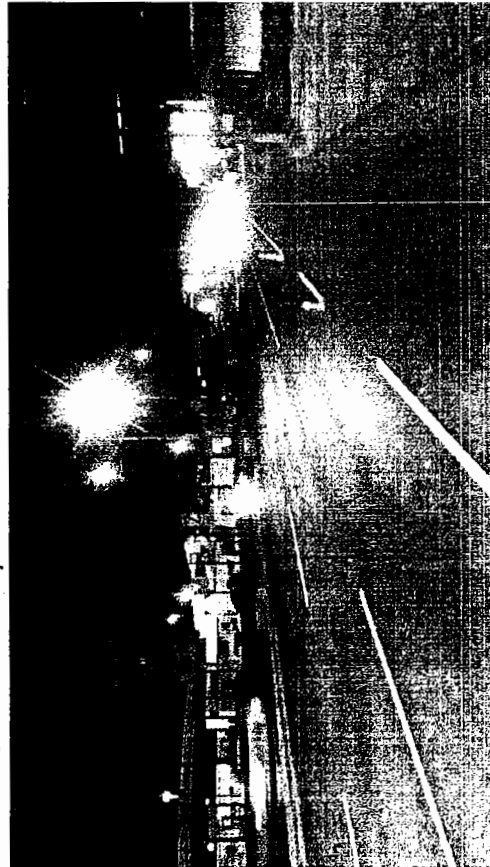


DR

GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CONMAAC S. DE R.L. DE C.V.



PINTURA TRAFICO HULE CLORADO

CALLE	AV. DIVISION DEL NORTE DE AV. UNIVERSIDAD A AV. TECNOLOGICO			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	270	X5	1350
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	390		390
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	0		0
VIALETAS	PZS	0		
			TOTAL DE ML	1740

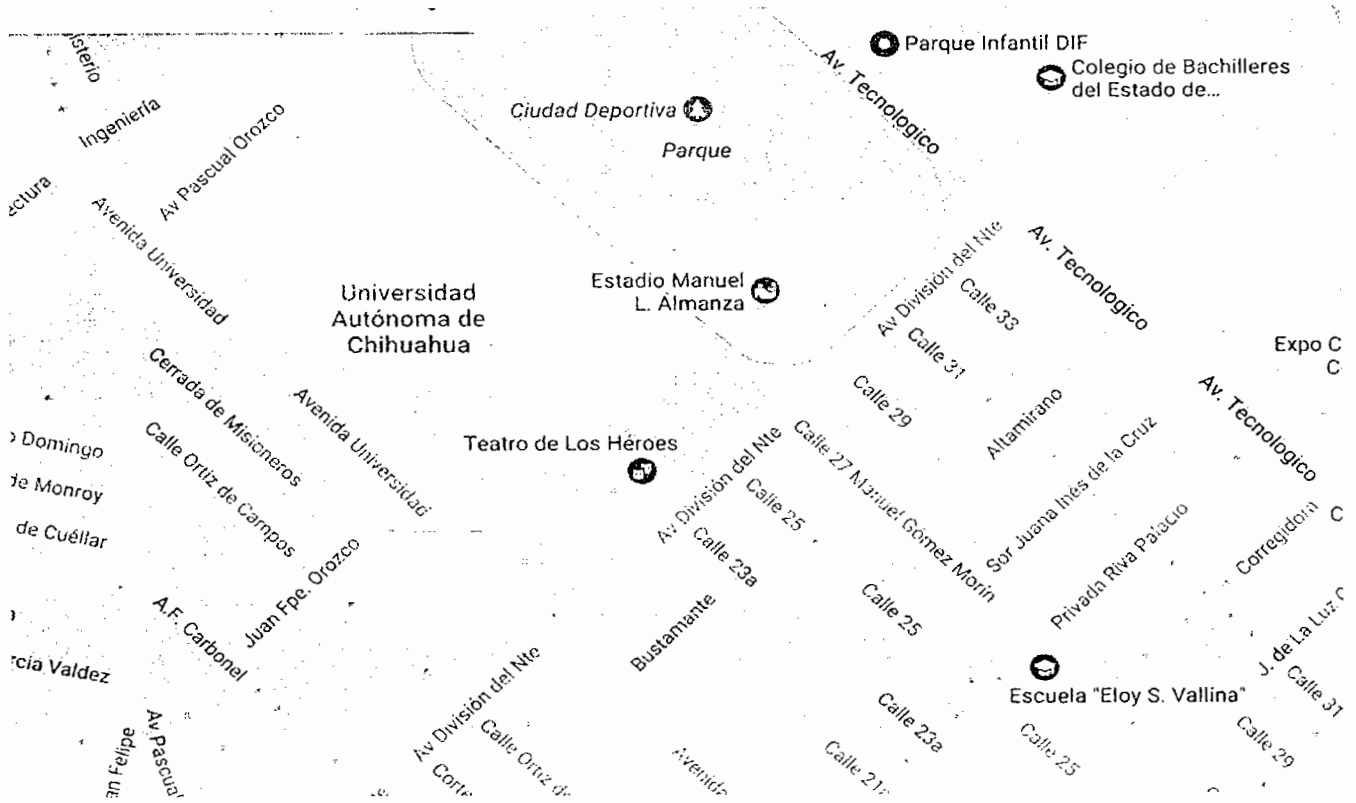

[Handwritten signature and initials]


AV. DIVISION DEL NORTE

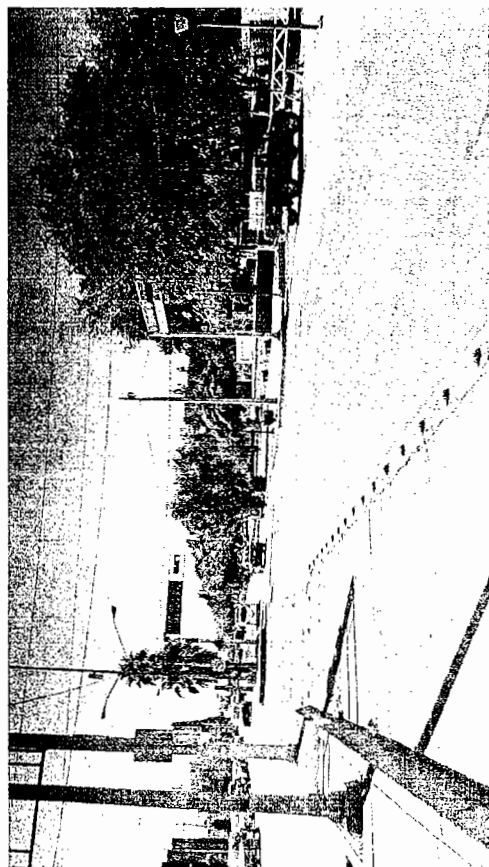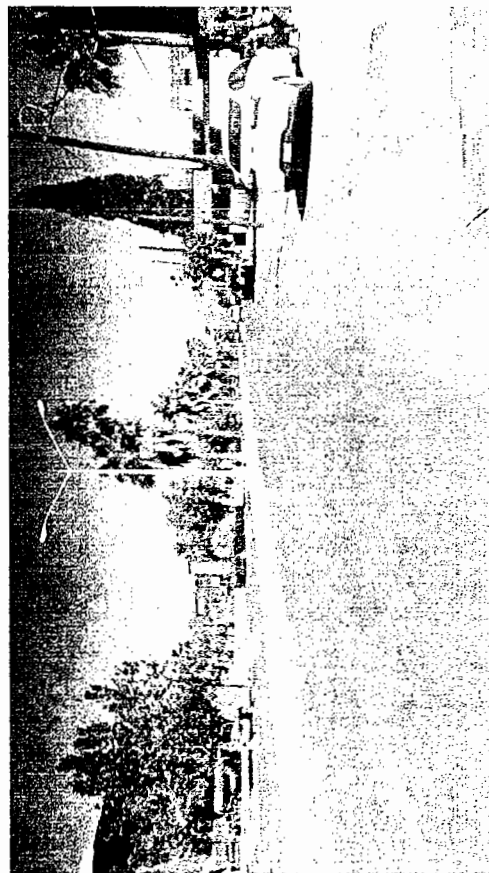





Q R

PINTURA TRAFICO HULE CLORADO

CALLE	CALLE HIDALGO DE YUCATAN A ESCUDERO			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	236	X5	1180
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	0		
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	0		
			TOTAL DE ML	1180

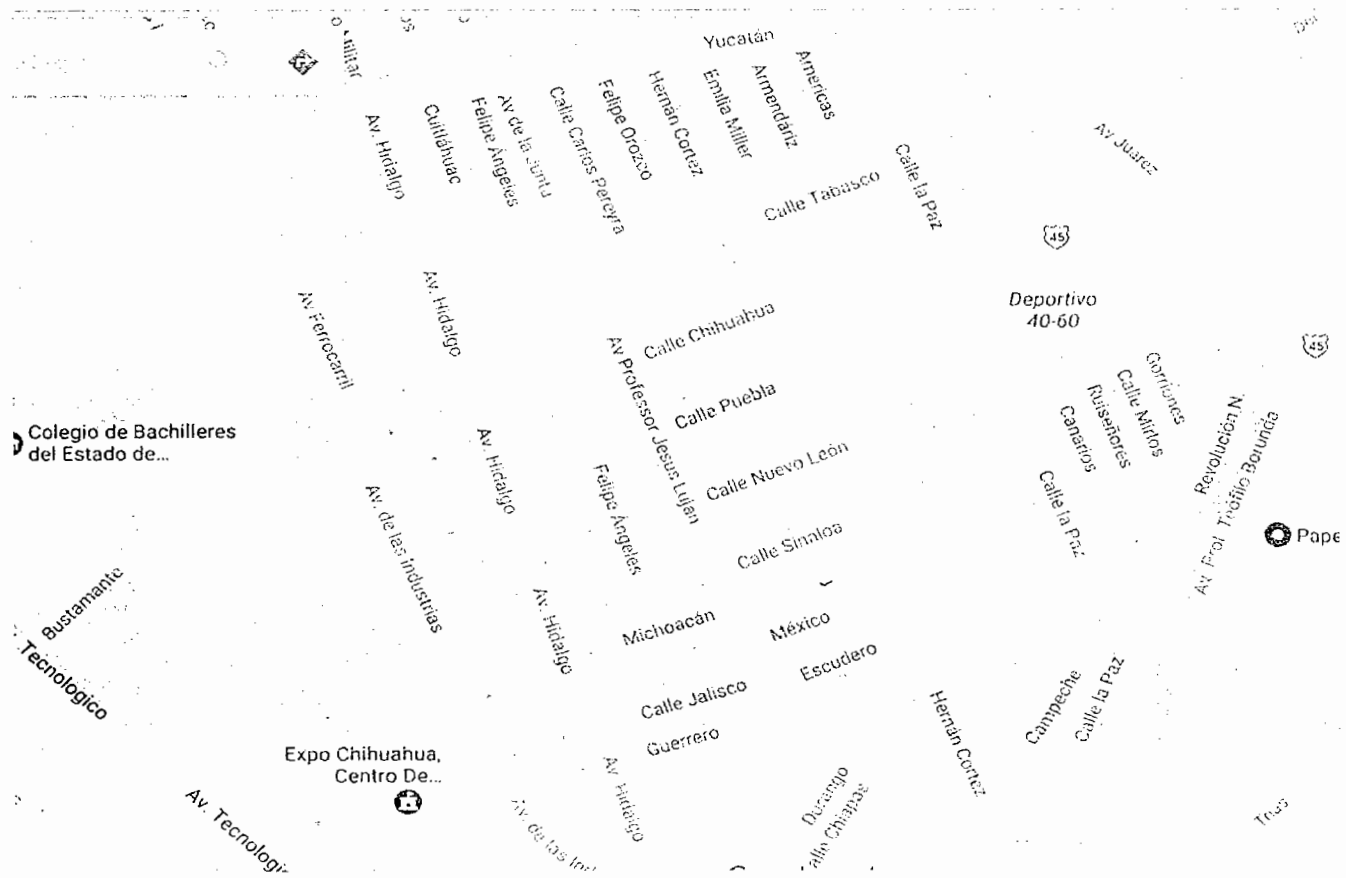


CALLE HIDALGO

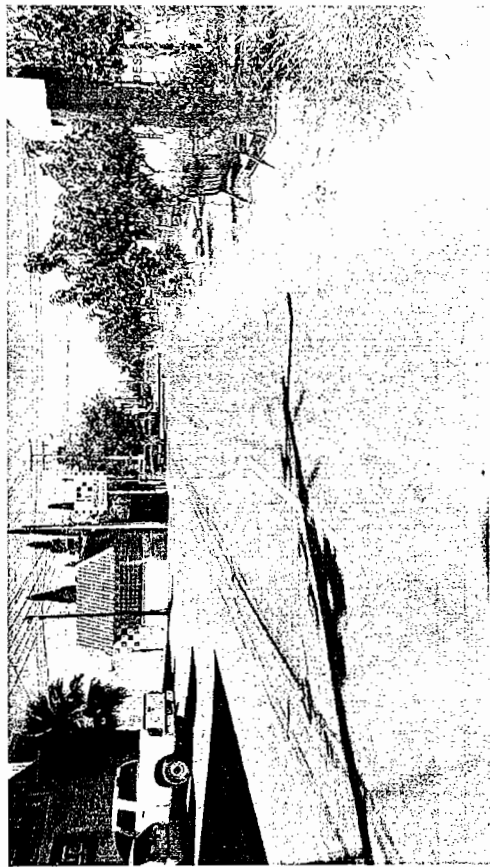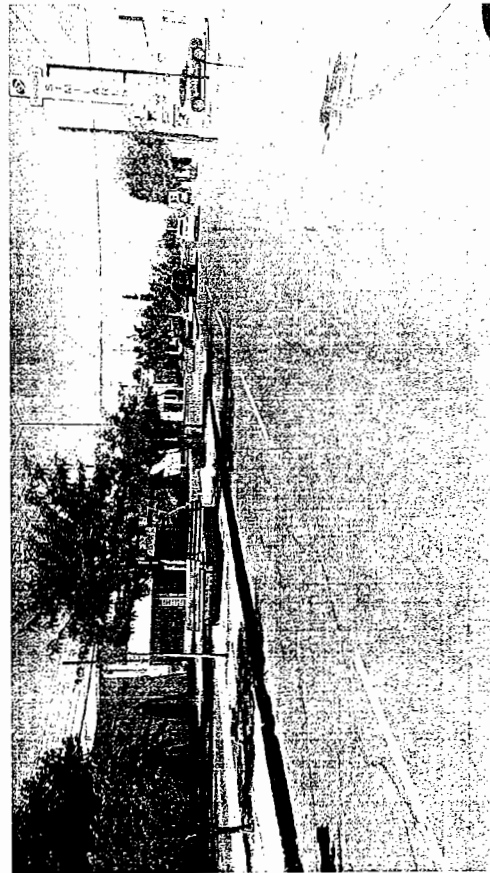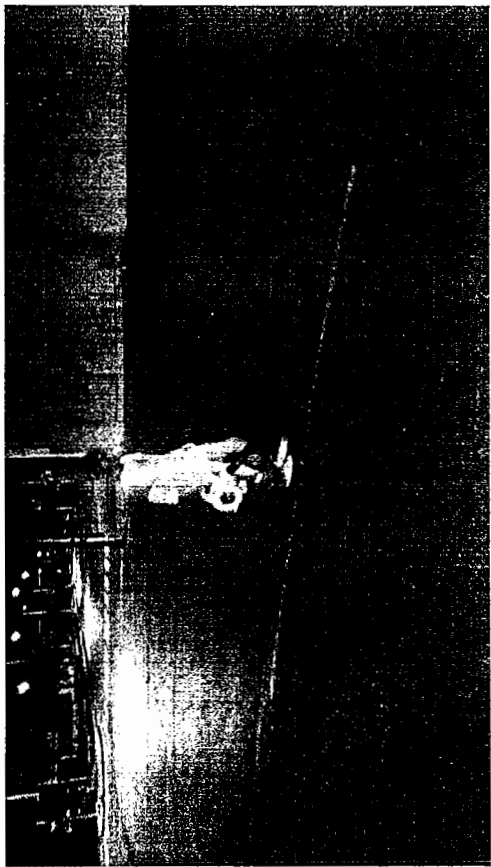


Handwritten signature or initials, possibly "P R".

PINTURA TRAFICO HULE CLORADO

CALLE	AVENIDA LA JUNTA DE TEOFILO BORUNDA A CALLE YUCATAN			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	258	X5	1290
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	0		0
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	1819		1819
			TOTAL DE ML	3109

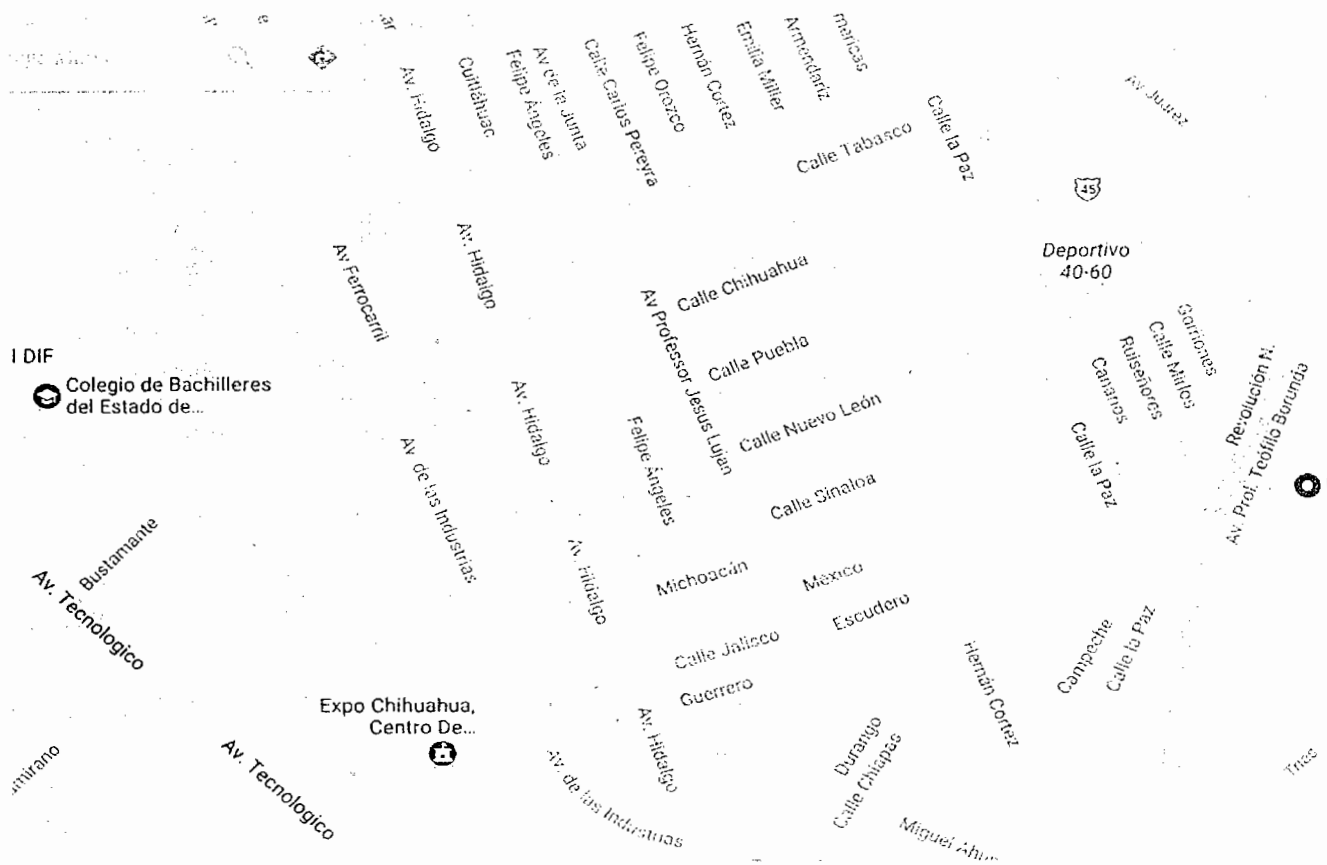


AV. LA JUNTA

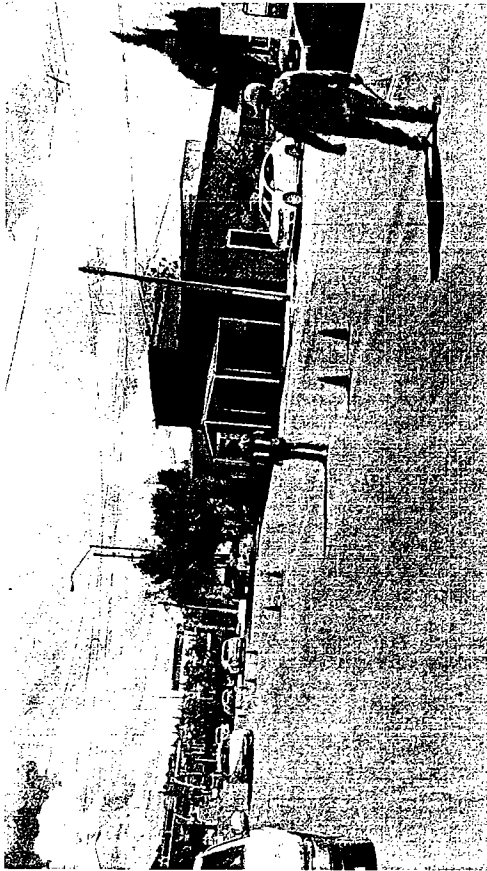


Handwritten signature or initials.

PINTURA TRAFICO HULE CLORADO

CALLE	AVENIDA AGUSTIN MELGAR DE AV. VALLARTA A AV. TECNOLOGICO			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	208	X5	1040
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	105		105
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	1572		1572
			TOTAL DE ML	2717

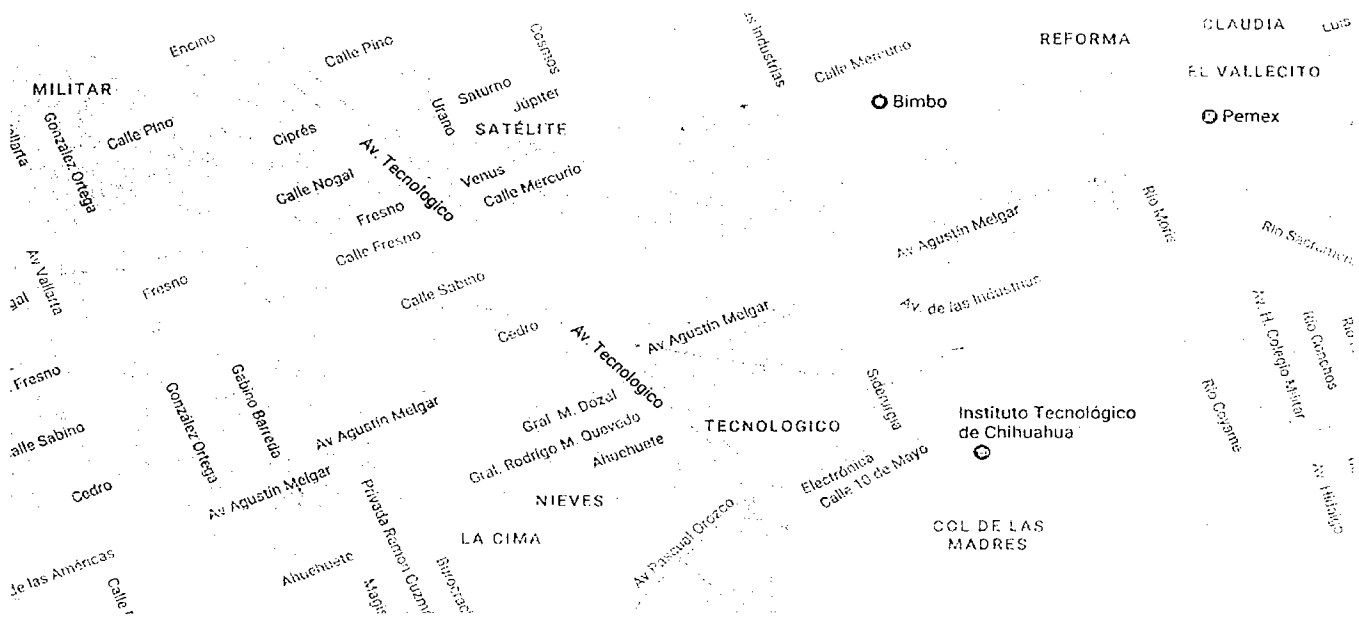

CALLE AGUSTIN MELGAR

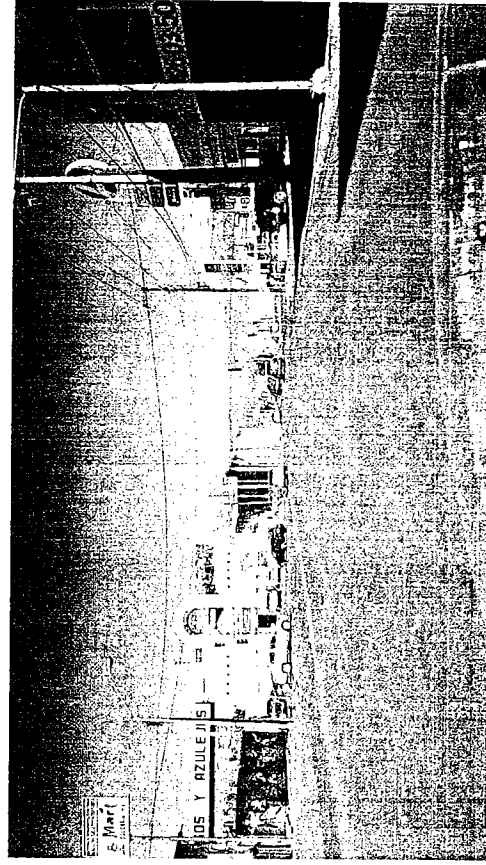


Handwritten signature or initials, possibly "D R", enclosed in a circle.

GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CONMAAC S. DE R.L. DE C.V.



PINTURA TRAFICO HULE CLORADO

CALLE	CALLE ESCUDERO DE AV. UNIVERSIDAD Y AV. LA JUNTA			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	167	X5	835
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	219		219
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	844		844
			TOTAL DE ML	1898

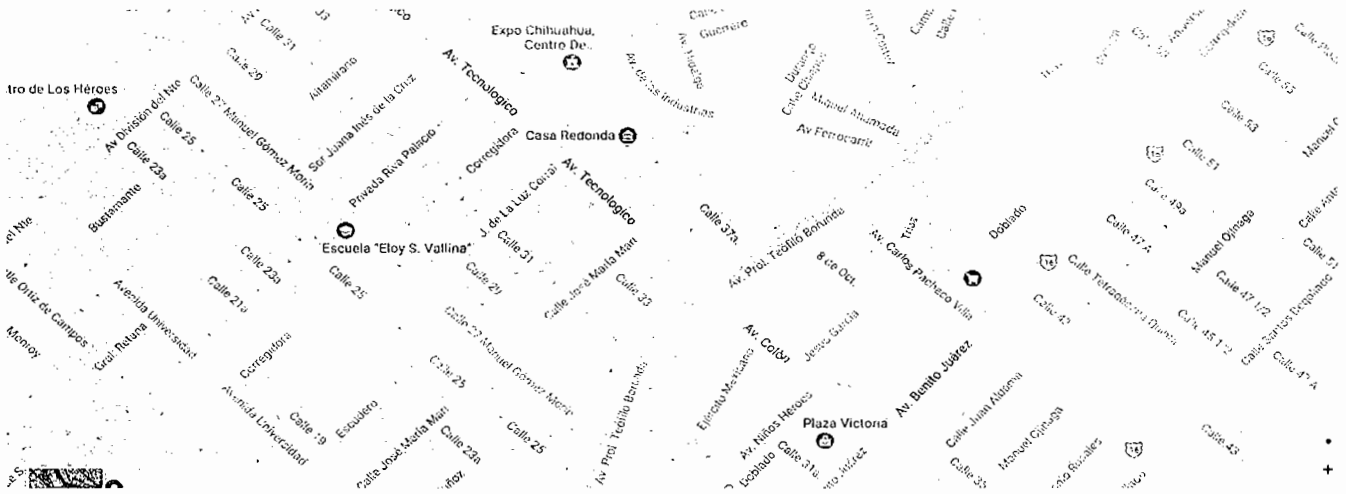

Handwritten signature and initials.

CALLE ESCUDERO

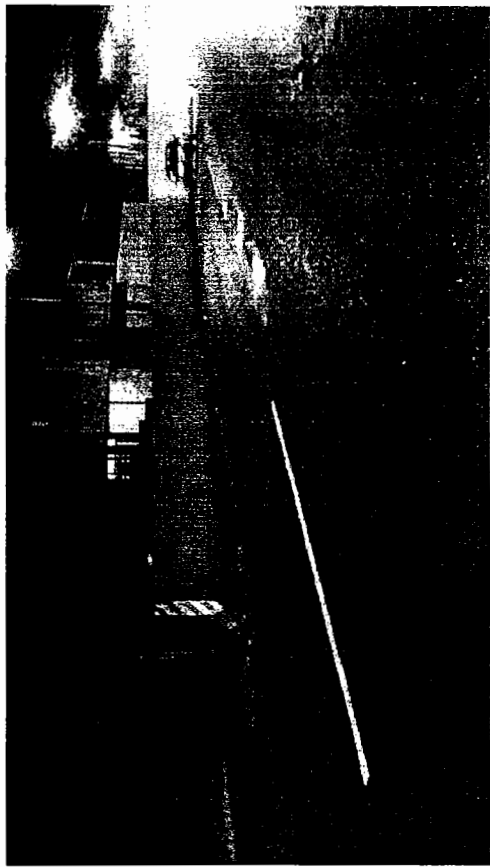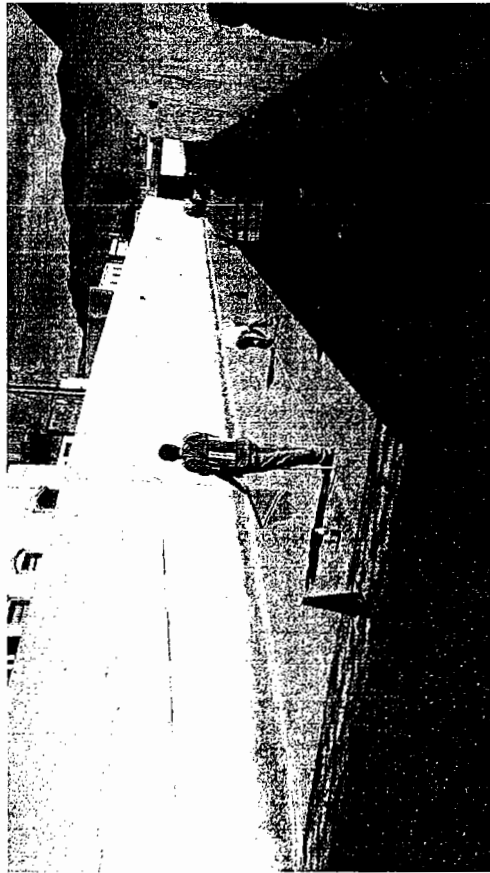


DR

GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CONMAAC S. DE R.L. DE C.V.




PINTURA TRAFICO HULE CLORADO

CALLE	CALLE 25 DE DIVISION DEL NORTE A TEOFILO BORUNDA			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	237	X5	1185
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	242		242
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	0		0
			TOTAL DE ML	1427

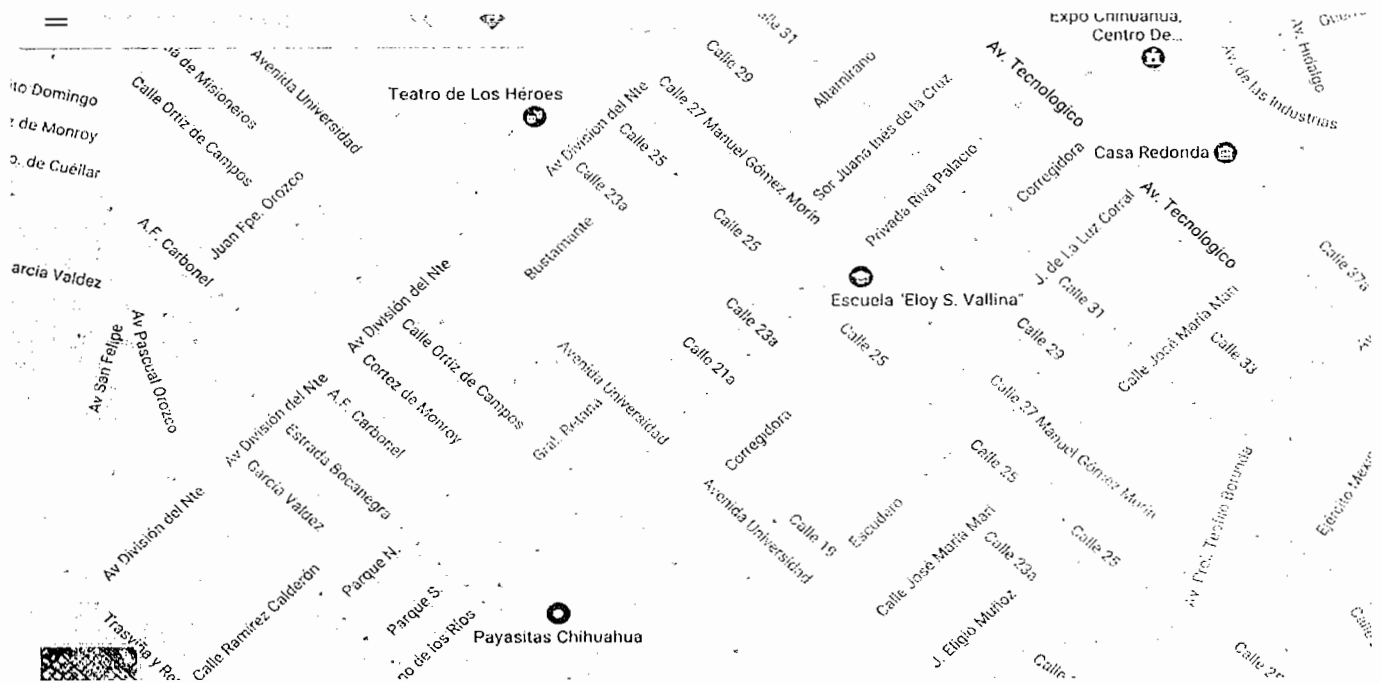

Handwritten signature and initials.


CALLE 25

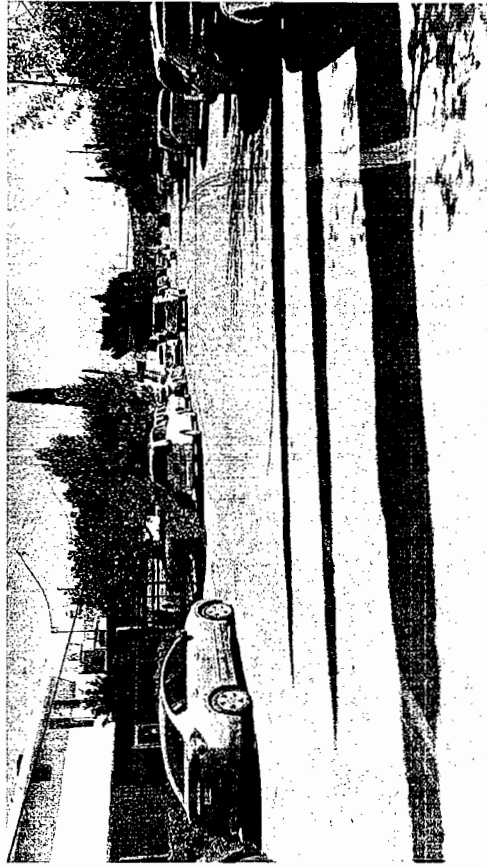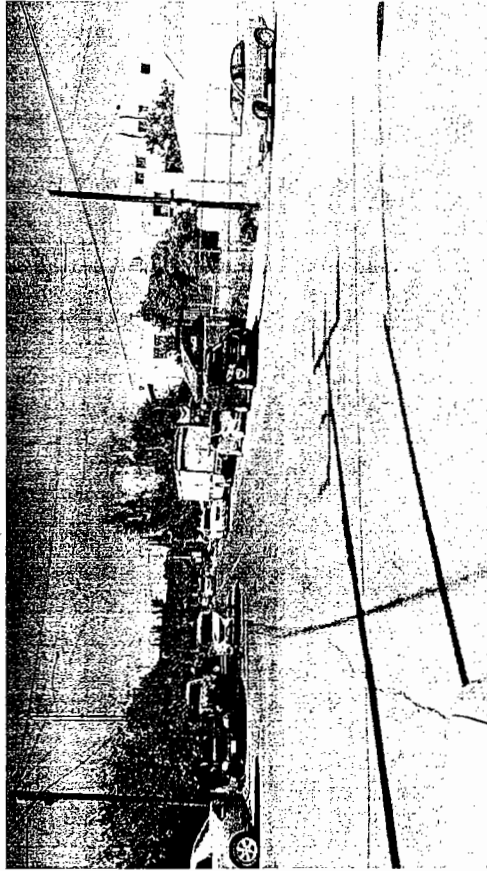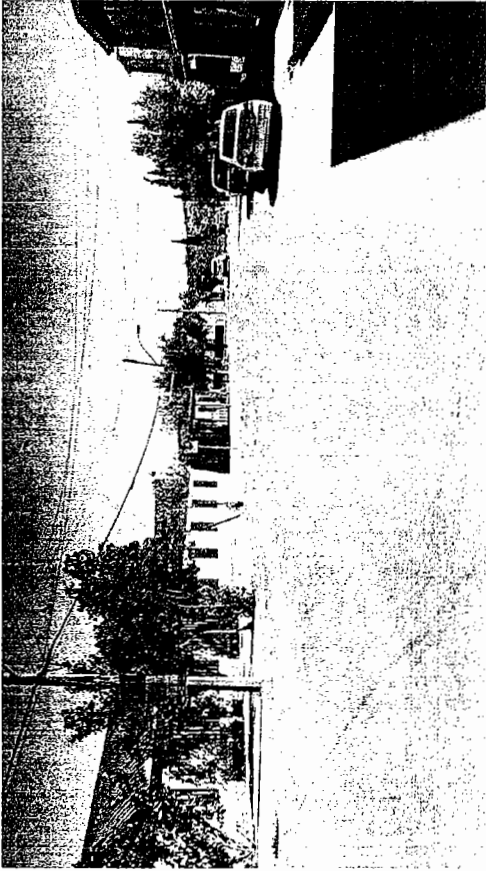



Handwritten signature or initials.

PINTURA TRAFICO HULE CLORADO

CALLE	AV. PASCUAL OROZCO DE AV. TECNOLOGICO A UNIVERSIDAD			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	179	X5	895
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	278		278
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	1031		1031
			TOTAL DE ML	2204

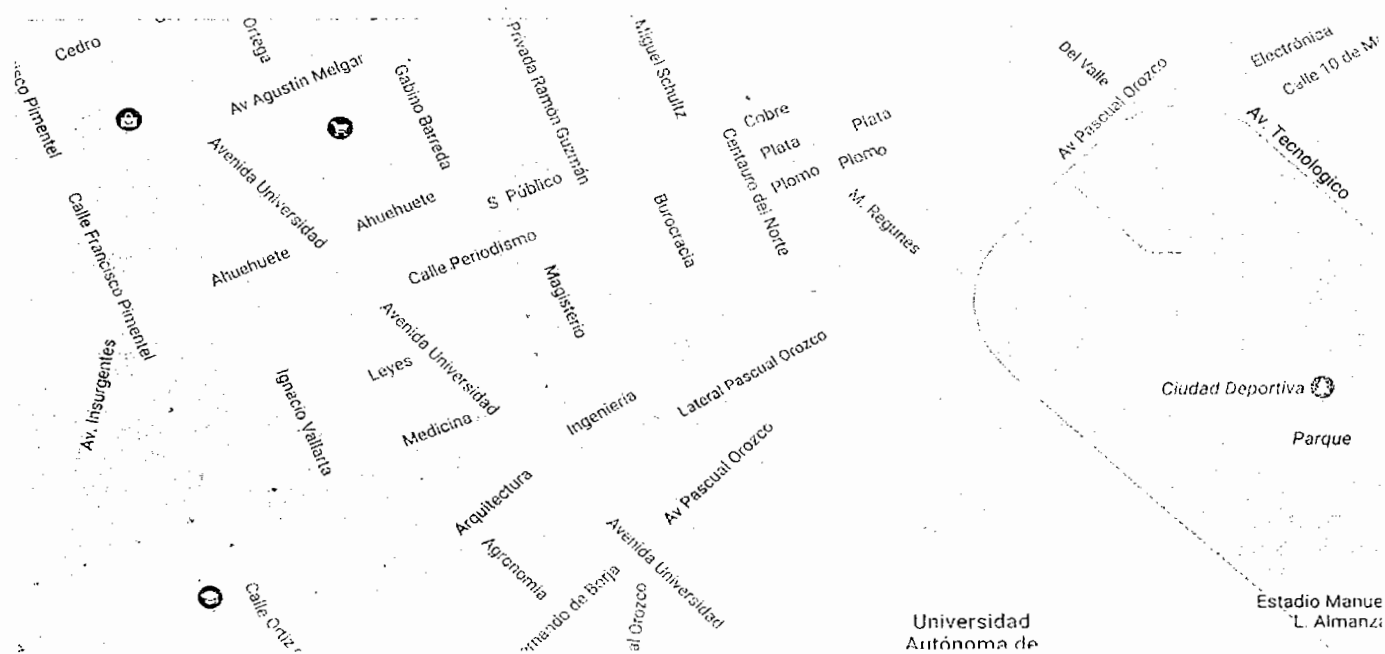

AV. PASCUAL OROZCO

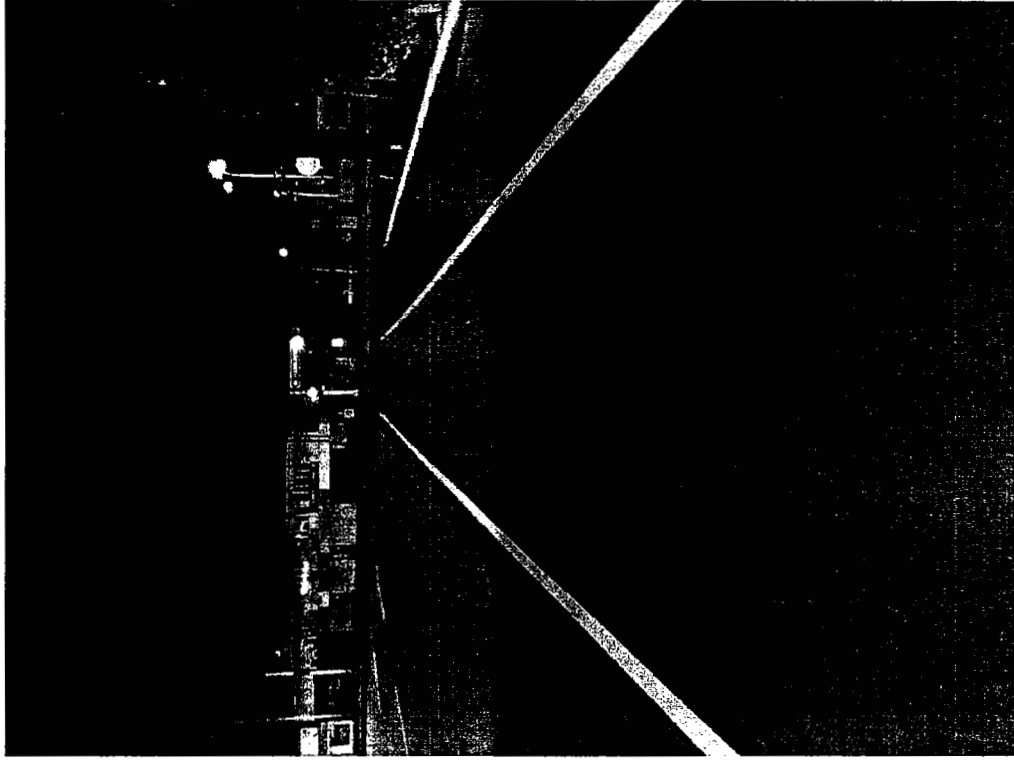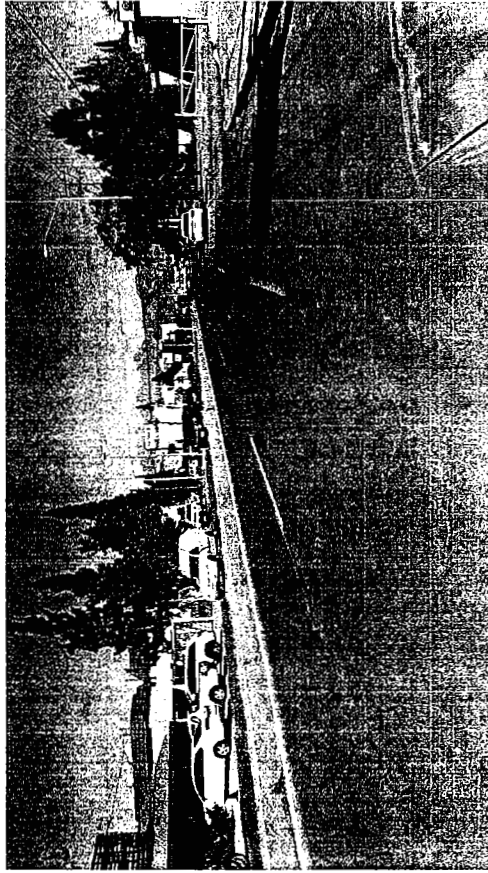


Q R

GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CONMAAC S. DE R.L. DE C.V.

PINTURA TRAFICO HULE CLORADO




CALLE	CALLE 21 DE TEOFILO BORUNDA A DIVISION DEL NORTE			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	152	X7	1064
LINEA CONTINUA BLANCA	ML			0
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	1021.4		1021.4
			TOTAL DE ML	2085.4

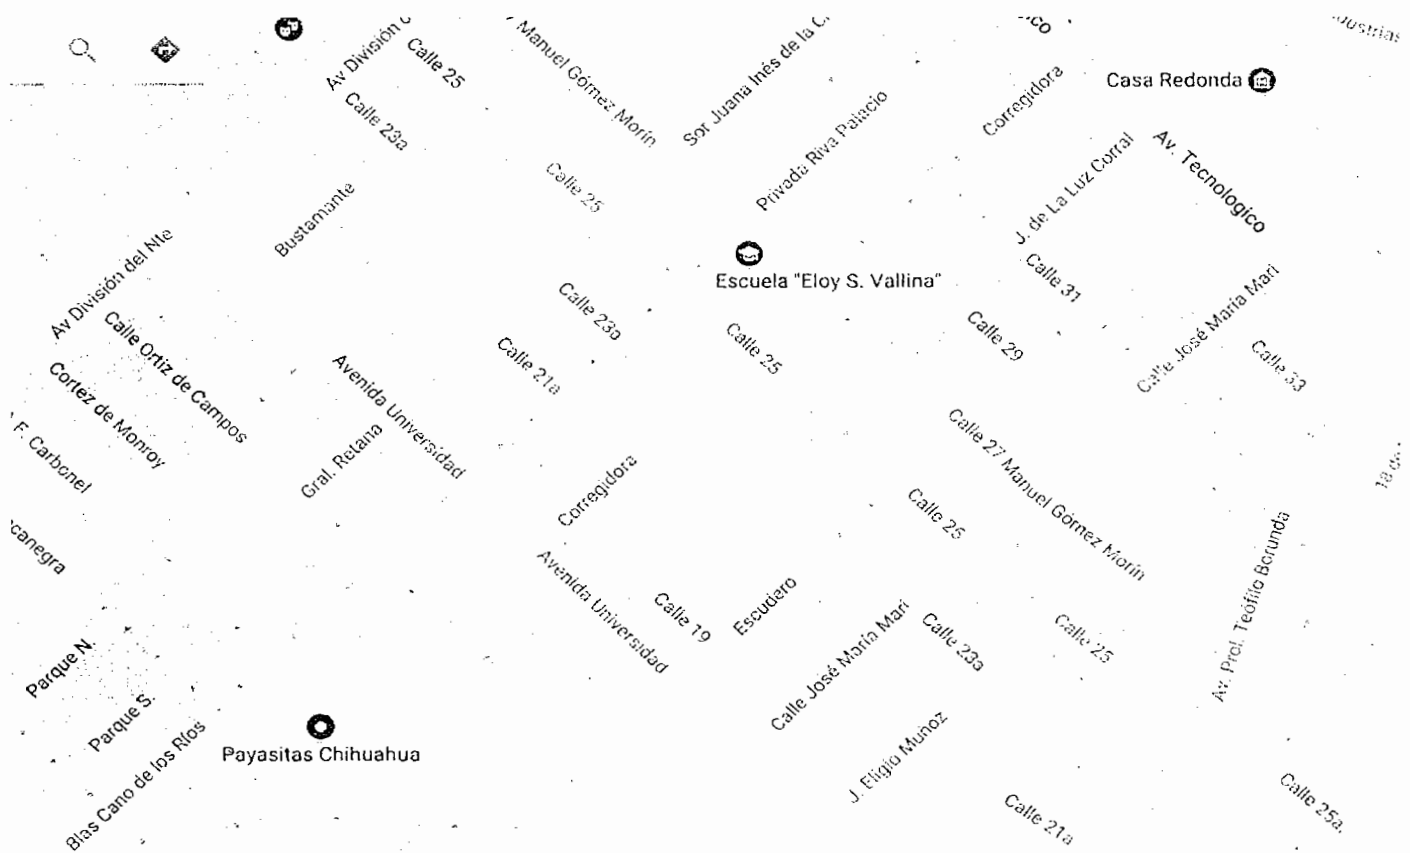

Go ale

Handwritten signature and initials.


CALLE 21

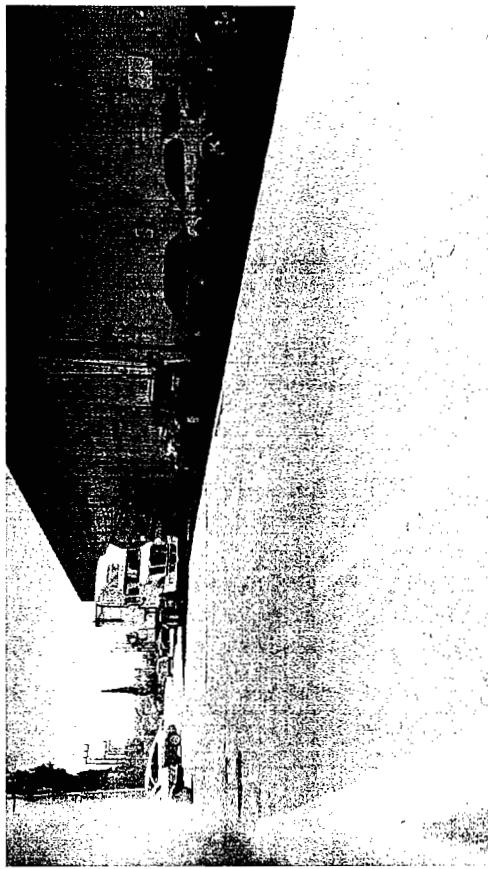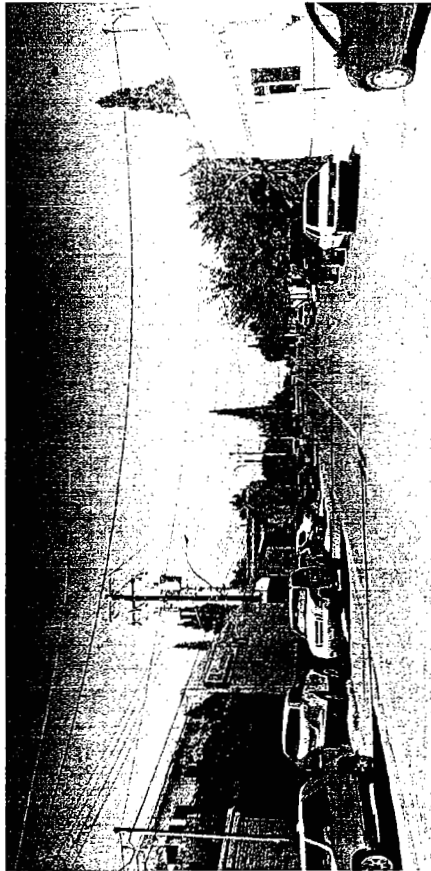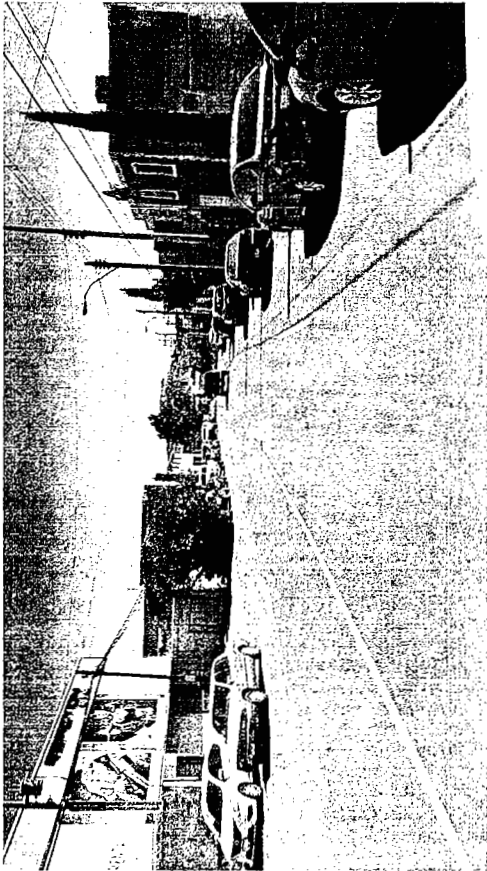





Handwritten signature or initials.

PINTURA TRAFICO HULE CLORADO

CALLE	CALLE RIVAPALACIO DE AV, COLON A AV. UNIVERSIDAD			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	198	X5	990
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	78		78
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	0		0
			TOTAL DE ML	1068

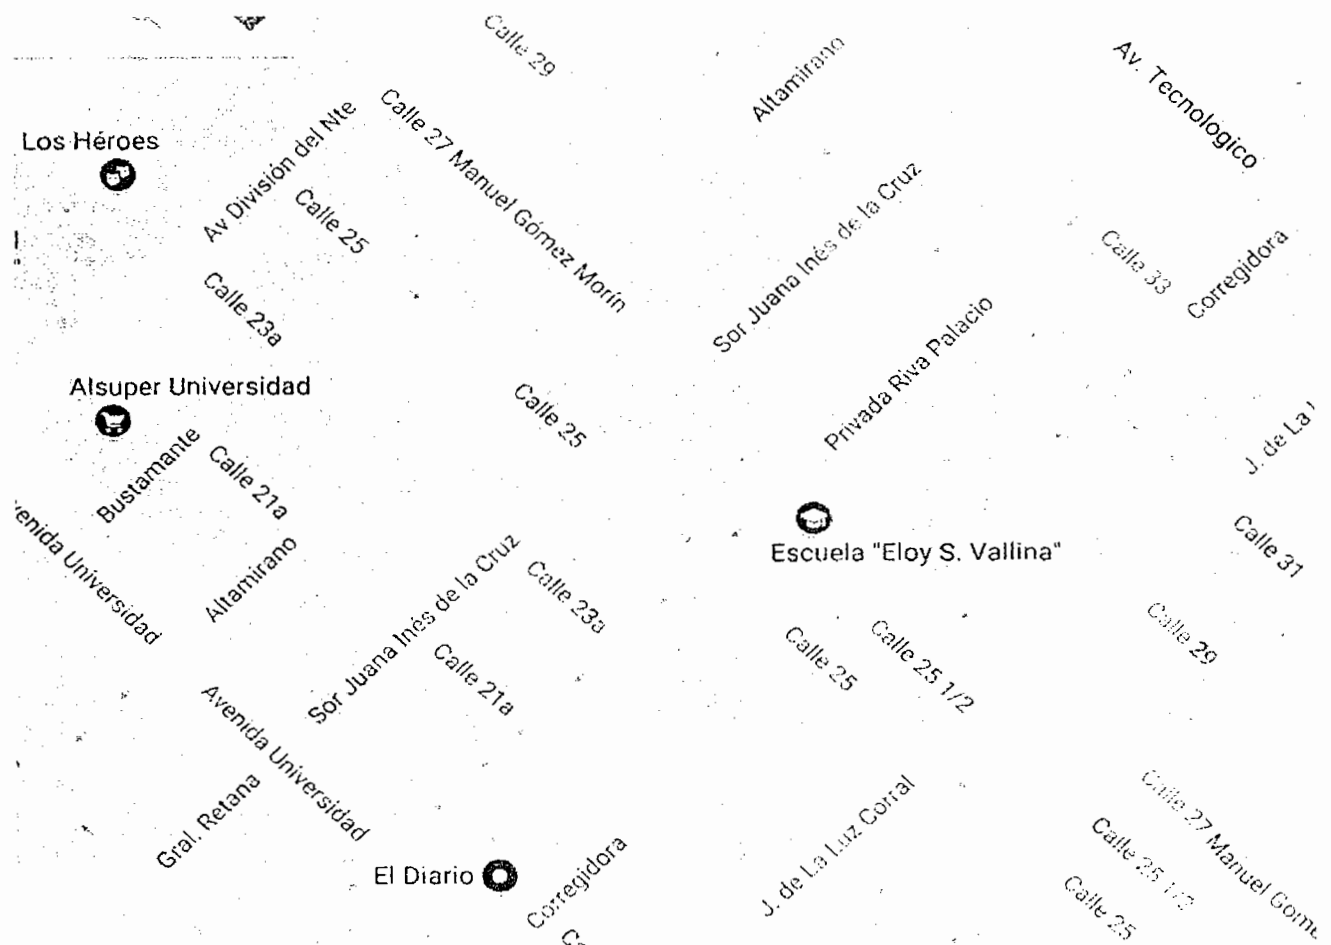

CALLE RIVAPALACIO

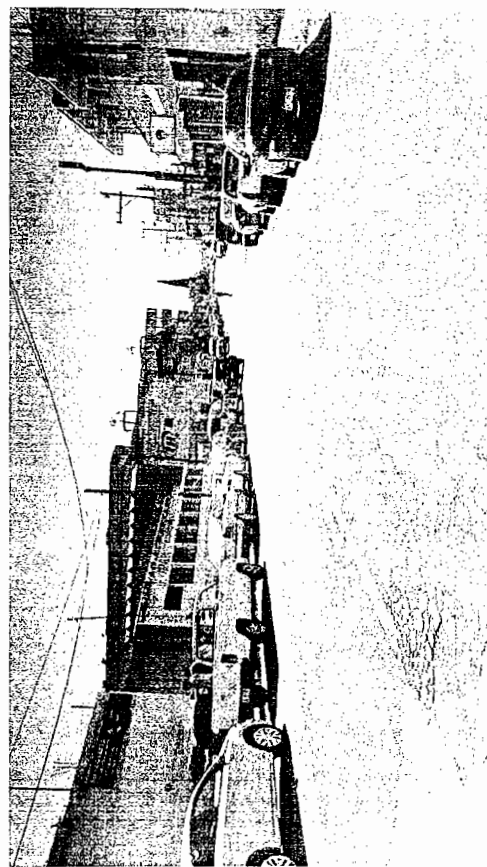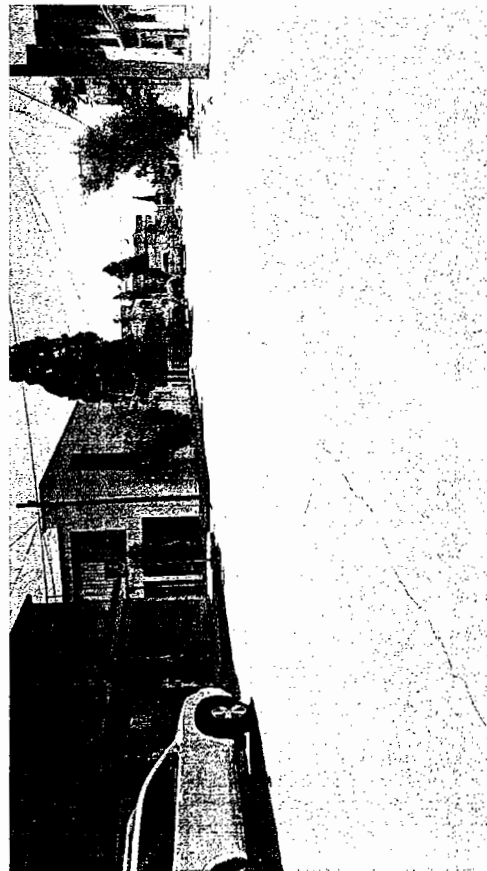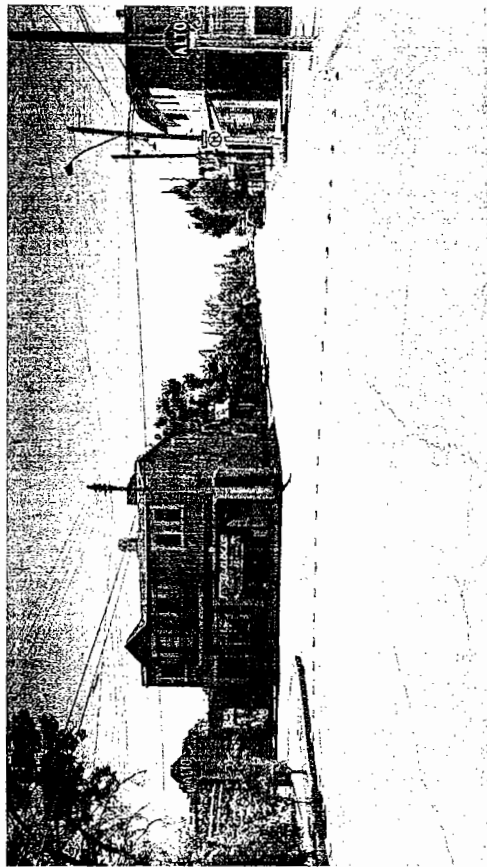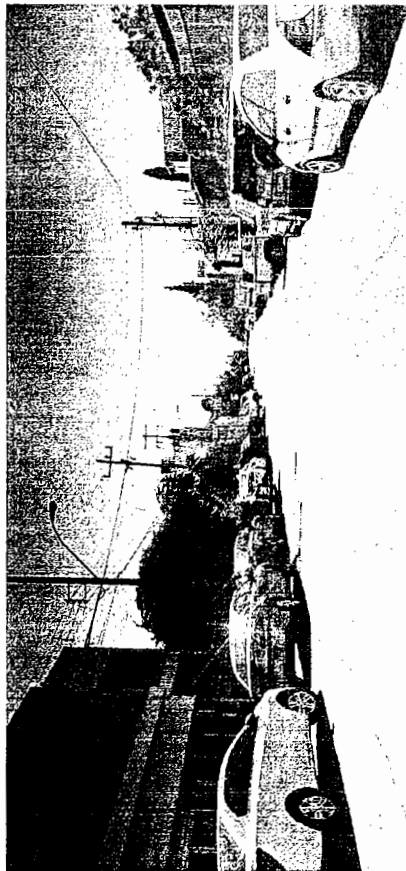

21




PINTURA TRAFICO HULE CLORADO

CALLE	CALLE MERCURIO DE H. COLEGIO M Y AV. TECNOLOGICO			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	127	X5	635
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	114		114
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	0		0
VIALETAS	PZS	0		
			TOTAL DE ML	749



2


CALLE MERCURIO

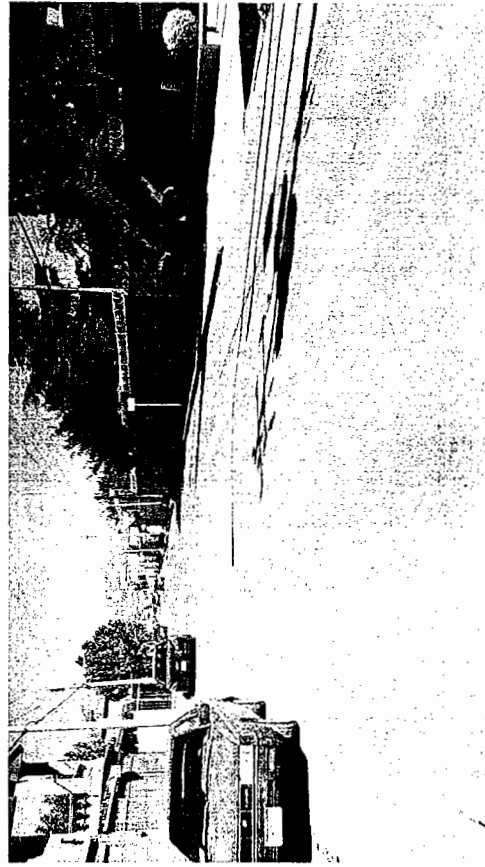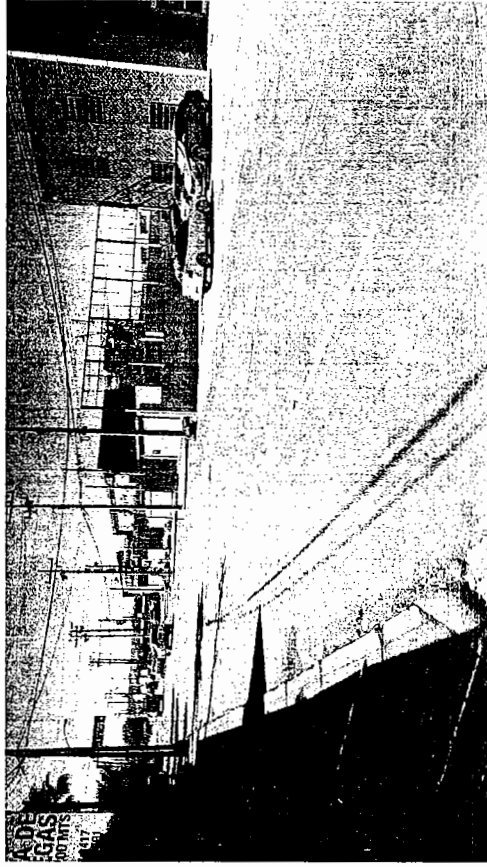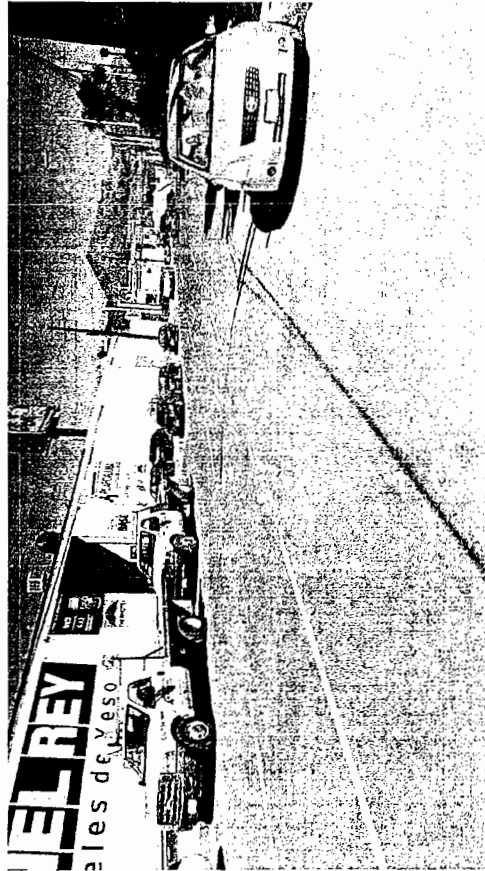

Handwritten signature or initials.




PINTURA TRAFICO HULE CLORADO

CALLE	AV. SICOMORO DE AV. INDUSTRIAS A AV. VALLARTA			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	212	X5	1060
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	150		150
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	0		0
VIALETAS	PZS	0		
			TOTAL DE ML	1210

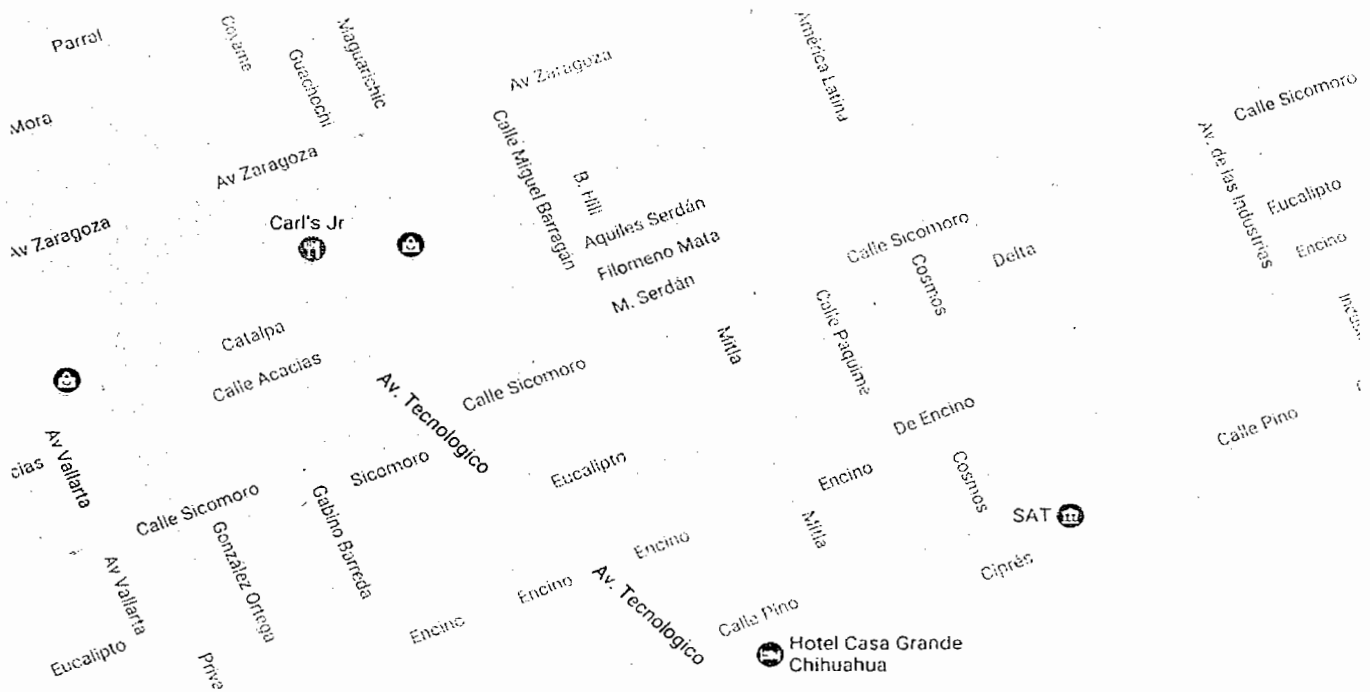

4

AV. SICOMORO

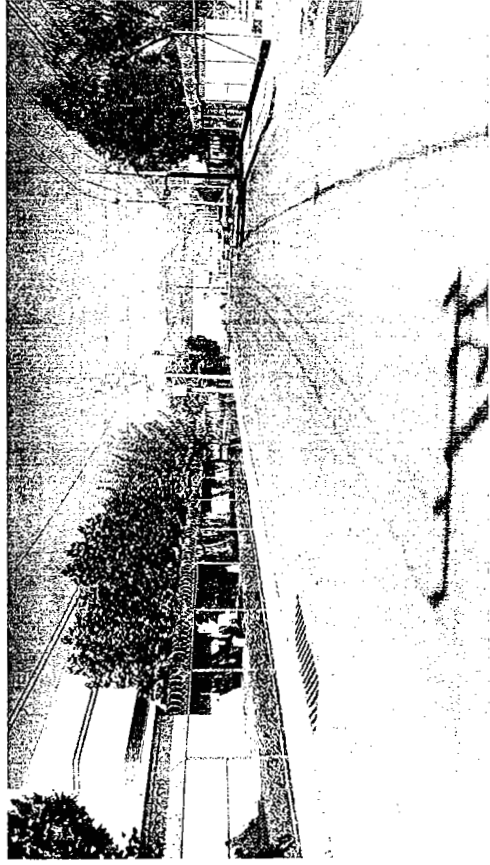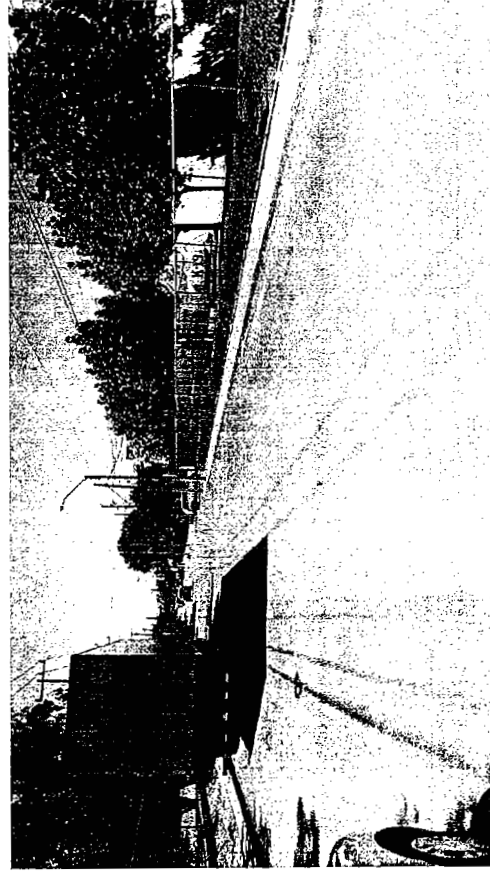
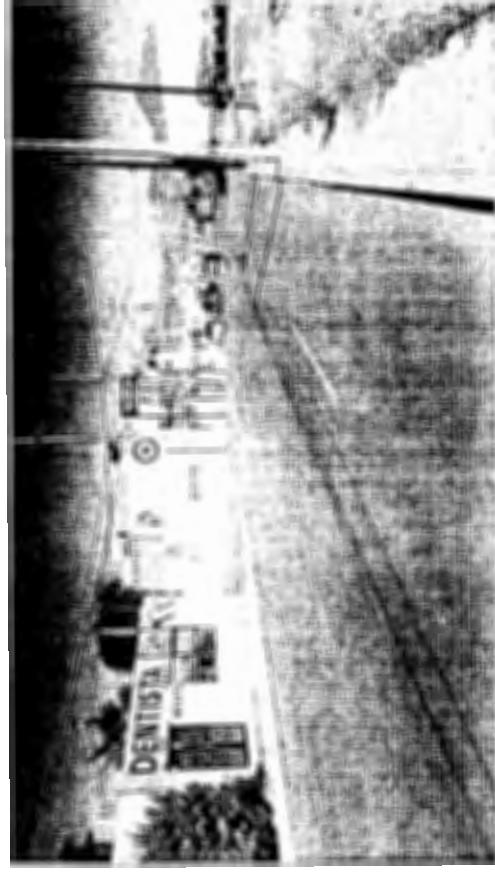


[Handwritten signature]

PINTURA TRAFICO HULE CLORADO


This map illustrates the urban layout of Chihuahua, Mexico, centered around the historic downtown area. Key landmarks include the Escuela Primaria Federal "Chihuahua" and the Real Universidad. The map shows a network of streets, including Av. Homero, Av. Tecnológico, and Av. de la Juventud. Public transport routes are marked with numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. The map also shows the location of the Gasolinera 118 and the Molino de Tai. The map is oriented with North at the top.

CALLE PASCUAL OROZCO

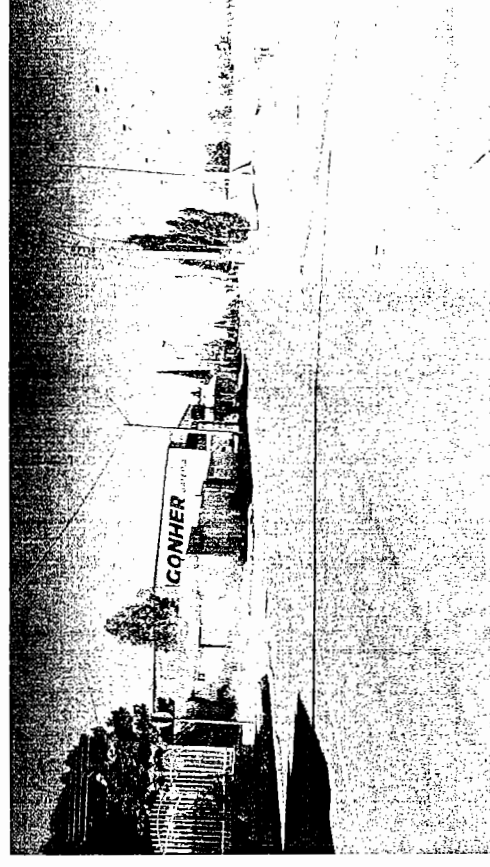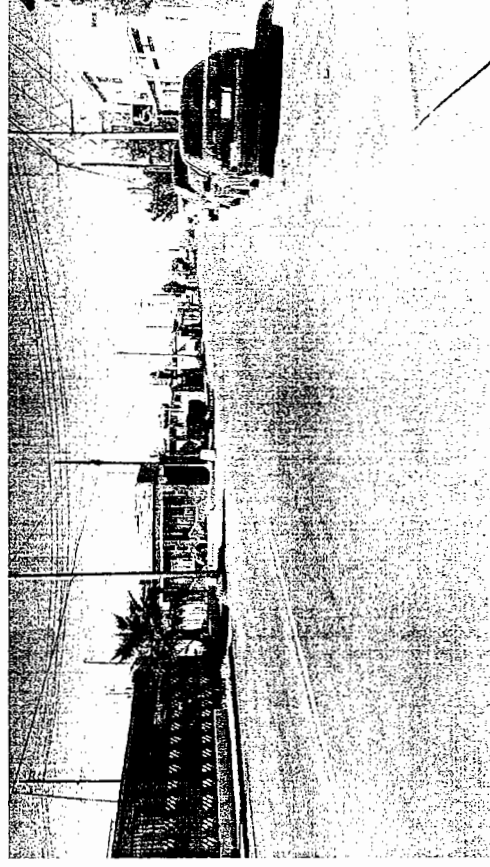

Q R

CALLE 27

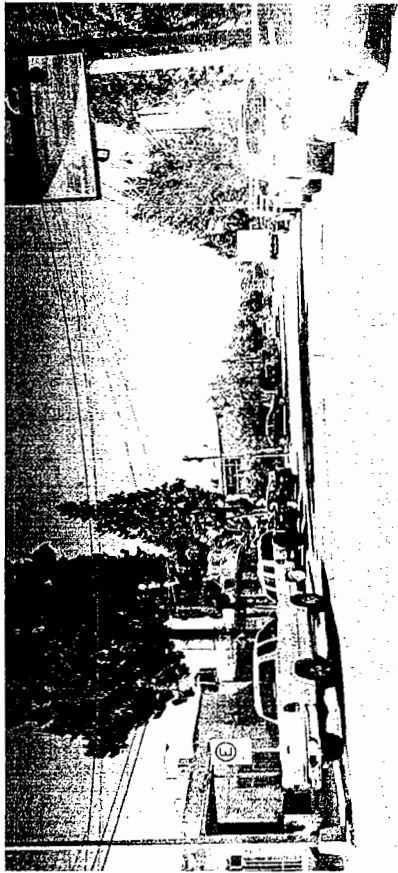


DR

GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CONMAAC S. DE R.L. DE C.V.

PINTURA TRAFICO HULE CLORADO

CALLE	CALLE 27 DE TEOFILO BORUNDA A AV. DIVISION DEL NORTE			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	275	X4	1100
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	232.4		232.4
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	0		0
VIALETAS	PZS	0		
			TOTAL DE ML	1332.4

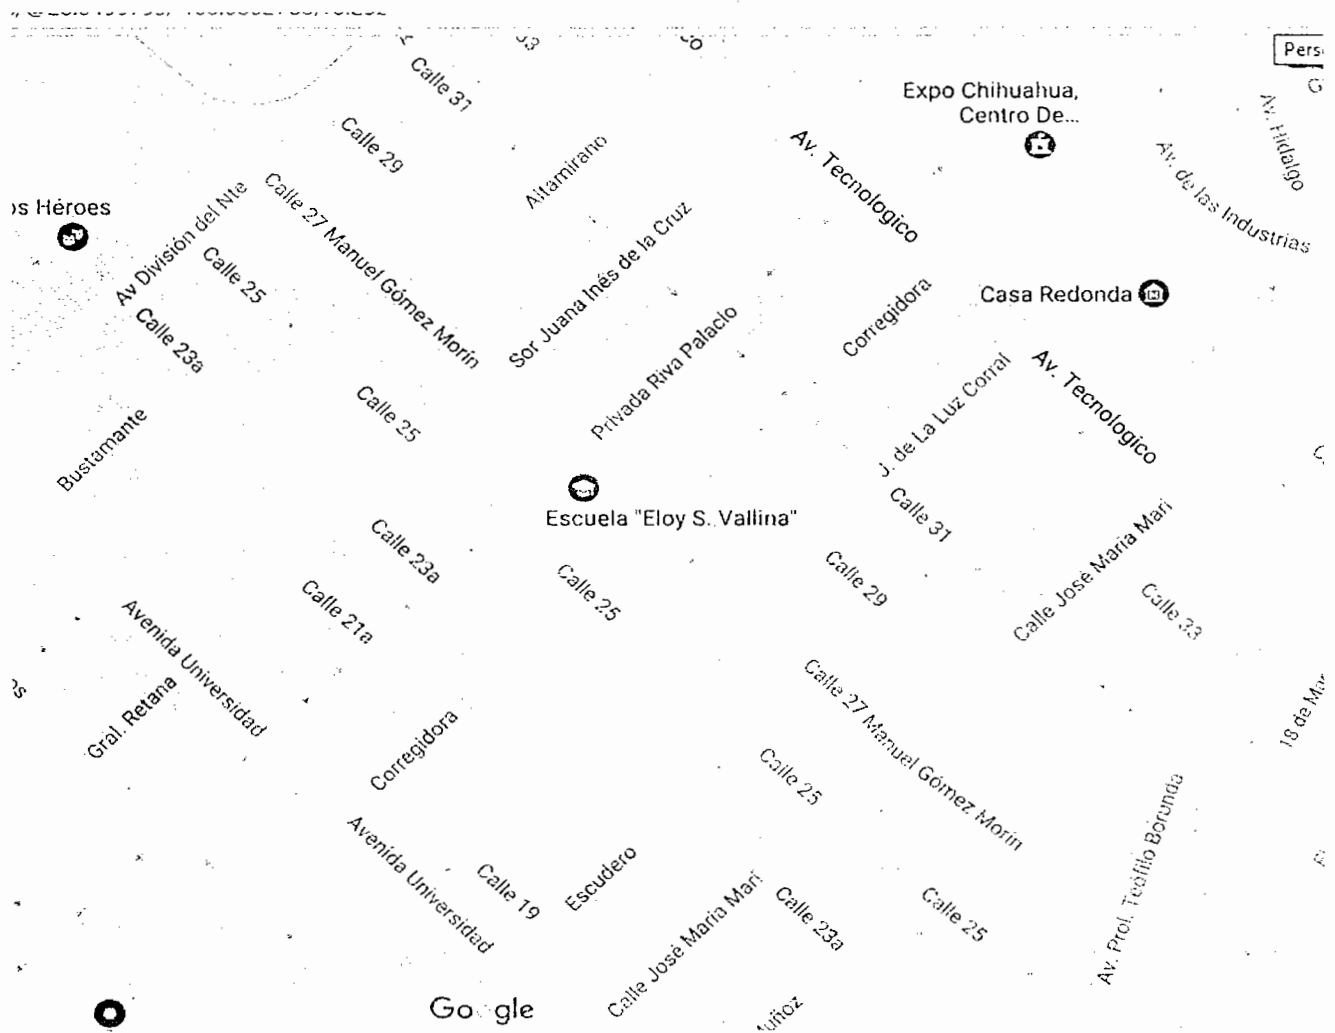

[Handwritten signature]

PINTURA TRAFICO HULE CLORADO





CALLE	AV. JUAN ESCUTIA DE AV. INDUSTRIAS A AV. H. COLEGIO M.			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	0	X5	0
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	0		0
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	932		932
VIALETAS	PZS	0		
			TOTAL DE ML	932

PINTURA TERMOPLASTICA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	205	X5	1025
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	277		277
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	0		0
VIALETAS	PZS	0		
			TOTAL DE ML	1302




AV. JUAN ESCUTIA

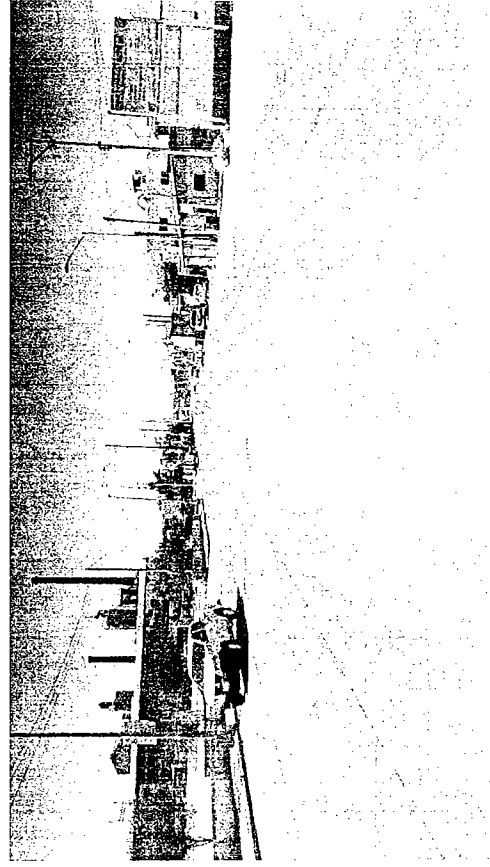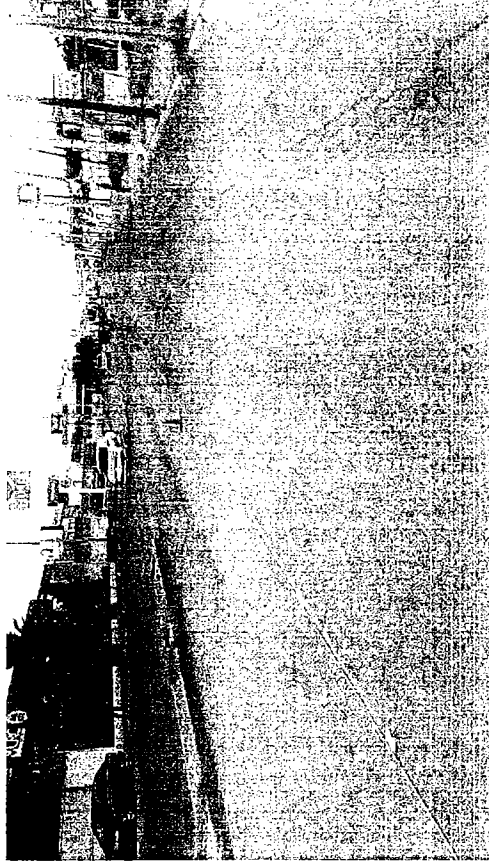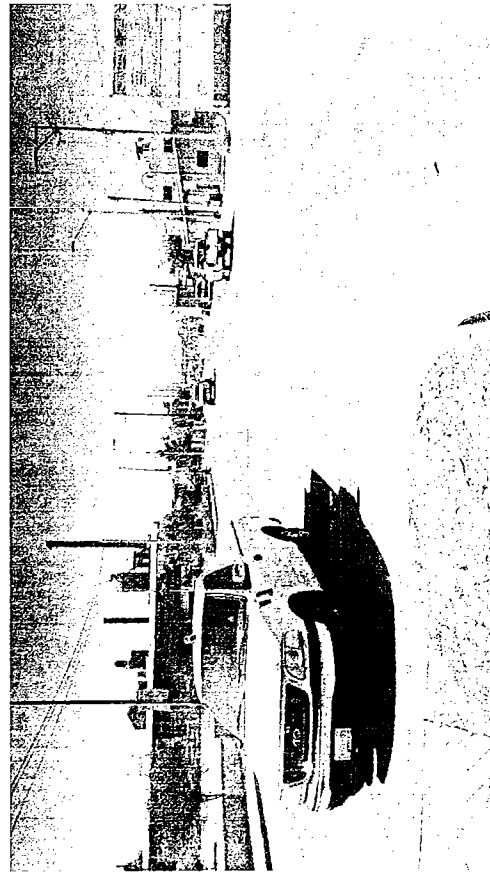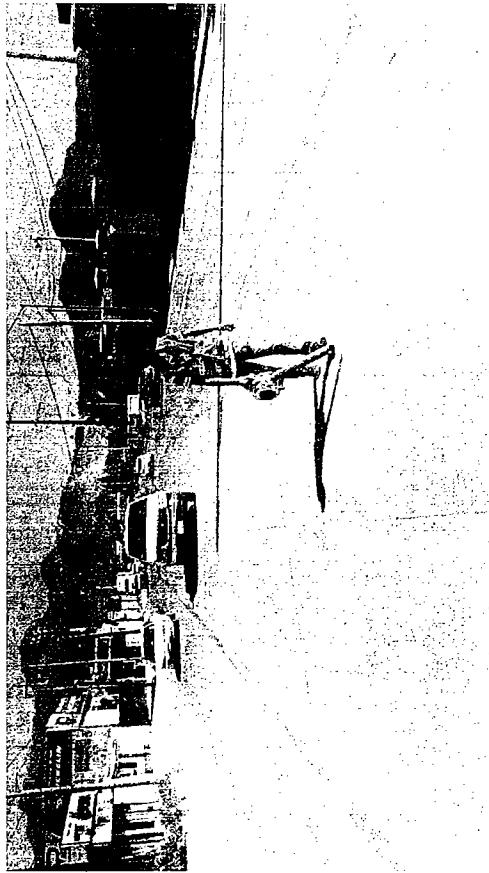

Dr

AV. JUAN ESCUTIA

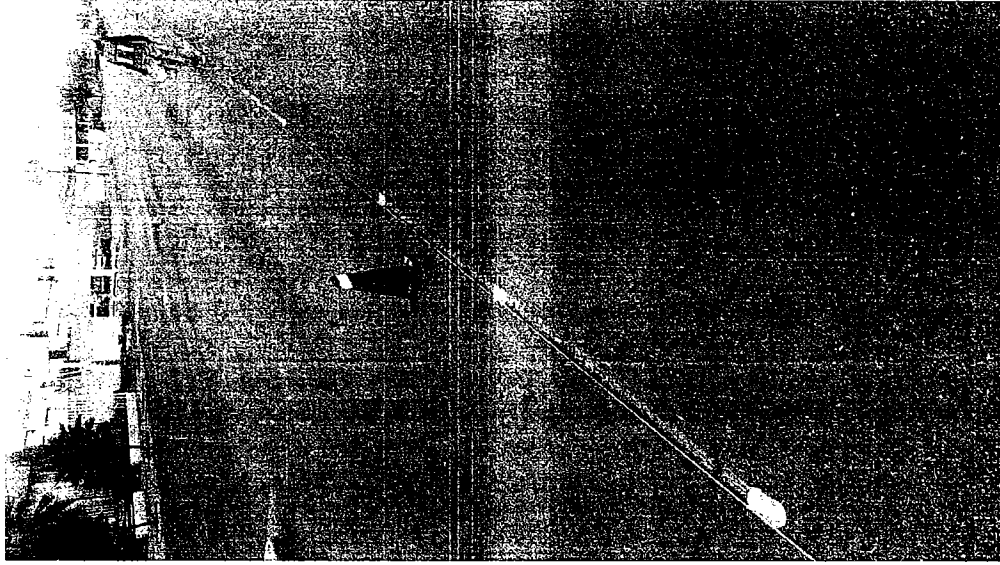

DP

GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CONMAAC S. DE R.L. DE C.V.


PINTURA TRAFICO HULE CLORADO

CALLE	AV. INDUSTRIAS DE TEOFILO BORUNDA A GUILLERMO PRIETO LUJAN			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	170	X5	850
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	118		118
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	4266		4266
VIALETAS	PZS	506		
			TOTAL DE ML	5234

PINTURA TERMOPLASTICA





DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	1773	X5	8865
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	2086.7		2086.7
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	0		0
VIALETAS	PZS	0		
			TOTAL DE ML	10951.7

no Puerto Luján

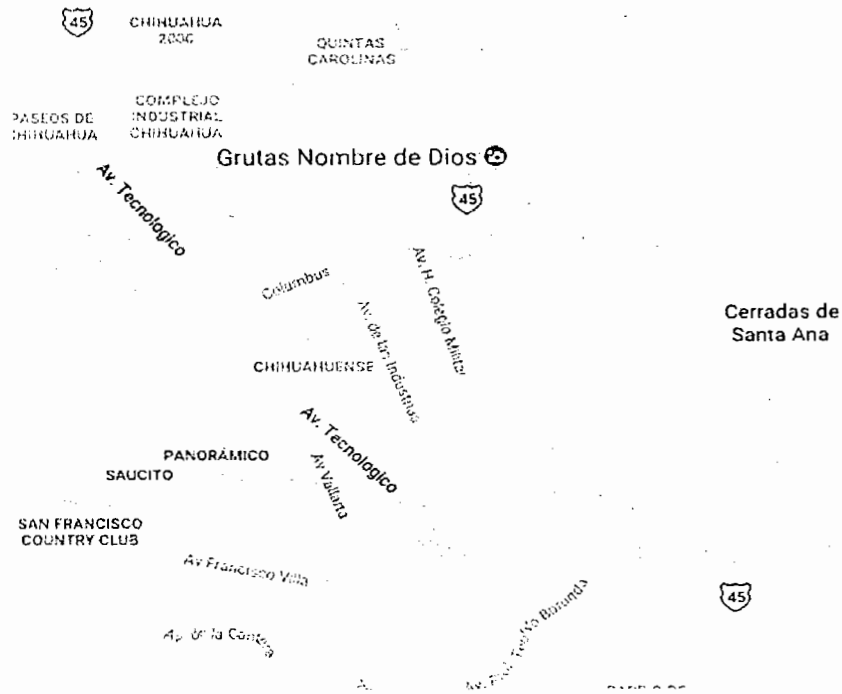



[Handwritten signature and initials]

AV. INDUSTRIAS/TERMOPLASTICA

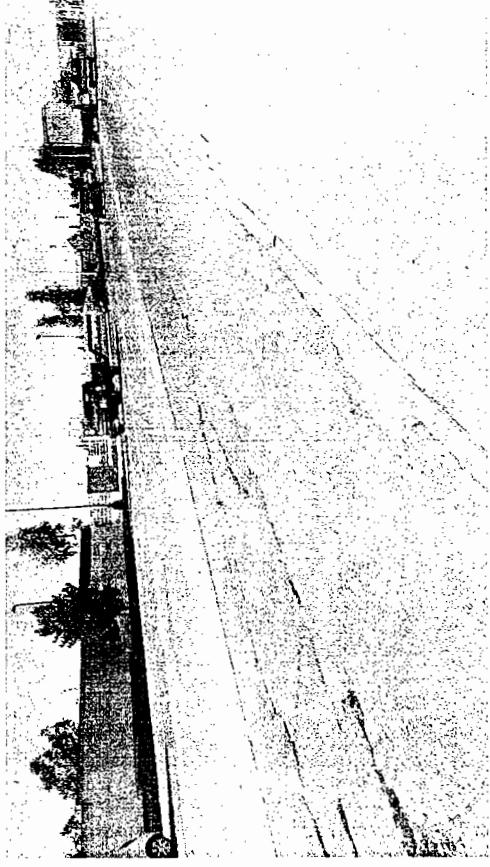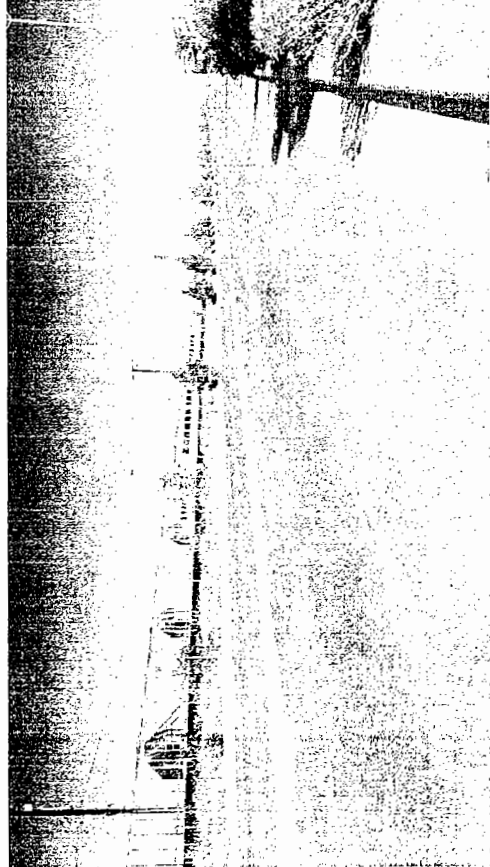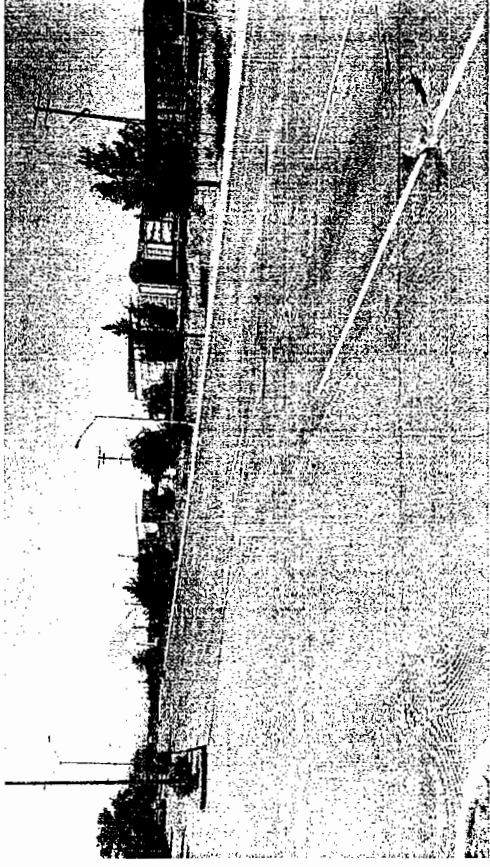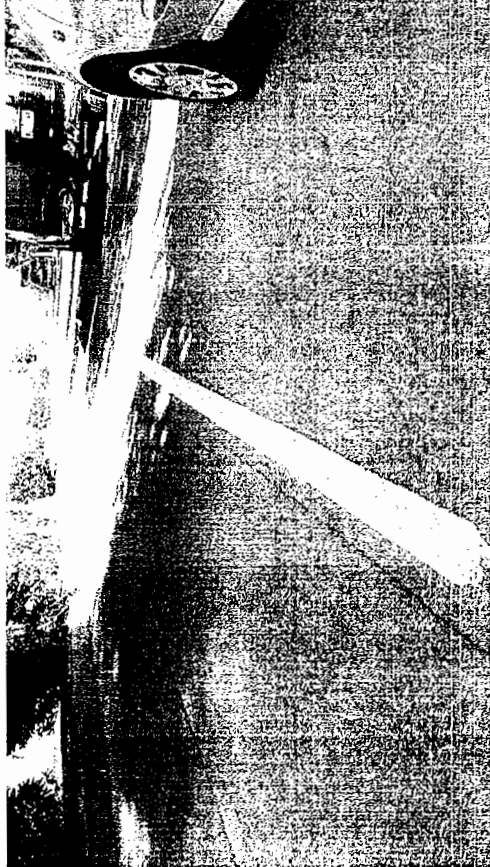

Handwritten signature or initials, possibly "DP".

AV. INDUSTRIAS/HULE CLORADO

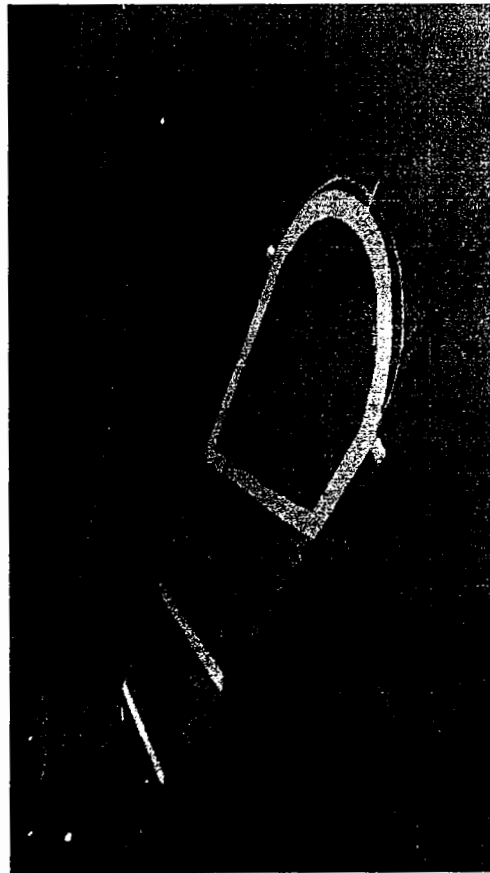

Handwritten signature or initials.

FOLIO N° 001

29-Sept-2017

CON ESTA FECHA SE INICIO LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO N° 150/2017 CON LA PINTURA AMARILLA EN LA CALLE 21^a ENTRE TEOFILO BORRERO Y DIVISION DEL NORTE. LOS TRABAJOS FUE DE PAUSE. AL 100%

30-Sept-2017

SE CONTINUO CON LOS TRABAJOS DE LA PINTURA BLANCA FUE DE NOCHE EN LA CALLE 21^a ENTRE TEOFILO BORRERO NOCHE Y DIVISION DEL NORTE DE AMBOS LADOS. AL 100%

2 OCTUBRE -2017

SE CONTINUO CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO. SE PINTO POR LA NOCHE EN LA CALLE 25^a ENTRE ANA TEOFILO BORRERO LITE Y DIVISION DEL NORTE. AL 100%



FOLIO: N° 002

4 OCTUBRE 2017

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN ESTE CENTRO NO-150/2017
CON LA PINTURA DE LA CALLE BROADWAY A LA CALLE
LINDOS HEROS POR LO QUE AVE. TECNOLÓGICA SE TIENE DE
AMBOS LADOS.

5 OCTUBRE 2017

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE PINTURA EN AVE
TECNOLÓGICA ENTRE - DIVISION DEL NORTE A LA CALLE
BROADWAY Y SUR - A NUESTRO ESTE TRABAJOS FUERON DE
NOCHE

6 OCTUBRE 2017

CONTINUAMOS CON LOS TRABAJOS DE PINTURA POR LA NOCHE
AVE TECNOLÓGICA ENTRE CALLE BROADWAY Y DIVISION DEL NORTE
CUERPO DE NOCHE A SUR

FOLIO N° 003

07- OCT- 2017

CONTINUAMOS CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO. SE
PINTO DE NOCHE EN AVE DE LA LUCHA ENTRE CALLE
BAJA CALIFORNIA Y CALLE YUCATAN AMBOS LADOS.
PINTURA BLANCA Y AMARILLA

09- OCT- 2017

CONTINUAMOS CON LOS TRABAJOS DE PINTURA FUERA DE
NOCHE, CALLE ESCUDERO ENTRE AVE UNIVERSIDAD Y
AVE DE LA LUCHA PINTURA BLANCA Y AMARILLA.
CALLE SICOLOGIA ENTRE AVE. INDUSTRIAS Y AVE. VOLCANES
PUES PINTURA BLANCA. CALLE MEMORIC ENTRE AVE
INDUSTRIAS Y AVE TECNLOGIA PUES PINTURA BLANCA

~~11~~

FOLIO N° 004

10 oct 2017

Continuamos con los trabajos de este contrato en AVE DE
LOS INDUSTRIALES ENTRE AVE - TEOFILO BERNARDO Y AVE
JUAN ESCOBAR AMBOS LADOS ESTOS TRABAJOS FUERA DE
DÍA Y SE UTILIZA PINTURA TEMPERA PASTEL BLANCA Y
PINTURA AMPOLLAS VERDE

11 oct - 2017

Continuamos con los trabajos de este contrato en AVE
DE LOS INDUSTRIALES EN FFCC (JARDIN) A C. GUILLERMO
PRIETO LUJAN L SUR - A - NORO Y DE GUILLERMO PRIETO
LUJAN A FRENTE A SENDERO (PLAZA) LOS TRABAJOS
FUERA DE DÍA Y SE UTILIZA PINTURA TEMPERA PASTEL BLANCA



Folio N° 005

12 OCT- 2017

SE CONTINUO CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO
EN AVE. JUAN ESCUTIA ENTRE AVE. DE LAS INDUSTRIAS
Y AVE. H. COLON MILITAR SE PINTO CON PINTURA
TECNORIAS HCA BLANCA Y PINTURA AMARILLA URAL
EN AMBOS LADOS LOS TRABAJOS FUERON DE NOCHE.
AVE HIDALGO ENTRE C. EDUARDO Y CALLE YUCATAN PINTURA
BLANCA FUERON DE NOCHE. C. PASUAL ORAZO ENTRE
AVE TECNOLÓGICA Y AVE UNIVERSIDAD SE UTILIZARON PINTURA
BLANCA Y AMARILLA AMBOS LADOS SE REALIZO LOS
TRABAJOS DE NOCHE.

13- OCT- 2017

SE CONTINUO CON LOS TRABAJOS DE NOCHE DE ESTE CONTRATO
EN AVE TECNOLÓGICA ENTRE CALLE VÍCTOR HERÓLES Y CALLE
DIVISION DEL NORTE AMBOS LADOS SE UTILIO PINTURA
BLANCA Y AMARILLA

Folio N° 006

14 OCT-2017

Continuamos con los trabajos de este contrato se pinto en
CARRE RIVS PALACIO Entre TECNOLÓGICA y AVE UNIVERSIDAD
Se utiliza pintura Blanca los trabajos fueron de noche

15 OCT-2017

Se continuo con los trabajos de pintura, de este contrato
En C- AGUSTIN MELGAR Entre AVE TECNOLÓGICA y AVE
UNIVERSIDAD ambos lados los trabajos fueron de noche
y se utiliza pintura Blanca duranilla.

17 OCT-2017

Continuamos con los trabajos de este contrato se pinto
en AVE DE LAS INDUSTRIAS Entre FRENTE A SUDERO (Plaza)
y FFCC (JABIL) CARRIL DE N-S Fue trabajo de día
Se utiliza pintura Blanca termoplastica

~~U~~

Folio N° 007

18 Oct 2017

Continuamos con los trabajos de este contrato D 15/2017
AVE DE LAS INDUSTRIAS ENTRE AVE HOMERU Y FFCC
(ABIL) Ambos lados se utilizo pintura Blanca los
trabajos fueron de noche. AVE DIVISION DEL NORTE ENTRE
AVE UNIVERSIDAD Y AVE TECNOLÓGICA Ambos lados se
utilizo pintura Blanca los trabajos fueron de noche
AVE TECNOLÓGICA ENTRE CALLE BROADWAY Y JUAN FERRER
Ambos lados se utilizo pintura Blanca y la labera de
noche. CALLE 27 ENTRE AVE TEFILO BORDEN WALK Y
DIVISION DEL NORTE. Se utilizo pintura Blanca y la
labera de noche

19 Oct 2017

Se continuo con los trabajos de este contrato se pinto
la AVE DE LOS ARBOLES ENTRE AVE TECNOLÓGICA Y C CHIHUAHUA
Ambos lados se trabajo de día y se utilizo pintura
Blanca y Amarilla

FOLIO N° 008

20-OCT-2017

SE CONTINUO CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO EN
CALLE PASADAL OCEANO ENTRE AVE JUAN FERRER Y AVE
HUMERO UNA SOLA LINEA AMARILLA. EN EL CENTRO
LOS TRABAJOS DE HIGIENIZACION DE DIA SE PINTO CON PINTURA
AMARILLA EL C- LINDO DE LOS BARRELOS INCORPORANDO AL 1-
CALLEIN MILITAR FUERA TRABAJOS DE NOCHE

21 OCT-2017

SE CONTINUO CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO SE
COLOCARON 506 VENTILAS EN AVE DE LOS FORTINEROS ENTRE
AVE PROFIL BARRERA Y AV. AGUSTIN MEXICANA AMBOS LADOS
Y SE COLOCARON 494 VENTILAS EN AVE TECNOLÓGICO
ENTRE RÍOS HERCULES Y C- LINDO AMBOS LADOS LOS
TRABAJOS FUERA DE DIA.
