



Factura

FOLIO: 777

FECHA: 5/7/2017 16:15:11

Documento Válido

Expedido en: ESTRADA BOCANEGRA 1702, SAN FELIPE, 31203, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS
SA DE CVMET0411185E7 ESTRADA BOCANEGRA No. 1702
SAN FELIPE,
CHIHUAHUA 31203
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICORégimen Fiscal: General de Ley Personas Morales
601Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA R.F.C.: MCI651010V22
Domicilio: MINA No. 408 Teléfono:
Colonia: CENTRO C.P.: 31000 Ciudad: CHIHUAHUA
Estado: CHIHUAHUA País: MEXICO

Cantidad	Unidad de medida	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	ESTIMACION No. 1 (UNICA) DEL PERIODO 12 DE JUNIO DE 2017 AL 22 DE JUNIO DEL 2017 OBRA: REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS. COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLIMERO; INCLUYE RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-60 EN: AV. PALESTINA ENTRE C. DEL CARRUAJE Y AV. FUERZA AEREA (TRAMOS AISLADOS) DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. CONTRATO No.- 064/2017 IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION \$1,573,687.34 DESCUENTOS: 0.2% D.I.F. \$3,147.37 0.2% C.M.I.C. \$3,147.37 SUMA DESCUENTOS \$6,294.74 RESUMEN: SUMA ESTA ESTIMACION \$1,573,687.37 AMORTIZACION ANTICIPO \$0.00 DESCUENTOS \$6,294.74 SUB - TOTAL \$1,567,392.63 I.V.A. \$251,789.98 SALDO NETO PARA PAGOS \$1,819,182.61 CON LETRA: (UN MILLON OCHOCIENTOS DIESEINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 61/100 M.N.)	1,573.687.37	1,573.687.37

Importe con letra
UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N.
Información de Pago
Forma de pago: Otros Cuenta: Condiciones:

SUBTOTAL:	1,573.687.37
I.V.A.:	251.789.98
TOTAL:	1,825.477.35



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404399972
Folio fiscal:	579E1115-776C-43A3-889A-A74008181435
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Julio 5 2017 - 17:15:17

Sello digital del CFDI

EncAjk0tpjthk025MDq/Inj+gDQwhVOD9+n0JgB55tNdKpc5AF2Kq05F9BBEaguWPRrC6PHkhrwGevoBc+Hc9
1V/CQUBIV99blaiiaoZ+ogv3ohyYi5L6RdtG6NIBQjHAOCRDuv9HBIHTjeP17QPSERsfNEgIfVUPM7cFJLWMP00
cpTBry0YSpB3141kxwP/36yDZqAvrh4rBbZPciVH5PgB6FG74P+nj46v1i18BOnyTCvdljctRQ4ae38SM93ui2
/u964wcl4Cznky0ELivm1A7L4uqaDE/CJ+QMoO1LmEYx1Kil138uZ4X/urghGjQrShABuH13LJoVm7f4eIq==

Sello del SAT

FVRGvBdsqSAMuArjMSvrc/6GQqN/zd5Ufp6ymvUgRxlju91eFPqzqneBw2unPykwtLnh79tbcND7j2P+
QCsK6Hfp+GGCBGQuaal1P2S815jyTGAogCvSspBbUg/QhwZU1+DOL:9bxj2GSKX/nKd4ZhcA2oF6VHM
T9d21wfvSLC11FGCTKw7u0xp+VVcvBmHT7W3BcCkC/NrDmUmqDjBIR12500/QeZouYLuA4HFFXSpzTa
cd9grUL+16FPhyb9PazXGE79Hbveh7AMGPY05ncJhAa8vWkTul7HhAa0j8oNCRBqwrwGShuF5ent1

MET0411185E7

**MERP
EDIFICACIONES Y
TERRACERIAS SA DE
CV**

MCI651010V22

**MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA**

Folio fiscal

Fecha de expedición

Fecha
certificación SAT

PAC que certificó

**579E1115-776C-
43A3-889A-
A74008181435**

2017-07-05T16:15:11

**2017-07-
05T17:15:17**

MAS0810247C0

Total del CFDI

Efecto del
comprobante

Estado CFDI

\$1,825,477.35

ingreso

Vigente

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- [Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más](#)

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA

HOJA DE RESUMEN FINAL

[illegible]

[illegible]

AV. PALESTINA

GENERADORES

AV. PALESTINA

TRAMO 1 ENTRE AV. FUERZA AEREA Y CALLE 26 (TOPE)

CARRILES CENTRALES Y CAMELLON (2 CARRILES ALTA) FRESADO Y TENDIDO

NO.	CAD 1	ANCHO	A1 + A2	LARGO PROM.	AREA (M2)
0	0+000	7.63			
1	0+050	7.64	15.27 ✓	25.00	381.75 ✓
2	0+100	7.49	15.13 ✓	25.00	378.25 ✓
3	0+150	7.68	15.17 ✓	25.00	379.25 ✓
4	0+200	7.65	15.33 ✓	25.00	383.25 ✓
5	0+250	7.40	15.05 ✓	25.00	376.25 ✓
6	0+300	7.39	14.79 ✓	25.00	369.75 ✓
7	0+350	7.38	14.77 ✓	25.00	369.25 ✓
8	0+400	7.39	14.77 ✓	25.00	369.25 ✓
9	0+450	7.44	14.83 ✓	25.00	370.75 ✓
10	0+500	7.48	14.92 ✓	25.00	373.00 ✓
11	0+550	7.31	14.79 ✓	25.00	369.75 ✓
12	0+600	7.35	14.66 ✓	25.00	366.50 ✓
13	0+650	7.42	14.77 ✓	25.00	369.25 ✓
14	0+700	7.36	14.78 ✓	25.00	369.50 ✓
15	0+750	7.29	14.65 ✓	25.00	366.25 ✓
	0+765	7.29	14.58 ✓	7.50	109.35 ✓

SUBTOTAL 5701.35

AV. PALESTINA

TRAMO 2 ENTRE CALLE 26 (TOPE) Y CALLE 20 (OXXO)

CARRILES CENTRALES Y CAMELLON (2 CARRILES ALTA) FRESADO Y TENDIDO

NO.	CAD 1	ANCHO	A1 + A2	LARGO PROM.	AREA (M2)
0	0+000	4.00			
1	0+050	4.11	8.11 ✓	25.00	202.75 ✓
atrás	0+093	4.31	8.42 ✓	21.50	181.03 ✓
adelante	0+093	7.68			
2	0+100	7.44	15.12 ✓	3.50	52.92 ✓
3	0+150	7.30	14.74 ✓	25.00	368.50 ✓
4	0+200	7.52	14.82 ✓	25.00	370.50 ✓
5	0+250	7.47	14.99 ✓	25.00	374.75 ✓
6	0+300	7.30	14.77 ✓	25.00	369.25 ✓
7	0+350	7.35	14.65 ✓	25.00	366.25 ✓
8	0+400	7.30	14.65 ✓	25.00	366.25 ✓
9	0+420	7.30	14.60 ✓	10.00	146.00 ✓

SUBTOTAL 2798.20

AV. PALESTINA
TRAMO 3 ENTRE CALLE 20 (OXXO) Y CALLE EJIDO CORRAL DE PIEDRA (TOPE)
 CARRILES CENTRALES Y CAMELLON (2 CARRILES ALTA) Y CARRIL DE BAJA
 SENTIDO E/O FRESADO Y TENDIDO

NO.	CAD 1	ANCHO	A1 + A2	LARGO PROM.	AREA (M2)
0	0+000	10.50			
1	0+050	10.51	21.01 ✓	25.00	525.25 ✓
2	0+100	10.55	21.06 ✓	25.00	526.50 ✓
3	0+150	10.48	21.03 ✓	25.00	525.75 ✓
4	0+200	10.55	21.03 ✓	25.00	525.75 ✓
5	0+250	10.35	20.90 ✓	25.00	522.50 ✓
6	0+300	10.30	20.65 ✓	25.00	516.25 ✓
atrás	0+329	10.47	20.77 ✓	14.50 ✓	301.17 ✓
adelante	0+329	9.33			
7	0+350	9.07	18.40 ✓	10.50 ✓	193.20 ✓
atrás	0+400	8.70	17.77 ✓	25.00	444.25 ✓
adelante	0+400	10.03			
	0+435	11.03	21.06 ✓	17.50 ✓	368.55 ✓

SUBTOTAL 4449.17 ✓

AV. PALESTINA
TRAMO 4 ENTRE CALLE EJIDO CORRAL DE PIEDRA Y AV. DEL CARRUAJE
 CARRILES CENTRALES Y CAMELLON (2 CARRILES ALTA) Y CARRIL DE BAJA
 SENTIDO E/O FRESADO Y TENDIDO

NO.	CAD 1	ANCHO	A1 + A2	LARGO PROM.	AREA (M2)
0	0+000	10.84			
1	0+050	10.46	21.30 ✓	25.00	532.50 ✓
2	0+100	10.55	21.01 ✓	25.00	525.25 ✓
3	0+150	10.7	21.25 ✓	25.00	531.25 ✓
4	0+200	10.7	21.40 ✓	25.00	535.00 ✓
5	0+250	10.7	21.40 ✓	25.00	535.00 ✓
6	0+300	10.86	21.56 ✓	25.00	539.00 ✓
atrás	0+350	10.68	21.54 ✓	25.00	538.50 ✓
adelante	0+350	7.6	18.28	—	0.00
8	0+400	7.5	15.10 ✓	25.00	377.50 ✓
	0+408	7.55	15.05 ✓	4.00	60.20 ✓

SUBTOTAL 4174.20 ✓


TOTAL FRESADO 17122.92 ✓

AREA MORTERO 17122.92 ✓


VOL. RENIVELACION 129.54


CROQUIS

AV. PALESTINA; TRAMO 1 ENTRE AV. FUERZA AEREA Y CALLE 26 (TOPE). CARRILES CENTRALES Y CAMELLON (2 CARRILES ALTA) FRESADO Y TENDIDO

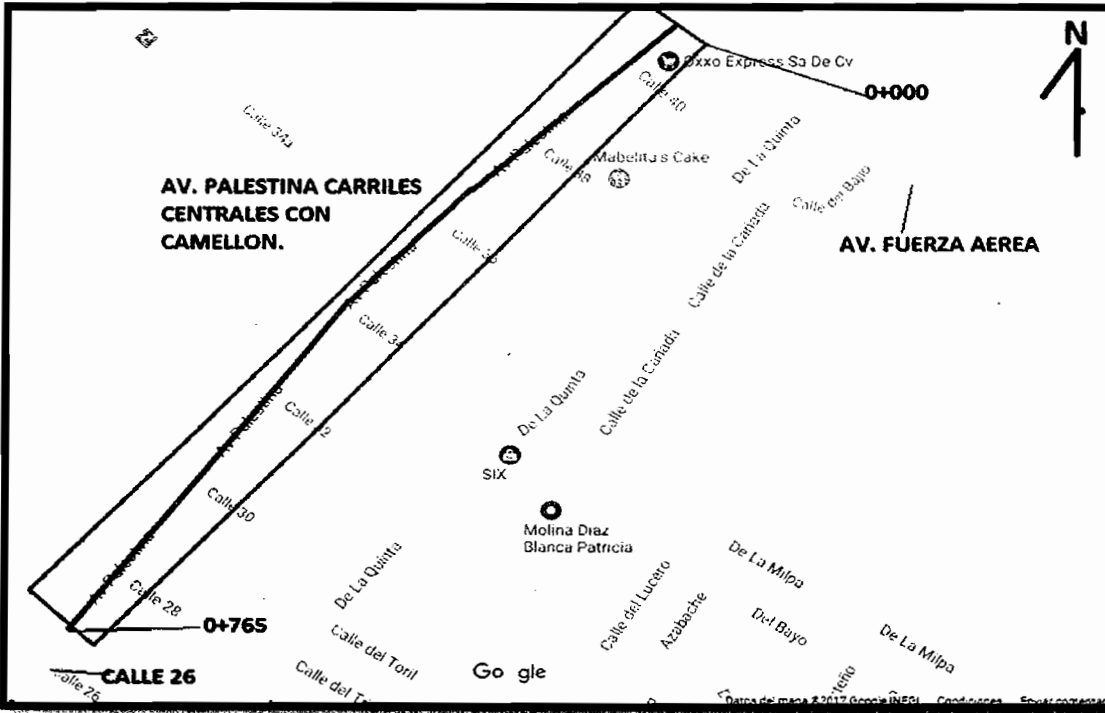

AV. PALESTINA; TRAMO 2 ENTRE CALLE 26 (TOPE) Y CALLE 20 (OXXO), CARRILES CENTRALES Y CAMELLON (2 CARRILES ALTA) FRESADO Y TENDIDO

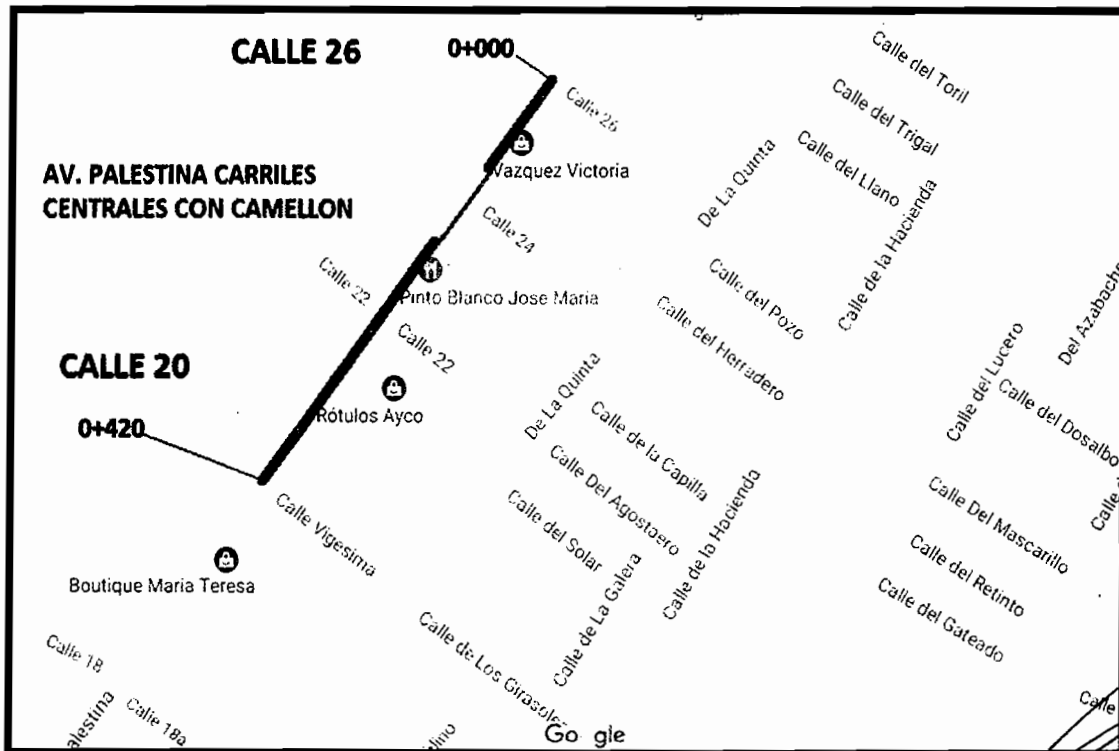

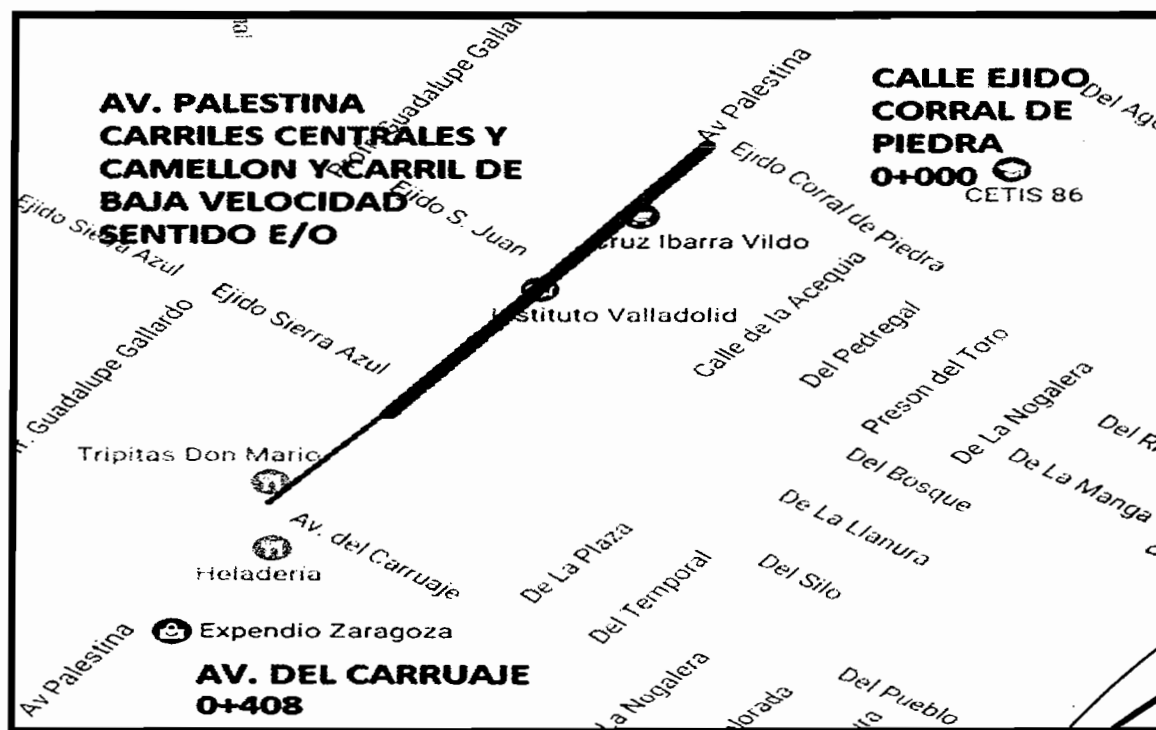



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	REHABILITACION PAVIMENTO	PLANTA	MERP
LOCALIZACION	CHIHUAHUA, CHIH.	FECHA RECIBO	14-jun.-17
TENDIDA EN AV. PALESTINA TRAMO 1 ENTRE AV. FUERZA AEREA Y	FECHA INFORME	17-jun.-17	
CALLE 26 (TOPE) CARRILES CENTRALES Y CAMELLON			

MUESTRA	MEZCLA ASFALTICA 3/8"
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	EN LA PLANTA DE ASFALTOS
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	100	
	1/2"	100	
	3/8"	98	
	1/4"	83	
	Núm. 4	70	
	Num. 10	38	
	Núm. 20	23	
	Núm. 40	17	
	Núm. 60	11	
	Núm. 100	9	
	Núm. 200	6	
	RET. MALLA		%
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCIÓN LINEAL %			
CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO			
TIPO			PG 76-22
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.			
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg			


COMPOSICION GRANULOMETRICA

% QUE PASA

MALLAS

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm3	2351	
ESTABILIDAD, kg.	1117	817.5
FLUJO, mm	3.1	2 - 3.5
VACIOS, %	4.1	DE 3 A 5
VAM, %	17.2	16 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %	5.3	5.2
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

OBSERVACIONE	LA MEZCLA ANALIZADA CUMPLE CON ESPECIFICACIONES PARA SU EMPLEO.
EL JEFE DEL LABORATORIO	
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON	



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.


R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	REHABILITACION PAVIMENTO	PLANTA	MERP
LOCALIZACION	CHIHUAHUA, CHIH.	FECHA RECIBO	20-jun.-17 ✓
TENDIDA EN AV. PALESTINA TRAMO 3 ENTRE CALLE 20 (OXXO) Y CALLE		FECHA INFORME	23-jun.-17
EJIDO CORRAL DE PIEDRA (TOPE) CARRILES CENTRALES Y CAMMELLON Y CARRIL DE BAJA VELOCIDAD			
	SENTIDO E/O		
MUESTRA	MEZCLA ASFALTICA 3/8"		
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA		
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL		
CLASE DE DEPOSITO MUESTREO	EN LA PLANTA DE ASFALTOS		
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA		

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO	CLASIFICACION PETROGRAFICA		
	CARPETA ASFALTICA		
	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	100	
	1/2"	100	
	3/8"	100	
	1/4"	84	
	Núm. 4	70	
	Num. 10	38	
	Núm. 20	25	
	Núm. 40	19	
	Núm. 60	13	
	Núm. 100	9	
	Núm. 200	6	
	RET. MALLA		%
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCIÓN LINEAL %			

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	PG 76-22 ✓
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	

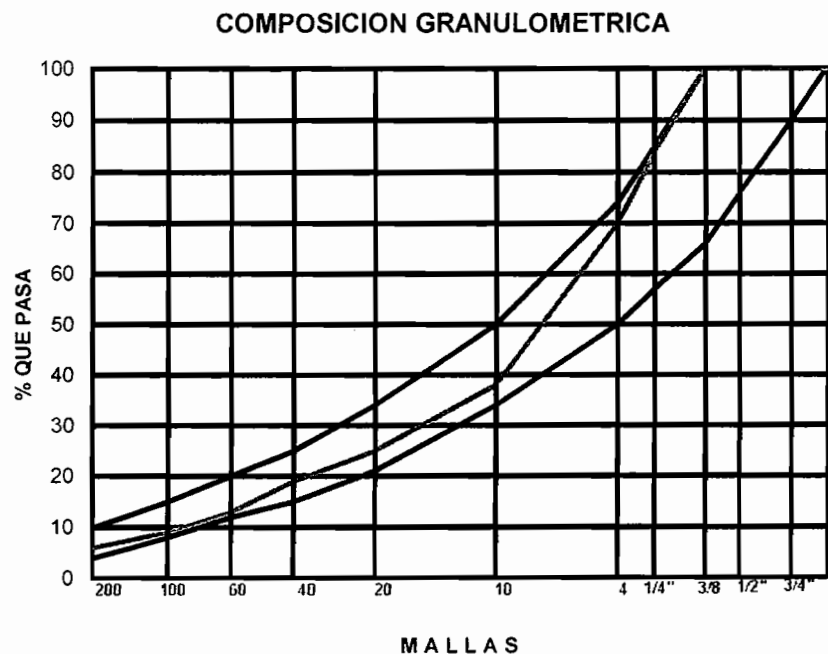

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³	2308	
ESTABILIDAD, kg.	1104	817.5
FLUJO, mm	3.0	2 - 3.5
VACIOS, %	4.3	DE 3 A 5
VAM, %	17.1	16 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %	5.3 /	5.2
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

OBSERVACIONE	LA MEZCLA ANALIZADA CUMPLE ESPECIFICACIONES PARA SU EMPLEO.
	EL JEFE DEL LABORATORIO C. FAUSTO CHAVEZ RASCON



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.


R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	REHABILITACION PAVIMENTO	PLANTA	MERP
LOCALIZACION	CHIHUAHUA, CHIH.	FECHA RECIBO	21-jun.-17
ENDIDO EN AV. PALESTINA TRAMO 4 ENTRE EJIDO CORRAL DE PIEDRA (TOPE	FECHA INFORME	24-jun.-17	
Y AV. DEL CARRUAJE CARRILES CENTRALES Y CAMELLON Y CARRIL DE BAJA VELOCIDAD	SENTIDO E/O		

MUESTRA	MEZCLA ASFALTICA 3/8"
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	EN LA PLANTA DE ASFALTOS
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	100	
	1/2"	100	
	3/8"	99	
	1/4"	89	
	Núm. 4	75	
	Num. 10	39	
	Núm. 20	24	
	Núm. 40	17	
	Núm. 60	13	
	Núm. 100	10	
	Núm. 200	5	
RET. MALLA			
P.V. SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCIÓN LINEAL %			

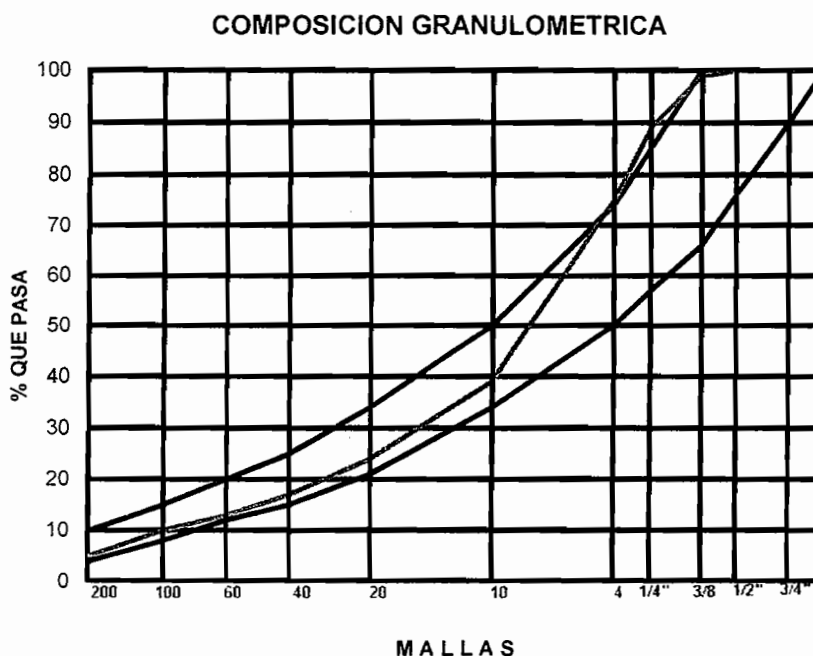


CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³	2346	
ESTABILIDAD, kg.	1098	817.5
FLUJO, mm	3.2	2 - 3.5
VACIOS, %	4.0	DE 3 A 5
VAM, %	17.1	16 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %	5.2	5.2
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	PG 76-22
PENETRACION, 25°C, 100 gr. 5 seg.	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	

OBSERVACIONE	LA MEZCLA ASFALTICA ANALIZADA ES ADECUADA PARA SU EMPLEO.
--------------	---

EL JEFE DEL LABORATORIO
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON

OBRA: 'REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLIMERO; INCLUYE RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-60 EN: AV. PALESTINA ENTRE C. DEL CARRUAJE Y AV. FUERZA AEREA (TRAMOS AISLADOS); DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

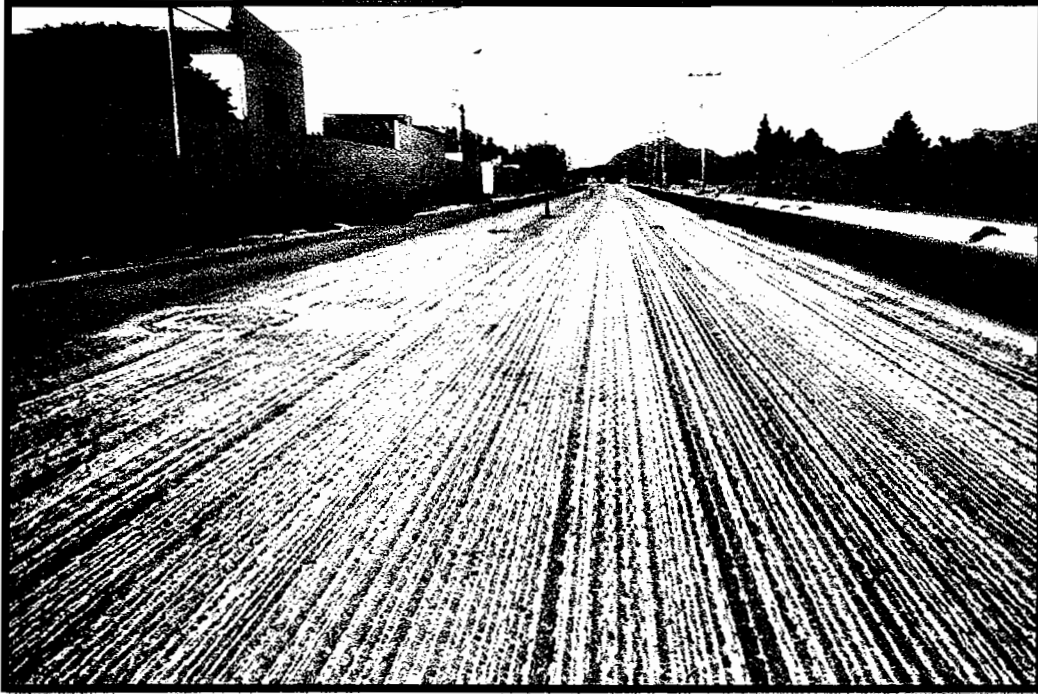

FRESADO



RENIVELACION

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBRA: 'REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLIMERO; INCLUYE RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-60 EN: AV. PALESTINA ENTRE C. DEL CARRUAJE Y AV. FUERZA AEREA (TRAMOS AISLADOS); DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.



FRESADO



MORTERO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBRA: REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLIMERO; INCLUYE RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-60 EN: AV. PALESTINA ENTRE C. DEL CARRUAJE Y AV. FUERZA AEREA (TRAMOS AISLADOS); DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.



MORTERO



MORTERO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBRA: 'REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLIMERO; INCLUYE RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-60 EN: AV. PALESTINA ENTRE C. DEL CARRUAJE Y AV. FUERZA AEREA (TRAMOS AISLADOS); DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.





RENIVELACIÓN



MORTERO



12-Junio-2017

- Se iniciaron los trabajos del contrato 064/2017 en la Av. Palestina entre Av. Fuerza Aérea y Av. del Camarero; Fresado el tramo 2: entre Av. Fza. Aérea y Calle 26 (Tope); Carriles centrales incluyendo el camellón.





13-Junio-17

- Se continuaron los trabajos de Fresado en Av. Palestina tramo 2: Entre calle 26 (Tope) y Calle 20 (Cerro); Carriles centrales y camellón.



14-Junio-17



- Se finalizó carpeta asfáltica de 3" en Av. Palestina Tramo 1: Entre A. Fza. Aérea y C. 26 (Tope); Carriles Centrales incluyendo camellón.



Folios 02




15-Junio-2017

- Se reiniciaron los trabajos de prosado en Av. Palestina Tramo 3: Entre Calle 20 (Cerro) y Calle Ejido Carril de Piedra (Torre); Carriles controlados incluyendo Carril y Carril de baja velocidad en el sentido Este-Oeste.





16-Junio-2017

- Se trabajó con prosado en el tramo 4, entre Calle Ejido Carril de Piedra y Av. del Camuejo de la Av. Palestina; Carriles controlados incluyendo carril y Carril de baja velocidad en sentido Este-Oeste; Trámulo al 100% de área establecida.





- Se tendió carpeta asfáltica de 3/4" en Av. Palestina Tramo 2: Entre Calle 26 (Torre) y Calle 20 (Oxxo); Obras concluidas incluyendo camellón.



20 - Junio - 2017



- Se tendió carpeta asfáltica de 3/4" en Av. Palestina Tramo 3: Entre Calle 20 (Oxxo) y Calle Ejido Canal de Piedra (Torre); Obras concluidas incluyendo camellón y carril de baja velocidad sentido este-Oeste; y se hizo limpieza general del tramo.



Folio 04:

21-Junio-2017

- Se tendió carpeta asfáltica de 3 1/2" en Av. Pabellina tramo 4: entre Calle Ejido Camil de Piedra (Tope) y Av. del Comercio; Curvas centricas incluyida camión y Camión de baja velocidad sentido Este-Oeste; terminando el área proyectada al 100%



22-Junio-2017

- Se hizo limpieza fina del tramo.

