



OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS

R.F.C.: HEFO710611J88 Domicilio: 4A No. 6901-A
Colonia: NOMBRE DE DIOS, C.P. 31110
Ciudad: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

FACTURA
SERIE: A
FOLIO: 15
FECHA: 9/8/2017 07:44:23

Documento Válido

Cliente: Municipio de Chihuahua
R.F.C.: MCI651010V22
Domicilio: Calle Mina No. 408
Colonia: Col. Centro
Ciudad: Chihuahua

C.P.: 31000,
Estado: Chihuahua

Localidad: Chihuahua
País: Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	PAGO DE ESTIMACION PAGO DE ESTIMACION NUMERO 2 DEL CONTRATO 66/2017 DE SEÑALIZACION EN PAVIMENTOS DE LAS VIALIDADES Y CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	475,285.38	475,285.38
1.00	No aplica	0.2% D.I.F. (AL MILLAR)..... \$ 950.57 0.2% CMIC (AL MILLAR)..... \$ 950.57 SUMA DE DESCUENTO \$ 1,901.14 SUMA DE ESTIMACION \$ 475,285.38 IMPORTE NETO A RECIBIR \$ 549,429.90	0.00	0.00

Importe con letra
QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 04/100 M.N.

SUBTOTAL:	475,285.38
I.V.A.:	76,045.66
TOTAL:	551,331.04



✓ Efectos fiscales al pago

E

FIRMA DE CONFORMIDAD

111.0114557AFA F3E7 4504-9329-A4008-111A00012C17-00 09F08:44:37:1X187E16B70E953A
c51RE6c1TV733KJ9qk0g1G0H0s04jC1T0LWVPLVH10WRzYkP1XvpHeOKqUHH7/zDU1Z1F7M2h/
D9VcNcB6D1U15N17g/sR0RqH1d5y3mjvaomF5T7Qq6RqG1ue2+cdv:ZDwpgn145M5Gp6b0n53c
chhh59F7j85DPYUdzEUMRBLF/yA21g55TRW0dVg5NpepFG6EMRREJ6h3u6MxUj+A4cWrl8ptXKVuM5
8OMUR1Nnq12r11128:CE3/1n1PBvY8b8rJvbw651A5jdhg1TL1Ladexb13A16/5ML8JcAoTH7IeCDT/E2==
DT/FA--100010600604048607411

Serie de Certificado: 00001000000406199622
ZtnTe+nfB0cR953JccPRE6c1TVY3XZRU0uPdg+GN1H0s04jC1T0LWVPLVH10WRzYkP1XvpHeOKqUHH7/zZ
bU+Z1F7M2h/D9VcNcB6D1U15N17g/sR0RqH1d5y3mjvaomF5T7Qq6RqG1ue2+cdv:ZDwpgn145M5Gp6b
0n53rchhh59F7j85DPYUdzEUMRBLF/yA21g55TRW0dVg5NpepFG6EMRREJ6h3u6MxUj+A4cWrl8ptXKVuM5
OMUR1Nnq12r11128:CE3/1n1PBvY8b8rJvbw651A5jdhg1TL1Ladexb13A16/5ML8JcAoTH7IeCDT/E2==

[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/) Inicio


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

* Datos obligatorios

RFC del emisor

HEFO710611J88

Folio fiscal

34657AFA-F34C-4504-9228-
A4D08011A0D0

Total del CFDI

\$551,331.04

Nombre o razón social del
emisor

OSCAR HOMERO HERMOSILLO
FRESCAS

Fecha de expedición

2017-08-09T07:44:23

Efecto del comprobante

ingreso

RFC del receptor

MCI651010V22

Fecha certificación
SAT

2017-08-09T08:44:32

Estado CFDI

Vigente

Nombre o razón social del
receptor

Municipio de Chihuahua

PAC que certificó

MAS0810247C0

Verificar CFDI

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- [Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

- [English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)
- [Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)
- [Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

Mantente informado. Suscríbete.

usuario@ejemplo.com



Síguenos en

<https://www.facebook.com/gobmx> <https://twitter.com/gobmx>

PROGRAMA: OBRA: SEÑALIZACIÓN EN PAVIMENTOS DE LAS VIALIDADES Y CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS R.F.C. HEFO710611-J88		CONTRATO No. 66/2017 CONTRATADO \$ 812,360.00 ESTIMACION No. 2 PERIODO: DEL 06 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2017. IMPORTE ESTIMADO \$ 475,285.38 IMPORTE ACUMULADO \$ 812,360.00	
C O N C E P T O PINTURA TRAFICO		O B S E R V A C I O N E S	
IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION		\$ 475,285.38	
DESCUENTOS: 0.2 % DIF (AL MILLAR). \$ 950.57 0.2 % CMIC (AL MILLAR). \$ 950.57 SUMA DESCUENTOS \$ 1,901.14		FORMULO: PRESIDENTE DE OBRA ING. JESUS GARCIA REVISO	
RESUMEN: SUMA ESTA ESTIMACION \$ 475,285.38 AMORTIZACION ANTICIPO (%) DESCUENTOS \$ 1,901.14 SUB - TOTAL \$ 473,384.24 I.V.A. \$ 76,045.66 SALDO NETO PARA PAGO \$ 549,429.90		ACEPTO: EL CONTRATISTA OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS M.B.	
CON LETRA:		Jefe del Depto. de Mantenimiento Vial SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA ING. RETORIO GOMEZ BALLONA ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA AUTORIZO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	

[illegible]



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO No. D-2018/2017

10 de julio del 2017

**ING. OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS
P R E S E N T E.-**

Con relación a la solicitud de fecha 06 de julio del 2017, en el que presenta a revisión y autorización del precio extraordinario de la obra: **"SEÑALIZACION EN PAVIMENTOS DE LAS VIALIDADES Y CALLES DE LA CIUDAD"**, que al amparo del contrato No. 066/2017, ejecuta su representada; al respecto me permito comunicar que el mismo ha sido autorizado tal y como se relaciona a continuación:

No.	CONCEPTO	CANT	UND.	PRECIO AUTORIZADO
EXT.01	Suministro y aplicación de pintura Termoplástica para TABLONES en cruces peatonales, con dimensiones de 40 cm. X 2.00 m. color blanco o amarillo, marca Veluvine.	120.64	M2	\$ 375.00

IMPORTE MÁXIMO AUTORIZADO \$ 45,240.00 SIN IVA

ATENTAMENTE


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.- Arq. Carlos Aguilar García.-Subdirector de Infraestructura Vial
C.c.p.-Ing Arturo Gómez Ballona.-Jefe del Departamento de Mantenimiento Vial e Infraestructura.
C.c.p.-Ing. Jesús Garay Ruiz.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

Avenida Los Nogales

De Sacramento a Tecnológico

cuerpo de avenida					
	diamantes	696.00	5.00	3,480.00	diamantes tec a sacramento
		731.00	5.00	3,655.00	diamantes sacramento a tec
	laterales	68.60	1.00	68.60	lin continua boyas
		151.80	2.00	303.60	desp puente
		193.40	1.00	193.40	lateral puente
		73.20	2.00	146.40	fre lat puent sosa v
		282.20	1.00	282.20	lat puente
		79.80	2.00	159.60	fre sal puente
		64.90	2.00	129.80	fre industrial
		93.60	2.00	187.20	desp puente
		636.00	1.00	636.00	lat abajo puent sin sal
		59.30	2.00	118.60	sal puente
		234.50	1.00	234.50	lat puente sin sal
		45.30	2.00	90.60	frenaje fte oxo
		311.10	1.00	311.10	lat abajo puente
		730.80	1.00	730.80	lat arriba puente venceremos
		73.30	2.00	146.60	frena industrias
		62.00	2.00	124.00	des puente
		285.80	1.00	285.80	lat puente sosa vera
		39.30	2.00	78.60	frenaje sosa vera
		200.50	1.00	200.50	lat puente sosa vera
		105.50	2.00	211.00	sal puente sosa vera
		111.00	2.00	222.00	frenaje tecnologico
		1,185.00	1.00	1,185.00	lat amarilla
		64.80	2.00	129.60	desp puente
		3,393.30	1.00	3,393.30	lat amarilla
		4,465.00	1.00	4,465.00	riveras sacramento a tecnologico
		147.80	1.00	147.80	isleta

21,316.60

peatonales y logaritmicas					
	11.20	0.40	7.00	31.36	logaritmicas
	3.00	0.40	12.00	14.40	tabletas

PIEZAS

61

45.76 m2







VIALIDAD LOS NOGALES Y TECNOLÓGICO



AVE LOS NOGALES FRENTE WAL-MART

[Handwritten signature]

[Handwritten scribbles and signatures]

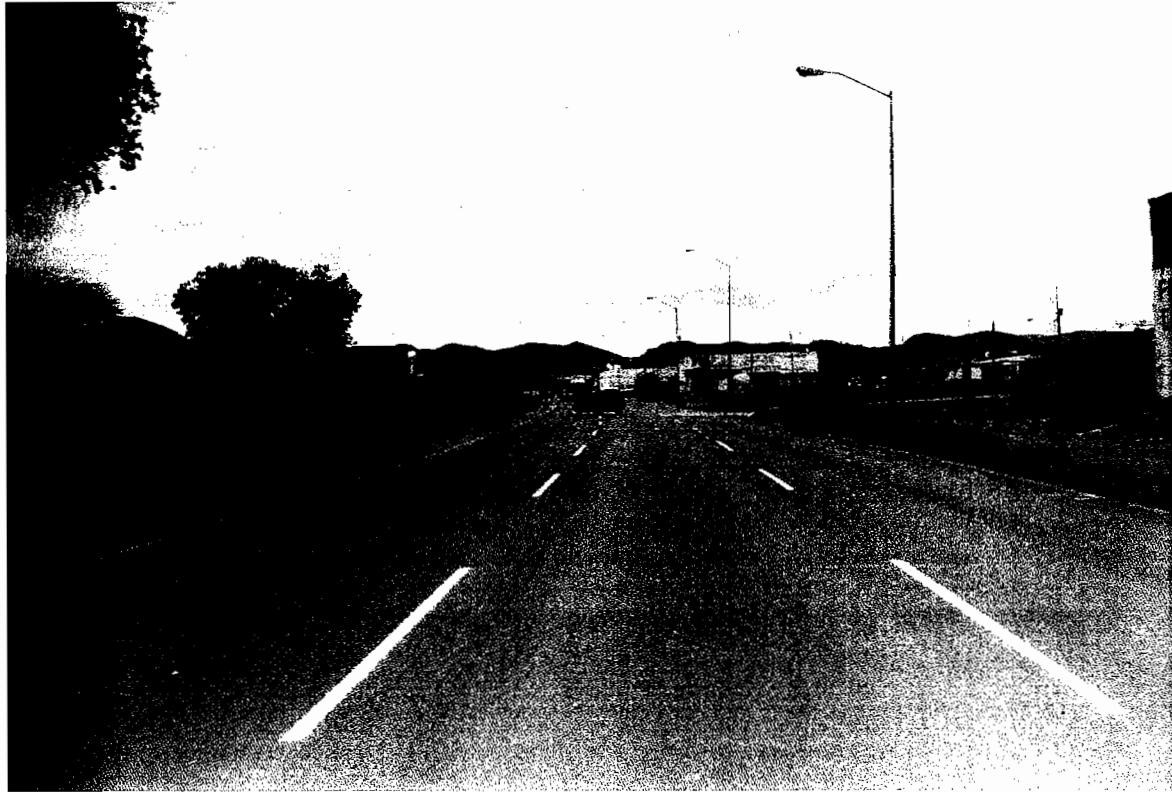


AVENIDA LOS NOGALES FRENTE WAL-MART



AVENIDA LOS NOGALES Y SOSA VERA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

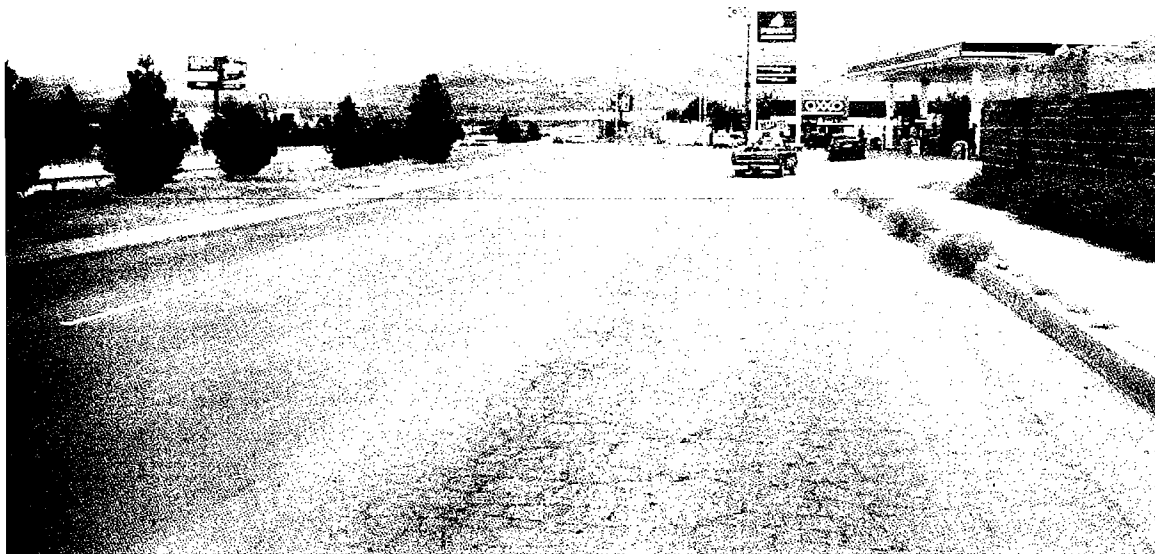

AVENIDA LOS NOGALES Y CALLE LA COBRIZA



AVENIDA LOS NOGALES Y VENCEREMOS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



AVENIDA LOS NOGALES Y C. LEY ORGANICA.



ISLETA EN NOGALES CASI TECNOLÓGICO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Boulevard Antonio Ortiz Mena

De Ave Americas hasta Periferico de la Juventud

LINEAS DE CARRIL

433.00	5.00		2,165.00	diamantes
37.90	1.00		37.90	insurgentes
55.60	1.00		55.60	carbonel
68.40	1.00		68.40	antonio de montes
66.20	1.00		66.20	deza y ulloa
52.80	1.00		52.80	mirador
48.30	3.00		144.90	mirador
37.30	1.00		37.30	mirador
60.90	1.00		60.90	campestre
67.70	1.00		67.70	california
55.30	1.00		55.30	politecnico
33.00	1.00		33.00	juan bernardo
33.90	1.00		33.90	oceano pacifico
31.60	1.00		31.60	transito
67.80	1.00		67.80	juventud
58.60	1.00		58.60	retorno
73.00	1.00		73.00	francisco villa
76.50	1.00		76.50	antonio de montes
69.00	1.00		69.00	deza y ulloa
30.60	1.00		30.60	mirador
84.00	1.00		84.00	campestre
109.80	1.00		109.80	presa el rejon
45.10	1.00		45.10	politecnico
21.90	1.00		21.90	retorno
21.20	1.00		21.20	retorno
27.80	1.00		27.80	transito
37.30	2.00		74.60	camellon simulado
38.00	1.00		38.00	frenaje fco villa
55.90	1.00		55.90	frenaje carbonel
72.90	1.00		72.90	frenaje antonio de montes
27.80	1.00		27.80	frenaje deza y ulloa
198.00	1.00		198.00	blanca lateral en mirador
50.50	1.00		50.50	frenaje campestre
59.70	1.00		59.70	presa california
61.20	1.00		61.20	politecnico
50.20	2.00		100.40	camellon simulado
36.20	1.00		36.20	frenaje juan bernardo
24.50	1.00		24.50	oceano pacifico
33.00	1.00		33.00	frenaje peatonal transito
315.00	1.00		315.00	diamantes
430.00	5.00		2,150.00	diamantes
36.50	1.00		36.50	transito
55.60	1.00		55.60	oceano pacifico
24.60	1.00		24.60	juan bernardo
62.00	1.00		62.00	calle 28

49.30	1.00		49.30	presa rejon
46.80	1.00		46.80	calle 24
49.60	1.00		49.60	mirador
61.00	3.00		183.00	deza y ulloa
48.20	1.00		48.20	antonio de montes
47.80	1.00		47.80	carbonel
47.60	1.00		47.60	insurgentes
71.60	1.00		71.60	americas
23.50	1.00		23.50	transito
14.80	1.00		14.80	transito
53.90	1.00		53.90	oceano pacifico
62.40	1.00		62.40	calle 28
49.10	1.00		49.10	rejon
47.20	1.00		47.20	calle 24
84.80	1.00		84.80	mirador
75.30	1.00		75.30	deza y ulloa
103.20	1.00		103.20	antonio de montes
87.20	1.00		87.20	glandorff
68.70	1.00		68.70	francisco villa
63.20	1.00		63.20	retorno
78.80	2.00		157.60	camellon simulado
52.20	1.00		52.20	linea lateral
47.60	1.00		47.60	lateral
36.70	1.00		36.70	linea cont transito peatonal
113.00	1.00		113.00	linea cont derecha
57.70	3.00		175.10	lateral continua
51.70	1.00		51.70	frenaje calle 28
45.80	1.00		45.80	frenaje calle rejon
104.40	1.00		104.40	camellon simulado calle bernardo
48.10	1.00		48.10	frenaje calle 24
25.30	2.00		50.60	camellon simulado calle 24
49.80	1.00		49.80	frenaje mirador
31.70	2.00		63.40	camellon simulado mirador
49.20	1.00		49.20	linea continua mirador
36.40	1.00		36.40	linea continua mirador
54.00	2.00		108.00	linea continua mirador
47.50	1.00		47.50	frenaje antonio de montes
53.40	1.00		53.40	frenaje carbonel
41.80	1.00		41.80	frenaje insurgentes
227.50	2.00		455.00	camellon simulado americas
71.60	1.00		71.60	frenaje americas
208.00	5.00		1,040.00	diamantes
75.00	5.00		375.00	diamantes


11,623.30





PEATONALES

3.00	0.40	84.00	100.80	tablones
3.30	0.40	6.00	7.92	logaritmicas
5.60	0.40	3.00	6.72	logaritmicas
7.00	0.40	3.00	8.40	logaritmicas
15.50	0.40	5.00	31.00	logaritmicas
13.20	0.40	2.00	10.56	logaritmicas
7.20	0.40	1.00	2.88	logaritmicas
19.10	0.40	3.00	22.92	logaritmicas
15.40	0.40	6.00	36.96	logaritmicas
24.30	0.40	2.00	19.44	cobach 3
13.30	0.40	1.00	5.32	cobach 3
49.70	0.40	2.00	39.76	cobach 3
30.70	0.40	1.00	12.28	cobach 3
15.20	0.40	3.00	18.24	cobach 3
15.00	0.40	2.00	12.00	cobach 3
18.60	0.40	3.00	22.32	cobach 3

PIEZAS 477 357.52 M2



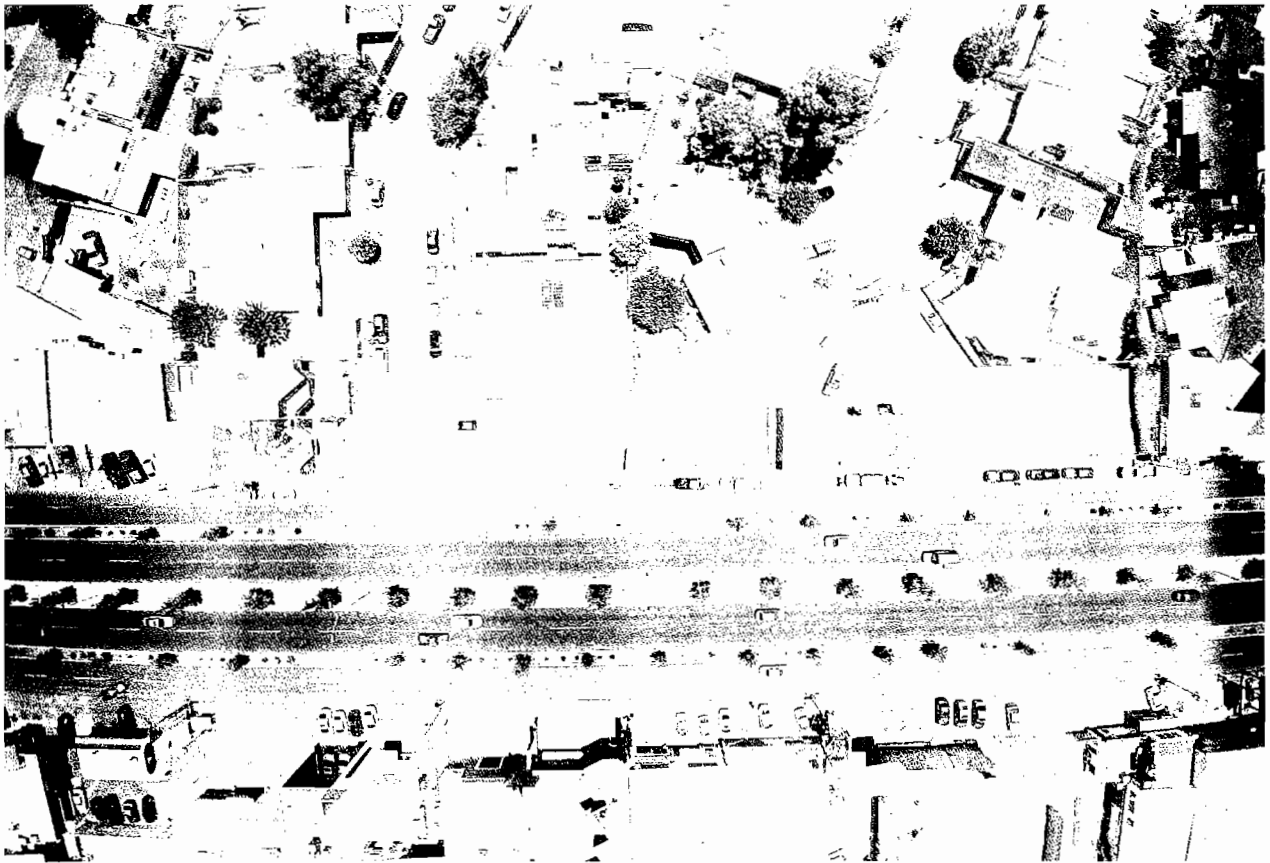
ORTIZ MENA Y OLIVOS



ORTIZ MENA FRENTE A DIRECCION DE VIALIDAD

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

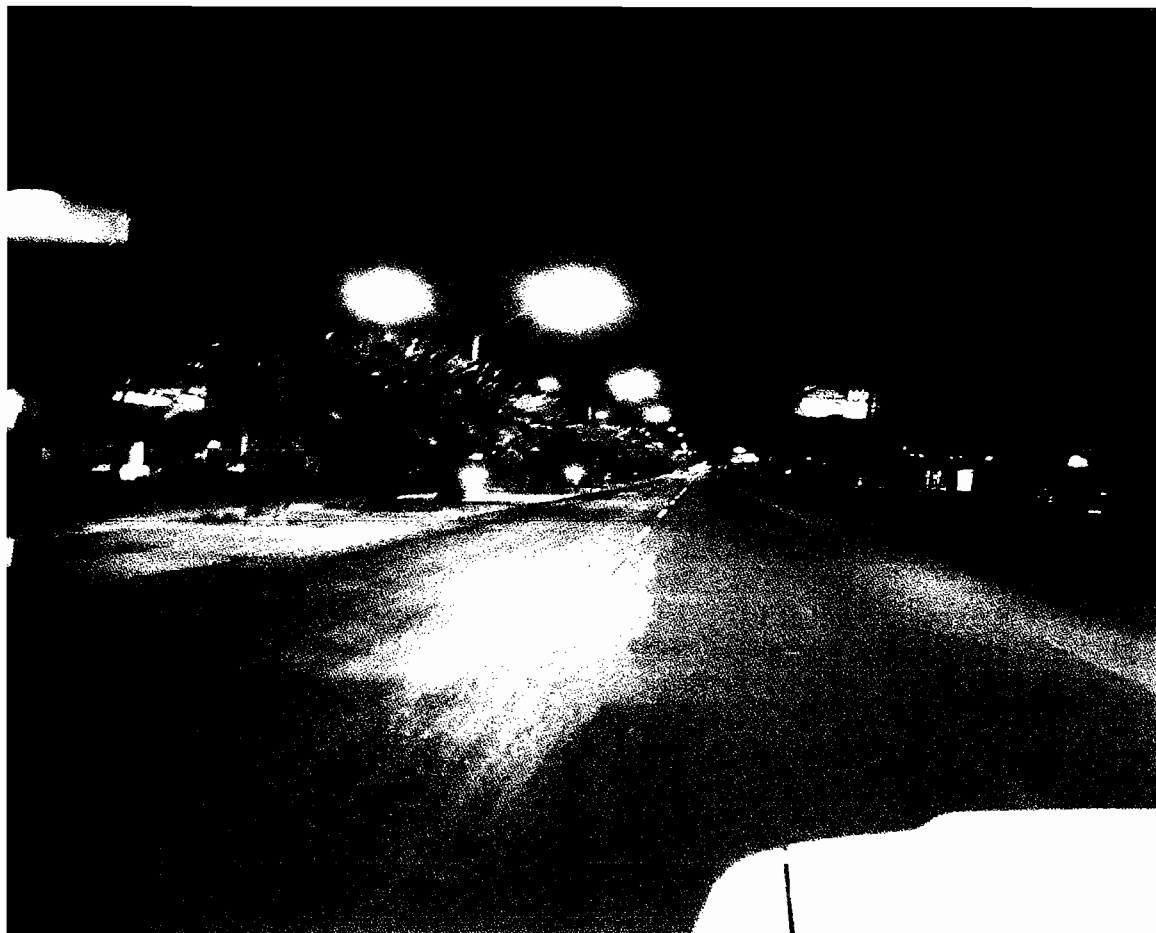

ORTIZ MENA Y AMERICAS



ORTIZ MENA FRENTE A DIRECCION DE VIALIDAD.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ORTIZ MENA Y BOSQUES DE YURIRIA



ORTIZ MENA Y PRESA SAN MARCOS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ORTIZ MENA Y OCEANO PACIFICO



ORTIZ MENA Y PERIFERICO DE LA JUVENTUD

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ave. Independencia

De Boulevard Fuentes Mares hasta Paseo Bolivar

LINEAS DE CARRIL

49.8	1.00		49.80	continua fuentes mares
15.3	3.00		45.90	frenaje zubiran
17.3	3.00		51.90	frenaje justiniani
35.6	3.00		106.80	frenaje tamborel
23.5	3.00		70.50	frenaje urueta
15.5	2.00		31.00	frenaje ponce de leon
10.6	3.00		31.80	frenaje samaniego
19.2	3.00		57.60	frenaje mendez
43.4	3.00		130.20	frenaje calle 20 noviembre
14.2	2.00		28.40	frenaje nicolas bravo
40.7	2.00		81.40	frenaje bolivar
390.0	5.00		1,950.00	diamantes

2,635.30


PASOS PEATONALES

12.5	0.40	1.00	5.00	frenado peatonal zubiran
16.0	0.40	3.00	19.20	tabletas peatonal zubiran
8.8	0.40	1.00	3.52	frenado peatonal justiniani
6.6	0.40	1.00	2.64	frenado peatonal justiniani
34.0	0.40	3.00	40.80	tablones justiniani
60.3	0.40	2.00	48.24	paralelas tamborel
24.9	0.40	1.00	9.96	frenado peatonal tamborel
13.2	0.40	1.00	5.28	frenado peatonal urueta
17.0	0.40	3.00	20.40	tablones urueta
12.6	0.40	1.00	5.04	frenado peatonal ponce de leon
12.9	0.40	1.00	5.16	frenado peatonal samaniego
17.0	0.40	3.00	20.40	tablones peatonal samaniego
13.1	0.40	1.00	5.24	frenado peatonal mendez
17.0	0.40	3.00	20.40	tablones mendez
12.3	0.40	1.00	4.92	frenado peatonal jimenez
15.0	0.40	3.00	18.00	tablones jimenez
12.2	0.40	1.00	4.88	frenado peatonal mina
14.0	0.40	3.00	16.80	tablones mina

PIEZAS

341

255.88 M2






INDEPENDENCIA Y 20 DE NOVIEMBRE



INDEPENDENCIA Y URQUIDI.

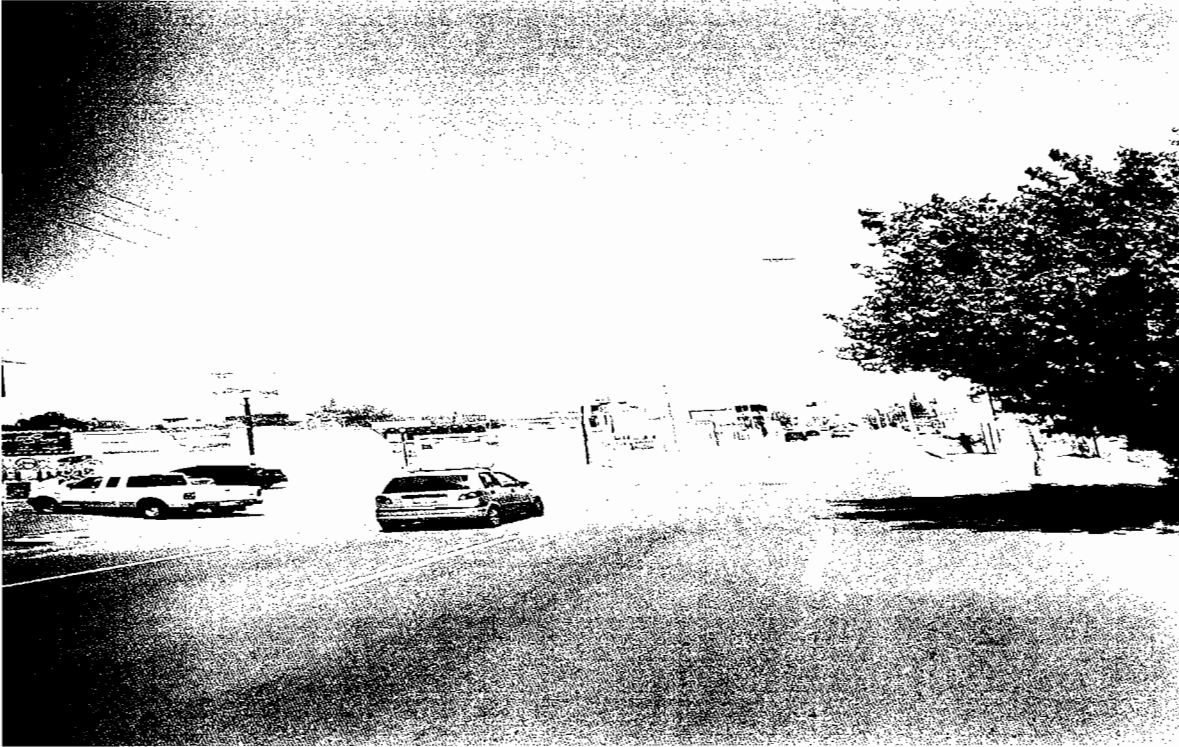


INDEPENDENCIA Y ZUBIRAN.



INDEPENDENCIA Y FUENTES MARES HACIA EL NORTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

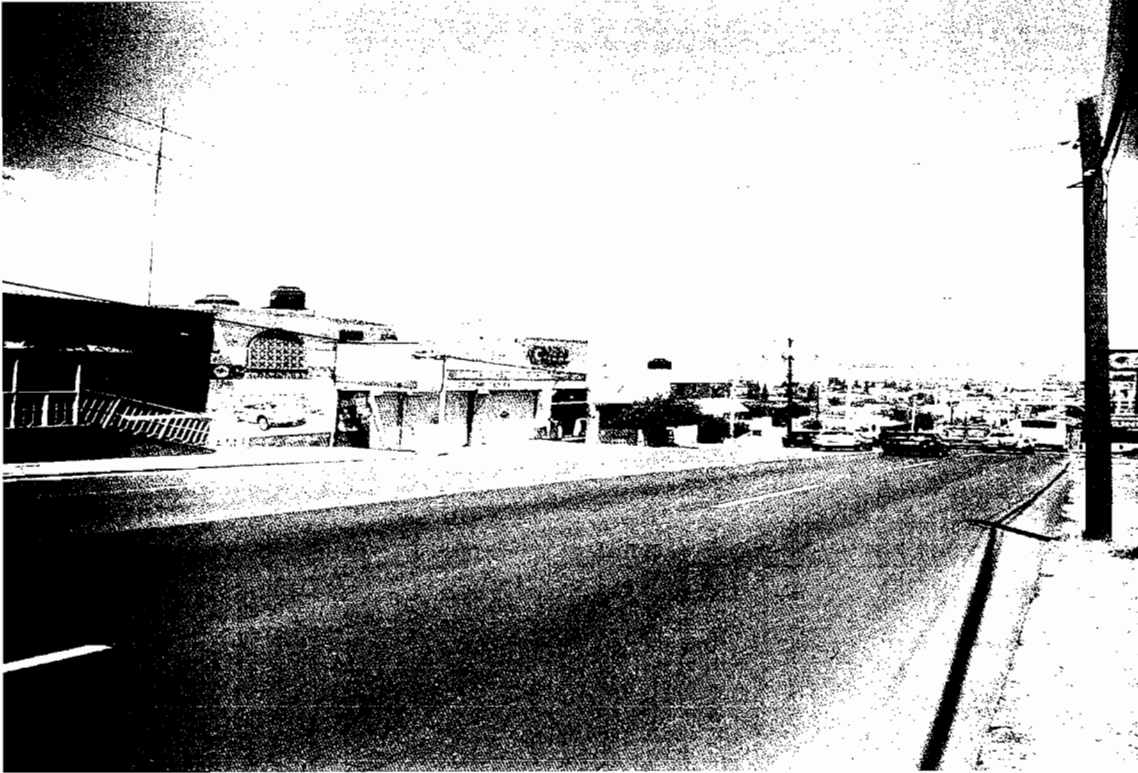

INDEPENDENCIA ENTRE SAMANIEGO Y J.J. CALVO



INDEPENDENCIA Y URUETA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ave Antonio de Montes

De Deza y Ulloa a Deza y Ulloa


Deza y Ulloa a Division del Norte					
	diamantes	286.00	5.00	1,430.00	
	frenajes	46.60	3.00	139.80	ortiz mena
		33.80	3.00	101.40	san felipe
		32.40	3.00	97.20	div norte
				1,768.40	total ml

de Division del Norte a Deza y Ulloa
800 ml

Division Del Norte a Deza y ulloa					
	diamantes	153.00	5.00	765.00	
	frenajes			-	
				-	
				765.00	total ml

Total MI

2,533.40





ANTONIO DE MONTES Y DEZA Y ULLOA



ANTONIO DE MONTES Y DEZA Y ULLOA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ANTONIO DE MONTES Y BLAS CANO DE LOS RIOS



ANTONIO DE MONTES Y RAMIREZ CALDERON



ANTONIO DE MONTES Y FERNANDO DE BORJA



ANTONIO DE MONTES Y BARRIENTOS Y PARDIÑAS

A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom left of the page.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.


Ave de la Cantera y Juventud

PASO PEATONAL

0.4	3	47	56.4
11.2	3.1		34.72
7.3	3.1		22.63
7.3	0.4		2.92
7.6	2.7		20.52
6.8	2.9		19.72
7	0.4		2.8
7.1	0.7		4.97
13.7	2.8		38.36
6.3	3		18.9
11.7	2.5		29.25
40	0.4		16
19.7	3.1		61.07
10.5	2.5		26.25
PIEZAS		473	354.51



CANTERA Y JUVENTUD



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




CANTERA Y JUVENTUD




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

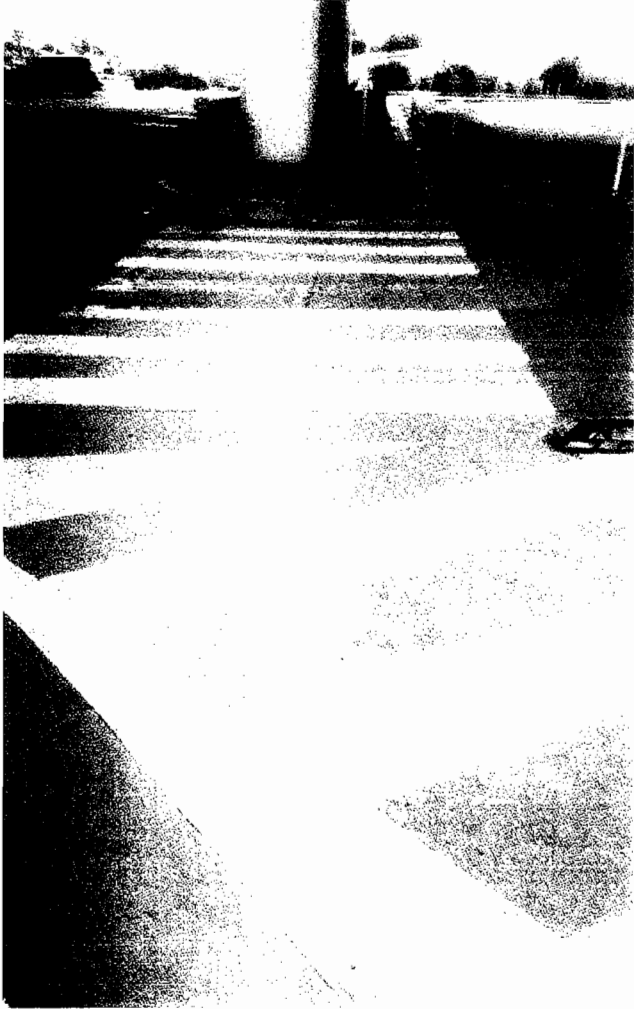

CANtera Y JUVENTUD

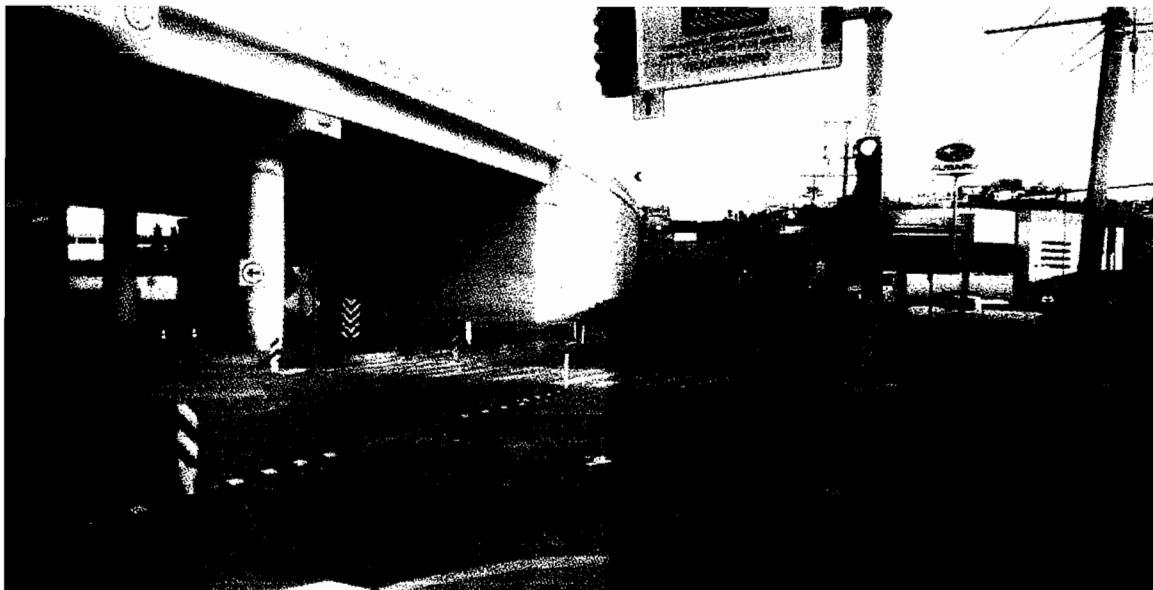

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


Ave de la Cantera y Tomas Valles


Thermoplastico

PASO PEATONAL


m2

120.64



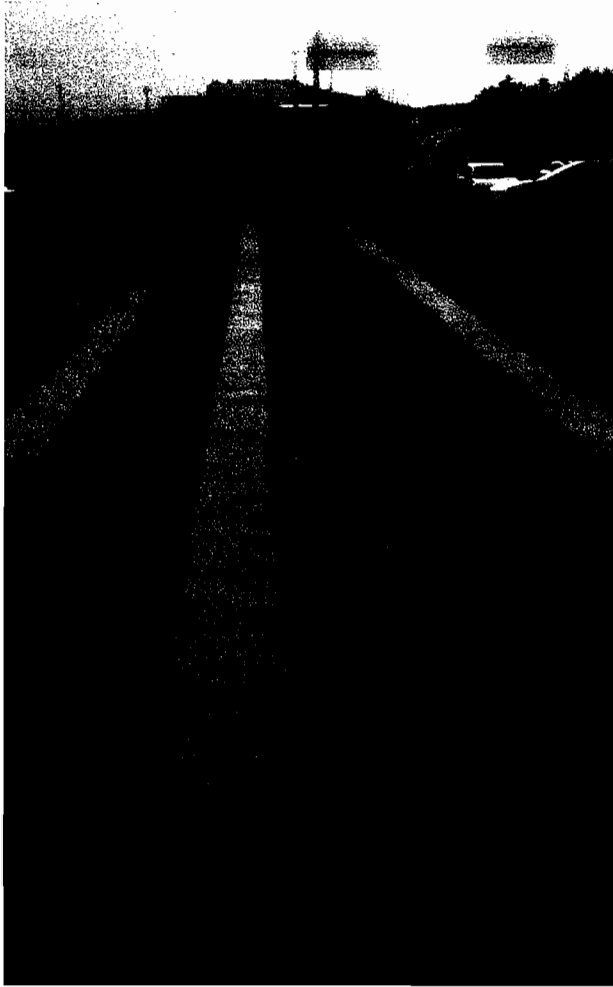

CANTERA Y TOMAS VALLES

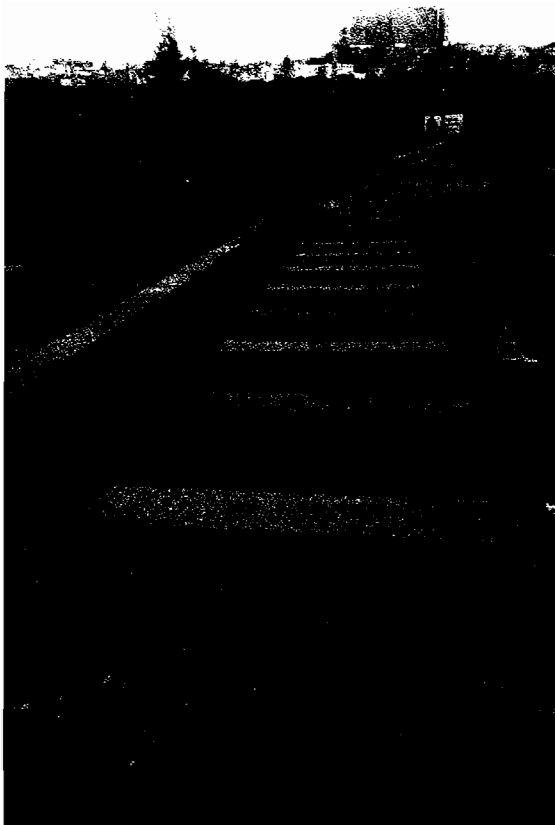

CANTERA Y TOMAS VALLES



CANTERA Y TOMAS VALLES

A large, stylized signature or stamp, possibly a name, written in a cursive or calligraphic style. It is located at the bottom left of the page.

Two smaller, stylized signatures or stamps, possibly names, written in a cursive or calligraphic style. They are located at the bottom right of the page.

Mision del bosque y Cantera

PASO PEATONAL

1	16.70	0.40	6.68
25	2.00	0.40	20.00
14	2.00	0.40	11.20
21	2.00	0.40	16.80
1	7.50	0.40	3.00
24	2.00	0.40	19.20
1	15.80	0.40	6.32
18	2.00	0.40	14.40
24	2.00	0.40	19.20
1	14.20	0.40	5.68
26	2.00	0.40	20.80

PIEZAS

191

143.28







[Handwritten signature]

CANtera Y MISION DEL BOSQUE

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

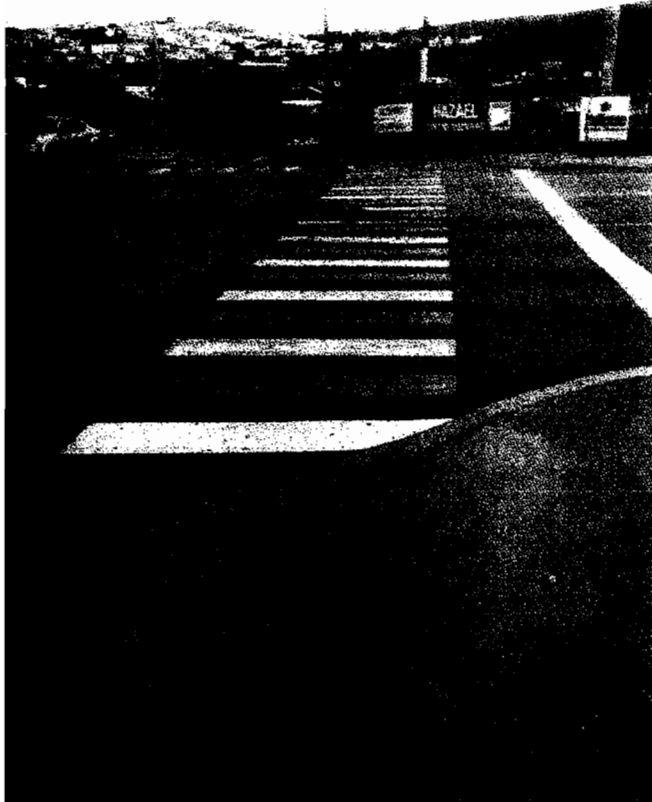

CANtera Y MISION DEL BOSQUE

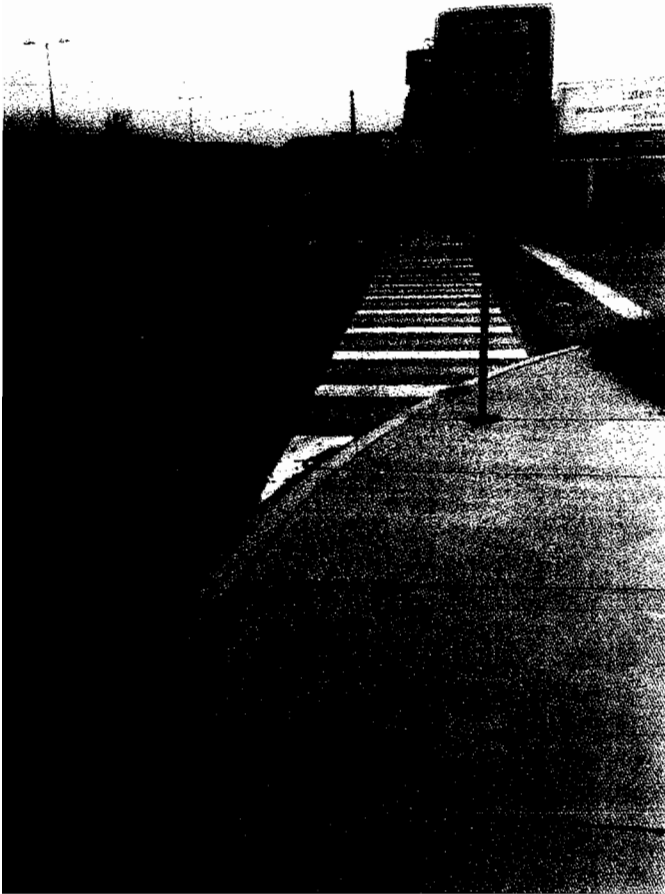

[Handwritten signature]

CANTERA Y MISION DEL BOSQUE


[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Calle 46
De Vialidad CH-P a Melchor Guaspe


De Vialidad CH-P a Melchor Guaspe					
	Linea Central	2,852.40	1.00	2,852.40	
				2,852.40	total ml

Total MI



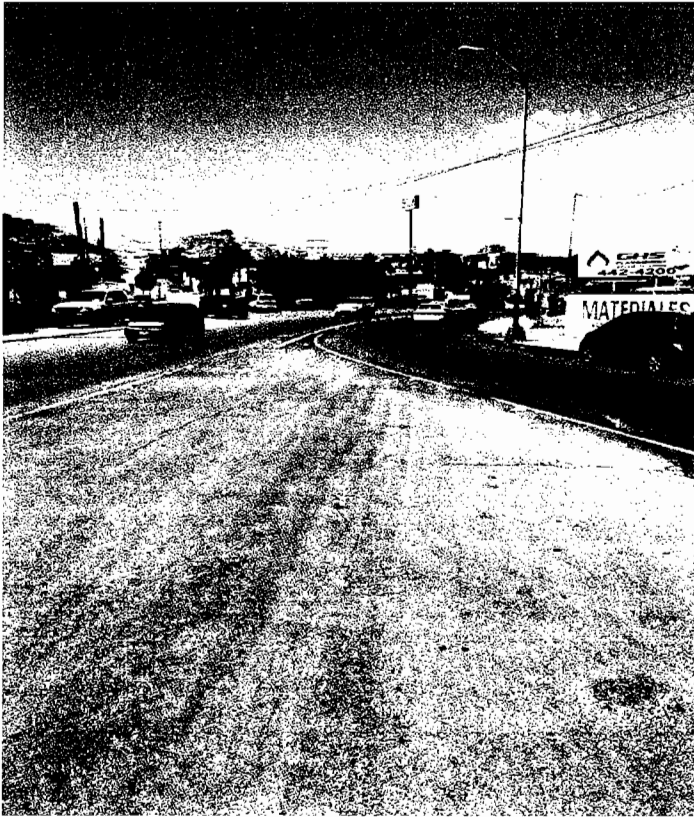

ISLETA CALLE 46a Y MELCHOR GUASPE

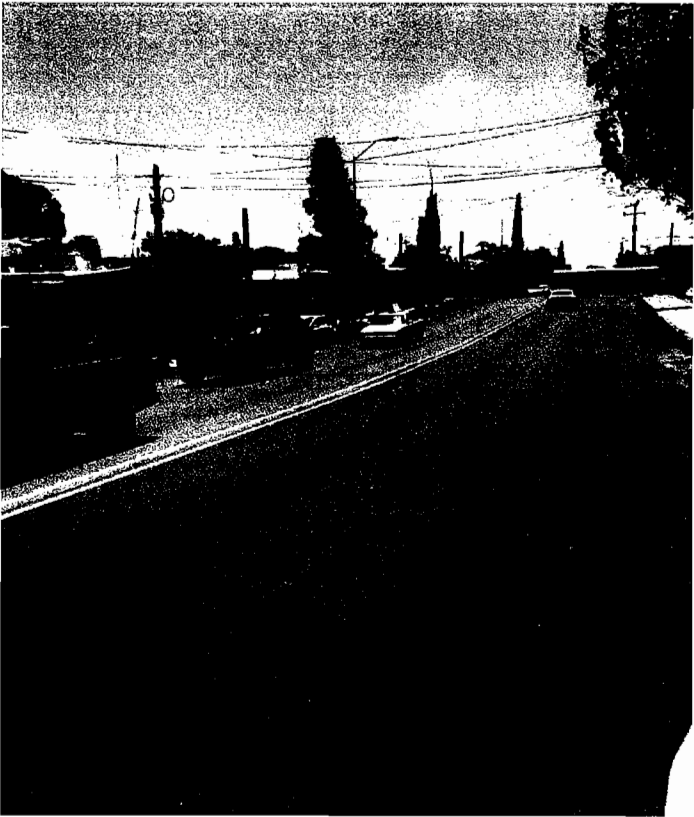


46 Y VIALIDAD CH-P VISTA HACIA EL SUR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CURVA CALLE 46 HACIA MELCHOR GUASPE

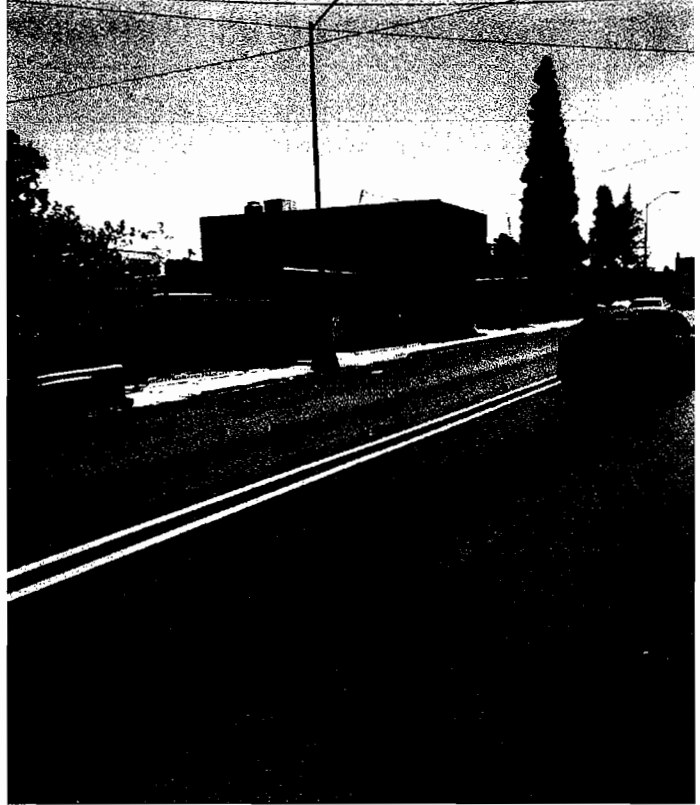


VISTA 46 Y MENDEZ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

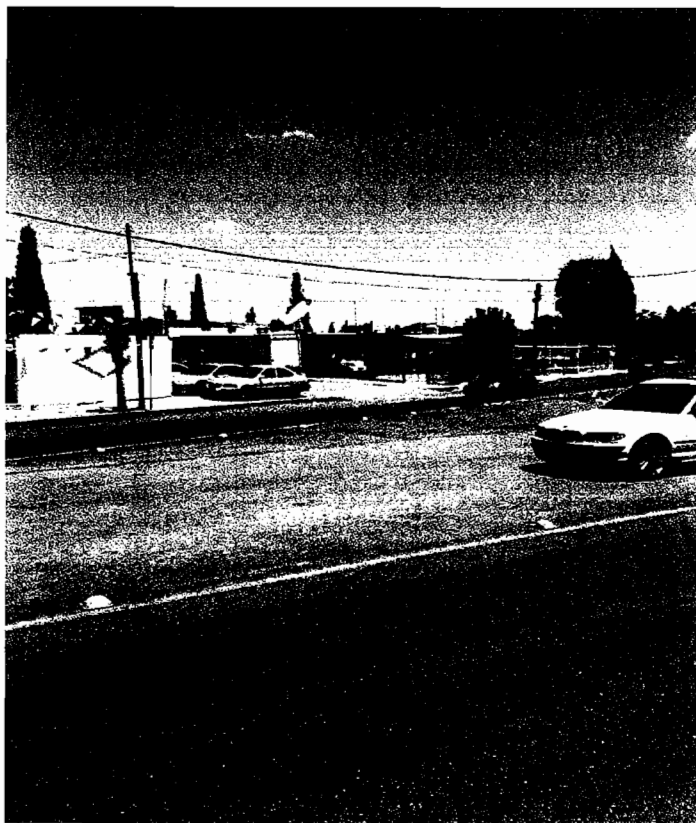

ISLETA EN MELCHOR GUASPE Y 46a.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




[Handwritten signature]

06 DE JULIO, 2017

POR INSTRUCCIONES SUPERIORES LE SOLICITO PINTAR CRUCES PEATONALES EN LOS CRUCEROS SIGUIENTES:

- AV. LA CANTERA Y TOMAS VALLES CON PINTURA TERMOPLASTICA
- AV. LA CANTERA Y C. MISION DEL VALLE CON PINTURA TRAFICO
- PFOO, JUVENTUD Y AV. LA CANTERA CON PINTURA TRAFICO.

ASI MISMO LE SOLICITO PRESENTAR EL ANALISIS DE PRECIO UNITARIO DE LA PINTURA TERMOPLASTICA PARA SU REVISION Y AUTORIZACION CORRESPONDIENTE, TODA VEZ DE SER UN TRABAJO EXTRA.







VIALIDAD LOS NOGALES.

9-JULIO-2017

10:00 PM.



- SE INICIA CON TRAZO DE CARRILES EN SENTIDO ORIENTE A PONIENTE DE CALLE EVEREST A TECNOLÓGICO, TERMINANDO TRAZO EN CALLE EVEREST. 5:20 AM.



10-JULIO-2017

10:25 PM.

- INICIAN TRABAJOS DE APLICACION DE PINTURA TRAFICO EN COLOR AMARILLO PARA LINEA CONTINUA LATERAL IZQUIERDA EN SENTIDO CALLE MONTE EVEREST A TECNOLÓGICO TERMINANDO EN SENTIDO TECNOLÓGICO - EVEREST 3:45 AM





VIALIDAD LOS NOGALES.

11-JULIO-2017

(12)

9:50 PM.

- APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO PARA GUIQUES DE
CARRIL, BAYONETAS, SEÑALIZADO CON TORRENTAS, ESTROBO Y CONES
CONTANDO CON APOYO DE UNIDADES DE VIALIDAD 4:45 AM



ORTIZ MENA.

13-JULIO-2017



10:15 PM.

SE INICIA TRAZO DE LINEAS DE CARRIL DESDE AVE. DE LAS AMERICAS
HASTA PERIFERICO DE LA JUVENTUD, TERMINANDO TRAZO NUEVAMENTE EN
AVE. AMERICAS.

TAMBIEN SE TRAZA Y APLICA PINTURA EN LINEAS PARALELAS EN ORTIZ
MENA Y FCO. VILLA PARA CRUCE PEATONAL.

FIN DE TRABAJO

4:55 AM




14-JULIO-2017

ORTIZ MENA.

10:00 PM.

SE INICIA APLICACION DE PINTURA EN GUIQUES Y BILLONETAS EN COLOR
BLANCO, INICIANDO EN O. MENA Y AMERICAS HACIA JUVENTUD,
TERMINANDO NUEVAMENTE EN AVE. AMERICAS.

2:55 AM.





ORTIZ MENA.

15 JULIO 2017

10:30 PM.

SE INICIA TRAZO Y APLICACION DE PINTURA EN PENTONAL EN COLOR BLANCO Y AMARILLO HACIENDO LA DIRECCION DE VIALIDAD, ASI COMO LAS LINEAS LOGARITMICAS EN AMBOS SENTIDOS.

4:15 AM.




AVE. INDEPENDENCIA
DE FUENTES MURES A PASEO BOLIVAR

16 JULIO 2017

10:10 PM.

SE INICIA CON TRAZO DE LINEAS DE CARRIL EN SENTIDO SUR-NORTE





INDEPENDENCIA

10:15 PM.

17/Julio/2017

APLICACION DE PINTURA PARA LINEAS (GUIQUES) DE CARRIL EN SENTIDO SUR-NORTE, ASI COMO BANQUETAS.

2:55 AM.





INDEPENDENCIA

20/Julio/2017

10:00

TRAZO DE PEATONEROS Y APLICACION DE PINTURA SEÑALIZADO CON TORRETES, ESTROBOS Y CORROS.

4:40




INDEPENDENCIA





21-JULIO-2017

16

10:20PM

CONTINUACIÓN DE TRAZO Y PINTURA DE PEATONALES EN COLOR
BLANCO Y AMARILLO. A TERMINO EN LA AVE. INDEPENDENCIA
DESDE FUENTES MARES A PASEO BOUVARD. 4:35AM



ANTONIO DE MONTES										23-JULIO 2017									
TRAMO DEJA Y UJALA A DIVISION DEL NORTE										10:30PM.									
-SE INICIA TRAZO EN ANTONIO DE MONTES Y DEJA Y UJALA HASTA DIVISION DEL NORTE, CON GUIDONES PARA 4 CIERRES.																			
TERMINANDO TRAZO A LA 1:00 AM																			
- JUICIO DE APLICACION DE PINTURA BLANCA EN GUIDONES																			
TERMINANDO APLICACION 3:45 AM																			
																			
ANTONIO DE MONTES										24-JULIO-2017									
TRAMO DIVISION DEL NORTE - DEJA Y UJALA										10:00PM.									
- SE INICIA APLICACION DE PINTURA EN GUIDONES DE CIERRE																			
TERMINANDO TRAZO 11:25 AM																			
																			
																			

CALIF 46^a



27/JULIO/2017

10:00 PM.

18

- SE INICIA TRAZO DE LINEA CENTRAL DURE EN TRAMO DE
VILLANO C.H-P HASTA ISLETA EN MEJOR CUALIDAD

- APLICACION DE PINTURA AMARILLA EN LINEA CONTINUA CENTRAL
TERMINACION DE TRABAJOS 4:55 am





3-AUGUSTO-2017

10:00 PM

CARTERA Y JUEVEDO

- SE INICIA CON TRAZO DE PERFORACION EN CAJONETAS EN TABLONES
BLANCO Y AMARILLO (GARANZO) APLICACION DE PINTURA BASE SOLVENTE
APLICADA CON RODILLO Y PERIMETRO ENMASCARADO





CAUTERIO Y MISION DEL BOSQUE

4-AGOSTO-17

10:20

SE INICIA CON TRATO Y APLICACION DE PINTURA EN PENTONAJES
CON PINTURA BLANCA Y AMARILLA EN TABLAJES DE 40 CMS

4:35 PM



CAUTERA Y TOMAS VALLES

7/AGOSTO/17

9:00 PM

SE INICIA CON TRAZO DE PEATONAL Y A SOLICITUD DE MUNICIPIO SE
APLICA PINTURA TERMOPLASTICA EN TABLEROS BLANCO Y AMARILLO DE
40 CM. ASI COMO LINEAS PARALELAS Y FRENTES.

TERMINANDO ASI LOS TRABAJOS (CONTRATADO) POR MUNICIPIO SEGUN
CONTRATO 60/2017 6:00 AM.

SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DIA 8-AGOSTO
A LAS 6:00 AM.

