



Arturo Davila Dozal
DADA650730ER0
Domicilio Fiscal
Cerrada de Ciervo 3907
Col. Lomas del Sol 31114
Chihuahua Chihuahua México
Tel. 4403137,4197398

Factura No: 1021
FOLIO FISCAL (UUID):
B12320F6-38AE-4978-812D-491FD2D8BAEB
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000303547987
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-08-30T10:18:27
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-08-30T10:13:27

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: MINA 408
CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIHUAHUA Chihuahua
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: Chihuahua, Chihuahua
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Fecha de Expedición: 30 agosto 2017
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	ESTIMACION NUMERO 2(DOS) POR LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 17.35 X 27.00 EN "ESC. PRIM. FEDERAL AMADOR HERNANDEZ A." CLAVE 08DPR2423Q, UBICADA EN CALLE PINO ALTOS No. 1707 DE LA COLONIA VILLAS DEL REAL. ALCANCE DE LA ESTIMACION \$371,721.10 CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 075/2017 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$0.00 RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO C.M.I.C DEL 0.2% \$743.44 D.I.F. DEL 0.2% \$743.44 SUMA \$1,486.88 FIRMA DEL CONTRATISTA NETO A RECIBIR \$429,709.60	\$ 371,721.10	\$ 371,721.10

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS, 48/100
MXN

SUBTOTAL: \$ 371,721.10
IVA(IVA 16.00%): \$ 59,475.38
TOTAL: \$ 431,196.48

SELLO DIGITAL DEL CFDI

HCfFka1Q11k4QqYpJfIoyJmsWzXCVVYcW3URPjgmpQWNh4BbnnVTXOVNyUFw0Fz0FEEV74p0xOm7DVzxBnT65HRCqPjZKfQwEcqUwjekNPIkQIE9SLBkFRaRPwtkR7aun2xVNeVsob03MS7aM5bU4bXIA9aIGe=

SELLO DIGITAL DEL SAT

kcZpk93k4zGQMwG7U/dlc2UGoHc1uPPIXSv2GAJ1uRe7a55chEi9YKP7UOLPAPVjrfIepm8IYQd9hykxEbNXk8an9+JlKg+CA4q242P+Toeh0AP6kP24YB+YktpqZXIIfc1Itp2JgQ+1nh20OWb3IS6CTN0p2Xzp3Jr2SvATyEE3HOKpTt3
op6JYpdSjzG2TghX1uOP8mZLR8ARVgYS10oAdPyGN7Xdf4DgHUSObUsaUloZ7Yu+6PO:bOuPSVcPoGid0qTHdbNCawPIAoC/Ma23DoH8NDP/cByu8KzIQUVp/uaqG4J49XJ4WOKsSFIR6Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B12320F6-38AE-4978-812D-491FD2D8BAEB|2017-08-30T10:18:27|RCfFka1Q11k4QqYpJfIoyJmsWzXCVVYcW3URPjgmpQWNh4BbnnVTXOVNyUFw0Fz0FEEV74p0xOm7DVzxBnT65HRCqPjZKfQwEcqUwjekNPIkQIE9SLBkFRaRPwtkR7aun2xVNeVsob03MS7aM5bU4bXIA9aIGe|=|00001000000405535779||



www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son
obligatorios desde Enero de 2011

Proveedor Autorizado de Certificación



[Verificar CFDI](#)

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DADA650730ERO	Arturo Davila Dozal	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B12320F6-38AE-4978-812D-491FD2D8BAEB	2017-08-30T10:13:27	2017-08-30T10:18:27	FMD100203JS7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$431,196.48	ingreso	Vigente	

[Imprimir](#)



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 075/2017	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 17.35 X 27.00 EN "ESC. PRIM. FEDERAL AMADOR HERNANDEZ A."	ESTIMACIÓN No. 2	\$ 859,778.37 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 26 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2017	
UBICACIÓN: CALLE PINOS ALTOS No. 1707, DE LA COLONIA VILLAS DEL REAL	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 431,196.48 CON IVA
CONTRATISTA: ING. ARTURO DAVILA DOZAL	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 336,584.58 CON IVA
RFC DADA-650730-ER0	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 767,781.06 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 371,721.10	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 371,721.10

--

DESCUENTOS		
0.2% C.M.I.C.	\$	743.44
0.2% D.I.F	\$	743.44
SUMA DESCUENTOS	\$	1,486.88
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	371,721.10
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	371,721.10
I.V.A.	\$	59,475.38
TOTAL	\$	431,196.48
(CON LETRA)		
(CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	1,486.88
SALDO NETO A RECIBIR	\$	429,709.60

AUTORIZO	ELABORO
ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA	ING. ARTURO DAVILA DOZAL
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. JAVIER VILLARREAL POSADA	ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN
SOCIAL	SOCIAL
Vo. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	

CHIHUAHUA, CHIH.,

28 DE AGOSTO DE 2017

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 429,709.59
(CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 59/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 2 CONTRATO No. 075/201 POR LA CANTIDAD DE : \$ 859,778.37 INCLUYE CONVENIO
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 37/100 MN POR TRABAJOS EN LA OBRA:

TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 17.35 X 27.00 EN "ESC. PRIM. FEDERAL AMADOR HERNANDEZ A."

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 371,721.10

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 371,721.10

IVA \$ 59,475.38

TOTAL \$ 431,196.48

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

C.M.I.C. DEL 0.2% 743.44

D.I.F. DEL 0.2% 743.44

SUMA 1,486.88

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO	\$ 859,778.37
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 336,584.58
ESTA ESTIMACION	\$ 431,196.48
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 767,781.06
POR EJERCER	\$ 91,997.31

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CONTRATO

IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% C.M.I.C.

0.2% D.I.F.

ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 743.44	\$ 743.44
ACUMULADO ACTUAL	\$ 743.44	\$ 743.44

R E C I B I M O S

ING. ARTURO DAVILA DOZAL
DADA-650730-ERO

OBRA: TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 17.35 X 27.00 EN "ESC. PRIM. FEDERAL
AMADOR HERNANDEZ A."

MUNICIPIO: CHIHUAHUA No. CONTRATO: 075/2017
ESTIMACIÓN No. 2

CONTRATISTA: ING. ARTURO DAVILA DOZAL

PERÍODO: 26 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

NORMALES

ESTRUCTURA

\$ 364,662.30

ALBAÑILERIA

\$ 7,058.80

SUBTOTAL 371,721.10

I.V.A. 59,475.38

TOTAL 431,196.48

POR EL CONTRATISTA

POR EL RESIDENTE DE D.O.P.M

ING. ARTURO DAVILA DOZAL

ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA

OBRA: TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 17.35 X 27.00 EN "ESC. PRIM. FEDERAL AMADOR HERNANDEZ A."

MUNICIPIO: CALLE PINOS ALTOS
No. 1707, DE LA
COLONIA VILLAS DEL
REAL
No. CONTRATO: 075/2017
ESTIMACIÓN No. 2
PERIODO: 26 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2017

CONTRATISTA: ING. ARTURO DAVILA DOZAL

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIO		

OBRA NORMAL						\$	371,721.10
-------------	--	--	--	--	--	----	------------

3	TECHUMBRE TIPO DOMO ESTRUCTURA					\$	371,721.10
29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA AUTO SOPORTANTE EN CUBIERTA, EN LAMINA CALIBRE 22 GALVANIZADA PARA ARCOS HASTA 18.00 M TIPO K-SPAN 120 MEDIDO EN HORIZONTAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	416.40	416.40	-	✓ 769.77 \$	320,532.23
30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA AUTO SOPORTANTE EN CUBIERTA, EN LAMINA CALIBRE 20 GALVANIZADA TIPO K-SPAN 120 PARA ARCOS HASTA 19 A 22 MTS. MEDIDO EN HORIZONTAL. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	52.05	52.05	-	✓ 847.84 \$	44,130.07
32	ALBAÑILERIA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GROUT ENTRE DADO Y PLACA BASE DE COLUMNA, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO	pza	20.00	352.94	-	✓ 352.94 \$	7,058.80

POR EL CONTRATISTA

ING. ARTURO DAVILA DOZAL

POR EL RESIDENTE DE D.O.P.M

ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA


GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA:


1 / 4

CONTRATO : No. 07/5/2017	TRAMO:	UBICADA EN CALLE PINOS ALTOS No. 1707, EN LA COL. VILLAS DEL REAL, MPIO. DE CHIHUAHUA
OBRA : TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 17.35 X 27.00 EN "ESC. PRIM. FEDERAL AMADOR HERNANDEZ A."	CONTRATISTA:	ING. ARTURO DAVILA DOZAL

No DE ESTIMACION: DOS		PERIODO: 26/07/2017 AL 26/08/2017						
CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS							
ESTRUCTURA	EJE	TRAMO	PZA	LARGO	ANCHO	ALTO	U.	SUB-TOTAL
29 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA AUTOSOPORTANTE EN CUBIERTA, EN LAMINA CAL. 22 GALVANIZADA PARA ARCOS HASTA 18.00 MTS. TIPO K-SPAN 120 MEDIDO EN HORIZONTAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	A-B	1 - 5	1	24.00	17.35		M2	416.40
TOTAL							M2	416.40

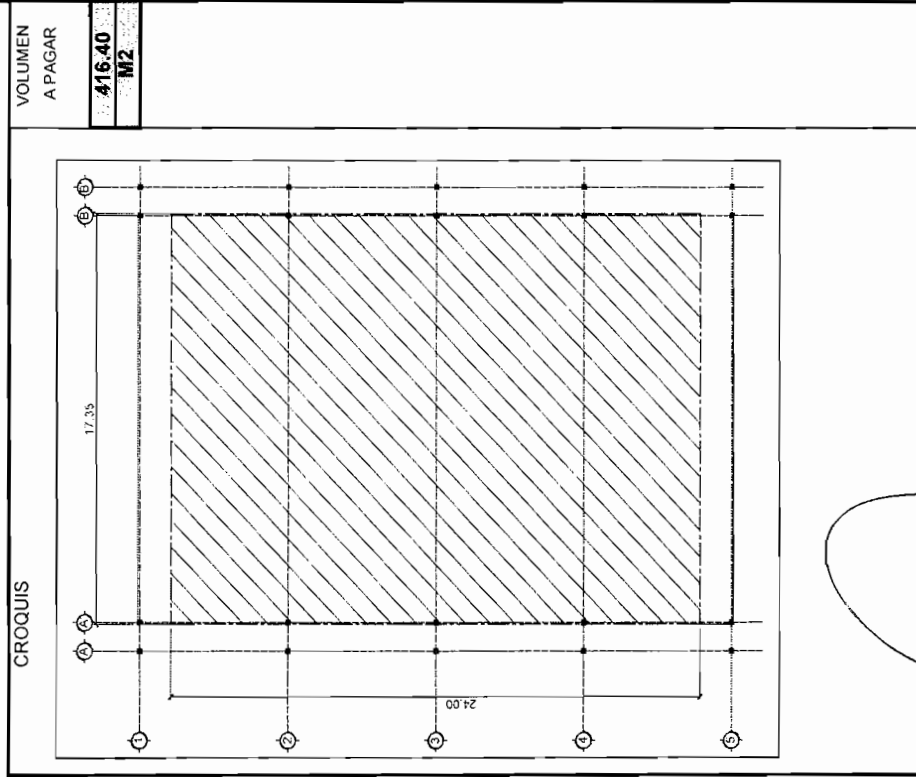


 RESIDENTE
 ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA


 CONTRATISTA
 ARTURO DAVILA DOZAL

2 / 4


TRAMO:

ING. ARTURO DAVILA DOZAL

No DE ESTIMACION: DOS PERIODO: 26/07/2017 AL 26/08/2017

[illegible]

CROQUIS

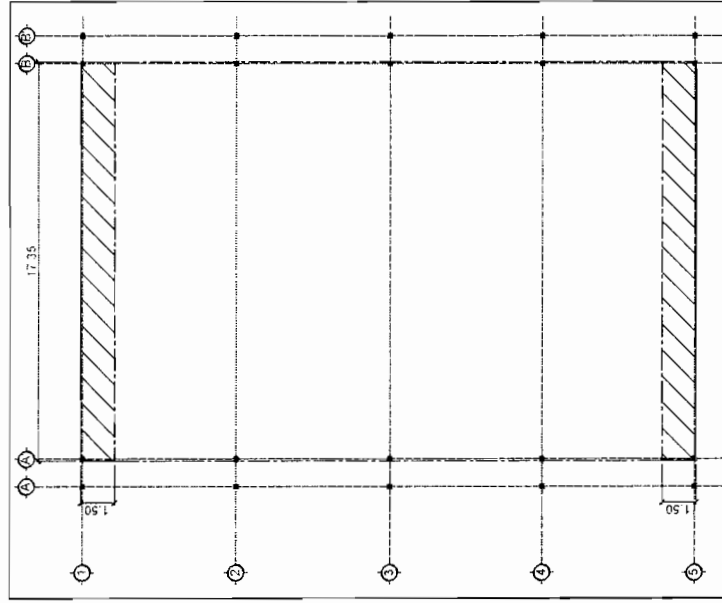

52.05
M2

RESIDENTE
ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA


CONTRATISTA
ARTURO DAVILA DOZAL

3 / 4

ING. ARTURO DAVILA DOZAL

PERIODO: 26/07/2017 AL 26/08/2017

CONCEPTO		OPERACIONES ARITMETICAS						
ALBANILERIA	EJE	TRAMO	PZA	LARGO	ANCHO	ALTO	U.	SUB-TOTAL
32 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GROUT ENTRE DADO Y PLACA BASE DE COLUMNA, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	DADOS					PLACAS/DADO		
	A-B'	1-5	20		1,00		PZA	20.00
TOTAL			PZA				TOTAL	20.00

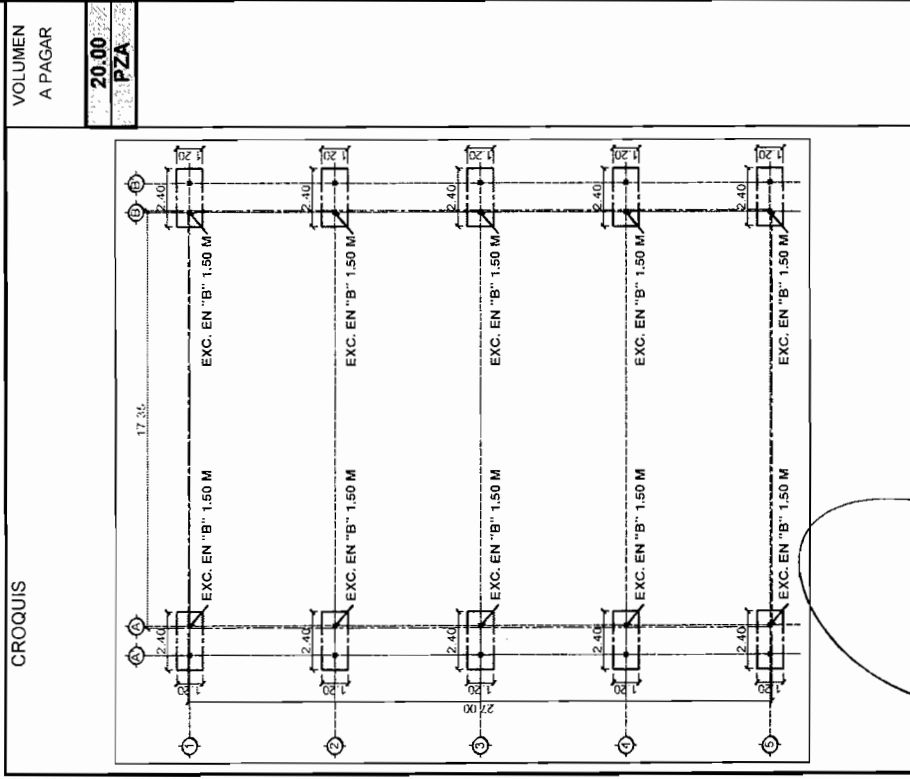

CONTRATISTA
ARTURO DAVILA DOZAL
