

LABORATORIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.

LACOSA CONTROL DE CALIDAD

REG. FED. CONT. CO951018 B58

MANUEL GARCIA GARCIA No. 10102

TELEFONOS (614)417 00 33

COL DEPORTISTAS CP 31125

Régimen Fiscal:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CHIHUAHUA, CHIH.

SERIE DEL CERTIFICADO 00001000000404480391

FACTURA

No. F 2042

FOLIO FISCAL

6BF66C0C-23FF-46FF-
AB8E-0C64F618A518

FECHA

Diciembre 14 2017 -
09:01:56

RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN: MINA No. 408 COLONIA: CENTRO C.P. 31000

CIUDAD: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA R.F.C. MC1651010V22 TELEFONO:

OBRA: 083/2017 Método de pago: CHEQUE No. Cuenta: 0016,4873,3307 Forma de pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN

No. DE PRUEBAS	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS. ESTIMACION: 2 (DOS) SEGUN CONTRATO No. 083/2017 AMORTIZACION DEL ANTICIPO: 0.00% RETENCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO C.M.I.C. 0.2% \$ 853.54 D.I.F. 0.2% \$ 853.54 SUMA \$ 1,707.08 NETO A RECIBIR \$ 493,346.12	426,770.00	426,770.00

CANTIDAD CON LETRA CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.

SUB-TOTAL \$ 426,770.00

16% I.V.A. \$ 68,283.20

TOTAL \$ 495,053.20

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



POR ESTE UNICO PAGARE DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE LABORATORIO Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V. EN SU DOMICILIO EL DÍA Diciembre 14 2017 LA CANTIDAD DE \$ 495,053.20 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.) VALOR DE TRABAJOS REALIZADOS A ENTERA SATISFACCION. SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA 4% DE INTERES MENSUAL HASTA SU TOTAL LIQUIDACION.

FIRMA

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE FISCAL CONSTRUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[10]68F66C0C-23FF-46FF-AB8E-0C64F618A518[2017-12-14T10:02:08][G2J54x06X14hrIpeR
o5K4uMBUhhhwakJ0I311QFQREXS4h2uTg9ECmxnVYBZYv8+Z17W1LPnzc7FX+/phwEMxShypMzri1YU
eYnbw50XIFk79739baj+ESILKQJkJe8jgwyV/CBUBNVLf6Vu7sFicYB0n1L2UBsCNowzLm9zS5OXbt
ICL8cwKmcRhs/y+8XASoIUPp9KyhA7d7brDOONgMcMLn9cRg5JvMOHm4tW7DHzi6DMkiOy/GSKCFPQu
9RA9RgtYMHAAQ14Tnfg8uwMpdRugisgchjRK7uKU9uBmWvi6dHUTV3McN5nc/+TxBr8/mwiUXXgnzE4
0CAKq==[00001000000404480391]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

G2J54x06X14hrIpeR05K4uMBUhhhwakJ0I311QFQREXS4h2uTg9ECmxnVYBZYv8+Z17W1LPnzc7FX+/phwEMx
ShypMzri1YUeYnbw50XIFk79739baj+ESILKQJkJe8jgwyV/CBUBNVLf6Vu7sFicYB0n1L2UBsCNowzLm9zS5OXbt
ICL8cwKmcRhs/y+8XASoIUPp9KyhA7d7brDOONgMcMLn9cRg5JvMOHm4tW7DHzi6DMkiOy/GSKCFPQu9
RA9RgtYMHAAQ14Tnfg8uwMpdRugisgchjRK7uKU9uBmWvi6dHUTV3McN5nc/+TxBr8/mwiUXXgnzE40CAKq==
SELLO DEL SAT
rx4fdY1CO1N16KQvU2OG0nU1YKUxYGRXK572wx7m1Gcck5CUgmaxj0u9WqVMf26WLKBJqCJJIIn6
7fVX3LbgvokRMh3HPQ4bH4M4a8dbjBkIXMazBFibCPYOI/zD/MDDE/ZcE4S+goPpZORV2h+RmY+fzyX
eyfZbMDqW54nYTznJWWKfHra5nWTuPhDwMVGmH1gqAPBG4KAPgMBGf0epJ2rQ7W5sbTtVGYLY
rA0+f1pQX2MU2mH3pRVH0+clE5DvDHgYRUHDSy7I8zyYKmbbGzr3yCjRdKgabRULg1uO4W/h4Raa
JeedY52AK5gv1RAf6rWaQ==

No. SERIE DEL CERTIFICADO 00001000000404480391 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION Diciembre 14 2017 - 10:02:08



[Handwritten signature]

Detalle del CFDI

Folio Fiscal: 6BF66C0C-23FF-46FF-AB8E-0C64F618A518

Fecha y Hora de Expedición: 2017-12-14T09:01:56

Fecha y Hora de Certificación: 2017-12-14T10:02:08

Nombre o Razón Social del Receptor: MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA

RFC del Receptor: MCI651010V22

Estado del Comprobante: Vigente


Efecto del Comprobante: Ingreso

Moneda: Peso Mexicano

Monto Total: \$495,053.20

Total Impuestos Traslados: \$68,283.20

Total Impuestos Retenidos:

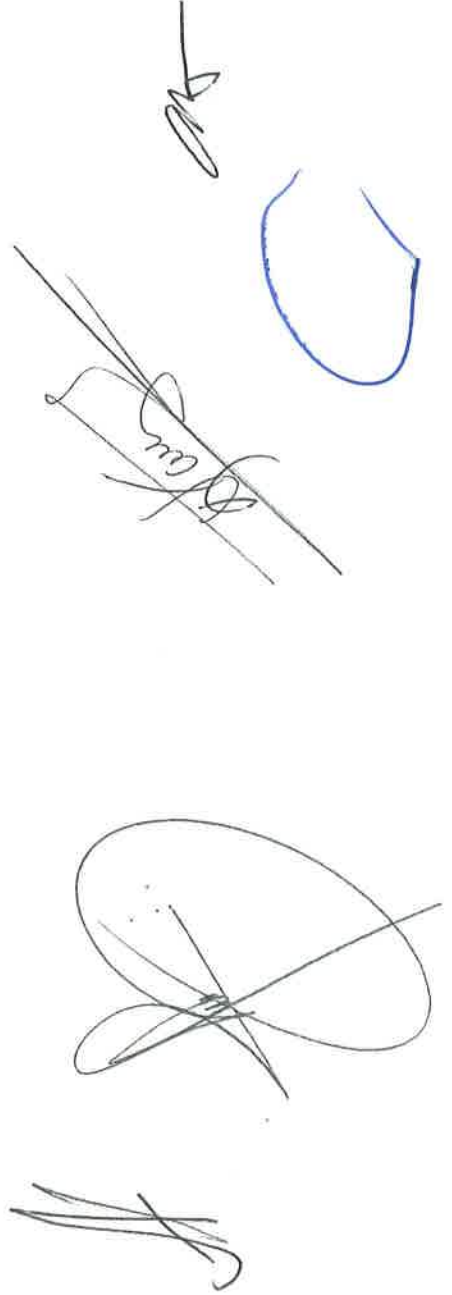The block contains handwritten signatures and stamps. On the left, there is a large, stylized signature in black ink. To its right, there is a signature that appears to be 'J. C. C.' with a large 'C' circled in blue ink. Further right, there is a signature that looks like 'AB'.

[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/) Inicio

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LCO951018B58	LABORATORIO Y CONSULTORIA SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6BF66C0C-23FF-46FF-AB8E-0C64F618A518	2017-12-14T09:01:56	2017-12-14T10:02:08	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$495,053.20	ingreso	Vigente	

HOJA 1

VOLUMEN
A PAGAR

LABORATORIO Y CONSULTORIA S.A DE C.V
CONTRATISTA



RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

NORMALES **426,770.00**

EXCEDENTES **0.00**

EXTRAS **0.00**

SUBTOTAL	426,770.00
I.V.A.	68,283.20
TOTAL	495,053.20



ING. FRANCISCO U. RAMIREZ LUJAN




POR EL CONTRATISTA



POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ARQ. JESUS M. SILVA GARCIA



CONTRATISTA:

LABORATORIO Y CONSULTORIA S.A DE C.V

ESTIMACIÓN No. 2

PERIODO: 26 de octubre al 14 de diciembre de 2017

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIOR		
OBRA NORMAL							
1.1	CALIDAD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAPAS DEE TERRACERIA Y SUBRASANTE	ENSAYE		31	15	\$ 1,100.00	\$ 17,600.00
1.2	CALIDAD DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAPAS DE SUBBASE Y BASE HIDRAULICA	ENSAYE		110	32	\$ 1,300.00	\$ 101,400.00
1.3	CALIDAD DE MATERIAL PETREO PARA UTILIZARS EN MEZCLA ASFALTICA	ENSAYE		79	10	\$ 1,300.00	\$ 89,700.00
1.4	CALIDAD DE MATERIAL PETREO PARA UTILIZARSE EN CONCRETO HIDRAULICO	ENSAYE		4	3	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00
1.5	DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO Y HUMEDAD OPTIMA	ENSAYE		0	0	\$ 375.00	\$ -
1.6	VERIFICACION DE DISEÑO MARSHALL	ENSAYE		0	0	\$ 2,500.00	\$ -
1.7	DETERMINACION RESISTENCIA DE CONCRETO A CADA 40 M3 MEDIANTE CILINDROS	ENSAYE		284	87	180.00	\$ 35,460.00
1.8	DETERMINACION RESISTENCIA DE CONCRETO A CADA 40 M3 MEDIANTE VIGAS	ENSAYE		52	15	\$ 280.00	\$ 10,360.00
1.9	PRUEBA DE CALIDAD DE MATERIALES ASFALTICOS	ENSAYE		36	0	\$ 36	\$ 68,400.00
1.1	DETERMINACION DEL GRADO DE COMPACTACION	ENSAYE		2,479	1,962	\$ 517	\$ 77,550.00
1.12	DETERMINACION DE PERMEABILIDAD EN PAVIMENTOS	ENSAYE		0	0	\$ 400.00	\$ -
1.13	DETERMINACION DEL GRADO DE COMPACTACION Y ESPESORES DE CARPETA	ENSAYE		42	0	\$ 600.00	\$ 25,200.00
1.14	EXTRACCION DE NUCLEOS DE CONCRETO HIDRAULICO	ENSAYE		0	0	\$ 0.00	\$ -
1.15	CONTROL DE RIEGOS ASFALTICOS V/O TENDIDOS DE M2	M2		0	0	\$ 0.00	\$ 1.50
1.17	DETERMINACION DEL REVENIMIENTO EN CONCRETO FRESCO	ENSAYE		0	0	\$ 0.00	\$ 125.00
							426,770.00

POR EL CONTRATISTA

ING. FRANCISCO U. RAMIREZ LUJAN

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

CHIHUAHUA, CHIH.,

14 de diciembre de 2017

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, LA CANTIDAD DE: \$ 493,346.12
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 2 CONTRATO No. 083/2017 POR LA CANTIDAD DE : \$ 999,999.99
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 POR TRABAJOS EN LA OBRA:
SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 426,770.00

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 426,770.00

IVA \$ 68,283.20

TOTAL \$ 495,053.20

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

C.M.I.C. DEL 0.2% 853.54

D.I.F. DEL 0.2% 853.54

SUMA 1,707.08

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO
\$ 999,999.99
\$ -
\$ 450,729.60
\$ 495,053.20
\$ 945,782.80
\$ 54,217.19

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL

0.2% D.I.F.

0.2% I.C.I.C.

0.2% C.M.I.C.

\$ -
\$ 853.54 \$ -
\$ 853.54 \$ -

R E C I B I M O S


LABORATORIO Y CONSULTORIA S.A DE C.V
LCO951018B58

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 083/2017	CONTRATADOS
OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS	ESTIMACIÓN No. 2	\$ 999,999.99 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 26 de octubre al 14 de diciembre de 2017	
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 495,053.20 CON IVA
CONTRATISTA: LABORATORIO Y CONSULTORIA S.A DE C.V	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 450,729.60 CON IVA
RFC LCO951018B58	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 945,782.80 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 426,770.00	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 426,770.00	

--

DESCUENTOS		
0.2% CMIC	\$	853.54
0.2% DIF	\$	853.54
SUMA DESCUENTOS	\$	1,707.08
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	426,770.00
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	426,770.00
I.V.A.	\$	68,283.20
TOTAL	\$	495,053.20
(CON LETRA)		
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	1,707.08
SALDO NETO A RECIBIR	\$	493,346.12

AUTORIZO	ELABORO
	
ARQ. JESUS M. SILVA GARCIA RESIDENTE D.D.U.E	LABORATORIO Y CONSULTORIA S.A DE C.V. CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
	
ARQ. JESUS ALFONSO VARGAS G JEFE DEL DEPTO DE CONTROL Y EVALUACION DE FRACCIONAMIENTO URBANO	ING. GABRIEL VALDEZ JUAREZ SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION URBANA
Vo. Bo.	
	
ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	ING. CARLOS H. CANELLO GIL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA
AUTORIZACIÓN PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
087/2017

DICTAMEN QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LA ADJUDICACIÓN DIRECTA, PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELATIVOS AL: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS

El Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública de Municipio de Chihuahua, instalado para la Presente Administración 2016-2018, en sesión celebrada el día 17 de Octubre del 2016, con fundamento en el artículo 20, 34 fracción III, 48 fracción II y 80 fracción X de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, somete a consideración la solicitud de autorización de la procedencia de no celebrar licitación pública, mediante el procedimiento de adjudicación directa, por conducto del Ing. Carlos Humberto Cabello Gil, Director de Obras Públicas, por lo que se emite el presente Dictamen de la prestación de servicios antes referida con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

Para la realización de la obra en mención, cuenta con los recursos financieros suficientes, autorizados bajo el PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA 2017, como afectación presupuestal a los Recursos Municipales, mediante el oficio de autorización No. 2017-PDM-DU-091 de fecha 18 de mayo del 2017, emitido por la Dirección de Planeación y Evaluación, con un importe de \$ 1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 m.n.) para ésta obra.

EXCEPCIONES AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA

La presente excepción al procedimiento de licitación pública se fundamenta en el artículo 80 fracción X de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en virtud de que determina que: *"Los Entes Públicos, bajo su responsabilidad y previo dictamen del Comité, podrán contratar obra pública y servicios, preferentemente a través de un procedimiento de invitación a cuando menos tres contratistas, salvo que ello, a su juicio, no resulte conveniente, en cuyo caso podrán utilizar el procedimiento de adjudicación directa, cuando: X. Se trate de servicios profesionales de investigación, consultoría y asesoría especializados, estudios y proyectos, para cualquiera de las fases de la obra pública, su dirección y supervisión"*.

Así mismo se verificó que en los archivos o en los de las unidades administrativas afines, no existen estudios o proyectos sobre la materia de que se trate. Por lo cual está

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA
AUTORIZACIÓN PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
087/2017

Dependencia no dispone cuantitativa o cualitativamente de los elementos, instalaciones y personal para llevarlos a cabo, esto con fundamento en el artículo 20 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionada con la Misma del Estado de Chihuahua.

La contratación que nos ocupa está dentro de este precepto, ya que el importe autorizado para ejercer en la obra a ejecutarse, no excede de 55 veces la unidad de medida de actualización elevado al año.

Discutida y analizada la solicitud en mérito y con fundamento en el artículo 48 fracción II de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Chihuahua, se determina el siguiente:

D I C T A M E N

I. Es procedente la solicitud presentada por la Dirección de Obras Públicas, para tal efecto se autoriza a la misma para que a través de su titular, en la contratación de los trabajos que anteceden, inicie el procedimiento de excepción a la licitación pública, relativo a la Adjudicación directa, seleccionando a la persona que cuente con la capacidad de respuesta inmediata, así como con recursos técnicos y financieros que resulten indispensables de acuerdo con las características y complejidad de los mismos, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones requeridas.

II. Este Dictamen se emite sin perjuicio de las acciones que deberán observarse previamente y durante el desarrollo de los procedimientos de contratación o en el cumplimiento de los contratos, así como a las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables en la materia.

Dado a las 14:00 hrs en la Ciudad de Chihuahua a los veintinueve días del mes de junio del año 2017.

POR EL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA

p.a. [Firma]
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESIDENTE


"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"




CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PUBLICAS**

DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA
AUTORIZACIÓN PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
087/2017



ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
SUBDIRECTOR
SECRETARIO EJECUTIVO


ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
VOCAL

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ASESOR


LIC. ERICK ALBERTO PARADA DÍAZ
SUBDIRECTOR JURÍDICO MUNICIPAL
ASESOR

LIC. MIGUEL ALONSO RIGGS BAEZA
SÍNDICO MUNICIPAL
ASESOR

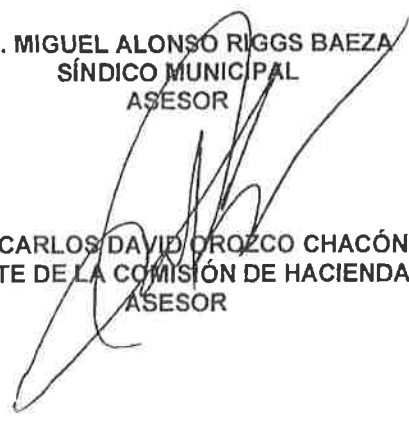
C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN
ASESOR

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Camino a la Presa Chuvistar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA
AUTORIZACIÓN PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
087/2017

LIC. GERMÁN ÁVILA HERNÁNDEZ
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
ASESOR

M.A.P. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
OFICIAL MAYOR
INVITADA

LIC. MARÍA DE LOS ANGELES ÁLVAREZ HURTADO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
INVITADA

ING. CARLOS EDUARDO RAYNAL REYGADAS
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO
INVITADO

LIC. VERÓNICA GRAJEDA VILLALOBOS
REGIDORA DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA
INVITADA

ING. LUIS TERRAZAS FRAGA
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE VIALIDAD Y TRÁNSITO
INVITADO

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Camino a la Presa Chuvíscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 083/2017 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS CC. MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN, LIC. CÉSAR GUSTAVO JÁUREGUI MORENO, C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ, ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL, ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL Y C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", Y POR LA OTRA PARTE LABORATORIO Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL ING. FRANCISCO UBALDO RAMÍREZ LUJÁN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA"; Y CONJUNTAMENTE COMO "AMBAS PARTES" QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- DECLARA "EL MUNICIPIO":

I.1.- Que por disposición de los artículos 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 8 y 11 fracción XVIII del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institución de orden público con personalidad jurídica, patrimonio propio y base de su organización territorial, política y administrativa.

I.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente Contrato, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 fracción II, 29 fracción XXI, 35 fracción II, 63 fracción XV, 64 fracción XI y 71 fracción III del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

I.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de servicios relacionados con la obra pública de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y que la adjudicación del presente contrato, se realiza previo dictamen de adjudicación directa identificado con el **No. 087/2017, de fecha 29 de junio de 2017**, de conformidad con lo establecido por los artículos 34 fracción III, 48 fracción II y 80 fracción X de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

I.4.- Que "EL CONTRATISTA" cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos materia de este contrato, consistentes en la prestación de los servicios relacionados con la obra pública consistente en: "SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS", para obligarse a la ejecución del servicio motivo de este contrato.

I.5.- Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de Inversión Directa para 2017, afectación presupuestal a los Recursos Municipales y que cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de la misma, según oficio de autorización **No. 2017-PDM-DU-091, de fecha 18 de mayo de 2017**, emitido por el director de planeación y Evaluación del Municipio de Chihuahua.



I.6.- Que el Director de Obras Públicas, manifiesta que la Dirección a su cargo, no dispone cuantitativa o cualitativamente de los elementos, instalaciones y personal suficiente para llevar a cabo el objeto del presente contrato, lo anterior de conformidad a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, para lo cual se cuenta con el dictamen No. 087/2017, de fecha 29 de junio de 2017.

I.7.- Que para los efectos del presente contrato señala como domicilio legal el ubicado en la Avenida Independencia No. 209 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA":

II.1.- Que acredita la existencia de la persona moral denominada **LABORATORIO Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V.**, mediante escritura pública número 9,306, volumen 458, de fecha 18 de octubre de 1995, protocolizada ante la fe del Notario Público número 22, de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, Lic. Jorge Neaves Navarro, inscrito bajo el número 28, folio 41, volumen 5 el libro Primero de la sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad y del Comercio

II.2.- Que es de **nacionalidad mexicana** y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su derecho de invocar la protección de ningún gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y obligaciones que se derivan del presente instrumento.

II.3.- Que su representante legal, acredita su personalidad, mediante, escritura pública número 14008, volumen 706, de fecha 5 de abril del 2001, protocolizada ante la fe del Notario Público número 22, de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, Lic. Jorge Neaves Navarro, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad y para los efectos legales del presente contrato, que las facultades conferidas no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

II.4.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el **LCO-951018-B58**.

II.5.- Que reúne las condiciones técnicas y económicas, para obligarse a la ejecución de la obra motivo del presente contrato.

II.6.- Bajo protesta de decir verdad, señala que conoce las reglas para la contratación y ejecución de obras públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como de las leyes y demás normas que las regulan.

II.7.- Que para efectos de este contrato señala como su domicilio legal el ubicado en calle, **Manuel García García No. 10102, Col. Deportistas en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua**.

II.8.- Que se encuentra registrado en el Padrón Único de Contratistas del Estado bajo el número **PUCGE-01255**, de conformidad a lo dispuesto por 26 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua.



II.9.- Que está conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertación vigente a la fecha del presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua (DIF), y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CÁMARA) esta última Delegación Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el cuatro al millar (0.4%) del monto de las estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados con motivo del presente contrato, importe que será enterado a "LA CÁMARA" para los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construcción y para obras de beneficio social, de "EL DIF".

II.10.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la información proporcionada es verdadera y corresponde a la inscrita en el Padrón Único de Contratistas del Estado, por lo que en caso de falsedad en la información, se estará en lo dispuesto en la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA del presente contrato.

III.- DECLARAN "AMBAS PARTES"

III.1.- Que se reconocen recíprocamente la capacidad legal y el carácter con el que comparecen a la celebración del presente contrato.

III.2.- Que están conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen en las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la prestación de los servicios relacionados con la obra pública consistente en: "SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS", con base a los precios unitarios autorizados en su caso.

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar la prestación del servicio hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido en los alcances del proyecto, en los términos de referencia y en el clausulado de este contrato, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este instrumento, por lo que el presente contrato, sus anexos y la documentación que se genere en el periodo de ejecución de los servicios, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente contrato es por la cantidad de: \$862,068.96 (Ochocientos sesenta y dos mil sesenta y ocho pesos 96/100 M.N.), más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN. "EL CONTRATISTA" se obliga a prestar los servicios objeto de este contrato, en un plazo de 144 días naturales, debiendo iniciarlos el día 01 de agosto de 2017 y terminarlos a más tardar el día 22 de diciembre de 2017.

CUARTA: ANTICIPO: Para el inicio de los trabajos no se hará entrega de anticipo.



QUINTA: FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que el pago de los servicios objeto de este contrato, se realizará previa la entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales.

"EL CONTRATISTA" deberá presentar la factura a la Subdirección dentro de los tres días naturales siguientes a la fecha de terminación del servicio, la cual deberá ir acompañada de los números generadores y de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la Subdirección para realizar la revisión y autorización de la factura contará con un plazo no mayor de diez días naturales siguientes a su presentación.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación, salvo que reiteradamente exista desacuerdo entre el Subdirección y **"EL CONTRATISTA"** en relación con algún o algunos aspectos específicos de obra ejecutada, caso en el cual, conocerá el Órgano de Control en funciones de conciliador, sometiéndose las partes al procedimiento previsto por el Título Séptimo, Capítulo Único del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. En ningún caso podrá la Subdirección autorizar el pago de trabajos no ejecutados.

La factura por servicios prestados será pagada en un plazo no mayor de treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que haya sido autorizada por la Subdirección. El lugar de pago de la factura será el edificio sede de la Tesorería Municipal ubicada en calle Sexta y Mina, colonia Centro de la Ciudad de Chihuahua, Chih.

En el caso de incumplimiento del pago de la factura, a solicitud escrita de **"EL CONTRATISTA"**, se le pagarán costos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL CONTRATISTA"**. Dicha solicitud escrita deberá presentarse por parte de **"EL CONTRATISTA"** a la Subdirección a más tardar dentro de los treinta días naturales posteriores al día que se generen, bajo pena de que precluya su derecho a reclamar el pago de los mismos.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **"EL CONTRATISTA"**, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL MUNICIPIO"**.

El pago de la factura no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que **"EL MUNICIPIO"** se reserva el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso.

SEXTA: GARANTÍAS. **"EL CONTRATISTA"** se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y su Reglamento, las garantías siguientes:



A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: "EL CONTRATISTA" garantizará el correcto cumplimiento del contrato, para tal efecto deberá entregar **Fianza** en moneda nacional emitida por una Institución legalmente autorizada y acreditada en esta ciudad, a favor de la Tesorería del Municipio de Chihuahua, por un importe de **\$86,206.89 (Ochenta y seis mil doscientos seis pesos 89/100 M.N.)**, equivalente al **10%** (Diez por ciento) del monto total del contrato, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, el cual se conservará hasta la entrega total de los trabajos a entera satisfacción de "EL MUNICIPIO", así mismo entregará carta compromiso de "EL CONTRATISTA".

B. SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCIÓN, VICIOS OCULTOS Y DAÑOS Y PERJUICIOS: Una vez terminados los trabajos objeto del presente contrato, a satisfacción de "EL MUNICIPIO", se liberará la garantía de cumplimiento a cambio de la entrega de la garantía para casos de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios, la cual consistirá en **Fianza** en moneda nacional emitida por una Institución legalmente autorizada y acreditada en esta ciudad, a favor de la Tesorería del Municipio de Chihuahua, por un importe equivalente al **10%** (Diez por ciento) del monto total ejercido de la obra, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, permaneciendo en poder de "EL MUNICIPIO" durante 12 meses posteriores a la fecha de entrega de la obra contratada, así mismo entregará carta compromiso de "EL CONTRATISTA".

Si "EL CONTRATISTA" no constituye la garantía para responder de los defectos o vicios ocultos, previamente a la recepción de los trabajos, "EL MUNICIPIO" procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento y el monto recuperado sustituirá a la garantía no constituida y los recursos serán considerados como aportación líquida sin derecho a devolución de conformidad con el Artículo 97 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

Las fianzas que se expidan con motivo de lo anteriormente señalado, deberán ser emitidas por una institución de fianzas legalmente establecida, a través de una sucursal u oficina de servicio ubicada en el Estado de Chihuahua.

Para la cancelación de cualquiera de las garantías señaladas con anterioridad, "EL CONTRATISTA" deberá presentar una solicitud por escrito a la Dirección de Obras Públicas, quién emitirá opinión al respecto y realizará el trámite correspondiente ante la dependencia correspondiente, a cuyo favor se otorgó la garantía.

La Tesorería del Municipio de Chihuahua a cuyo favor se otorgó la garantía, deberá emitir respuesta por escrito dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, negando u otorgando la autorización para la cancelación. En caso de que no emita respuesta dentro de ése término, se tendrá por autorizada la cancelación.

SÉPTIMA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA" deberá comunicar a "EL MUNICIPIO" y al Órgano de Control la conclusión del servicio que le fue encomendado, para que éste dentro de diez días naturales, verifique la debida terminación del mismo conforme a las condiciones establecidas en el presente instrumento. Al finalizar la verificación de los servicios, "EL MUNICIPIO" contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta de entrega-recepción correspondiente, quedando los servicios bajo su responsabilidad.



Recibidos físicamente los servicios, las partes deberán elaborar dentro de seis días naturales, el finiquito de los mismos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que **"EL CONTRATISTA"** no acuda con **"EL MUNICIPIO"** para su elaboración dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, éste procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a **"EL CONTRATISTA"** dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión. Dentro de este plazo, **"EL MUNICIPIO"** convocará a **"EL CONTRATISTA"** a una audiencia de conciliación, invitando a un representante del Órgano de Control; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a **"EL CONTRATISTA"**, ésta tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, **"EL MUNICIPIO"** pondrá a disposición de **"EL CONTRATISTA"** el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes a su favor; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

OCTAVA: RELACIONES LABORALES: **"EL CONTRATISTA"**, como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. **"EL CONTRATISTA"** conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de **"EL MUNICIPIO"**, en relación con los trabajos especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda obligación laboral a **"EL MUNICIPIO"**.

NOVENA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: **"EL CONTRATISTA"** se obliga a realizar los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos establecidos en su propuesta o expediente técnico en su caso, y a los términos señalados en el presente contrato, ya que los trabajos se efectuarán a satisfacción de **"EL MUNICIPIO"**, **"EL CONTRATISTA"** deberá responder civil, penal, laboral y de cualquier otra índole por su cuenta y riesgo, de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegare a causar a **"EL MUNICIPIO"** o a terceros, derivado de este contrato.

Así mismo, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a responder en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.

DÉCIMA: PENAS CONVENCIONALES. **"EL MUNICIPIO"** podrá aplicar para el caso de que **"EL CONTRATISTA"** no concluya la prestación del servicio en la fecha señalada en el presente instrumento, una pena convencional consistente en una cantidad igual al uno por ciento (1%) del importe de los servicios no realizados en la fecha de terminación señalada en el presente contrato, que cubrirá **"EL CONTRATISTA"** mensualmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a favor de **"EL MUNICIPIO"**.



Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de **"EL MUNICIPIO"** no sea imputable a **"EL CONTRATISTA"**.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, **"EL MUNICIPIO"** podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo, si **"EL MUNICIPIO"** opta por la rescisión del contrato, aplicará a **"EL CONTRATISTA"** una sanción consistente en un porcentaje del valor del mismo, que podrá ser a juicio de **"EL MUNICIPIO"**, hasta por el monto de la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato.

DÉCIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: **"EL MUNICIPIO"** en cualquier momento podrá suspender temporalmente en todo o en parte los servicios contratados, por cualquier causa justificada, sin que ello implique su terminación definitiva. La suspensión se efectuará conforme al procedimiento establecido en el artículo 72 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 153 de su Reglamento.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

DÉCIMA SEGUNDA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: **"EL MUNICIPIO"**, podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general. La contravención a las disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y su Reglamento, y las demás disposiciones administrativas sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de **"EL CONTRATISTA"** que se estipulan en el presente Contrato, así como la suspensión injustificada de los trabajos por parte de **"EL CONTRATISTA"**, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para **"EL MUNICIPIO"**, además de que se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato. Para tales efectos se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 74 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y el Reglamento a dicho cuerpo normativo.

"EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, por que existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos, y en su caso, se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio al Estado; para tales efectos se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y su Reglamento.

DÉCIMA TERCERA: **"EL MUNICIPIO"** con fundamento en el Artículo 71 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y su Reglamento, designa al Director de Obras Públicas, para que en caso de suspensión temporal, terminación anticipada o rescisión en todo o en parte de los servicios, sea dicho funcionario quién ejerza las facultades otorgadas en dicho artículo.

DÉCIMA CUARTA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecución de los servicios objeto de este Contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a los términos de referencia,



lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y demás normas y disposiciones administrativas que sean aplicables.

DÉCIMA QUINTA: Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulará el finiquito correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de "EL CONTRATISTA". Si existen responsabilidades en contra de ésta, se deducirá del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, "EL MUNICIPIO" hará efectiva la garantía para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la medida que proceda.

DÉCIMA SEXTA: El presente Contrato, sus anexos y la documentación que se genere en el periodo de ejecución de los servicios, son los instrumentos que vincularán a las partes en sus derechos y obligaciones.

DÉCIMA SÉPTIMA: Para cualquier cuestión no prevista, duda o interpretación las partes lo resolverán de común acuerdo y en caso de controversia, se someterán a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, renunciando desde este momento a cualquier fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

LEÍDO LO ANTERIOR TANTO POR "EL MUNICIPIO" COMO "EL CONTRATISTA", ENTERADOS DE SU VALOR Y ALCANCE LEGAL Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCIÓN Y CONTENIDO, LO FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 31 DE JULIO DE 2017.

POR "EL MUNICIPIO"

MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. CÉSAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO


C.P. AÍDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS



ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA


C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN
REGIDOR PRESIDENTE DE
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN
POR "EL CONTRATISTA"


ING. FRANCISCO UBALDO RAMÍREZ LUJÁN
REPRESENTANTE LEGAL DE
LABORATORIO Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V.

Las firmas que anteceden corresponden al Contrato de Prestación de Servicios No. 083/2017 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo el servicio denominado: "SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS", celebrado el 31 de julio de 2017.

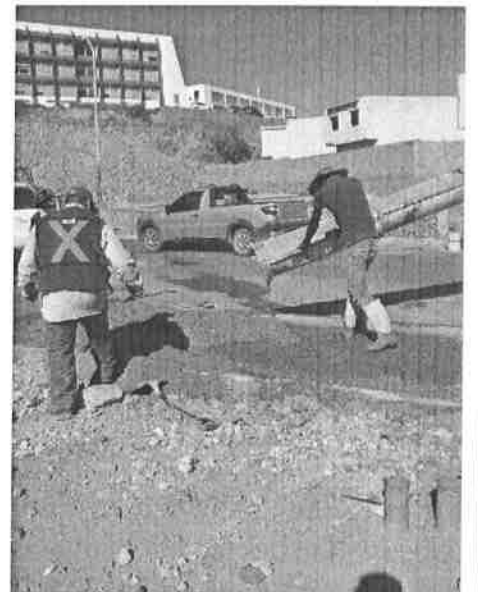

**POLIZA DE FIANZA
BENEFICIARIO**

EXPEDICION

31-07-2017

ENDO.SO

0000

MONTO DE FIANZA

99.999.99

MONEDA

PESOS

NO. DE FIANZA

1833604

INCLUSION

911

ACE Fianzas Monterrey, S.A., con domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 250 Piso 15 "Torre Niza", Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 11o. y 36o de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 99,999.99 NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Por: LABORATORIO Y CONSULTORIA,S.A.DE C.V.

Ante: TESORERIA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

POR LA SUMA DE \$ 99,999.99 (NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)
RESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO CON I.V.A.

ANTE: TESORERIA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

PARA GARANTIZAR POR: LABORATORIO Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., EL EXACTO Y TOTAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 083/2017 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2017 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, REPRESENTADO POR LOS CC. MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN, LIC. CESAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO, C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ, ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL, ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL Y C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACON, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA NUESTRO FIADO LABORATORIO Y CONSULTORIA, S.A DE C.V., RELATIVO A TRABAJOS REFERENTES A: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS, CON UN IMPORTE TOTAL CONTRATADO DE \$ 999,999.99 (NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE EL I.V.A.

ESTA INSTITUCION DECLARA EXPRESAMENTE: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y SE OTORGA DE MANERA CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA OTORGADA PARA EL CONTRATO ORIGINAL Y ESTARA EN VIGOR HASTA QUE LA OBRA HAYA SIDO RECIBIDA EN SU TOTALIDAD POR EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, ASI COMO DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES, MEDIOS DE DEFENSA O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONAN POR LAS PARTES CONTRATANTES Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME. B) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO A QUE SE REFIERE LA FIANZA O EXISTE ESPERA, LA VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDARA PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, MANIFESTANDO EN ESTE ACTO PARA ELLO, SU EXPRESA CONFORMIDAD, HACIENDO RENUNCIA EXPRESA AL BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, POR EL ARTICULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS C) QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO, AUN CUANDO UNA PARTE DE ELLA SE CONTRATE CON AUTORIZACION DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; D) QUE ESTA FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA OBLIGACION DEL CONTRATO, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL FIADO, SE PAGARA EL MONTO TOTAL GARANTIZADO EN ESTA POLIZA; E) QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA, SERA REQUISITO LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA. F) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA SOMETERSE EXPRESAMENTE A LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 178, 282, 283, 289 Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS; G) QUE EN CASO DE NO CUBRIR EL MONTO DE ESTA FIANZA EN EL PLAZO QUE SE ESTABLECE EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PAGARA POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UN INTERES CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, EN RELACION CON LOS ARTICULOS 2104, 2108, 2109 Y 2110 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL. H) QUE PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE ESTA POLIZA REPRESENTA, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ESTATALES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

Expedido en: OFICINA: 00151; CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

ACE Fianzas Monterrey, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CAPITULO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) QUE ESTA POLIZA CONSIGNA.

IVAN FELIPE ORDOÑEZ VENZOR
DDV1810214G37

ACE Fianzas Monterrey, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE BUCARSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE ACE Fianzas Monterrey, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS.

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.
MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES DE GARANTÍAS, A.C.

Consulte nuestro aviso de privacidad en:
www.acefianzasmonterrey.com

LÍNEA DE VALIDACIÓN

0918 4973 F9

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

Página 1 de 3

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 01 de Marzo de 2016, con el número CNSF-F0009-0041-2016 y se vincula a la documentación contractual que ACE Fianzas Monterrey, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate."

[illegible]

Firma Digital:



POLIZA DE FIANZA BENEFICIARIO

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	EXPEDICION
99,999.99	PESOS	1833604	0	31-07-2017
				ENDOSO
				0000

ACE Fianzas Monterrey, S.A., con domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 250 Piso 15 "Torre Niza", Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 11o. y 36o de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 99,999.99 NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Por: LABORATORIO Y CONSULTORIA,S.A.DE C.V.

Ante: TESORERIA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERELES EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO; I) LA AFIANZADORA ES CONFORME EN QUE LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO LE SEAN FORMULADOS POR CONDUCTO DE SUS AGENTES AUTORIZADOS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., J) QUE AFIANZADORA ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE FRANCISCO DE BRIONES 201-4 INT 2, COLONIA SAN FELIPE EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH; K) TODA ESTIPULACION QUE APAREZCA IMPRESA POR FORMATO POR PARTE DE AFIANZADORA ACE FIANZAS M ONTERREY, S.A., QUE CONTRAVENGA LAS ESTIPULACIONES AQUÍ ASENTADAS, LAS CUALES COMPRENDEN EL PROEMIO Y LOS INCISOS DEL A) AL K), SE CONSIDERAN NO PUESTAS.***FIN DE TEXTO***
----- FIN DE TEXTO -----

Expedido en: OFICINA: 00151; CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

ACE Fianzas Monterrey, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CAPITULO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) QUE ESTA POLIZA CONSIGNA.

IVAN FELIPE ORDOÑEZ VENZOR
OOV1810214G37

ACE Fianzas Monterrey, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE ACE Fianzas Monterrey, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en:
www.acefianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION

0918 4973 F9

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.
MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES DE GARANTÍAS, A.C.

R.F.C. FMO930803PB1 ACE Fianzas Monterrey, S.A.



Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 01 de Marzo de 2016, con el número CNSF-F0009-0041-2016 y se vincula a la documentación contractual que ACE Fianzas Monterrey, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate."

Firma Digital: SSOA7U8wJYPgiZT1U7B1d1mkRaFP0ygdBhddIwCCKNS07aZaPeuZ0vHEmvWS1ZnsmiaLShGgQ0VgVgJbEg7AS5K4e07vWU7RMWd3b654274pwc3uqgnatDh+KIR4PgdTB7p7w7n7z7s7b7e7z
5WGH7d6h7N7K7q7d7U7C7X7N7B7H73V6SR0S127C7P7H737K7U7B7g7s7H7b7G7z7d7P7C7C737e7Z7u7S7E7X7e7D77m7B7b7d7s7v7S7H7S747p7d7y7o7d77H7m7f7+7VSM7P7z7p7o7s7w7H77Z7s7M7S737y7b7o77U7H7K77z7d7V7X7E7Y7A7=



Esta obligación de cumplimiento garantiza la ejecución de la obra y/o el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los documentos fuente afianzados, bajo los términos y especificaciones estipulados en dichos documentos, celebrado entre el Fiado y el Beneficiario.

1. Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos en los que consten con exactitud el monto de la Fianza, nombre completo y domicilios DEL (LOS) BENEFICIARIOS (S) y EL DE (LOS) FIADO(S), la obligación principal afianzada, vigencia, forma en que el BENEFICIARIO (S) deberá de acreditar el incumplimiento, demás cláusulas que deberán regir la póliza y firma del representante de la Institución. Art. 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. (LISF).
2. El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o disminución de su monto, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra modificación deberá (n) conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO(S) y deberá presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante la Afianzadora. Art. 279 de la LISF.
3. Los derechos y obligaciones derivadas de esta Fianza se reputan actos de comercio para todos los que en ella intervengan, sea como BENEFICIARIO(S), FIADO(S), SOLICITANTE(S), CONTRAFIADOR(ES) U OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), con excepción de la garantía hipotecaria que por la Fianza haya otorgado, y estarán regidos por la LISF y en lo que no prevea por la legislación mercantil y por el Título Décimo tercero de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Código Civil Federal (C.C.F.), relativo a la Fianza civil. Art. 32 y 183 LISF.
4. El texto de la póliza no debe contradecir las limitaciones que en la misma se establezcan.
5. La Fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o jamos en dinero.
6. La Afianzadora está excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se refieren los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La Fianza no se extinguirá aun cuando el Acreedor no requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR(ES) FIADO(S) el cumplimiento de la obligación principal afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el Juicio promovido en su contra. Art. 178 de la LISF.
7. La obligación de la Afianzadora contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS) ACREEDOR(ES) O BENEFICIARIO(S) concede(n) AL (LOS) FIADO(S) prórroga o espera sin consentimiento por escrito de la Afianzadora. Art. 179 de la LISF.
8. La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la Fianza si la Afianzadora no da su consentimiento para esa novación y para garantizar con la misma Fianza la obligación novada. Art. 2220 del C.C.F.
9. La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la Fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa dicha obligación principal fiada queda sujeta a nuevos gravámenes y condiciones. Art. 2847 del C.C.F.
10. Las acciones de los Beneficiarios de la fianza en contra de la Afianzadora tratándose de fianzas de vigencia determinada, caducan en 180 días naturales contados desde el día en que se haya hecho exigible la obligación por incumplimiento del fiado o bien, desde el día estipulado en la póliza (tratándose de fianzas de vigencia determinada o indeterminada); o bien, desde el día siguiente de aquél en que haya expirado la vigencia de la fianza (cuando la misma se haya emitido por tiempo determinado). Tratándose de fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo de caducidad será el de tres años, conforme se dispone por el artículo 174 de la LISF. Una vez presentada la reclamación, habrá nacido el derecho del beneficiario para hacer efectiva la póliza, el cual quedará sujeto a la prescripción prevista por el artículo 175 de la LISF. La Afianzadora se liberará por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba la obligación o el de tres años, lo que resulte menor. Cualquier solicitud de pago hecha por el beneficiario a la afianzadora, interrumpe la prescripción salvo que resulte improcedente.
11. Cuando la fianza sea a favor de Beneficiarios particulares deberán presentar sus reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la póliza de fianza respectiva, directamente ante la Afianzadora. En caso que ésta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el Beneficiario podrá, a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o bien ante los Tribunales Federales o Comunes en términos de los dispuesto por los artículos 279 y 280 de la LISF. Independientemente de ello, para los casos de consultas o reclamaciones, los Solicitantes, Fiados u Obligados Solidarios, podrán acudir ante la Unidad Especializada de Atención de Consultas y Quejas de ACE Fianzas Monterrey, S.A., llamada Área de Atención Personalizada a Clientes (APC).
12. Los Beneficiarios deberán presentar su reclamación por escrito ante la Afianzadora requiriendo el pago de la fianza, acompañando la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza en su oficina matriz, sucursales y oficinas de servicio quien dispondrá de un plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación, para proceder a su pago o en su caso, para comunicar por escrito al Beneficiario las razones, causas o motivos de su improcedencia. Art. 279 de la LISF. Lo anterior sin perjuicio del plazo para solicitar documentación adicional.
13. En términos del artículo 166 de la LISF, salvo pacto en contrario en el texto de la póliza de fianza, el incumplimiento de la obligación se acreditará acompañando al escrito de reclamo, la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada en términos del artículo 279 de la LISF. En caso de que el Beneficiario sea la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se deberá observar lo previsto en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.
14. Las fianzas que se emitan en moneda extranjera, se sujetarán a las disposiciones del TÍTULO 19, CAPÍTULO 19.2 de la Circular Única de Seguros y Fianzas, mismas que están a disposición del fiado y del Beneficiario en el sitio www.cnstf.gob.mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/CUSF19_2 y que se tienen por reproducidas como si a la letra se insertase.
15. Si la Fianza es a favor de la Federación, del Distrito Federal de los Estados y de los Municipios, su procedimiento de cobro se hará conforme al Art. 282 de la LISF.
16. Si la Afianzadora no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir su obligación de acuerdo a lo siguiente: Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en unidades de inversión, a partir de la fecha de su exigibilidad, de acuerdo con el Art. 283 de la LISF y su pago se hará en moneda nacional al valor que dichas unidades de Inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo. Al respecto, la Afianzadora pagará un interés moratorio sobre la obligación denominada en unidades de inversión conforme a los dispuesto en el párrafo anterior, cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión de las Instituciones de Banca Múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora. Los intereses moratorios se generarán por día, a partir de la fecha del vencimiento de los plazos referidos y hasta el día en que se efectúe el pago. Para su cálculo, las tasas de referencia a que se refiere este artículo deberán dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de días correspondientes a los meses en los que persista el incumplimiento.
17. La Afianzadora podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos, juicios u otros procedimientos judiciales en los cuales haya otorgado esta Fianza en todo lo que se relacione a las responsabilidades que de ésta derive, así como en los procesos que se sigan al Fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A petición de parte, la Afianzadora será llamada a dicho proceso o juicio para que éste a sus resultados. Art. 287 de la LISF.
18. Las autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, deberán informar, a solicitud de la Afianzadora, sobre la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya otorgado la fianza y resolver, dentro de los treinta días siguientes a su recepción, las solicitudes de cancelación de la Fianza. Art. 293 de la LISF.
19. La Afianzadora se considera de acreditada solvencia por las Fianzas que expida Art. 16 de la LISF.
20. Al admitir las fianzas las Autoridades Federales y Locales no podrán calificar la solvencia de las Instituciones, ni exigir su comprobación o la constitución de garantías que las respalden. Art. 18 de la LISF.
21. Ninguna autoridad fijará mayor importe a las Fianzas que otorguen las Afianzadoras autorizadas por el Gobierno Federal que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas de garantía. Art. 18 de la LISF.
22. El pago de la Fianza, subroga a la Afianzadora en todos los derechos acciones y privilegios de (los) acreedor(es) a quien(es) se le(s) haya pagado, relacionados con la obligación afianzada. La Fianza se extinguirá si por culpa o negligencia del (los) acreedor(es) la Afianzadora no puede subrogarse en esos derechos acciones y privilegios en contra de su(s) deudores FIADO(S) Art. 177 de la LISF y 2830 y 2845 del C.C.F.
23. Las reclamaciones a esta fianza incluirán: fecha de reclamo, número de fianza, fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del fiado y del beneficiario, del representante, en su caso, domicilio del beneficiario para oír y recibir notificaciones, descripción de obligación garantizada, referencia del contrato fuente, descripción del incumplimiento que motiva la reclamación acompañando la documentación soporte, y el importe originalmente reclamado, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza (CUSF Capítulo 4.2.8 fracción VIII).



ACE Fianzas Monterrey

ACE Fianzas Monterrey, S.A.
Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 15
Col. Juárez Deleg. Cuauhtémoc
México Ciudad de México C.P. 06600
Tel. 57-26-37-00
R.F.C. FMO-930803-PB1
Regimen Fiscal: Régimen General de la Ley Personas Morales

Comprobante Electrónico

Datos de comprobante		Serie de certificado del emisor		Folio Fiscal	
CLIENTE FISCAL LABORATORIO Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.,		00001000000406704487		AD61B1AC-C171-1A40-B58A-5BDA199E035B	
MANUEL GARCIA GARCIA No. 10102 DEPORTISTAS CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO, C.P. 31125.		Serie: FA		Folio: 1499165	
R.F.C. LCO951018B58 Tel. 17-00-33		Folio Interno: 2756446		Oficina: CHIHUAHUA	
A - 5657		Lugar y fecha de expedición: CHIHUAHUA, MEXICO. A 07/09/2017			
FIADO 129641 - LABORATORIO Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.,		Domicilio de la sucursal: FRANCISCO DE BRIONES #201-A, INTERIOR 2, SAN FELIPE II, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31203			
Método de Pago: 03		Fecha Emisión: 07/09/2017 12:45:45		Moneda: PESOS T.C.:	
Número de Cuenta: No Aplica					
Descripción del servicio PRIMA DE EXPEDICION DE LA FIANZA 1833604 / 0 DE PROVEEDURIA - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR UN MONTO AFIANZADO DE 99,999.99 PESOS Y UNA VIGENCIA DEL 31/07/2017 AL 30/07/2018. ANTE EL BENEFICIARIO 729245 - TESORERIA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PARA GARANTIZAR: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS					
ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA FA0001499058					

Cantidad	Unidad	Conceptos del Servicio	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	PRIMA	1,650.00	1,650.00
1	NO APLICA	DERECHOS	57.75	57.75
1	NO APLICA	GASTOS	2,345.46	2,345.46

Sello digital del CFDI: f3Mc4b10jCwG60FFwvEgu3zwB953Xsh81UvJN8Jvdm0Vsdtrvgj4tCSH7a1/RHTMyt8AFKXQDP7/zk5KYeiNhLhu0uH5440s6kF1ANK6F98pKZqB2ygsKwZUvTpsU6+KPx/BwhPxxk962ojjCpCLUyT8NWRtKcos/0JGKCG apj46Bkg30rkdtNk56n3y7scv6rznE1bbdt3U16d6L8fdBwPjNp8rIZosFLAZGf67L/hciFw2S17tk1Ezbv7gn1V/KZOMNAQ7u2Qan206wqWKAOfJkHwW/bwKQ1j7L/TQVRGBNDaEey+dyKEFFVKnWf7jo3gk2in2geig==	
Sello del SAT: ny8N33dx1vW09Xzk8EtgI82EY78R0Wdy0hyQzE4hmd3T/a5ybQ8DU+HYU/4yKgfA4+JazhWQVg73WESNs2Qzi44KJQW7KwUo/WNA49m+EC2hpXly7KpDmKxgk9GK/1K0i0i0fCumQ5Jr5qM6kbPnTnzUdyuJwTdiWwIadd 036811f26qu1yJ28akWdWufFmN5w21HvexPhuvX3/0e4WgacQ6b5pkZwru1V7NRH9tPipunhonir308Xbdvvg9nq006kHao8WMAAtoU+uPx7sTsYrAm56QW8gkXWYQ4HwN/SidR13onJj08GprZq1LZat+5rj2os02A==	
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: 1.0 AD61B1AC-C171-1A40-B58A-5BDA199E035B 2017-09-07T12:46:48 f3Mc4b10jCwG60FFwvEgu3zwB953Xsh81UvJN8Jvdm0Vsdtrvgj4tCSH7a1/RHTMyt8AFKXQDP7/zk5KYeiNhLhu0uH5440s6kF1ANK6F98pKZqB2ygsKwZUvTpsU6+KPx/BwhPxxk962ojjCpCLUyT8NWRtKcos/0JGKCGapj46Bkg30rkdtNk56n3y7scv6rznE1bbdt3U16d6L8fdBwPjNp8rIZosFLAZGf67L/hciFw2S17tk1Ezbv7gn1V/KZOMNAQ7u2Qan206wqWKAOfJkHwW/bwKQ1j7L/TQVRGBNDaEey+dyKEFFVKnWf7jo3gk2in2geig== 00001000000401041203	
No. Serie del certificado del SAT: 00001000000401041203	Fecha y hora de certificación: 2017-09-07T12:46:48

ACE Fianzas Monterrey, S.A. por ningún motivo o circunstancia aceptará pagos en efectivo. En todo caso, los pagos deberán hacerse a través de sucursales bancarias. Cualquier pago que contravenga lo anterior, no será reconocido por esta institución de fianzas.

Si su pago es efectuado con cheque éste deberá ser nominativo única y exclusivamente a favor de ACE Fianzas Monterrey, S.A., en el caso de cheques devueltos, se reserva el derecho de cobrar el 20% en los términos del artículo 193 de la Ley General de Títulos y operaciones de crédito

Los cheques son recibidos de acuerdo a lo establecido en el artículo 7° de la Ley General de Títulos y operaciones de crédito "los títulos de crédito" dados en pago se presumen recibidos bajo la condición "salvo buen cobro"

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INFORME DE COMPACTACIONES - OBRA TERMINADA

MÉTODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 6938 VIGENTES

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO

CLIENTE: DESARROLLO URBANO

REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

Fecha de Informe:
2017-12-13

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		% Compactación
					Del Lugar	Máxima	Óptima	Del Lugar	
92	Prueba: 1				Tipo de Capa: BASE MAT.CALIZO TRITURADO			Fecha Ensaye: 2017-10-24	
	% Especificado: 100				Localización: CALLE MOLINO SALVERO DE AV.DESARROLLO AL 0+090				
	A		I	15	1851	1850	6,7	5,3	100,10
	B		C	15	1863	1850	6,7	5,1	100,70
	C		D	15	1855	1850	6,7	6,3	100,30
	D		I	15	1871	1850	6,7	5,0	101,10
	E		C	15	1878	1850	6,7	5,6	101,50
	F		D	15	1861	1850	6,7	5,5	100,60
	G		I	15	1855	1850	6,7	6,1	100,30
	Promedio de Compactación:								100.66

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC. MOLINO DE AGUA

93	Prueba: 1		Tipo de Capa: SUBRASANTE MAT.DE LUGAR				Fecha Ensaye: 2017-10-25	
	% Especificado: 95		Localización: CALLE CIRCUITO LUNA FUERTE L/SUR					
	A	I	20	1863	1960	12,6	9,0	95,10
	B	C	20	1891	1960	12,6	8,6	96,50
	C	D	20	1866	1960	12,6	10,3	95,20
	D	I	20	1867	1960	12,6	9,6	95,30
	E	C	20	1872	1960	12,6	10,1	95,50
	Promedio de Compactación:							

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC. LUNA ROJA

94	Prueba: 1	Tipo de Capa: BASE MAT.TRITURADO PARCIAL					Fecha Ensaye: 2017-10-26	
	% Especificado: 100	Localización: CALLE CIRCUITO CALICANTO L/NORTE						
	A	I	15	1851	1850	7,9	6,0	100,10
	B	C	15	1861	1850	7,9	5,9	100,60
	C	D	15	1854	1850	7,9	5,1	100,20
	D	I	15	1871	1850	7,9	6,7	101,10
	E	C	15	1852	1850	7,9	6,0	100,10
	Promedio de Compactación:							

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC. CALICANTO

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TÉCNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

INFORME DE COMPACTACIONES - OBRA TERMINADA

MÉTODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 6938 VIGENTES

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO

CLIENTE: DESARROLLO URBANO

REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

Fecha de Informe:

2017-12-13

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		% Compactación
					Del Lugar	Máxima	Óptima	Del Lugar	
95	Prueba: 1				Tipo de Capa: TERRENO NATURAL			Fecha Ensaye: 2017-10-26	
	% Especificado: 90				Localización: BANQUETA PUBLICA FRENTE A AREA DE DONACION				
	A		C	20	1750	1900	12,0	9,4	92,10
	B		C	20	1711	1900	12,0	10,7	90,10
	Promedio de Compactación:								91,10

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC. MONTE CHELLO

96	Prueba: 1	Tipo de Capa: TERRENO NATURAL					Fecha Ensaye: 2017-10-26	
	% Especificado: 90	Localización: BANQUETA PUBLICA CALLE REAL DE ASTURIAS						
	A	C	20	1770	1900	12,0	9,9	93,20
	B	C	20	1751	1900	12,0	10,1	92,20
	Promedio de Compactación:							92,70

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.


Observaciones: 0+000 AL 0+060 FRACC. ASTURIAS

97	Prueba: 1	Tipo de Capa: SUBRASANTE MAT.DE LUGAR					Fecha Ensaye: 2017-10-26		
	% Especificado: 95	Localización: CALLE CIRCUITO VISTAS DE SENDERO L/NTE Y SUR							
	A	I	20	1821	1914	11,0	7,7	95,10	
	B	C	20	1837	1914	11,0	8,1	96,00	
	C	D	20	1848	1914	11,0	7,6	96,60	
	D	I	20	1822	1914	11,0	9,1	95,20	
	E	C	20	1836	1914	11,0	8,6	95,90	
	F	D	20	1820	1914	11,0	7,7	95,10	
	G	I	20	1842	1914	11,0	6,3	96,20	
	H	C	20	1856	1914	11,0	9,1	97,00	
Promedio de Compactación:								95,89	

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC. VISTAS DE LAS LOMAS

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TÉCNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

INFORME DE COMPACTACIONES - OBRA TERMINADA

MÉTODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 6938 VIGENTES

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO

CLIENTE: DESARROLLO URBANO

REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

Fecha de Informe:
2017-12-13

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		% Compactación	
					Del Lugar	Máxima	Óptima	Del Lugar		
98	Prueba: 1				Tipo de Capa: BASE MAT.DE LUGAR TRITURADO			Fecha Ensaye: 2017-10-26		
	% Especificado: 100				Localización: CALLE HDA LOE MORALES					
	A		I	15	2201	2200	7,0	6,0	100,00	
	B		C	15	2236	2200	7,0	5,7	101,60	
	C		D	15	2221	2200	7,0	6,7	101,00	
	D		I	15	2209	2200	7,0	5,0	100,40	
	E		C	15	2216	2200	7,0	5,3	100,70	
	F		D	15	2231	2200	7,0	6,1	101,40	
	G		I	15	2207	2200	7,0	6,3	100,30	
	H		C	15	2215	2200	7,0	5,5	100,70	
	I		D	15	2221	2200	7,0	5,3	101,00	
	Promedio de Compactación:								100,79	

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: ENTRE CALLE REAL ESCONDIDA Y CIRCUITO ALTOZANO FRACC.ALTOZANO

99	Prueba: 1				Tipo de Capa: TERRENO NATURAL BANQUETA			Fecha Ensaye: 2017-10-31	
	% Especificado: 90				Localización: AV.PORTAL DEL ALAMO				
	A		C	20	1711	1900	12,6	8,6	90,10
	B		C	20	1721	1900	12,6	8,9	90,60
	C		C	20	1713	1900	12,6	7,7	90,20
	D		C	20	1718	1900	12,6	10,0	90,40
Promedio de Compactación:								90,33	

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC.PORTAL DE REAL 1 ETAPA 2

100	Prueba: 1				Tipo de Capa: TERRENO NATURAL BANQUETA			Fecha Ensaye: 2017-10-31	
	% Especificado: 90				Localización: CALLE REAL DE CARDO				
	A		C	20	1713	1900	12,6	9,9	90,20
	B		C	20	1721	1900	12,6	8,7	90,60
	C		C	20	1712	1900	12,6	9,6	90,10
	D		C	20	1736	1900	12,6	10,1	91,40
Promedio de Compactación:								90,58	

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC.PORTAL DE REAL 1 ETAPA 2

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

INFORME DE COMPACTACIONES - OBRA TERMINADA

MÉTODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 6938 VIGENTES

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO

CLIENTE: DESARROLLO URBANO

REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

Fecha de Informe:

2017-12-13

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		% Compactación
					Del Lugar	Máxima	Óptima	Del Lugar	
101	Prueba: 1				Tipo de Capa: TERRENO NATURAL BANQUETA			Fecha Ensaye: 2017-10-31	
	% Especificado: 90				Localización: CALLE REAL DE ASALIA				
	A		C	20	1721	1900	12,6	10,3	90,60
	B		C	20	1711	1900	12,6	9,1	90,10
	C		C	20	1718	1900	12,6	8,8	90,40
Promedio de Compactación:									90,37

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC.PORTAL DEL REAL 1 ETAPA 2

102	Prueba: 1				Tipo de Capa: TERRENO NATURAL BANQUETA			Fecha Ensaye: 2017-10-31	
	% Especificado: 90				Localización: CALLE RIO SONORA				
	A		C	20	1721	1900	12,6	9,0	90,60
	B		C	20	1713	1900	12,6	9,7	90,20
	C		C	20	1718	1900	12,6	9,0	90,40
	D		C	20	1731	1900	12,6	8,8	91,10
	E		C	20	1751	1900	12,6	10,3	92,20
	F		C	20	1712	1900	12,6	9,9	90,10
Promedio de Compactación:									90,77

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.


Observaciones: FRACC.VISTAS DEL NORTE 2 ETAPA 2

103	Prueba: 1				Tipo de Capa: BASE MTA.MEJORADO CALIZO			Fecha Ensaye: 2017-10-31	
	% Especificado: 100				Localización: CON CARPETA RECUPERADA				
	A		I	15	1932	1931	6,0	5,5	100,10
	B		C	15	1940	1931	6,0	6,0	100,50
	C		D	15	1951	1931	6,0	5,3	101,00
	D		I	15	1933	1931	6,0	5,0	100,10
	E		C	15	1967	1931	6,0	5,5	101,90
	F		D	15	1970	1931	6,0	5,6	102,00
	G		I	15	1941	1931	6,0	6,0	100,50
Promedio de Compactación:									100,87

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: CALLE VALLE DE SAN PEDRO CIRCUITO SANTA VICTORIA L/SUR FRACC.SAN PEDRO III

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TÉCNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

INFORME DE COMPACTACIONES - OBRA TERMINADA

MÉTODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 6938 VIGENTES

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO

CLIENTE: DESARROLLO URBANO

REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

Fecha de Informe:

2017-12-13

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		% Compactación	
					Del Lugar	Máxima	Óptima	Del Lugar		
104	Prueba: 1				Tipo de Capa: BASE MAT.MEJORADO CALIZO		Fecha Ensaye: 2017-10-31			
	% Especificado: 100				Localización: CON CARPETA RECUPERADA					
	A		I	15	1936	1931	6,0	4,9	100,30	
	B		C	15	1951	1931	6,0	5,1	101,00	
	C		D	15	1961	1931	6,0	5,8	101,60	
	D		I	15	1942	1931	6,0	5,5	100,60	
	E		C	15	1937	1931	6,0	5,0	100,30	
	F		D	15	1951	1931	6,0	5,7	101,00	
	G		I	15	1936	1931	6,0	6,0	100,30	
	H		C	15	1942	1931	6,0	5,5	100,60	
	Promedio de Compactación:								100,71	

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: CIRCUITO LUNA FUERTE L/ORIENTE FRACC. LUNA ROJA

105	Prueba: 1				Tipo de Capa: TERRENO NATURAL BANQUETA		Fecha Ensaye: 2017-11-01		
	% Especificado: 90				Localización: CALLE PASEOS DE LOS PIRINEOS				
	A		C	20	1713	1900	12,6	8,7	90,20
	B		C	20	1721	1900	12,6	8,6	90,60
	C		C	20	1712	1900	12,6	7,7	90,10
	D		C	20	1715	1900	12,6	8,6	90,30
	E		C	20	1723	1900	12,6	9,1	90,70
Promedio de Compactación:								90,38	

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.


Observaciones: FRACC. BOSQUES DEL VALLE ETAPA V

106	Prueba: 1				Tipo de Capa: TERRENO NATURAL BANQUETA		Fecha Ensaye: 2017-11-03		
	% Especificado: 90				Localización: CALLE RIO SONORA				
	A		C	20	1711	1900	12,6	9,1	90,10
	B		C	20	1721	1900	12,6	10,3	90,60
	C		C	20	1736	1900	12,6	9,7	91,40
Promedio de Compactación:								90,70	

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC. VISTAS DEL NORTE 2 ETAPA 2

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TÉCNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

INFORME DE COMPACTACIONES - OBRA TERMINADA

MÉTODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 6938 VIGENTES

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO
 CLIENTE: DESARROLLO URBANO
 REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL
 LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua
 CONTRATISTA:

Fecha de Informe:
 2017-12-13

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		% Compactación	
					Del Lugar	Máxima	Óptima	Del Lugar		
107	Prueba: 1				Tipo de Capa: TERRENO NATURAL BANQUETA			Fecha Ensaye: 2017-11-03		
	% Especificado: 90				Localización: CALLE VIÑEDOS DE BALDUZZI					
	A		C	20	1715	1900	12,6	8,6	90,30	
	B		C	20	1726	1900	12,6	10,0	90,80	
	C		C	20	1741	1900	12,6	9,9	91,60	
	Promedio de Compactación:								90,90	

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC. LOS VIÑEDOS

108	Prueba: 1				Tipo de Capa: BASE MAT. GCC		Fecha Ensaye: 2017-11-06		
	% Especificado: 100				Localización: CALLE CIRCUITO DE MARSAL L/ORIENTE				
	A		I	15	2231	2230	5,0	4,6	100,00
	B		C	15	2236	2230	5,0	3,8	100,30
	C		D	15	2242	2230	5,0	3,3	100,50
	D		I	15	2238	2230	5,0	8,1	100,40
	E		C	15	2251	2230	5,0	4,6	100,90
	F		D	15	2230	2230	5,0	3,3	100,00
	G		I	15	2251	2230	5,0	3,9	100,90
Promedio de Compactación:									100,43

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC. ROMANCE 2 ETAPA 5

109	Prueba: 1				Tipo de Capa: SUBRASANTE MAT. CALIZO		Fecha Ensaye: 2017-11-06		
	% Especificado: 95				Localización: CALLE CIRCUITO MARSAL L/PONIENTE Y SUR				
	A		D	20	1846	1940	12,1	9,1	95,20
	B		C	20	1862	1940	12,1	9,6	96,00
	C		I	20	1847	1940	12,1	8,8	95,20
	D		D	20	1871	1940	12,1	9,9	96,40
	E		C	20	1862	1940	12,1	10,1	96,00
	F		I	20	1872	1940	12,1	9,6	96,50
	G		D	20	1851	1940	12,1	8,6	95,40
	H		C	20	1847	1940	12,1	9,9	95,20
Promedio de Compactación:									95,74

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC. ROMANCE 2 ETAPA 5

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
 GERENTE TÉCNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

LCO-COMP
 Página 38 de 63

INFORME DE COMPACTACIONES - OBRA TERMINADA

METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 6938 VIGENTES

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO

CLIENTE: DESARROLLO URBANO

REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

Fecha de Informe:

2017-12-13

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		% Compactación
					Del Lugar	Máxima	Óptima	Del Lugar	
110	Prueba: 1				Tipo de Capa: BASE MAT.GCC		Fecha Ensaye: 2017-11-07		
	% Especificado: 100				Localización: CALLE CIRCUTIO RIO BOLAÑOS LNORTE				
	A		I	15	2236	2230	5,0	3,0	100,30
	B		C	15	2241	2230	5,0	2,7	100,50
	C		D	15	2230	2230	5,0	3,0	100,00
	D		I	15	2247	2230	5,0	3,6	100,80
	E		C	15	2251	2230	5,0	4,0	100,90
	F		D	15	2242	2230	5,0	3,7	100,50
	G		I	15	2250	2230	5,0	2,6	100,90
	H		C	15	2236	2230	5,0	3,1	100,30
Promedio de Compactación:									100,53

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.


Observaciones: FRACC.VISTAS DEL NORTE 2 ETAPA 2

111	Prueba: 1				Tipo de Capa: BASE MAT.GCC		Fecha Ensaye: 2017-11-07		
	% Especificado: 100				Localización: CALLE PAMTEPEC				
	A		I	15	2242	2230	5,0	2,0	100,50
	B		C	15	2257	2230	5,0	2,0	101,20
	C		D	15	2236	2230	5,0	3,7	100,30
	D		I	15	2230	2230	5,0	3,1	100,00
	E		C	15	2237	2230	5,0	2,0	100,30
	F		D	15	2245	2230	5,0	3,6	100,70
	G		I	15	2251	2230	5,0	2,2	100,90
Promedio de Compactación:									100,56

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRAC.VISTAS DEL NORTE 2 ETAPA 2

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

INFORME DE COMPACTACIONES - OBRA TERMINADA

MÉTODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 6938 VIGENTES

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO

CLIENTE: DESARROLLO URBANO

REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

Fecha de Informe:
2017-12-13

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		% Compactación
					Del Lugar	Máxima	Óptima	Del Lugar	
112	Prueba: 1				Tipo de Capa: BASE MAT.GCC			Fecha Ensaye: 2017-11-07	
	% Especificado: 100				Localización: CALLE CIRCUITO DE TEUNTEPEC L/SUR Y NTE				
	A		D	15	2237	2230	5,0	3,6	100,30
	B		C	15	2230	2230	5,0	3,8	100,00
	C		I	15	2247	2230	5,0	2,3	100,80
	D		D	15	2256	2230	5,0	2,2	101,20
	E		C	15	2261	2230	5,0	2,7	101,40
	F		I	15	2231	2230	5,0	3,9	100,00
	G		D	15	2247	2230	5,0	3,1	100,80
	H		C	15	2236	2230	5,0	3,6	100,30
	I		I	15	2247	2230	5,0	2,0	100,80
Promedio de Compactación:									100,62

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC. VISTAS DEL NORTE 2 ETAPA 2

113	Prueba: 1	Tipo de Capa: BASE MAT.TRITURADO DE LUGAR					Fecha Ensaye: 2017-11-07		
	% Especificado: 100	Localización: AV.HDA LOS MORALES DE AV.REAL ESCONDIDA							
	A	I	15	2213	2200	7,0	5,7	100,60	
	B	C	15	2203	2200	7,0	6,1	100,10	
	C	D	15	2210	2200	7,0	5,0	100,50	
	D	I	15	2221	2200	7,0	5,5	101,00	
	E	C	15	2211	2200	7,0	5,7	100,50	
	F	D	15	2219	2200	7,0	6,1	100,90	
	G	I	15	2231	2200	7,0	6,6	101,40	
	H	D	15	2209	2200	7,0	5,7	100,40	
	I	C	15	2200	2200	7,0	5,6	100,00	
	J	I	15	2221	2200	7,0	6,0	101,00	
	K	D	15	2212	2200	7,0	5,8	100,50	
	L	C	15	2210	2200	7,0	5,5	100,50	
	M	I	15	2225	2200	7,0	6,0	101,10	
	N	D	15	2231	2200	7,0	5,1	101,40	
	Promedio de Compactación:							100,71	

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: AL 0+100 CUERPO IZQ. Y DER FRACC. ALTOZANO

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TÉCNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

LCO-COMP
Página 40 de 63

INFORME DE COMPACTACIONES - OBRA TERMINADA

METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 6938 VIGENTES

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO

CLIENTE: DESARROLLO URBANO

REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

Fecha de Informe:

2017-12-13

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		% Compactación
					Del Lugar	Máxima	Óptima	Del Lugar	
114	Prueba: 1				Tipo de Capa: TERRENO NATURAL BANQUETA			Fecha Ensaye: 2017-11-09	
	% Especificado: 90				Localización: CALLE RIOS TORMEX				
	A		C	20	1713	1900	12,6	10,5	90,20
	B		C	20	1721	1900	12,6	9,9	90,60
	C		C	20	1756	1900	12,6	10,1	92,40
Promedio de Compactación:									91.07

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: ENTRE RIO TONALA Y RIO PRAT FRACC.VISTAS DEL NORTE 2 ETAPA 2

115	Prueba: 1				Tipo de Capa: TERRENO NATURAL BANQUETA L/DER		Fecha Ensaye: 2017-11-09		
	% Especificado: 90				Localización: CALLE CIRCUITO TEATRO LA FENISE L/NORTE				
	A		C	20	1718	1900	12,6	8,8	90,40
	B		C	20	1721	1900	12,6	10,3	90,60
	C		C	20	1742	1900	12,6	9,1	91,70
Promedio de Compactación:									90,90

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.


Observaciones: 0+000 AL 0+030 FRACC.SAN CARLOS

116	Prueba: 1				Tipo de Capa: SUBRASANTE MAT.DE LUGAR		Fecha Ensaye: 2017-11-09		
	% Especificado: 95				Localización: CALLE DE ORO				
	A		I	20	1864	1960	12,6	9,6	95,10
	B		C	20	1866	1960	12,6	9,1	95,20
	C		D	20	1871	1960	12,6	8,9	95,50
	D		I	20	1885	1960	12,6	9,9	96,20
	E		C	20	1872	1960	12,6	10,3	95,50
	F		D	20	1867	1960	12,6	9,1	95,30
	G		I	20	1863	1960	12,6	10,0	95,10
Promedio de Compactación:									95,41

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC. LAS LUNAS II

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

INFORME DE COMPACTACIONES - OBRA TERMINADA

METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 6938 VIGENTES

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO

CLIENTE: DESARROLLO URBANO

REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

Fecha de Informe:
2017-12-13

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		%
					Del Lugar	Máxima	Óptima	Del Lugar	Compactación
117	Prueba: 1				Tipo de Capa: SUBRASANTE MAT.DE LUGAR			Fecha Ensaye: 2017-11-09	
	% Especificado: 95				Localización: CALLE CIRCUITO DE PLATA L/PONIENTE Y NORTE				
	A		I	20	1880	1960	12,6	7,9	95,90
	B		C	20	1865	1960	12,6	10,3	95,20
	C		D	20	1872	1960	12,6	9,1	95,50
	D		I	20	1866	1960	12,6	9,9	95,20
	E		C	20	1871	1960	12,6	8,7	95,50
	F		D	20	1869	1960	12,6	10,3	95,40
	G		I	20	1871	1960	12,6	9,1	95,50
Promedio de Compactación:									95,46

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC.LAS LUNAS II

118	Prueba: 1	Tipo de Capa: SUBRASANTE MAT.DE LUGAR					Fecha Ensaye: 2017-11-09		
	% Especificado: 95	Localización: CALLE LA LUNA CRECIENTE							
	A	I	20	1866	1960	12,6	8,1	95,20	
	B	C	20	1872	1960	12,6	8,8	95,50	
	C	D	20	1889	1960	12,6	8,7	96,40	
	D	I	20	1871	1960	12,6	9,6	95,50	
	E	C	20	1891	1960	12,6	9,9	96,50	
	F	D	20	1866	1960	12,6	10,0	95,20	
	G	I	20	1869	1960	12,6	10,1	95,40	
	Promedio de Compactación:								95,67

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.


Observaciones: FRACC.LAS LUNAS II

119	Prueba: 1	Tipo de Capa: BASE MAT.GCC					Fecha Ensaye: 2017-11-10		
	% Especificado: 100	Localización: CALLE VISTA DE LA CIMA							
	A	I	15	2236	2230	5,0	4,3	100,30	
	B	C	15	2241	2230	5,0	4,1	100,50	
	C	D	15	2251	2230	5,0	3,6	100,90	
	D	I	15	2232	2230	5,0	4,7	100,10	
	Promedio de Compactación:								100,45

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC.VISTAS DE LAS LOMAS

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

INFORME DE COMPACTACIONES - OBRA TERMINADA

METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 6938 VIGENTES

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO

CLIENTE: DESARROLLO URBANO

REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

Fecha de Informe:
2017-12-13

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		%
					Del Lugar	Máxima	Óptima	Del Lugar	Compactación
120	Prueba: 1				Tipo de Capa: BASE MAT.MEJORADO CALIZO		Fecha Ensaye: 2017-11-11		
	% Especificado: 100				Localización: CARPETA RECUPERADA CALLE DEL ORO				
	A		I	15	2006	2000	9,9	8,6	100,30
	B		C	15	2051	2000	9,9	7,7	102,60
	C		D	15	2021	2000	9,9	9,0	101,10
	D		I	15	2001	2000	9,9	7,7	100,10
	E		C	15	2037	2000	9,9	8,6	101,90
	F		D	15	2019	2000	9,9	6,7	101,00
	G		I	15	2020	2000	9,9	7,0	101,00
Promedio de Compactación:									101,14

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.


Observaciones: FRACC. LAS LUNAS II

121	Prueba: 1				Tipo de Capa: BASE MAT.MEJORADO CALIZO		Fecha Ensaye: 2017-11-11		
	% Especificado: 100				Localización: CARPETA RECUPERADA CIRCUITO DE PLATA				
	A		I	15	2016	200	9,9	7,1	1008,00
	B		C	15	2012	200	9,9	8,3	1006,00
	C		D	15	2001	200	9,9	7,9	1000,50
	D		I	15	2028	200	9,9	7,0	1014,00
	E		C	15	2041	200	9,9	8,3	1020,50
	F		D	15	2016	200	9,9	7,7	1008,00
	G		I	15	2013	200	9,9	6,7	1006,50
	H		C	15	2001	200	9,9	8,6	1000,50
	I		D	15	2019	200	9,9	7,7	1009,50
Promedio de Compactación:									1008,17

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: L/ORIENTE Y NORTE FRACC.LAS LUNAS II

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

INFORME DE COMPACTACIONES - OBRA TERMINADA

METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 6938 VIGENTES

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO

CLIENTE: DESARROLLO URBANO

REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

Fecha de Informe:

2017-12-13

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		% Compactación
					Del Lugar	Máxima	Óptima	Del Lugar	
122	Prueba: 1				Tipo de Capa: BASE MAT.MEJORADO CALIZO			Fecha Ensaye: 2017-11-11	
	% Especificado: 100				Localización: CARPETA RECUPERADA CALLE LUNA CRECIENTE				
	A		I	15	2020	2000	9,9	6,1	101,00
	B		C	15	2015	2000	9,9	7,0	100,80
	C		D	15	2036	2000	9,9	7,3	101,80
	D		I	15	2021	2000	9,9	7,9	101,10
	E		C	15	2010	2000	9,9	8,0	100,50
	F		D	15	2051	2000	9,9	7,1	102,60
	G		I	15	2030	2000	9,9	6,6	101,50
Promedio de Compactación:									101,33

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC.LAS LUNAS II

123	Prueba: 1		Tipo de Capa: BASE MAT.GCC				Fecha Ensaye: 2017-11-14		
	% Especificado: 100		Localización: CALLE SIDRA						
	A	I	15	2156	2124	3,9	3,0	101,50	
	B	C	15	2125	2124	3,9	2,0	100,00	
	C	D	15	2171	2124	3,9	2,2	102,20	
	D	I	15	2136	2124	3,9	2,8	100,60	
	E	C	15	2130	2124	3,9	2,3	100,30	
	F	D	15	2147	2124	3,9	2,0	101,10	
	G	I	15	2151	2124	3,9	2,7	101,30	

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.


Observaciones: FRACC.QUINTAS ARBOLEDAS ETAPA 5 ORIENTE

124	Prueba: 1		Tipo de Capa: BASE MAT.GCC				Fecha Ensaye: 2017-11-14		
	% Especificado: 100		Localización: CALLE MARACUYA L/PONIENTE						
	A	I	15	2136	2124	3,9	3,6	100,60	
	B	C	15	2148	2124	3,9	3,0	101,10	
	C	D	15	2161	2124	3,9	2,7	101,70	

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC.QUINTAS ARBOLEDAS ETAPA 5 ORIENTE

ATENTAMENTE:



Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TECNICO

LCO-COMP
Página 44 de 63

INFORME DE COMPACTACIONES - OBRA TERMINADA

METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 6938 VIGENTES

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO

CLIENTE: DESARROLLO URBANO

Fecha de Informe:

REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL

2017-12-13

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		% Compactación
					Del Lugar	Máxima	Óptima	Del Lugar	
125	Prueba: 1				Tipo de Capa: BASE MAT.GCC		Fecha Ensaye: 2017-11-14		
	% Especificado: 100				Localización: CALLE CIRCUITO MARSAL L/SUR				
	A		I	15	2156	2124	3,9	2,6	101,50
	B		C	15	2136	2124	3,9	3,1	100,60
	C		D	15	2171	2124	3,9	2,0	102,20
Promedio de Compactación:									101,43

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC.ROMANCE II ETAPA III

126	Prueba: 1				Tipo de Capa: BASE MEJORADA MAT.CALIZO		Fecha Ensaye: 2017-11-17		
	% Especificado: 100				Localización: CALLE VALLE DE SAN PEDRO DE CANAL AL 0+060				
	A		I	15	1971	1960	12,6	9,6	100,60
	B		C	15	1982	1960	12,6	8,6	101,10
	C		D	15	1965	1960	12,6	9,1	100,30
	D		I	15	1972	1960	12,6	10,0	100,60
Promedio de Compactación:									100,65

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC.VALLE DE SAN PEDRO

127	Prueba: 1				Tipo de Capa: BASE MEJORADA MAT.CALIZO		Fecha Ensaye: 2017-11-17		
	% Especificado: 100				Localización: CALLE CIRCUITO VALLE DE SAN VICTORIA				
	A		I	15	1965	1960	12,6	8,7	100,30
	B		C	15	1988	1960	12,6	9,9	101,40
	C		D	15	1971	1960	12,6	9,0	100,60
	D		I	15	1967	1960	12,6	8,3	100,40
Promedio de Compactación:									100,68

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.


Observaciones: DE VALLE DE SAN PEDRO A 0+060 FRACC.VALLE DE SAN PEDRO

128	Prueba: 1				Tipo de Capa: BASE MAT.CALISO TRITURADO		Fecha Ensaye: 2017-11-17		
	% Especificado: 100				Localización: CIRCUITO MOLINO DE NAVAL MORA L/NORTE				
	A		I	15	1867	1850	7,9	6,9	100,90
	B		C	15	1920	1850	7,9	5,5	103,80
	C		I	15	1875	1850	7,9	6,0	101,40
	D		D	15	1906	1850	7,9	6,7	103,00
Promedio de Compactación:									102,28

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC.MOLINO DE AGUA

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

LCO-COMP
Página 45 de 63

INFORME DE COMPACTACIONES - OBRA TERMINADA

METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 6938 VIGENTES

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO

CLIENTE: DESARROLLO URBANO

REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

Fecha de Informe:
2017-12-13

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		%
					Del Lugar	Máxima	Óptima	Del Lugar	Compactación
129	Prueba: 1				Tipo de Capa: BASE MAT.GCC		Fecha Ensaye: 2017-11-22		
	% Especificado: 100				Localización: CALLE SIDRA L/SUR				
	A		I	15	2135	2124	3,9	2,0	100,50
	B		C	15	2156	2124	3,9	2,2	101,50
	C		D	15	2128	2124	3,9	3,0	100,20
Promedio de Compactación:									100,73

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: CALLE SIDRA L/ORIENTE 0+060 FRACC.QUINTAS ARBOLEDAS ETAPA 5 ORIENTE

130	Prueba: 1				Tipo de Capa: BASE MAT.GCC		Fecha Ensaye: 2017-11-22		
	% Especificado: 100				Localización: CALLE SIDRA L/ORIENTE				
	A		I	15	2136	2124	3,9	2,6	100,60
	B		C	15	2156	2124	3,9	2,2	101,50
	C		D	15	2128	2124	3,9	2,0	100,20
Promedio de Compactación:									100,77

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.


Observaciones: FRACC.QUINTAS ARBOLEDAS ETAPA 5 ORIENTE

131	Prueba: 1				Tipo de Capa: SUBRASANTE MAT.TRITURADO		Fecha Ensaye: 2017-11-22		
	% Especificado: 95				Localización: CALLE CIRCUITO VALLE DEL TRENT 1 0+000 AL 0+109				
	A		I	15	1910	2010	6,5	5,3	95,00
	B		C	15	1921	2010	6,5	6,1	95,60
	C		D	15	1912	2010	6,5	5,7	95,10
	D		I	15	1936	2010	6,5	6,1	96,30
	E		C	15	1928	2010	6,5	5,0	95,90
	F		D	15	1921	2010	6,5	4,0	95,60
	G		I	15	1946	2010	6,5	4,1	96,80
Promedio de Compactación:									95,76

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC.VALLE DE MERCIA

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

LCO-COMP
Página 46 de 63

INFORME DE COMPACTACIONES - OBRA TERMINADA

METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 6938 VIGENTES

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO

CLIENTE: DESARROLLO URBANO

REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

Fecha de Informe:
2017-12-13

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		% Compactación
					Del Lugar	Máxima	Óptima	Del Lugar	
132	Prueba: 1				Tipo de Capa: SUBRASANTE MAT.TRITURADO			Fecha Ensaye: 2017-11-22	
	% Especificado: 95				Localización: CALLE CIRCUITO VALLE DEL TRENT 4 0+000 AL 0+060				
	A		I	15	1921	2010	6,5	5,1	95,60
	B		C	15	1913	2010	6,5	5,5	95,20
	C		D	15	1936	2010	6,5	6,3	96,30
	D		I	15	1928	2010	6,5	5,0	95,90
Promedio de Compactación:									95,75

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC.VALLE DE MERCIA

133	Prueba: 1	Tipo de Capa: SUBRASANTE MAT.TRITURADO					Fecha Ensaye: 2017-11-22		
	% Especificado: 95	Localización: CALLE CIRCUITO VALLE DEL TRENT 1.A 0+000 AL 0+100							
	A	I	15	1921	2010	6,5	4,1	95,60	
	B	C	15	1923	2010	6,5	5,7	95,70	
	C	D	15	1918	2010	6,5	5,5	95,40	
	D	I	15	1936	2010	6,5	5,6	96,30	
	E	C	15	1941	2010	6,5	4,7	96,60	
	F	D	15	1930	2010	6,5	4,1	96,00	
	G	I	15	1922	2010	6,5	5,5	95,60	
	Promedio de Compactación:								95,89

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.


Observaciones: FRACC.VALLE DE MERCIA

134	Prueba: 1	Tipo de Capa: SUBRASANTE MAT.TRITURADO					Fecha Ensaye: 2017-11-22		
	% Especificado: 95	Localización: CALLE DE UESSEX 0+000 AL 0+140							
	A	I	15	1931	2010	6,5	6,3	96,10	
	B	C	15	1910	2010	6,5	6,0	95,00	
	C	D	15	1918	2010	6,5	5,3	95,40	
	D	I	15	1922	2010	6,5	5,5	95,60	
	E	C	15	1938	2010	6,5	6,3	96,40	
	F	D	15	1918	2010	6,5	5,0	95,40	
	G	I	15	1915	2010	6,5	5,1	95,30	
	H	C	15	1936	2010	6,5	4,6	96,30	
Promedio de Compactación:								95,69	

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC.VALLE DE MERCIA

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

INFORME DE COMPACTACIONES - OBRA TERMINADA

MÉTODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 6938 VIGENTES

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO

CLIENTE: DESARROLLO URBANO

Fecha de Informe:

2017-12-13

REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		%
					Del Lugar	Máxima	Óptima	Del Lugar	Compactación
135	Prueba: 1		Tipo de Capa: SUBRASANTE MAT. TRITURADO					Fecha Ensaye: 2017-11-22	
	% Especificado: 95		Localización: CALLE VALLE DEL KENT 2						
	A		I	15	1913	2010	6,5	4,0	95,20
	B		C	15	1921	2010	6,5	4,2	95,60
	C		D	15	1946	2010	6,5	5,0	96,80
	D		I	15	1918	2010	6,5	4,8	95,40
	E		C	15	1937	2010	6,5	4,1	96,40
	Promedio de Compactación:								95,88

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC. VALLE DE MERCIA

136	Prueba: 1				Tipo de Capa: BASE MAT. TRITURADO PARCIAL		Fecha Ensaye: 2017-11-23		
	% Especificado: 100				Localización: CALLE CIRCUITO VALLE DEL TRENT 1 0+000 AL 0+109				
	A		I	15	2015	2010	6,5	5,3	100,20
	B		C	15	2085	2010	6,5	5,6	103,70
	C		D	15	2021	2010	6,5	4,6	100,50
	D		I	15	2013	2010	6,5	4,7	100,10
	E		C	15	2036	2010	6,5	5,8	101,30
	F		D	15	2041	2010	6,5	4,0	101,50
	G		I	15	2021	2010	6,5	4,1	100,50
Promedio de Compactación:									101,11

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC. VALLE DE MERCIA

137	Prueba: 1				Tipo de Capa: BASE MAT. TRITURADO PARCIAL		Fecha Ensaye: 2017-11-23		
	% Especificado: 100				Localización: CALLE CIRCUITO TRENT 4 0+000 AL 0+060				
	A		I	15	2036	2010	6,5	5,5	101,30
	B		C	15	2048	2010	6,5	4,0	101,90
	C		D	15	2013	2010	6,5	4,6	100,10
	D		I	15	2028	2010	6,5	5,1	100,90
Promedio de Compactación:									101,05

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC. VALLE DE MERCIA

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TÉCNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

INFORME DE COMPACTACIONES - OBRA TERMINADA

METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 6938 VIGENTES

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO

CLIENTE: DESARROLLO URBANO

REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

Fecha de Informe:

2017-12-13

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		%
					Del Lugar	Máxima	Óptima	Del Lugar	Compactación
138	Prueba: 1				Tipo de Capa: BASE MAT.TRITURADO PARCIAL			Fecha Ensaye: 2017-11-23	
	% Especificado: 100				Localización: CALLE CIRCUITO VALLE DEL TRENT 1.A 0+000 AL 0+100				
	A		I	15	2014	2010	6,5	4,4	100,20
	B		C	15	2051	2010	6,5	4,6	102,00
	C		D	15	2030	2010	6,5	4,7	101,00
	D		I	15	2060	2010	6,5	5,7	102,50
	E		C	15	2013	2010	6,5	5,5	100,10
	F		D	15	2021	2010	6,5	4,9	100,50
	G		I	15	2028	2010	6,5	4,0	100,90
Promedio de Compactación:									101,03

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC.VALLE DE MERCIA

139	Prueba: 1		Tipo de Capa: BASE MAT.TRITURADO PARCIAL				Fecha Ensaye: 2017-11-23		
	% Especificado: 100		Localización: CALLE UESSEX 0+000 AÑ 0+140						
	A	I	15	2012	2010	6,5	4,7	100,10	
	B	C	15	2021	2010	6,5	5,5	100,50	
	C	D	15	2036	2010	6,5	5,6	101,30	
	D	I	15	2056	2010	6,5	4,9	102,30	
	E	C	15	2038	2010	6,5	4,6	101,40	
	F	D	15	2042	2010	6,5	5,8	101,60	
	G	I	15	2018	2010	6,5	4,3	100,40	
	H	C	15	2015	2010	6,5	4,0	100,20	
	Promedio de Compactación:							100,98	

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.


Observaciones: FRACC.VALLE DE MERCIA

140	Prueba: 1	Tipo de Capa: BASE MAT.TRITURADO PARCIAL					Fecha Ensaye: 2017-11-23		
	% Especificado: 100	Localización: CALLE VALLE DEL KENT 2 0+000 AL 0+080							
	A	I	15	2013	2010	6,5	4,1	100,10	
	B	C	15	2046	2010	6,5	4,3	101,80	
	C	D	15	2020	2010	6,5	4,1	100,50	
	D	I	15	2051	2010	6,5	5,0	102,00	
						Promedio de Compactación: 101,10			

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC.VALLE DE MERCIA

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

INFORME DE COMPACTACIONES - OBRA TERMINADA

METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 6938 VIGENTES

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO

CLIENTE: DESARROLLO URBANO

REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

Fecha de Informe:
2017-12-13

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		% Compactación
					Del Lugar	Máxima	Óptima	Del Lugar	
141	Prueba: 1				Tipo de Capa: ULTIMA CAPA RELLENO MAT.DE			Fecha Ensaye: 2017-11-23	
	% Especificado: 90				Localización: CALLE CIRCUITO MONTE CALERES L/ORIENTE				
	A		C	20	1746	1920	10,6	9,6	90,90
	B		C	20	1786	1920	10,6	9,0	93,00
	C		C	20	1791	1920	10,6	8,7	93,30
	D		C	20	1771	1920	10,6	8,8	92,20
	E		C	20	1747	1920	10,6	9,0	91,00
	F		C	20	1791	1920	10,6	9,7	93,30
	G		C	20	1746	1920	10,6	9,6	90,90
	H		C	20	1786	1920	10,6	9,0	93,00
Promedio de Compactación:									92,20

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.


Observaciones: ZANJA DE AGUA POTABLE Y DE DRENAJE FRACC. MONTE CALERES

142	Prueba: 1	Tipo de Capa: ULTIMA CAPA RELLENO MAT.DE					Fecha Ensaye: 2017-11-23	
	% Especificado: 90	Localización: CALLE CIRUCITO MONTE CALERES L/SUR Y NORTE						
	A	C	20	1756	1920	10,6	7,6	91,50
	B	C	20	1791	1920	10,6	9,3	93,30
	C	C	20	1788	1920	10,6	8,8	93,10
	D	C	20	1776	1920	10,6	9,1	92,50
	E	C	20	1796	1920	10,6	7,7	93,50
	F	C	20	1781	1920	10,6	8,6	92,80
	G	C	20	1771	1920	10,6	7,1	92,20
Promedio de Compactación:								92,70

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: ZANJA DE AGUA POTABLE Y DE DRENAJE FRACC. MONTE CALERES

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

INFORME DE COMPACTACIONES - OBRA TERMINADA

MÉTODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 6938 VIGENTES

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO

CLIENTE: DESARROLLO URBANO

REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

Fecha de Informe:
2017-12-13

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		%
					Del Lugar	Máxima	Óptima	Del Lugar	Compacción
143	Prueba: 1				Tipo de Capa: BASE MAT.GCC			Fecha Ensaye: 2017-11-23	
	% Especificado: 100				Localización: CALLE CIRCUITO DE QUEBEK L/ORIENTE Y SUR				
	A		I	15	2207	2200	5,6	5,2	100,30
	B		C	15	2221	2200	5,6	5,0	101,00
	C		D	15	2236	2200	5,6	4,2	101,60
	D		I	15	2201	2200	5,6	4,1	100,00
	E		C	15	2216	2200	5,6	4,5	100,70
	F		D	15	2212	2200	5,6	5,1	100,50
	G		I	15	2200	2200	5,6	4,4	100,00
Promedio de Compactación:									100.59

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC.VANCUBER

144	Prueba: 1	Tipo de Capa: BASE MAT.GCC					Fecha Ensaye: 2017-11-23	
	% Especificado: 100	Localización: CALLE CIRCUITO DE QUEBEK L/PONIENTE						
	A	I	15	2216	2200	5,6	4,3	100,70
	B	C	15	2202	2200	5,6	4,6	100,10
	C	D	15	2210	2200	5,6	4,1	100,50
	D	I	15	2221	2200	5,6	5,0	101,00
	E	C	15	2236	2200	5,6	4,0	101,60
	Promedio de Compactación:							100,78

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.


Observaciones: FRACC.VANCUBER

145	Prueba: 1		Tipo de Capa: BASE MAT.TRITURADO PARCIAL				Fecha Ensaye: 2017-11-23		
	% Especificado: 100		Localización: CALLE SIROBA						
	A	I	15	1965	1960	8,7	6,1	100,30	
	B	C	15	1987	1960	8,7	6,6	101,40	
	C	D	15	1980	1960	8,7	7,0	101,00	
	D	I	15	1971	1960	8,7	6,7	100,60	
	E	C	15	1976	1960	8,7	5,6	100,80	
	Promedio de Compactación:								100.82

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC.DOMINIO

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TÉCNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

INFORME DE COMPACTACIONES - OBRA TERMINADA

METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 6938 VIGENTES

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO

CLIENTE: DESARROLLO URBANO

REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

Fecha de Informe:
2017-12-13

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		%
					Del Lugar	Máxima	Óptima	Del Lugar	Compactación
146	Prueba: 1				Tipo de Capa: BASE MAT.TRITURADO PARCIAL			Fecha Ensaye: 2017-11-23	
	% Especificado: 100				Localización: CALLE PASEO DE LA MONTAÑA CUERPO DER Y IZQ				
	A		I	15	1972	1960	8,7	7,1	100,60
	B		C	15	1987	1960	8,7	6,3	101,40
	C		D	15	1976	1960	8,7	7,1	100,80
	D		I	15	1988	1960	8,7	7,7	101,40
	E		C	15	1991	1960	8,7	6,0	101,60
	F		D	15	2000	1960	8,7	6,9	102,00
	G		I	15	2010	1960	8,7	6,1	102,60
	H		C	15	1989	1960	8,7	8,0	101,50
	I		D	15	1991	1960	8,7	7,1	101,60
	J		I	15	1977	1960	8,7	6,6	100,90
	K		C	15	1981	1960	8,7	7,1	101,10
	L		D	15	2010	1960	8,7	6,1	102,60
	M		I	15	2001	1960	8,7	8,0	102,10

Promedio de Compactación: 101,55

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: 0+000 AL CALLE PICO HELD FRACC.DOMINIO

147	Prueba: 1		Tipo de Capa: BASE MAT.TRITURADO PARCIAL				Fecha Ensaye: 2017-11-23		
	% Especificado: 100		Localización: CALLE PICO DE CORONAS						
	A	I	15	1977	1920	8,7	6,0	103,00	
	B	C	15	1981	1920	8,7	6,7	103,20	
	C	D	15	1971	1920	8,7	7,0	102,70	
	D	I	15	1965	1920	8,7	7,6	102,30	
	E	C	15	1969	1920	8,7	6,1	102,60	
	F	D	15	1988	1920	8,7	7,7	103,50	

Promedio de Compactación: 102,88

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC.DOMINIO

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

LCO-COMP
Página 52 de 63

INFORME DE COMPACTACIONES - OBRA TERMINADA

METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 6938 VIGENTES

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO

CLIENTE: DESARROLLO URBANO

REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

Fecha de Informe:
2017-12-13

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		% Compacción
					Del Lugar	Máxima	Óptima	Del Lugar	
148	Prueba: 1				Tipo de Capa: BASE MAT. TRITURADO PARCIAL			Fecha Ensaye: 2017-11-23	
	% Especificado: 100				Localización: CALLE PICO DE ALBA				
	A		I	15	1976	1920	8,7	7,0	102,90
	B		C	15	1988	1920	8,7	7,3	103,50
	C		D	15	1991	1920	8,7	6,3	103,70
	D		I	15	1963	1920	8,7	8,1	102,20
	E		C	15	1971	1920	8,7	7,0	102,70
Promedio de Compactación:									103,00

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC.DOMINIO

149	Prueba: 1				Tipo de Capa: BASE MAT.DE LUGAR TRITURADO			Fecha Ensaye: 2017-11-24	
	% Especificado: 100				Localización: CALLE CIRCUITO ALTOZANO CUERPO DER 0+000 AL 0+300				
	A		I	15	1889	1888	12,3	9,7	100,10
	B		C	15	1916	1888	12,3	9,6	101,50
	C		D	15	1900	1888	12,3	10,1	100,60
	D		I	15	1921	1888	12,3	10,0	101,70
	E		C	15	1896	1888	12,3	11,0	100,40
	F		D	15	1889	1888	12,3	10,1	100,10
	G		I	15	1900	1888	12,3	10,3	100,60
	H		C	15	1916	1888	12,3	9,9	101,50
	I		D	15	1921	1888	12,3	9,2	101,70
	J		I	15	1931	1888	12,3	11,0	102,30
	K		C	15	1900	1888	12,3	9,1	100,60
	L		D	15	1889	1888	12,3	9,9	100,10
	M		I	15	1901	1888	12,3	10,9	100,70
	N		C	15	1921	1888	12,3	10,7	101,70
	O		D	15	1913	1888	12,3	10,6	101,30
	P		I	15	1922	1888	12,3	10,3	101,80
	Q		C	15	1888	1888	12,3	11,0	100,00
Promedio de Compactación:									100,98

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC.ALTOZANO

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

LCO-COMP
Página 53 de 63

INFORME DE COMPACTACIONES - OBRA TERMINADA

METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 6938 VIGENTES

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO

CLIENTE: DESARROLLO URBANO

REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

Fecha de Informe:
2017-12-13

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		% Compactación
					Del Lugar	Máxima	Óptima	Del Lugar	
150	Prueba: 1				Tipo de Capa: SUBRASANTE MAT.DE LUGAR			Fecha Ensaye: 2017-11-28	
	% Especificado: 95				Localización: CALLE CIRCUITO ALTOZANO CUERPO DER				
	A		I	20	1910	2000	12,2	9,1	95,50
	B		C	20	1921	2000	12,2	8,1	96,10
	C		D	20	1900	2000	12,2	9,1	95,00
	D		I	20	1909	2000	12,2	8,8	95,50
	E		C	20	1936	2000	12,2	9,3	96,80
	F		D	20	1918	2000	12,2	9,1	95,90
	G		I	20	1921	2000	12,2	8,8	96,10
	H		C	20	1937	2000	12,2	8,3	96,90
	I		D	20	1901	2000	12,2	8,8	95,10
	J		I	20	1900	2000	12,2	9,1	95,00
Promedio de Compactación:									95,79

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: 0+300 A CALLE AV.LOS MORALES FRACC.ALTOZANO

151	Prueba: 1				Tipo de Capa: SUBRASANTE MAT.DE LUGAR		Fecha Ensaye: 2017-11-28		
	% Especificado: 95				Localización: CALLE CIRCUITO ALTOZANO CUERPO IZQ				
	A		D	20	1937	2000	12,2	8,6	96,90
	B		C	20	1917	2000	12,2	7,7	95,90
	C		I	20	1913	2000	12,2	7,1	95,70
	D		D	20	1921	2000	12,2	8,0	96,10
	E		C	20	1947	2000	12,2	7,6	97,40
	F		I	20	1908	2000	12,2	8,8	95,40
	G		D	20	1901	2000	12,2	9,1	95,10
	H		C	20	1921	2000	12,2	8,6	96,10
	I		I	20	1930	2000	12,2	9,9	96,50
	J		D	20	1941	2000	12,2	8,3	97,10
Promedio de Compactación:									96,22

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: 0+300 A CALLE AV.LOS MORALES FRACC.ALTOZANO

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

INFORME DE COMPACTACIONES - OBRA TERMINADA

MÉTODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 6938 VIGENTES

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO

CLIENTE: DESARROLLO URBANO

REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

Fecha de Informe:

2017-12-13

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		% Compactación
					Del Lugar	Máxima	Óptima	Del Lugar	
152	Prueba: 1				Tipo de Capa: ULTIMA CAPA RELLENO MAT.DE			Fecha Ensaye: 2017-11-28	
	% Especificado: 90				Localización: ZANJA DE DRENAJE CALLE CIRCUITO DE LA CANTERA				
	A		C	20	1723	1914	11,0	9,1	90,00
	B		C	20	1741	1914	11,0	8,6	91,00
	C		C	20	1751	1914	11,0	7,7	91,50
	D		C	20	1750	1914	11,0	8,3	91,40
	E		C	20	1731	1914	11,0	9,0	90,40
	F		C	20	1727	1914	11,0	7,7	90,20
	G		C	20	1740	1914	11,0	8,6	90,90
	H		C	20	1736	1914	11,0	7,7	90,70
Promedio de Compactación:									90,76

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC. VISTAS DE LAS LOMAS

153	Prueba: 1	Tipo de Capa: ULTIMA CAPA RELLENO MAT.CALIZO					Fecha Ensaye: 2017-11-28	
	% Especificado: 90	Localización: ZANJA DE AGUA CALLE CIRCUITO DE LA CANTERA						
	A	C	20	1725	1914	11,0	8,1	90,10
	B	C	20	1730	1914	11,0	8,1	90,40
	C	C	20	1742	1914	11,0	9,0	91,00
	D	C	20	1761	1914	11,0	9,1	92,00
	E	C	20	1737	1914	11,0	8,3	90,80
	F	C	20	1741	1914	11,0	7,7	91,00
	G	C	20	1751	1914	11,0	8,6	91,50
	H	C	20	1726	1914	11,0	9,1	90,20
Promedio de Compactación:								90,88

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.


Observaciones:

154	Prueba: 1		Tipo de Capa: SUBRASANTE MAT.CALIZO					Fecha Ensaye: 2017-11-29	
	% Especificado: 95		Localización: CALLE ALTO DE LA ESCONDIDA						
	A	I	20	1845	1940	12,6	7,7	95,10	
	B	C	20	1861	1940	12,6	8,0	95,90	
	C	D	20	1876	1940	12,6	8,6	96,70	
	D	I	20	1847	1940	12,6	9,1	95,20	
	E	C	20	1862	1940	12,6	10,0	96,00	
	Promedio de Compactación:								95,78

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC. CUMBRES DE ROBINSON III

ATENTAMENTE:



Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TECNICO

LCO-COMP
Página 55 de 63

INFORME DE COMPACTACIONES - OBRA TERMINADA

METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 6938 VIGENTES

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO

CLIENTE: DESARROLLO URBANO

REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

Fecha de Informe:
2017-12-13

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		% Compactación
					Del Lugar	Máxima	Óptima	Del Lugar	
155	Prueba: 1		Tipo de Capa: SUBRASANTE MAT.CALIZO				Fecha Ensaye: 2017-11-29		
	% Especificado: 95		Localización: CALLE ALTO DE LOS ARADOS						
	A		I	20	1845	1940	12,6	8,0	95,10
	B		C	20	1891	1940	12,6	8,8	97,50
	C		D	20	1851	1940	12,6	9,1	95,40
	D		I	20	1863	1940	12,6	7,1	96,00
	E		C	20	1870	1940	12,6	8,6	96,40
	Promedio de Compactación:								96,08

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC.CUMBRES DE ROBINSON III

156	Prueba: 1				Tipo de Capa: SUBRASANTE MAT.CALIZO		Fecha Ensaye: 2017-11-29		
	% Especificado: 95				Localización: CALLE ALTOS DE SANTO DOMINGO				
	A		I	20	1856	1940	12,6	7,0	95,70
	B		C	20	1872	1940	12,6	8,0	96,50
	C		D	20	1881	1940	12,6	8,8	97,00
	D		I	20	1847	1940	12,6	8,6	95,20
	E		C	20	1851	1940	12,6	7,1	95,40
Promedio de Compactación:									95,96

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.


Observaciones: FRACC.CUMBRES DE ROBINSON III

157	Prueba: 1				Tipo de Capa: SUBRASANTE MAT.CALIZO		Fecha Ensaye: 2017-11-29		
	% Especificado: 95				Localización: CALLE ALTOS DE LA PARRA				
	A		I	20	1847	1940	12,6	8,0	95,20
	B		C	20	1863	1940	12,6	8,7	96,00
	C		D	20	1878	1940	12,6	7,1	96,80
	D		I	20	1860	1940	12,6	7,7	95,90
	E		C	20	1847	1940	12,6	8,0	95,20
Promedio de Compactación:									95,82

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC.CUMBRES DE ROBINSON III

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

INFORME DE COMPACTACIONES - OBRA TERMINADA

MÉTODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 6938 VIGENTES

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO

CLIENTE: DESARROLLO URBANO

REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

Fecha de Informe:
2017-12-13

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		%
					Del Lugar	Máxima	Óptima	Del Lugar	Compacción
158	Prueba: 1				Tipo de Capa: SUBRASANTE MAT.CALIZO			Fecha Ensaye: 2017-11-29	
	% Especificado: 95				Localización: CALLE ALTOS DE LA CANTERA				
	A		I	20	1855	1940	12,6	8,3	95,60
	B		C	20	1870	1940	12,6	8,0	96,40
	C		D	20	1881	1940	12,6	7,8	97,00
	D		I	20	1867	1940	12,6	8,7	96,20
	E		C	20	1880	1940	12,6	9,0	96,90
Promedio de Compactación:									96,42

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC. CUMBRES DE ROBINSON III

159	Prueba: 1				Tipo de Capa: BASE MAT. GCC		Fecha Ensaye: 2017-11-29		
	% Especificado: 100				Localización: CALLE ALTOS DE LA ESCONDIDA				
	A		D	15	2131	2130	4,5	2,1	100,00
	B		C	15	2156	2130	4,5	2,2	101,20
	C		I	15	2147	2130	4,5	3,6	100,80
	D		D	15	2145	2130	4,5	2,0	100,70
	E		C	15	2130	2130	4,5	2,1	100,00
Promedio de Compactación:									100,54

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC. CUMBRES DE ROBINSON III

160	Prueba: 1				Tipo de Capa: BASE MAT. GCC		Fecha Ensaye: 2017-11-29		
	% Especificado: 100				Localización: CALLE ALTOS DE LOS ARADOS				
	A		D	15	2130	2130	4,5	2,2	100,00
	B		C	15	2146	2130	4,5	2,0	100,80
	C		I	15	2166	2130	4,5	2,7	101,70
	D		D	15	2171	2130	4,5	3,1	101,90
	E		C	15	2156	2130	4,5	2,0	101,20
Promedio de Compactación:									101,12

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC. CUMBRES DE ROBINSON III

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TÉCNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

LCO-COMP
Página 57 de 63

INFORME DE COMPACTACIONES - OBRA TERMINADA

MÉTODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 6938 VIGENTES

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO

CLIENTE: DESARROLLO URBANO

REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

Fecha de Informe:
2017-12-13

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		% Compactación
					Del Lugar	Máxima	Óptima	Del Lugar	
161	Prueba: 1				Tipo de Capa: BASE MAT.GCC			Fecha Ensaye: 2017-11-29	
	% Especificado: 100				Localización: CALLE ALTOS DE SANTO DOMINGO				
	A		D	15	2136	2130	4,5	2,1	100,30
	B		C	15	2147	2130	4,5	2,7	100,80
	C		I	15	2156	2130	4,5	2,0	101,20
	D		D	15	2171	2130	4,5	2,1	101,90
	E		C	15	2148	2130	4,5	3,0	100,80
	Promedio de Compactación:								101,00

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC.CUMBRES DE ROBINSON III

162	Prueba: 1				Tipo de Capa: BASE MAT.GCC		Fecha Ensaye: 2017-11-29		
	% Especificado: 100				Localización: CALLE ALTOS DE LA PARRA				
	A		D	15	2130	2130	4,5	2,7	100,00
	B		I	15	2156	2130	4,5	3,1	101,20
	C		C	15	2171	2130	4,5	2,0	101,90
	D		D	15	2167	2130	4,5	2,7	101,70
	E		C	15	2138	2130	4,5	3,0	100,40
Promedio de Compactación:									101,04

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.


Observaciones: FRACC.CUMBRES DE ROBINSON III

163	Prueba: 1				Tipo de Capa: BASE MAT.GCC		Fecha Ensaye: 2017-11-29		
	% Especificado: 100				Localización: CALLE ALTOS DE LA CANTERA				
	A		D	15	2136	2130	4,5	2,2	100,30
	B		C	15	2147	2130	4,5	2,6	100,80
	C		I	15	2177	2130	4,5	2,2	102,20
	D		D	15	2161	2130	4,5	2,1	101,50
	E		C	15	2152	2130	4,5	3,0	101,00
Promedio de Compactación:									101,16

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC.CUMBRES DE ROBINSON III

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TÉCNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

INFORME DE COMPACTACIONES - OBRA TERMINADA

METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 6938 VIGENTES

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO

CLIENTE: DESARROLLO URBANO

REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

Fecha de Informe:

2017-12-13

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		% Compactación
					Del Lugar	Máxima	Óptima	Del Lugar	
164	Prueba: 1				Tipo de Capa: SUBRASANTE MAT.CALIZO			Fecha Ensaye: 2017-11-29	
	% Especificado: 95				Localización: CALLE ALTOS D ELA ESCONDIDA L/PONIENTE				
	A		I	15	1845	1940	12,6	6,8	95,10
	B		C	15	1861	1940	12,6	7,8	95,90
	C		D	15	1851	1940	12,6	8,8	95,40
	D		I	15	1867	1940	12,6	7,6	96,20
	E		C	15	1881	1940	12,6	8,1	97,00
	F		D	15	1856	1940	12,6	7,1	95,70
	G		I	15	1846	1940	12,6	8,8	95,20
	Promedio de Compactación:								95,79

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: ENTRE CALLE ESCONDIDA L/SUR Y CALLE ALTOS DE LA PARRA FRACC.CUMBRES DE ROBINSON III

165	Prueba: 1	Tipo de Capa: BASE MAT.GCC					Fecha Ensaye: 2017-11-29	
	% Especificado: 100	Localización: CALLE ALTOS DE LA ESCONDIDA L/PONIENTE						
	A	D	15	2131	2130	4,5	2,1	100,00
	B	C	15	2146	2130	4,5	2,0	100,80
	C	I	15	2151	2130	4,5	2,3	101,00
	D	D	15	2162	2130	4,5	2,0	101,50
	E	C	15	2142	2130	4,5	2,7	100,60
	F	I	15	2136	2130	4,5	3,1	100,30
	G	D	15	2140	2130	4,5	2,0	100,50
	Promedio de Compactación:							

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.


Observaciones: ENTRE CALLE ESCONDIDA L/SUR Y CALLE ALTOS DE LA PARRA FRACC.CUMBRES DE ROBINSON III

166	Prueba: 1	Tipo de Capa: BASE MAT.TRITURADO PARCIAL				Fecha Ensaye: 2017-11-30		
	% Especificado: 100	Localización: CALLE DE LA ECOLOGIA						
	A	I	15	1821	1820	7,1	5,5	100,10
	B	C	15	1836	1820	7,1	5,0	100,90
	C	D	15	1838	1820	7,1	4,8	101,00
	D	I	15	1841	1820	7,1	4,6	101,20
	E	C	15	1851	1820	7,1	5,1	101,70
	F	D	15	1861	1820	7,1	5,0	102,30
	Promedio de Compactación:							

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC.PENSIONES CIVILES

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

LCO-COMP
Página 59 de 63

INFORME DE COMPACTACIONES - OBRA TERMINADA

MÉTODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 6938 VIGENTES

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO

CLIENTE: DESARROLLO URBANO

REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

Fecha de Informe:

2017-12-13

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		% Compactación
					Del Lugar	Máxima	Óptima	Del Lugar	
167	Prueba: 1				Tipo de Capa: BASE MAT. TRITURADO PARCIAL			Fecha Ensaye: 2017-11-30	
	% Especificado: 100				Localización: CALLE AV.DE LA LEGALIDAD				
	A		I	15	1825	1820	7,1	5,6	100,30
	B		C	15	1838	1820	7,1	6,0	101,00
	C		D	15	1851	1820	7,1	4,6	101,70
	D		I	15	1831	1820	7,1	4,7	100,60
	E		C	15	1823	1820	7,1	5,0	100,20
	F		D	15	1841	1820	7,1	5,2	101,20

Promedio de Compactación: 100,83

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC. PENSIONES CIVILES

168	Prueba: 1				Tipo de Capa: BASE MAT. TRITURADO PARCIAL			Fecha Ensaye: 2017-11-30	
	% Especificado: 100				Localización: CALLE DEL PRESTIGIO				
	A		I	15	1861	1820	7,1	5,2	102,30
	B		C	15	1821	1820	7,1	5,0	100,10
	C		D	15	1836	1820	7,1	4,6	100,90
	D		I	15	1842	1820	7,1	5,5	101,20
	E		C	15	1831	1820	7,1	6,2	100,60
	F		D	15	1825	1820	7,1	5,1	100,30

Promedio de Compactación: 100,90

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC. PENSIONES CIVILES


169	Prueba: 1				Tipo de Capa: BASE MAT. TRITURADO PARCIAL			Fecha Ensaye: 2017-11-30	
	% Especificado: 100				Localización: CALLE CATEDRATICO				
	A		I	15	1836	1820	7,1	6,0	100,90
	B		C	15	1830	1820	7,1	5,7	100,50
	C		D	15	1821	1820	7,1	5,1	100,10
	D		I	15	1851	1820	7,1	6,0	101,70
	E		C	15	1846	1820	7,1	5,5	101,40
	F		D	15	1831	1820	7,1	5,0	100,60

Promedio de Compactación: 100,87

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC. PENSIONES CIVILES

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

INFORME DE COMPACTACIONES - OBRA TERMINADA

MÉTODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 6938 VIGENTES

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO
 CLIENTE: DESARROLLO URBANO
 REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL
 LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua
 CONTRATISTA:

Fecha de Informe:
 2017-12-13

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		%
					Del Lugar	Máxima	Óptima	Del Lugar	Compactación
170	Prueba: 1				Tipo de Capa: TERRENO NATURAL			Fecha Ensaye: 2017-12-04	
	% Especificado: 90				Localización: BANQUETA PUBLICA L/DER CALLE LLANURA COLORIN				
	A		C	20	1715	1900	12,6	10,9	90,30
	B		C	20	1721	1900	12,6	10,0	90,60
	C		C	20	1711	1900	12,6	9,9	90,10
	D		C	20	1710	1900	12,6	8,7	90,00
	E		C	20	1736	1900	12,6	9,1	91,40
Promedio de Compactación:									90.48

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC.MONTE VERDE 1

171	Prueba: 1	Tipo de Capa: TERRENO NATURAL					Fecha Ensaye: 2017-12-04	
	% Especificado: 90	Localización: BANQUETA PUBLICA L/IZQ CALLE LLANURA COLORIN						
	A	C	20	1721	1900	12,6	10,3	90,60
	B	C	20	1729	1900	12,6	10,6	91,00
	C	C	20	1741	1900	12,6	9,1	91,60
	D	C	20	1736	1900	12,6	8,8	91,40
	E	C	20	1716	1900	12,6	9,1	90,30
	Promedio de Compactación:							

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.


Observaciones: FRACC.MONTE VERDE 1

172	Prueba: 1	Tipo de Capa: TERRENO NATURAL					Fecha Ensaye: 2017-12-04	
	% Especificado: 90	Localización: BANQUETA PUBLICA L/DER CALLE LLANURA SABAL L/PONIENTE						
	A	C	20	1731	1900	12,6	9,6	91,10
	B	C	20	1712	1900	12,6	10,1	90,10
	C	C	20	1718	1900	12,6	10,9	90,40
	D	C	20	1721	1900	12,6	10,2	90,60
	E	C	20	1731	1900	12,6	9,1	91,10
	Promedio de Compactación:							

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC.MONTE VERDE 1

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
 GERENTE TÉCNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

LCO-COMP
 Página 61 de 63

INFORME DE COMPACTACIONES - OBRA TERMINADA

METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 6938 VIGENTES

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO

CLIENTE: DESARROLLO URBANO

REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

Fecha de Informe:
2017-12-13

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		%
					Del Lugar	Máxima	Óptima	Del Lugar	Compactación
173	Prueba: 1				Tipo de Capa: BASE MAT.GCC			Fecha Ensaye: 2017-12-05	
	% Especificado: 100				Localización: CALLE CIRCUITO DEL SENDERO L/ORIENTE Y SUR				
	A		I	15	2231	2230	5,0	3,6	100,00
	B		C	15	2246	2230	5,0	3,7	100,70
	C		D	15	2236	2230	5,0	3,1	100,30
	D		I	15	2251	2230	5,0	2,7	100,90
	E		C	15	2237	2230	5,0	2,2	100,30
	F		D	15	2261	2230	5,0	2,0	101,40
	G		I	15	2238	2230	5,0	2,7	100,40
	H		C	15	2242	2230	5,0	4,0	100,50
	I		D	15	2250	2230	5,0	3,6	100,90
	J		I	15	2230	2230	5,0	3,1	100,00
	K		C	15	2242	2230	5,0	3,0	100,50
	L		D	15	2237	2230	5,0	2,7	100,30
	M		I	15	2242	2230	5,0	2,2	100,50
	N		C	15	2261	2230	5,0	3,0	101,40
	O		D	15	2268	2230	5,0	3,6	101,70
Promedio de Compactación:									100,65

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.


Observaciones: FRACC.VISTAS DE LAS LOMAS

174	Prueba: 1		Tipo de Capa: BASE MAT.GCC				Fecha Ensaye: 2017-12-05		
	% Especificado: 100		Localización: CALLE CALGARY						
	A	I	15	2201	2200	5,1	4,2	100,00	
	B	C	15	2236	2200	5,1	4,0	101,60	
	C	D	15	2221	2200	5,1	2,0	101,00	
	D	I	15	2216	2200	5,1	3,0	100,70	
	E	C	15	2212	2200	5,1	3,1	100,50	
	Promedio de Compactación:								100,76

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC. VANCUBER

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

LCO-COMP
Página 62 de 63

INFORME DE COMPACTACIONES - OBRA TERMINADA

METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: ASTM-D-690, 698, 1557, 2216, 6938 VIGENTES

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO

CLIENTE: DESARROLLO URBANO

REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

Fecha de Informe:

2017-12-13

No.	Ensaye	Estación	Lado	Profundidad Sondeo (cm)	MASA VOLUMÉTRICA		Humedad (%)		% Compactación
					Del Lugar	Máxima	Óptima	Del Lugar	
175	Prueba: 1				Tipo de Capa: TERRENO NATURAL		Fecha Ensaye: 2017-12-11		
	% Especificado: 90				Localización: CALLE RIO SONOYTA				
	A		C	20	1718	1900	12,6	10,1	90,40
	B		C	20	1725	1900	12,6	10,6	90,80
	C		C	20	1736	1900	12,6	9,9	91,40
	D		C	20	1721	1900	12,6	11,0	90,60
Promedio de Compactación:									90.80

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC.VISTAS DEL NORTE II

176	Prueba: 1				Tipo de Capa: BASE MAT.TRITURADO PARCIAL		Fecha Ensaye: 2017-12-11		
	% Especificado: 100				Localización: CALLE PICO DE GALANA 0+000 AL 0+070				
	A		I	15	1951	1940	12,9	10,6	100,60
	B		C	15	1963	1940	12,9	9,8	101,20
	C		D	15	1981	1940	12,9	10,1	102,10
	D		I	15	1947	1940	12,9	10,3	100,40
	E		C	15	1958	1940	12,9	9,9	100,90
	F		D	15	1967	1940	12,9	10,0	101,40
Promedio de Compactación:									101,10

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC.DOMINIO

177	Prueba: 1				Tipo de Capa: SUBRASANTE MAT.DE LUGAR		Fecha Ensaye: 2017-12-11		
	% Especificado: 95				Localización: CIRCUITO VISTA DE LA CANTERA				
	A		I	20	1820	1914	11,0	9,8	95,10
	B		C	20	1836	1914	11,0	10,2	95,90
	C		D	20	1851	1914	11,0	9,5	96,70
	D		I	20	1821	1914	11,0	10,0	95,10
	E		C	20	1830	1914	11,0	9,6	95,60
	F		D	20	1850	1914	11,0	9,1	96,70
	G		I	20	1821	1914	11,0	10,0	95,10
Promedio de Compactación:									95,74

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS CUMPLEN CON EL ESPECIFICADO.

Observaciones: FRACC.VISTAS DE LAS LOMAS

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe.

LCO-COMP
Página 63 de 63


CILINDROS DE CONCRETO - OBRA TERMINADA

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO
 CLIENTE: DESARROLLO URBANO
 REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL
 LOCALIDAD: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
 CONTRATISTA:

Fecha Informe:
 2017-12-13

No.	Cil	Elemento Edad (dias)	Rev. (cm)	Resis (kgf/cm ²)	Localización FC_P (kgf/cm ²)	% Resist	Vibrado	Equipo de Mezcla Aditivo	Fecha Colado
19		BANQUETA PUBLICA L/IZQ			CALLE CIRCUITO DE GELA			GCC	
	A	7	11,0	131,6	200	65,8	No	NO	2017-10-03
	B	28	11,0	208,1	200	104,0	No	NO	2017-10-03
	C	28	11,0	223,6	200	111,8	No	NO	2017-10-03
20		BANQUETA PUBLICA L/IZQ			CALLE LLANURA SIEMPRE			GCC	
	A	7	12,0	136,4	200	68,2	No	NO	2017-10-04
	B	28	12,0	205,3	200	102,7	No	NO	2017-10-04
	C	28	12,0	222,5	200	111,3	No	NO	2017-10-04
21		BANQUETA PUBLICA L/DER			CALLE LLANURA COATILLO			GCC	
	A	7	10,0	147,4	200	73,7	Si	NO	2017-10-04
	B	28	10,0	202,0	200	101,0	Si	NO	2017-10-04
	C	28	10,0	214,0	200	107,0	Si	NO	2017-10-04
22		GUARNICION L/DER			CALLE LLANURA COATILLO			GCC	
	A	7	12,0	133,2	200	66,6	No	NO	2017-10-05
	B	28	12,0	208,4	200	104,2	No	NO	2017-10-05
	C	28	12,0	219,0	200	109,5	No	NO	2017-10-05
23		GUARNICION			L/IZQ CUERPO DER.			GCC	
	A	7	12,0	136,8	200	68,4	Si	NO	2017-10-11
	B	28	12,0	201,1	200	100,6	Si	NO	2017-10-11
	C	28	12,0	211,8	200	105,9	Si	NO	2017-10-11
24		BANQUETA PUBLICA			L/DER CALLE CIRCUITO VISTA			GCC	
	A	7	12,0	131,3	200	65,7	Si	NO	2017-10-13
	B	28	12,0	201,3	200	100,6	Si	NO	2017-10-13
	C	28	12,0	212,7	200	106,3	Si	NO	2017-10-13

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
 GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización del laboratorio.

LCO-CI-OT
 Pagina 4 de 18


CILINDROS DE CONCRETO - OBRA TERMINADA

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO
 CLIENTE: DESARROLLO URBANO
 REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL
 LOCALIDAD: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
 CONTRATISTA:

Fecha Informe:
 2017-12-13

No.	Cil	Elemento Edad (días)	Rev. (cm)	Resis (kgf/cm ²)	Localización FC_P (kgf/cm ²)	% Resist	Vibrado	Equipo de Mezcla Aditivo	Fecha Colado
25		BANQUETA PUBLICA			L/DER CALLE VISTA ROCHA			GCC	
	A	7	12,0	143,4	200	71,7	No	NO	2017-10-13
	B	28	12,0	218,4	200	109,2	No	NO	2017-10-13
	C	28	12,0	207,3	200	103,7	No	NO	2017-10-13
26		BANQUETA PUBLICA			L/IZQ Y CUERPO IZQ			GCC	
	A	7	11,0	99,6	150	66,4	No	NO	2017-10-13
	B	28	11,0	152,8	150	101,9	No	NO	2017-10-13
	C	28	11,0	168,3	150	112,2	No	NO	2017-10-13
27		BANQUETRA PUBLICA			L/DER CALLE VIÑEDO			GCC	
	A	7	11,0	111,0	150	74,0	No	NO	2017-10-13
	B	28	11,0	174,8	150	116,5	No	NO	2017-10-13
	C	28	11,0	160,8	150	107,2	No	NO	2017-10-13
28		BANQUETA PUBLICA L/DER			CALLE CIRCUITO DE GELA			GCC	
	A	7	11,0	132,1	200	66,0	Si	NO	2017-10-10
	B	28	11,0	221,2	200	110,6	Si	NO	2017-10-10
	C	28	11,0	209,1	200	104,6	Si	NO	2017-10-10
29		BANQUETA PUBLICA			L/IZQ CALLE RIO TURIA			GCC	
	A	7	11,0	138,7	200	69,3	Si	NO	2017-10-17
	B	28	11,0	201,0	200	100,5	Si	NO	2017-10-17
	C	28	11,0	210,6	200	105,3	Si	NO	2017-10-17
30		BANQUETA PUBLICA			L/DER CALLE RIO TORMES			GCC	
	A	7	12,0	141,5	200	70,8	Si	NO	2017-10-17
	B	28	12,0	220,4	200	110,2	Si	NO	2017-10-17
	C	28	12,0	205,7	200	102,8	Si	NO	2017-10-17

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
 GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización del laboratorio.


CILINDROS DE CONCRETO - OBRA TERMINADA

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO
 CLIENTE: DESARROLLO URBANO
 REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL
 LOCALIDAD: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
 CONTRATISTA:

Fecha Informe:
 2017-12-13

No.	Cil	Elemento Edad (días)	Rev. (cm)	Resis (kgf/cm ²)	Localización FC_P (kgf/cm ²)	% Resist	Vibrado	Equipo de Mezcla Aditivo	Fecha Colado
31		GUARNICION L/IZQ Y DER			CALLE VALLE DEL MAR			GCC	
	A	7	11,0	135,8	200	67,9	No	NO	2017-10-18
	B	28	11,0	207,7	200	103,8	No	NO	2017-10-18
	C	28	11,0	222,0	200	111,0	No	NO	2017-10-18
32		GUARNICION L/IZQ Y DER			CALLE VALLE DEL MAR			GCC	
	A	7	12,0	144,3	200	72,2	No	NO	2017-10-18
	B	28	12,0	202,3	200	101,2	No	NO	2017-10-18
	C	28	12,0	212,5	200	106,2	No	NO	2017-10-18
33		GUARNICION L/IZQ			CALLE LLANURA SABIA			GCC	
	A	7	11,0	132,7	200	66,3	No	NO	2017-10-21
	B	28	11,0	207,8	200	103,9	No	NO	2017-10-21
	C	28	11,0	200,3	200	100,1	No	NO	2017-10-21
34		GUARNICION L/IZQ			CALLE MARACUYA			GCC	
	A	7	11,0	137,4	200	68,7	No	NO	2017-10-24
	B	28	11,0	207,7	200	103,8	No	NO	2017-10-24
	C	28	11,0	219,5	200	109,7	No	NO	2017-10-24
35		GUARNICION L/DER			AV.DESARROLLO 0+000 AL			GCC	
	A	7	12,0	142,2	200	71,1	No	NO	2017-10-24
	B	28	12,0	201,7	200	100,8	No	NO	2017-10-24
	C	28	12,0	213,4	200	106,7	No	NO	2017-10-24
36		GUARNICION L/IZQ			CALLE VALUARTE			GCC	
	A	7	7,0	138,4	200	69,2	No	NO	2017-10-25
	B	28	7,0	218,0	200	109,0	No	NO	2017-10-25
	C	28	7,0	205,5	200	102,8	No	NO	2017-10-25

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
 GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización del laboratorio.


CILINDROS DE CONCRETO - OBRA TERMINADA

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO
 CLIENTE: DESARROLLO URBANO
 REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL
 LOCALIDAD: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
 CONTRATISTA:

Fecha Informe:
 2017-12-13

No.	Cil	Elemento Edad (dias)	Rev. (cm)	Resis (kgf/cm²)	Localización FC_P (kgf/cm²)	% Resist	Vibrado	Equipo de Mezcla Aditivo	Fecha Colado
37		GUARNICION L/IZQ			CALLE LUNA AMADIA			AMERICAS	
	A	7	11,0	147,1	200	73,6	No	NO	2017-10-25
	B	28	11,0	202,0	200	101,0	No	NO	2017-10-25
	C	28	11,0	212,9	200	106,4	No	NO	2017-10-25
38		GUARNICION L/DER			CALLE VALLE DEL TRENT			GCC	
	A	7	12,0	133,0	200	66,5	No	NO	2017-10-25
	B	28	12,0	203,7	200	101,9	No	NO	2017-10-25
	C	28	12,0	219,1	200	109,6	No	NO	2017-10-25
39		GUARNICION L/IZQ			CALLE VALLE DEL TRENT			GCC	
	A	7	12,0	132,1	200	66,0	No	NO	2017-10-26
	B	28	12,0	203,6	200	101,8	No	NO	2017-10-26
	C	28	12,0	214,3	200	107,2	No	NO	2017-10-26
40		BANQUETA PUBLICA			CALLE CIRCUITO VALLE DE			GCC	
	A	7	13,0	108,0	150	72,0	No	NO	2017-10-26
	B	28	13,0	163,3	150	108,9	No	NO	2017-10-26
	C	28	13,0	171,4	150	114,3	No	NO	2017-10-26
41		GUARNICION L/IZQ Y DER			CALLE VISTA DE LA CIMA			GCC	
	A	7	11,0	132,0	200	66,0	No	NO	2017-10-27
	B	28	11,0	200,7	200	100,4	No	NO	2017-10-27
	C	28	11,0	210,3	200	105,2	No	NO	2017-10-27
42		BANQUETA PUBLICA			L/IZQ CUERPO IZQ			GCC	
	A	7	12,0	153,7	200	76,8	No	NO	2017-10-27
	B	28	12,0	217,1	200	108,6	No	NO	2017-10-27
	C	28	12,0	202,8	200	101,4	No	NO	2017-10-27

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
 GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especimenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización del laboratorio.


CILINDROS DE CONCRETO - OBRA TERMINADA

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO
 CLIENTE: DESARROLLO URBANO
 REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL
 LOCALIDAD: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
 CONTRATISTA:

Fecha Informe:
 2017-12-13

No.	Cil	Elemento		Resis (kgf/cm ²)	Localización		Equipo de Mezcla		Fecha Colado
		Edad (días)	Rev. (cm)		FC_P (kgf/cm ²)	% Resist	Vibrado	Aditivo	
43		BANQUETA PUBLICA L/DER			CALLE REAL DE ASTURIA		GCC		
	A	7	12,0	137,8	200	68,9	Si	NO	2017-10-27
	B	28	12,0	208,5	200	104,2	Si	NO	2017-10-27
	C	28	12,0	222,2	200	111,1	Si	NO	2017-10-27
44		GUARNICION L/DER			CALLE VISTA DE LA CIMA		GCC		
	A	7	11,0	142,0	200	71,0	No	NO	2017-10-28
	B	28	11,0	217,6	200	108,8	No	NO	2017-10-28
	C	28	11,0	203,7	200	101,9	No	NO	2017-10-28
45		BANQUETA PUBLICA L/IZQ			CALLE CIRCUITO VALLE DE		GCC		
	A	7	12,0	109,1	150	72,7	No	NO	2017-10-28
	B	28	12,0	152,0	150	101,3	No	NO	2017-10-28
	C	28	12,0	163,7	150	109,1	No	NO	2017-10-28
46		BANQUETA PUBLICA L/IZQ			CUERPO IZQ.AV.PORTAL DE		GCC		
	A	7	12,0	145,3	200	72,6	No	NO	2017-10-31
	B	28	12,0	208,4	200	104,2	No	NO	2017-10-31
	C	28	12,0	223,1	200	111,6	No	NO	2017-10-31
47		BANQUETA PUBLICA			L/DER CALLE REAL DE CARDO		GCC		
	A	7	11,0	133,0	200	66,5	No	NO	2017-10-31
	B	28	11,0	201,7	200	100,8	No	NO	2017-10-31
	C	28	11,0	217,8	200	108,9	No	NO	2017-10-31
48		BANQUETA PUBLICA			L/IZQ CALLE REAL DE ASALIA		GCC		
	A	7	11,0	149,9	200	75,0	No	NO	2017-10-31
	B	28	11,0	203,0	200	101,5	No	NO	2017-10-31
	C	28	11,0	214,6	200	107,3	No	NO	2017-10-31

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
 GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización del laboratorio.

LCO-CI-OT
 Pagina 8 de 18


CILINDROS DE CONCRETO - OBRA TERMINADA

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO
 CLIENTE: DESARROLLO URBANO
 REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL
 LOCALIDAD: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
 CONTRATISTA:

Fecha Informe:
 2017-12-13

No.	Cil	Elemento Edad (días)	Rev. (cm)	Resis (kgf/cm²)	Localización FC_P (kgf/cm²)	% Resist	Vibrado	Equipo de Mezcla Aditivo	Fecha Colado
49		GUARNICION L/DER			CALLE RIO UCAYAUI			GCC	
	A	7	12,0	137,8	200	68,9	No	NO	2017-10-31
	B	28	12,0	206,7	200	103,3	No	NO	2017-10-31
	C	28	12,0	218,5	200	109,2	No	NO	2017-10-31
50		BANQUETA PUBLICA			L/DER CALLE RIO SONORA			GCC	
	A	7	11,0	132,0	200	66,0	Si	NO	2017-10-31
	B	28	11,0	200,7	200	100,3	Si	NO	2017-10-31
	C	28	11,0	210,8	200	105,4	Si	NO	2017-10-31
51		BANQUETA PUBLICA L/IZQ			CALLE PASEOS DE LOS			GCC	
	A	7	11,0	98,5	150	65,6	Si	NO	2017-11-01
	B	28	11,0	151,0	150	100,7	Si	NO	2017-11-01
	C	28	11,0	160,8	150	107,2	Si	NO	2017-11-01
52		GUARNICION L/IZQ			CIRCUITO VISTA DEL			GCC	
	A	7	12,0	144,2	200	72,1	No	NO	2017-11-01
	B	28	12,0	221,2	200	110,6	No	NO	2017-11-01
	C	28	12,0	210,0	200	105,0	No	NO	2017-11-01
53		GUARNICION L/IZQ			CUERPO IZQ. AV.PASEOS			GCC	
	A	7	12,0	132,0	200	66,0	No	NO	2017-11-01
	B	28	12,0	203,0	200	101,5	No	NO	2017-11-01
	C	28	12,0	218,6	200	109,3	No	NO	2017-11-01
54		GUARNICION L/IZQ			CALLE PUERTO VARAS			GCC	
	A	7	12,0	148,5	200	74,3	No	NO	2017-11-01
	B	28	12,0	209,4	200	104,7	No	NO	2017-11-01
	C	28	12,0	200,8	200	100,4	No	NO	2017-11-01

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
 GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización del laboratorio.


CILINDROS DE CONCRETO - OBRA TERMINADA

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO
 CLIENTE: DESARROLLO URBANO
 REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL
 LOCALIDAD: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
 CONTRATISTA:

Fecha Informe:
 2017-12-13

No.	Cil	Elemento Edad (días)	Rev. (cm)	Resis (kgf/cm ²)	Localización FC_P (kgf/cm ²)	% Resist	Vibrado	Equipo de Mezcla Aditivo	Fecha Colado
55		GUARNICION L/DER			CALLE CALAMA			GCC	
	A	7	11,0	137,9	200	68,9	No	NO	2017-11-01
	B	28	11,0	225,8	200	112,9	No	NO	2017-11-01
	C	28	11,0	210,4	200	105,2	No	NO	2017-11-01
56		GUARNICION L/DER			CALLE CALLE DEL MAR L/SUR			GCC	
	A	7	11,0	142,7	200	71,3	No	NO	2017-11-01
	B	28	11,0	203,8	200	101,9	No	NO	2017-11-01
	C	28	11,0	214,8	200	107,4	No	NO	2017-11-01
57		GUARNICION L/DER			CALLE RIO CHAMBIAL			GCC	
	A	7	11,0	153,7	200	76,9	No	NO	2017-11-03
	B	28	11,0	213,2	200	106,6	No	NO	2017-11-03
	C	28	11,0	222,2	200	111,1	No	NO	2017-11-03
58		BANQUETA PUBLICA L/IZQ			CALLE RIO SONORA			GCC	
	A	7	12,0	132,1	200	66,0	No	NO	2017-11-03
	B	28	12,0	202,3	200	101,1	No	NO	2017-11-03
	C	28	12,0	213,4	200	106,7	No	NO	2017-11-03
59		GUARNICION L/DER			CIRCUITO LUNA FUERTE			GCC	
	A	7	11,0	145,8	200	72,9	No	NO	2017-11-03
	B	28	11,0	202,7	200	101,3	No	NO	2017-11-03
	C	28	11,0	219,4	200	109,7	No	NO	2017-11-03
60		BANQUETA PUBLICA L/DER			CALLE VIÑEDOS BALDUZZI			GCC	
	A	7	13,0	111,3	150	74,2	No	NO	2017-11-03
	B	28	13,0	157,0	150	104,7	No	NO	2017-11-03
	C	28	13,0	167,9	150	111,9	No	NO	2017-11-03

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
 GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización del laboratorio.

LCO-CI-OT
 Pagina 10 de 18

CILINDROS DE CONCRETO - OBRA TERMINADA

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO

CLIENTE: DESARROLLO URBANO

REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL


LOCALIDAD: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

CONTRATISTA:

Fecha Informe:
2017-12-13

No.	Cil	Elemento Edad (días)	Rev. (cm)	Resis (kgf/cm²)	Localización FC_P (kgf/cm²)	% Resist	Vibrado	Equipo de Mezcla Aditivo	Fecha Colado
61		BANQUETA PUBLICA L/DER			CALLE REAL DE ASALIA			GCC	
	A	7	12,0	99,7	150	66,4	No	NO	2017-11-06
	B	28	12,0	152,6	150	101,7	No	NO	2017-11-06
	C	28	12,0	162,1	150	108,0	No	NO	2017-11-06
62		BANQUETA PUBLICA L/DER			CALLE TARENTO			GCC	
	A	7	11,0	106,1	150	70,7	No	NO	2017-11-06
	B	28	11,0	169,8	150	113,2	No	NO	2017-11-06
	C	28	11,0	155,3	150	103,5	No	NO	2017-11-06
63		BANQUETA PUBLICA L/IZQ			AV.BOSQUE DEL REAL			GCC	
	A	7	11,0	106,6	150	71,1	No	NO	2017-11-08
	B	28	11,0	169,7	150	113,2	No	NO	2017-11-08
	C	28	11,0	160,3	150	106,9	No	NO	2017-11-08
64		GUARNICION L/DER			CUERPO DER AV. MICRON			GCC	
	A	7	12,0	132,8	200	66,4	No	NO	2017-11-08
	B	28	12,0	210,7	200	105,4	No	NO	2017-11-08
	C	28	12,0	200,4	200	100,2	No	NO	2017-11-08
65		GUARNICION L/DER			CIRCUITO CALICANTO			GCC	
	A	7	11,0	149,1	200	74,6	No	NO	2017-11-08
	B	28	11,0	219,1	200	109,6	No	NO	2017-11-08
	C	28	11,0	202,3	200	101,2	No	NO	2017-11-08
66		GUARNICION L/DER			0+060 AL 0+100			GCC	
	A	7	12,0	135,9	200	68,0	No	NO	2017-11-08
	B	28	12,0	208,0	200	104,0	No	NO	2017-11-08
	C	28	12,0	223,6	200	111,8	No	NO	2017-11-08

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización del laboratorio.

LCO-CI-OT
Pagina 11 de 18


CILINDROS DE CONCRETO - OBRA TERMINADA

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO
 CLIENTE: DESARROLLO URBANO
 REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL
 LOCALIDAD: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
 CONTRATISTA:

Fecha Informe:
 2017-12-13

No.	Cil	Elemento Edad (días)	Rev. (cm)	Resis (kgf/cm²)	Localización FC_P (kgf/cm²)	% Resist	Vibrado	Equipo de Mezcla Aditivo	Fecha Colado
67		GUARNICION L/IZQ Y DER			CIRCUITO VISTA DE SENDERO			GCC	
	A	7	11,0	142,7	200	71,3	No	NO	2017-11-08
	B	28	11,0	216,2	200	108,1	No	NO	2017-11-08
	C	28	11,0	201,6	200	100,8	No	NO	2017-11-08
68		GUARNICION L/DER			CALLE CIRCUITO RIO			GCC	
	A	7	10,0	137,2	200	68,6	No	NO	2017-11-09
	B	28	10,0	202,1	200	101,1	No	NO	2017-11-09
	C	28	10,0	218,6	200	109,3	No	NO	2017-11-09
69		GUARNICION L/DER			CALLE CIRCUITO RIO			GCC	
	A	7	12,0	145,5	200	72,8	No	NO	2017-11-09
	B	28	12,0	222,4	200	111,2	No	NO	2017-11-09
	C	28	12,0	207,7	200	103,8	No	NO	2017-11-09
70		BANQUETA PUBLICA L/IZQ			CALLE RIO TORMES			GCC	
	A	7	11,0	99,0	150	66,0	No	NO	2017-11-09
	B	28	11,0	163,1	150	108,7	No	NO	2017-11-09
	C	28	11,0	174,8	150	116,5	No	NO	2017-11-09
71		BANQUETA PUBLICA L/DER			CALLE CIRCUITO TEATRO LA			GCC	
	A	7	11,0	110,8	150	73,9	No	NO	2017-11-09
	B	28	11,0	160,8	150	107,2	No	NO	2017-11-09
	C	28	11,0	150,3	150	100,2	No	NO	2017-11-09
72		GUARNICION L/DER			CIRCUITO VISTAS DEL			GCC	
	A	7	11,0	137,3	200	68,6	Si	NO	2017-11-13
	B	28	11,0	226,8	200	113,4	Si	NO	2017-11-13
	C	28	11,0	211,4	200	105,7	Si	NO	2017-11-13

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
 GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización del laboratorio.


CILINDROS DE CONCRETO - OBRA TERMINADA

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO
 CLIENTE: DESARROLLO URBANO
 REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL
 LOCALIDAD: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
 CONTRATISTA:

Fecha Informe:
 2017-12-13

No.	Cil	Elemento Edad (dias)	Rev. (cm)	Resis (kgf/cm²)	Localización FC_P (kgf/cm²)	% Resist	Vibrado	Equipo de Mezcla Aditivo	Fecha Colado
73		BANQUETA PUBLICA L/IZQ			CALLE REAL DE ASALIA			GCC	
	A	7	12,0	103,2	150	68,8	Si	NO	2017-11-14
	B	28	12,0	150,3	150	100,2	Si	NO	2017-11-14
	C	28	12,0	159,8	150	106,5	Si	NO	2017-11-14
74		GUARNICION L/DER			CALLE SIDRA			GCC	
	A	7	11,0	132,2	200	66,1	No	NO	2017-11-14
	B	28	11,0	220,7	200	110,4	No	NO	2017-11-14
	C	28	11,0	206,3	200	103,1	No	NO	2017-11-14
75		GUARNICION L/DER			CIRCUITO MARSAL L/ORIENTE			GCC	
	A	7	11,0	145,7	200	72,9	No	NO	2017-11-14
	B	28	11,0	202,0	200	101,0	No	NO	2017-11-14
	C	28	11,0	219,1	200	109,6	No	NO	2017-11-14
76		GUARNICION L/IZQ			CIRCUITO MARSAL			GCC	
	A	7	12,0	135,4	200	67,7	No	NO	2017-11-14
	B	28	12,0	212,2	200	106,1	No	NO	2017-11-14
	C	28	12,0	220,4	200	110,2	No	NO	2017-11-14
77		BANQUETA PUBLICA L/IZQ			CALLE VIÑEDOS VILLARINO			GCC	
	A	7	12,0	106,6	150	71,0	No	NO	2017-11-22
	B	28	12,0	0,0	150	0,0	No	NO	2017-11-22
	C	28	12,0	0,0	150	0,0	No	NO	2017-11-22
78		GUARNICION L/IZQ			CALLE CIRCUITO DE SIDRA			GCC	
	A	7	12,0	135,8	200	67,9	No	NO	2017-11-22
	B	28	12,0	0,0	200	0,0	No	NO	2017-11-22
	C	28	12,0	0,0	200	0,0	No	NO	2017-11-22

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
 GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización del laboratorio.

LCO-CI-OT
 Pagina 13 de 18


CILINDROS DE CONCRETO - OBRA TERMINADA

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO
 CLIENTE: DESARROLLO URBANO
 REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL
 LOCALIDAD: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
 CONTRATISTA:

Fecha Informe:
 2017-12-13

No.	Cil	Elemento Edad (dias)	Rev. (cm)	Resis (kgf/cm ²)	Localización FC_P (kgf/cm ²)	% Resist	Equipo de Mezcla Aditivo	Fecha Colado
79								
		GUARNICION L/DER Y IZQ			CALLE CIRCUITO SIDRA		GCC	
	A	7	11,0	144,5	200	72,3	No	2017-11-22
	B	28	11,0	0,0	200	0,0	No	2017-11-22
	C	28	11,0	0,0	200	0,0	No	2017-11-22
80								
		BANQUETA PUBLICA L/DER			CALLE CIRCUITO SIDRA		GCC	
	A	7	12,0	101,2	150	67,4	No	2017-11-22
	B	28	12,0	0,0	150	0,0	No	2017-11-22
	C	28	12,0	0,0	150	0,0	No	2017-11-22
81								
		BANQUETA PUBLICA L/DER			AV. QUINTA REAL		GCC	
	A	7	11,0	108,8	150	72,5	No	2017-11-22
	B	28	11,0	0,0	150	0,0	No	2017-11-22
	C	28	11,0	0,0	150	0,0	No	2017-11-22
82								
		GURNICION L/DER			CALLE CIRCUITO MARSAL		GCC	
	A	7	12,0	131,6	200	65,8	No	2017-11-22
	B	28	12,0	0,0	200	0,0	No	2017-11-22
	C	28	12,0	0,0	200	0,0	No	2017-11-22
83								
		BANQUETA PUBLICA L/IZQ			CALLE LLANURA SABAL L/SUR		GCC	
	A	7	12,0	110,8	150	73,9	No	2017-11-23
	B	28	12,0	0,0	150	0,0	No	2017-11-23
	C	28	12,0	0,0	150	0,0	No	2017-11-23
84								
		BANQUETA PUBLICA L/DER			CALLE LLANURA SABAL		GCC	
	A	7	11,0	100,7	150	67,2	No	2017-11-23
	B	28	11,0	0,0	150	0,0	No	2017-11-23
	C	28	11,0	0,0	150	0,0	No	2017-11-23

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
 GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización del laboratorio.

LCO-CI-OT
 Pagina 14 de 18


CILINDROS DE CONCRETO - OBRA TERMINADA

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO
 CLIENTE: DESARROLLO URBANO
 REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL
 LOCALIDAD: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
 CONTRATISTA:

Fecha Informe:
 2017-12-13

No.	Cil	Elemento Edad (días)	Rev. (cm)	Resis (kgf/cm ²)	Localización FC_P (kgf/cm ²)	% Resist	Vibrado	Equipo de Mezcla Aditivo	Fecha Colado
85		GUARNICION L/IZQ			CUERPO DER.CIRCUITO			GCC	
	A	7	12,0	131,1	200	65,5	No	NO	2017-11-16
	B	28	12,0	0,0	200	0,0	No	NO	2017-11-16
	C	28	12,0	0,0	200	0,0	No	NO	2017-11-16
86		BANQUETA PUBLICA L/DER			CALLE RIO UCAYO			GCC	
	A	7	12,0	100,1	150	66,7	No	NO	2017-11-24
	B	28	12,0	0,0	150	0,0	No	NO	2017-11-24
	C	28	12,0	0,0	150	0,0	No	NO	2017-11-24
87		BANQUETA PUBLICA L/IZQ			CIRCUITO MOLINO NAVAL			GCC	
	A	7	11,0	109,8	150	73,2	Si	NO	2017-11-24
	B	28	11,0	0,0	150	0,0	Si	NO	2017-11-24
	C	28	11,0	0,0	150	0,0	Si	NO	2017-11-24
88		GUARNICION L/DER			CALLE CIRCUITO ALTOZANO			GCC	
	A	7	12,0	132,0	200	66,0	No	NO	2017-11-28
	B	28	12,0	0,0	200	0,0	No	NO	2017-11-28
	C	28	12,0	0,0	200	0,0	No	NO	2017-11-28
89		GUARNICION L/IZQ Y DER			CALLE CICUITO VIATAS DE			GCC	
	A	7	11,0	145,5	200	72,7	No	NO	2017-11-28
	B	28	11,0	0,0	200	0,0	No	NO	2017-11-28
	C	28	11,0	0,0	200	0,0	No	NO	2017-11-28
90		GUARNICION L/DER Y IZQ			CALLE CIRCUITO VISTA DE			GCC	
	A	7	10,0	135,3	200	67,6	No	NO	2017-11-28
	B	28	10,0	0,0	200	0,0	No	NO	2017-11-28
	C	28	10,0	0,0	200	0,0	No	NO	2017-11-28

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
 GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización del laboratorio.

LCO-CI-OT
 Pagina 15 de 18


CILINDROS DE CONCRETO - OBRA TERMINADA

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO
 CLIENTE: DESARROLLO URBANO
 REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL
 LOCALIDAD: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
 CONTRATISTA:

Fecha Informe:
 2017-12-13

No.	Cil	Elemento		Resis (kgf/cm²)	Localización		Equipo de Mezcla		Fecha Colado
		Edad (días)	Rev. (cm)		FC_P (kgf/cm²)	% Resist	Vibrado	Aditivo	
91		GUARNICION L/DER			CALLE CIRCUITO VISTA DE		GCC		
	A	7	12,0	141,7	200	70,8	No	NO	2017-11-28
	B	28	12,0	0,0	200	0,0	No	NO	2017-11-28
	C	28	12,0	0,0	200	0,0	No	NO	2017-11-28
92		GUARNICION L/DER			CALLE CIRCUITO DE MARSAL		GCC		
	A	7	12,0	131,6	200	65,8	No	NO	2017-11-29
	B	28	12,0	0,0	200	0,0	No	NO	2017-11-29
	C	28	12,0	0,0	200	0,0	No	NO	2017-11-29
93		GUARNICION L/IZQ			CALLE CIRCUITO DE MARSAL		GCC		
	A	7	11,0	147,7	200	73,8	No	NO	2017-11-29
	B	28	11,0	0,0	200	0,0	No	NO	2017-11-29
	C	28	11,0	0,0	200	0,0	No	NO	2017-11-29
94		GUARNICION L/IZQ			CALLE RIO BOLAÑOS		GCC		
	A	7	10,0	143,4	200	71,7	No	NO	2017-11-30
	B	28	10,0	0,0	200	0,0	No	NO	2017-11-30
	C	28	10,0	0,0	200	0,0	No	NO	2017-11-30
95		GUARNICION L/DER			CALLE RIO TEGUANTEPEK		GCC		
	A	7	12,0	134,3	200	67,2	No	NO	2017-11-30
	B	28	12,0	0,0	200	0,0	No	NO	2017-11-30
	C	28	12,0	0,0	200	0,0	No	NO	2017-11-30
96		GUARNICION L/IZQ Y DER			CALLE RIO TEUNTEPEK		GCC		
	A	7	11,0	148,7	200	74,3	No	NO	2017-11-30
	B	28	11,0	0,0	200	0,0	No	NO	2017-11-30
	C	28	11,0	0,0	200	0,0	No	NO	2017-11-30

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
 GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización del laboratorio.

LCO-CI-OT
 Pagina 16 de 18


CILINDROS DE CONCRETO - OBRA TERMINADA

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO
 CLIENTE: DESARROLLO URBANO
 REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL
 LOCALIDAD: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
 CONTRATISTA:

Fecha Informe:
 2017-12-13

No.	Cil	Elemento Edad (días)	Rev. (cm)	Resls (kgf/cm²)	Localización FC_P (kgf/cm²)	% Resist	Vibrado	Equipo de Mezcla Aditivo	Fecha Colado
97		GUARNICION L/DER			CALLE RIO PANTEPEK			GCC	
	A	7	12,0	137,6	200	68,8	No	NO	2017-11-30
	B	28	12,0	0,0	200	0,0	No	NO	2017-11-30
	C	28	12,0	0,0	200	0,0	No	NO	2017-11-30
98		GUARNICION EN GLORIETA			CALLE HDA LOS MORALES			GCC	
	A	7	12,0	132,4	200	66,2	No	NO	2017-12-05
	B	28	12,0	0,0	200	0,0	No	NO	2017-12-05
	C	28	12,0	0,0	200	0,0	No	NO	2017-12-05
99		GUARNICION L/DER			CUERPO DER 0+100 AL			GCC	
	A	7	11,0	141,4	200	70,7	No	NO	2017-12-05
	B	28	11,0	0,0	200	0,0	No	NO	2017-12-05
	C	28	11,0	0,0	200	0,0	No	NO	2017-12-05
100		BANQUETA PUBLICA L/DER			CALLE LLANURA COLORIN			GCC	
	A	7	11,0	109,9	150	73,2	No	NO	2017-12-05
	B	28	11,0	0,0	150	0,0	No	NO	2017-12-05
	C	28	11,0	0,0	150	0,0	No	NO	2017-12-05
101		BANQUETA PUBLICA L/IZQ			CALLE LLANURA COLORIN			GCC	
	A	7	12,0	99,0	150	66,0	No	NO	2017-12-05
	B	28	12,0	0,0	150	0,0	No	NO	2017-12-05
	C	28	12,0	0,0	150	0,0	No	NO	2017-12-05
102		BANQUETA PUBLICA L/IZQ			CALLE LLANURA SABAL			GCC	
	A	7	12,0	103,9	150	69,2	No	NO	2017-12-05
	B	28	12,0	0,0	150	0,0	No	NO	2017-12-05
	C	28	12,0	0,0	150	0,0	No	NO	2017-12-05

ATENTAMENTE:



ING. MYRNA IBARRA APARICIO
 GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización del laboratorio.

LCO-CI-OT
 Pagina 17 de 18

**LABORATORIO Y CONSULTORIA, S.A.DE C.V.**

CALLE MANUEL GARCIA GARCIA NO. 10102 COL. COL.DEPORTISTAS 614 4170033 Chihuahua Chihuahua. 31125

CILINDROS DE CONCRETO - OBRA TERMINADA**OBRA:** 406 DESARROLLO URBANO**CLIENTE:** DESARROLLO URBANO**Fecha Informe:**

2017-12-13

REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL**LOCALIDAD:** CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.**CONTRATISTA:**

No.	Cil	Elemento Edad (dias)	Rev. (cm)	Resis (kgf/cm ²)	Localización FC_P (kgf/cm ²)	% Resist	Vibrado	Equipo de Mezcla Aditivo	Fecha Colado
103		BANQUETA PUBLICA L/DER			CALLE MARACUYA			GCC	
	A	7	11,0	101,5	150	67,6	No	NO	2017-12-06
	B	28	11,0	0,0	150	0,0	No	NO	2017-12-06
	C	28	11,0	0,0	150	0,0	No	NO	2017-12-06
104		BANQUETA PUBLICA L/IZQ			CALLE RIO SONOYTA			GCC	
	A	7	12,0	110,9	150	73,9	No	NO	2017-12-11
	B	28	12,0	0,0	150	0,0	No	NO	2017-12-11
	C	28	12,0	0,0	150	0,0	No	NO	2017-12-11
105		GUARNICION L/IZQ			CALLE CIRCUITO DEL			GCC	
	A	7	11,0	131,2	200	65,6	No	NO	2017-12-11
	B	28	11,0	0,0	200	0,0	No	NO	2017-12-11
	C	28	11,0	0,0	200	0,0	No	NO	2017-12-11

INFORME DE OBRA TERMINADA - VIGAS DE CONCRETO.

METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: NMX-C-161, 160, 156, 157, 162, 191 Y ASTM-C-1064 VIGENTES

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO
CLIENTE: DESARROLLO URBANO
REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL
LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua
CONTRATISTA:

Fecha Informe:
2017-12-13

No.	Elemento	Edad (dias)	Ancho (cm)	Peralte (cm)	Localización	Rev. (cm)	Carga (kgf)	(N)	Equipo de Mezcla	MR	MR_Proy	Aditivo	Fecha	Vibrado
1	LOSA DE CONCRETO	7	15,00	15,00	FRANJA DER DE ESTE A OESTE	12,00	3058,00	29989	40,77	3998,17	42	FIBRA	2017-09-15	Si
	A	7	15,00	15,00	45,00	12,00	3058,00	29989	40,77	3998,17	42	FIBRA	2017-09-15	Si
	B	28	15,00	15,00	45,00	12,00	3822,00	37482	50,96	4997,47	42	FIBRA	2017-09-15	Si
2	LOSA DE CONCRETO	7	15,00	15,00	FRANJA ARLREDEDOR DE GLORIETA CALLE REAL DE ASTURIAS	12,00	3097,00	30372	41,29	4049,17	42	FIBRA	2017-09-22	Si
	A	7	15,00	15,00	45,00	12,00	3097,00	30372	41,29	4049,17	42	FIBRA	2017-09-22	Si
	B	28	15,00	15,00	45,00	12,00	3755,00	36825	50,07	4910,19	42	FIBRA	2017-09-22	Si
3	LOSA DE CONCRETO	7	15,00	15,00	FRANJA 1 DE NORTE A SUR CALLE RIOSA	11,00	2776,00	27224	37,01	3629,44	42	FIBRA	2017-09-23	Si
	A	7	15,00	15,00	45,00	11,00	2776,00	27224	37,01	3629,44	42	FIBRA	2017-09-23	Si
	B	28	15,00	15,00	45,00	11,00	3684,00	36128	49,12	4817,03	42	FIBRA	2017-09-23	Si
4	LOSA DE CONCRETO	7	15,00	15,00	CUERPO DER FRANJA 1	12,00	2993,00	29352	39,91	3913,83	42	FIBRA	2017-10-02	Si
	A	7	15,00	15,00	45,00	12,00	2993,00	29352	39,91	3913,83	42	FIBRA	2017-10-02	Si
	B	28	15,00	15,00	45,00	12,00	3744,00	36717	49,92	4895,48	42	FIBRA	2017-10-02	Si
5	LOSA DE CONCRETO	7	15,00	15,00	CUERPO IZQ FRANJA 1	11,00	3098,00	30382	41,31	4051,13	42	FIBRA	2017-10-02	Si
	A	7	15,00	15,00	45,00	11,00	3098,00	30382	41,31	4051,13	42	FIBRA	2017-10-02	Si
	B	28	15,00	15,00	45,00	11,00	4024,00	39463	53,65	5261,27	42	FIBRA	2017-10-02	Si
6	LOSA DE CONCRETO	7	15,00	15,00	CALLE CIRCUITO TEATRO LA FENICE	13,00	2966,00	29087	39,55	3878,53	42	FIBRA	2017-10-09	Si
	A	7	15,00	15,00	45,00	13,00	2966,00	29087	39,55	3878,53	42	FIBRA	2017-10-09	Si
	B	28	15,00	15,00	45,00	13,00	3805,00	37315	50,73	4974,91	42	FIBRA	2017-10-09	Si
7	LOSA DE CONCRETO	7	15,00	15,00	FRANJA 2 CUERPO IZQ	11,00	2815,00	27606	37,53	3680,44	42	FIBRA	2017-10-11	Si
	A	7	15,00	15,00	45,00	11,00	2815,00	27606	37,53	3680,44	42	FIBRA	2017-10-11	Si
	B	28	15,00	15,00	45,00	11,00	3883,00	38080	51,77	5076,90	42	FIBRA	2017-10-11	Si

ATENTAMENTE:

ING. MARIANA BARRA APARICIO
GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especimenes y/o muestras sometidas a prueba.
Prohibido la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización del laboratorio.

INFORME DE OBRA TERMINADA - VIGAS DE CONCRETO.

METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: NMX-C-161, 160, 156, 157, 162, 191 Y ASTM-C-1064 VIGENTES

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO

CLIENTE: DESARROLLO URBANO

REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

Fecha Informe:

2017-12-13

No.	Elemento	Edad (días)	Ancho (cm)	Peralte (cm)	Localización	Rev. (cm)	Carga (kgf)	(N)	(kgf/cm ²)	Equipo de Mezcla	MR	MR_Proy	Aditivo	Fecha	Vibrado
8	LOSA DE CONCRETO	7	15,00	15,00	FRANJA 1 LDER	12,00	2899,00	28430	38,65	GCC	3790,27	42	FIBRA	2017-10-11	Si
	A	7	15,00	15,00	45,00	12,00	2899,00	28430	38,65	GCC	3790,27	42	FIBRA	2017-10-11	Si
	B	28	15,00	15,00	45,00	12,00	3710,00	36383	49,47	GCC	4851,35	42	FIBRA	2017-10-11	Si
9	LOSA DE CONCRETO	7	15,00	15,00	FRANJA 1 LNORTE	12,00	3075,00	30156	41,00	GCC	4020,73	42	FIBRA	2017-10-11	Si
	A	7	15,00	15,00	45,00	12,00	3075,00	30156	41,00	GCC	4020,73	42	FIBRA	2017-10-11	Si
	B	28	15,00	15,00	45,00	12,00	3610,00	35403	48,13	GCC	4719,94	42	FIBRA	2017-10-11	Si
10	LOSA DE CONCRETO	7	15,00	15,00	FRANJA DER.CIRCUITO PRAVIA	12,00	3057,00	29979	40,76	GCC	3997,19	42	FIBRA	2017-10-12	Si
	A	7	15,00	15,00	45,00	12,00	3057,00	29979	40,76	GCC	3997,19	42	FIBRA	2017-10-12	Si
	B	28	15,00	15,00	45,00	12,00	3875,00	38002	51,67	GCC	5067,10	42	FIBRA	2017-10-12	Si
11	LOSA DE CONCRETO	7	15,00	15,00	FRANJA 3 CIRCUITO PRAVIA LSUR	12,00	2964,00	29067	39,52	GCC	3875,59	42	FIBRA	2017-10-12	Si
	A	7	15,00	15,00	45,00	12,00	2964,00	29067	39,52	GCC	3875,59	42	FIBRA	2017-10-12	Si
	B	28	15,00	15,00	45,00	12,00	3606,00	35364	48,08	GCC	4715,04	42	FIBRA	2017-10-12	Si
12	LOSA DE CONCRETO	7	15,00	15,00	FRANJA DER 0+050 AL 0+100	11,00	3021,00	29626	40,28	GCC	3950,12	42	FIBRA	2017-10-18	Si
	A	7	15,00	15,00	45,00	11,00	3021,00	29626	40,28	GCC	3950,12	42	FIBRA	2017-10-18	Si
	B	28	15,00	15,00	45,00	11,00	4158,00	40777	55,44	GCC	5436,81	42	FIBRA	2017-10-18	Si
13	LOSA DE CONCRETO	7	15,00	15,00	FRANJA 2 LSUR 0+000 AL 0+080	12,00	3095,00	30352	41,27	GCC	4047,20	42	FIBRA	2017-10-26	Si
	A	7	15,00	15,00	45,00	12,00	3095,00	30352	41,27	GCC	4047,20	42	FIBRA	2017-10-26	Si
	B	28	15,00	15,00	45,00	12,00	3824,00	37501	50,99	GCC	5000,41	42	FIBRA	2017-10-26	Si
14	LOSA DE CONCRETO	7	15,00	15,00	FRANJA 2 LSUR 0+040 AL 0+080	11,00	2890,00	28342	38,53	GCC	3778,50	42	FIBRA	2017-10-26	Si
	A	7	15,00	15,00	45,00	11,00	2890,00	28342	38,53	GCC	3778,50	42	FIBRA	2017-10-26	Si
	B	28	15,00	15,00	45,00	11,00	3600,00	35305	48,00	GCC	4707,19	42	FIBRA	2017-10-26	Si

ATENTAMENTE:

ING. MARYNA BARRA APARICIO
GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.
Prohibido la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización del laboratorio.

INFORME DE OBRA TERMINADA - VIGAS DE CONCRETO.

METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: NMX-C-161, 160, 156, 157, 162, 191 Y ASTM-C-1064 VIGENTES

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO

CLIENTE: DESARROLLO URBANO

REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

Fecha Informe:

2017-12-13

No.	Elemento	Edad (días)	Ancho (cm)	Peralte (cm)	Localización	Rev. (cm)	Carga (kgf)	(N)	(kgf/cm²)	Equipo de Mezcla	MR	MR_Proy	Aditivo	Fecha	Vibrado
15	LOSA DE CONCRETO	7	15,00	15,00	FRANJA 2 0+000 AL 0+030	11,00	2715,00	26626	36,20	GCC	3550,01	42	FIBRA	2017-11-01	Si
	A	7	15,00	15,00	45,00	11,00	3561,00	34922	47,48		4656,20	42		2017-11-01	
16	LOSA DE CONCRETO	28	15,00	15,00	FRANJA 2 0+030 AL 0+070	11,00	2641,00	25900	35,21	GCC	3452,92	42	FIBRA	2017-11-01	Si
	A	7	15,00	15,00	45,00	12,00	3824,00	37501	50,99		5000,41	42		2017-11-01	
17	LOSA DE CONCRETO	28	15,00	15,00	FRANJA 1 CUERPO IZQ	12,00	2700,00	26478	36,00	GCC	3530,39	40	FIBRA	2017-11-07	Si
	A	7	15,00	15,00	45,00	11,00	3724,00	36521	49,65		4869,00	40		2017-11-07	
18	LOSA DE CONCRETO	28	15,00	15,00	FRANJA 3 CUERPO IZQ	11,00	2952,00	28950	39,36	GCC	3859,90	40	FIBRA	2017-11-08	Si
	A	7	15,00	15,00	45,00	12,00	3660,00	35893	48,80		4785,65	40		2017-11-08	
19	LOSA DE CONCRETO	28	15,00	15,00	FRANJA 1 CUERPO DER	12,00	2600,00	25498	34,67	GCC	3399,97	42	FIBRA	2017-11-08	Si
	A	7	15,00	15,00	45,00	11,00	3800,00	37266	50,67		4969,03	42		2017-11-08	
20	LOSA DE CONCRETO	28	15,00	15,00	FRANJA 2 CUERPO IZQ	12,00	3100,00	30401	41,33	GCC	4053,09	42	FIBRA	2017-11-08	Si
	A	7	15,00	15,00	45,00	12,00	3594,00	35246	47,92		4699,35	42		2017-11-08	
21	LOSA DE CONCRETO	28	15,00	15,00	FRANJA 3 CUERPO IZQ	11,00	2800,00	27459	37,33	GCC	3660,82	40	FIBRA	2017-11-09	Si
	A	7	15,00	15,00	45,00	11,00	3720,00	36482	49,60		4864,10	40		2017-11-09	

ATENTAMENTE:

ING. MYRNA IBARRA APARICIO
GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.
Prohibido la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización del laboratorio.

INFORME DE OBRA TERMINADA - VIGAS DE CONCRETO.

MÉTODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: NMX-C-161, 160, 156, 157, 162, 191 Y ASTM-C-1064 VIGENTES

OBRA: 406 DESARROLLO URBANO

CLIENTE: DESARROLLO URBANO

REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL

LOCALIDAD: Chihuahua Chihuahua

CONTRATISTA:

Fecha Informe:

2017-12-13

No.	Elemento	Edad (días)	Ancho (cm)	Peralte (cm)	Localización	Rev.	Carga	Equipo de Mezcla	Aditivo	Fecha	Vibrado
					Dist.	(cm)	(kgf) (N)	MR (kgf/cm ²) (KPa)	MR_Pro (kgf/cm ²)	% Res	
22	LOSA DE CONCRETO				0+150						
	A	7	15,00	15,00	45,00	12,00	3054,00	29950	40,72	3993,27	42
	B	28	15,00	15,00	45,00	12,00	3678,00	36070	49,04	4809,18	42
23	LOSA DE CONCRETO				FRANJA 1 CUERPO DER 0+060 A 0+100						
	A	7	15,00	15,00	45,00	11,00	2854,00	27989	38,05	3731,43	42
	B	28	15,00	15,00	45,00	11,00	3960,00	38835	52,80	5177,91	42
24	LOSA DE CONCRETO				FRANJA 2 CUERPO IZQ						
	A	7	15,00	15,00	45,00	12,00	2700,00	26478	36,00	3530,39	40
	B	28	15,00	15,00	45,00	12,00	3550,00	34814	47,33	4641,49	40
25	LOSA DE CONCRETO				FRANJA CUERPO IZQ 0+030 AL 0+090						
	A	7	15,00	15,00	45,00	11,00	2893,00	28371	38,57	3782,42	42
	B	28	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0	0,00	0,00	42
26	LOSA DE CONCRETO				FRANJA 1 ALREDEDOR DE GLORIETA						
	A	7	15,00	15,00	45,00	12,00	2675,00	26233	35,67	3498,03	42
	B	28	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0	0,00	0,00	42
27	LOSA DE CONCRETO				FRANJA 2 CIRCUITO ALTOZANO CUERPO IZQ 0+060 AL 0+100						
	A	7	15,00	15,00	45,00	10,00	2850,00	27949	38,00	3726,53	42
	B	28	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0	0,00	0,00	42
28	LOSA DE CONCRETO				FRANJA 1 AREA DE GLORIETA						
	A	7	15,00	15,00	45,00	11,00	2980,00	29224	39,73	3896,18	42
	B	28	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0	0,00	0,00	42

ATENTAMENTE:

ING. MYRNA BARRA APARICIO
GERENTE TECNICO

Este informe solo afecta a los especímenes y/o muestras sometidas a prueba.

Prohibido la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización del laboratorio.

METODOS DE PRUEBA EMPLEADOS: NMX-C-077, NMX-C-436, NMX-C-071, NMX-C-088, NMX-C-416	
CLIENTE: DESARROLLO URBANO	ENSAYE: 5561 INFORME: 13709
REPRESENTANTE: ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL	FECHA DE RECIBO: 01-11-17
OBRA: 406 DESARROLLO URBANO (FRACC MONTE CALERAS)	FECHA DE INFORME: 01-11-17
BANCO/LUGAR:	USO DEL MATERIAL: COLCHON PARA TUBO

INFORME ARENA PARA CONCRETO
ANALISIS GRANULOMETRICO

MALLA		RESULTADOS	ESPECIFICACIONES NMX-C-111
		% QUE PASA	% QUE PASA ACUMULADO
3/8"	9,5mm	96	100
No.4	4,75mm	93	95-100
No.8	2,36mm	89	80-100
No.16	1,18mm	71	50-85
No.30	0,60mm	55	25-60
No. 50	0,30mm	28	10-30
No.100	0,15mm	9	2-10
No. 200	0.075 mm	3	
PRUEBA		RESULTADO	ESPECIFIC.
MODULO DE FINURA		2.55	2,30 A 3,10
% DE PERDIDA POR LAVADO EN MALLA No. 200		3	5% MAX
COLORIMETRIA		1	No.3 MAX
MASA VOLUMETRICA SUELTA		1464	-----Kg/m3
MASA VOLUMETRICA COMPACTA		1610	-----Kg/m3
DENSIDAD		2.49	-----
ABSORCION		4.21	-----
OBSERVACIONES: SE REPORTAN LOS RESULTADOS DE LABORATORIO			

ATENTAMENTE
 SIGNATARIO AUTORIZADO

LABORATORIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.

LACOSA

CONTROL DE CALIDAD
Manuel Garcia No. 10102 Col. Deportistas
Chihuahua, Chih. C.P. 31125
Tels. 417-00-33 y 419-56-20

INFORME DE ENSAYE DE MATERIALES PARA TERRACERIAS

METODOS ASTM EMPLEADOS: C702-11, C136-06,D698-00,D4318-10

OBRA	406 DESARROLLO URBANO (FRACC LUNA ROJA)	INFORME N°	13712
CLIENTE	DESARROLLO URBANO	FECHA DE ENSAYE	29/10/2017
REPRESENTANTE	ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL		01/11/2017
IDENTIFICACIÓN	No. DE ENSAYE	5589	
	CAPA	SUBRASANTE	SUBYACENTE
	LOCALIZACION	CIRCUITO LUNA FUERTE LADO SUR Y CIRCUITO LUNA FRIA LADO ORIENTE	
	BANCO		TERRAPLEN

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL	PRUEBAS DE LABORATORIO	ESP. SCT CMT-1-03/02	N- ENSAYE	ESP. SCT	ENSAYE	ESP. SCT CMT-1-01/02	N- ENSAYE
	TAMAÑO MAXIMO EN PULGADAS	3	2 1/2	COMPACTABLE		-	
	RETENIDO EN MALLA DE 75 mm, en %	-	0.0%	-		-	
	PASA EN MALLA DE 4.75 mm, en %	-	100	-		-	
	PASA EN MALLA DE 0.425 mm, en %	-	38	-		-	
	PASA EN MALLA DE 0.075 mm, en %	-	23	-		-	
	LIMITE LIQUIDO MAXIMO en %	40	28	50		50	
	INDICE PLASTICO MAXIMO en %	12	13	-		-	
	P.E.S.SUELTO, en kg/m ³	-	1324	-		-	
	P.E.S.MAXIMO, en kg/m ³	-	1932	-		-	
	HUMEDAD OPTIMA, en %	-	11.0	-		-	
	HUMEDAD NATURAL, en %	-		-		-	
	COMPACTACION DEL LUGAR, en %	100 +/- 2		95 +/- 2		90 +/- 2	
	V.R.S. ESTANDAR SATURADO MIN %	20	100	10		5	
	EXPANSIÓN MAXIMA en %	2	0.0	3		5	
	CLASIFICACION SUCS	-	SC	-			

ESTUDIO DE ESPESORES	COLOR ----						
	CURVA DE PROYECTO ----						
	Cond. lugar	HUMEDAD DE PRUEBA, en %					
		VALOR RELATIVO DE SOPORTE, en %					
		ESPESOR REQUERIDO, en cm					
	90 % COMP.	HUMEDAD DE PRUEBA, en %					
		VALOR RELATIVO DE SOPORTE, en %					
		ESPESOR REQUERIDO, en cm					
	95 % COMP.	HUMEDAD DE PRUEBA, en %					
		VALOR RELATIVO DE SOPORTE, en %					
		ESPESOR REQUERIDO, en cm					
	100 % COMP.	HUMEDAD DE PRUEBA, en %					
		VALOR RELATIVO DE SOPORTE, en %					
		ESPESOR REQUERIDO, en cm					

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

SE REPORTAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LABORATORIO

ATENTAMENTE

SIGNATARIO AUTORIZADO

* ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS ESPECIMENES Y/O MUESTRAS SOMETIDAS A PRUEBA.

* PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACION DEL LABORATORIO.

LCO-CI-IMT

LABORATORIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.

LACOSA

CONTROL DE CALIDAD
Manuel García No. 10102 Col. Deportistas
Chihuahua, Chih. C.P. 31125
Tels. 417-00-33 y 419-56-20

INFORME DE ENSAYE DE MATERIALES PARA TERRACERIAS

METODOS ASTM EMPLEADOS: C702-11, C136-06, D698-00, D4318-10

OBRA	406 DESARROLLO URBANO (FRACC MONTE VERDE I)	INFORME N°	13713
CLIENTE	DESARROLLO URBANO	FECHA DE ENSAYE	04/11/2017
REPRESENTANT	ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL	FECHA DE INFORME	06/11/2017
IDENTIFICACIÓN	No. DE ENSAYE	5593	
	CAPA	SUBRASANTE	SUBYACENTE
	LOCALIZACION	AVENIDA MONTE VERDE KM 2+000 AL KM 2+600 CUERPO LADO NORTE	
	BANCO		

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL	PRUEBAS DE LABORATORIO	ESP. SCT CMT-1-03/02	N- ENSAYE	ESP. SCT	ENSAYE	ESP. SCT CMT-1-01/02	N- ENSAYE
	TAMAÑO MAXIMO EN PULGADAS	3	3	COMPACTABLE		-	
	RETENIDO EN MALLA DE 75 mm, en %	-	0.0%	-		-	
	PASA EN MALLA DE 4.75 mm, en %	-	46	-		-	
	PASA EN MALLA DE 0.425 mm, en %	-	20	-		-	
	PASA EN MALLA DE 0.075 mm, en %	-	13	-		-	
	LIMITE LIQUIDO MAXIMO en %	40	44	50		50	
	INDICE PLASTICO MAXIMO en %	12	18	-		-	
	P.E.S.SUELTO, en kg/m ³	-	1388	-		-	
	P.E.S.MAXIMO, en kg/m ³	-	1760	-		-	
	HUMEDAD OPTIMA, en %	-	16.7	-		-	
	HUMEDAD NATURAL, en %	-		-		-	
	COMPACTACION DEL LUGAR, en %	100 +/- 2		95 +/- 2		90 +/- 2	
	V.R.S. ESTANDAR SATURADO MIN %	20	71	10		5	
	EXPANSIÓN MAXIMA en %	2	1.0	3		5	
	CLASIFICACION SUCS	-	GC	-			

ESTUDIO DE ESPESORES	COLOR	----					
	CURVA DE PROYECTO	----					
	Cond. lugar	HUMEDAD DE PRUEBA, en %					
		VALOR RELATIVO DE SOPORTE, en %					
		ESPESOR REQUERIDO, en cm					
	90 % COMP.	HUMEDAD DE PRUEBA, en %					
		VALOR RELATIVO DE SOPORTE, en %					
		ESPESOR REQUERIDO, en cm					
	95 % COMP.	HUMEDAD DE PRUEBA, en %					
		VALOR RELATIVO DE SOPORTE, en %					
		ESPESOR REQUERIDO, en cm					
	100 % COMP.	HUMEDAD DE PRUEBA, en %					
		VALOR RELATIVO DE SOPORTE, en %					
		ESPESOR REQUERIDO, en cm					

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

SE REPORTAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LABORATORIO

ATENTAMENTE

SIGNATARIO AUTORIZADO

* ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS ESPECIMENES Y/O MUESTRAS SOMETIDAS A PRUEBA.

* PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTA INFORME SIN LA AUTORIZACION DEL LABORATORIO.

LCO-CI-IMT

LABORATORIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.

LACOSA

CONTROL DE CALIDAD
 Manuel García No. 10102 Col. Deportistas
 Chihuahua, Chih. C.P. 31125
 Tels. 417-00-33 y 419-56-20

INFORME DE ENSAYE DE MATERIALES PARA TERRACERIAS

METODOS ASTM EMPLEADOS: C702-11, C136-06,D698-00,D4318-10

OBRA	406 DESARROLLO URBANO (FRACC SAN PEDRO)	INFORME N°	13714
CLIENTE	DESARROLLO URBANO	FECHA DE ENSAYE	04/11/2017
REPRESENTANT	ARQ GUILLERMO SOTO LEAL	FECHA DE INFORME	06/11/2017
IDENTIFICACIÓN	No. DE ENSAYE	5595	
	CAPA	SUBRASANTE	SUBYACENTE
	LOCALIZACION	CALLE VALLE DE SAN PEDRO ENTRE CIRCUITO VALLE DE SAN VICTORIA	
	BANCO		

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL	PRUEBAS DE LABORATORIO	ESP. SCT CMT-1-03/02	N- ENSAYE	ESP. SCT	ENSAYE	ESP. SCT CMT-1-01/02	N- ENSAYE
	TAMAÑO MAXIMO EN PULGADAS	3	3	COMPACTABLE		-	
	RETENIDO EN MALLA DE 75 mm, en %	-	0.0%	-		-	
	PASA EN MALLA DE 4.75 mm, en %	-	42	-		-	
	PASA EN MALLA DE 0.425 mm, en %	-	15	-		-	
	PASA EN MALLA DE 0.075 mm, en %	-	7	-		-	
	LIMITE LIQUIDO MAXIMO en %	40	22	50		50	
	INDICE PLASTICO MAXIMO en %	12	NP	-		-	
	P.E.S.SUELTO, en kg/m ³	-	1352	-		-	
	P.E.S.MAXIMO, en kg/m ³	-	1891	-		-	
	HUMEDAD OPTIMA, en %	-	7.8	-		-	
	HUMEDAD NATURAL, en %	-		-		-	
	COMPACTACION DEL LUGAR, en %	100 +/- 2		95 +/- 2		90 +/- 2	
	V.R.S. ESTANDAR SATURADO MIN %	20	100	10		5	
	EXPANSIÓN MAXIMA en %	2	0.0	3		5	
	CLASIFICACION SUCS	-	GP-GM	-			

ESTUDIO DE ESPESORES	COLOR ----						
	CURVA DE PROYECTO ----						
	Cond. lugar	HUMEDAD DE PRUEBA, en %					
		VALOR RELATIVO DE SOPORTE, en %					
		ESPESOR REQUERIDO, en cm					
	90 % COMP.	HUMEDAD DE PRUEBA, en %					
		VALOR RELATIVO DE SOPORTE, en %					
		ESPESOR REQUERIDO, en cm					
	95 % COMP.	HUMEDAD DE PRUEBA, en %					
		VALOR RELATIVO DE SOPORTE, en %					
		ESPESOR REQUERIDO, en cm					
	100 % COMP.	HUMEDAD DE PRUEBA, en %					
		VALOR RELATIVO DE SOPORTE, en %					
		ESPESOR REQUERIDO, en cm					

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

SE REPORTAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LABORATORIO

ATENTAMENTE

SIGNATARIO AUTORIZADO

* ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS ESPECIMENES Y/O MUESTRAS SOMETIDAS A PRUEBA

* PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTA INFORME SIN LA AUTORIZACION DEL LABORATORIO.

LCO-CI-IMT

INFORME DE MATERIALES PARA BASE DE PAVIMENTO CON CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA

METODOS ASTM EMPLEADOS: C702-11, C136-06, D698-00, D4318-10, C127-12, C128-12, D2419-09, C131-06, D4791-10


OBRA	406 DESARROLLO URBANO (FRACC CUMBRES DE ROBINSON 3)	INFORME N°	13710
CLIENTE	DESARROLLO URBANO	ENSAYE N°	5583
REPRESENTANTE	ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL	FECHA DE ENSAYE	31-oct-17
ENVIADA POR	PERSONAL DE LABORATORIO	FECHA INFORME	01-nov-17

DATOS DEL MATERIAL MUESTREADO

DESC. PETROGRAFICA DEL MATERIAL	GRAVA ARENA
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	CALLE ALTOS DE LA CANTERA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	
UBICACION DEL BANCO	

M.V.S. SUELTO (kg/m ³)	1561
M.V.S. MAXIMO (kg/m ³)	2141
HUMEDAD OPTIMA (%)	4.4

COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLA	% RETENIDO
	EN 50.0	-
	EN 37.5	-
	% PASA	
	50.00	100
	37.50	100
	25.00	100
	19.00	98
	9.500	88
	4.750	72
	2.000	46
	0.850	30
	0.425	20
	0.250	17
	0.150	14
	0.075	12

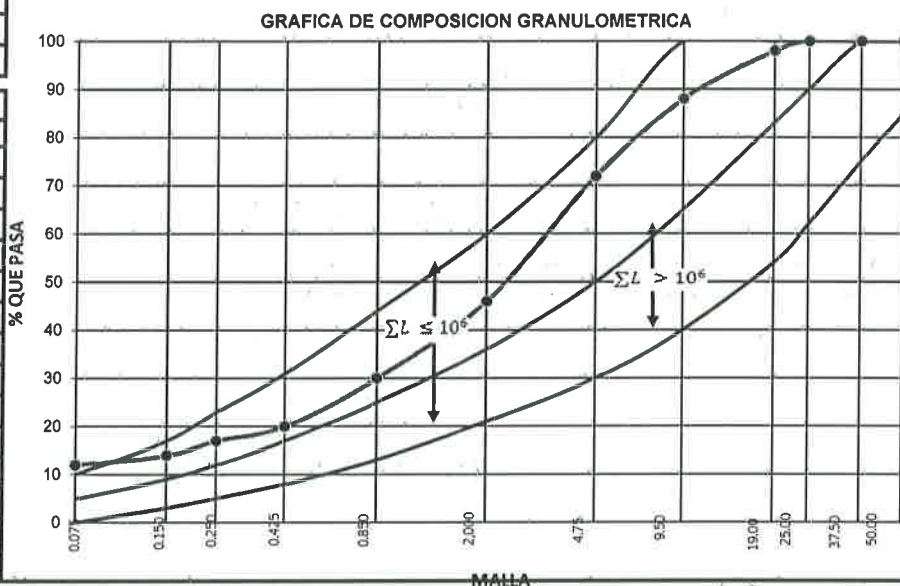

PRUEBAS EN MAT. MAYOR QUE LA MALLA Num. 9.5		PRUEBA %		ESP. SCT N-CMT-4-02-002/11		ENSAYE
				$\Sigma L \leq 10\%$	$\Sigma L > 10\%$	
ABSORCION (%)	1.18	V.R.S. ESTANDAR MIN		80	100	102%
DENSIDAD	2.61	EQUIVALENTE ARENA MIN		40	50	38%
CLASIFICACION UNIFICADA DE SUELOS		P. ALARG. Y LAJEADAS MAX		40	35	-
		DESG. DE LOS ANGELES MAX		35	30	-
SP-SM		PRUEBAS SOBRE MATERIAL TAMIZADO POR LA MALLA Num. 0.425				
		LIMITE LIQUIDO MAX		25	25	22
		LIMITE PLASTICO		NA	NA	12
		INDICE PLASTICO MAX		6	6	10

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE REPORTAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL LABORATORIO

SIGNATARIO AUTORIZADO

INFORME DE MATERIALES PARA BASE DE PAVIMENTO CON CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA


METODOS ASTM EMPLEADOS: C702-11, C136-06, D698-00, D4318-10, C127-12, C128-12, D2419-09, C131-06, D4791-10

OBRA	406 DESARROLLO URBANO (FRACC LUNA ROJA)	INFORME N°	13711
CLIENTE	DESARROLLO URBANO	ENSAYE N°	5584
REPRESENTANTE	ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL	FECHA DE ENSAYE	31-oct-17
ENVIADA POR	PERSONAL DE LABORATORIO	FECHA INFORME	01-nov-17

DATOS DEL MATERIAL MUESTREADO	
DESC. PETROGRAFICA DEL MATERIAL	GRAVA ARENA MEJORADA CON CARPETA RECUPERADA
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	AVENIDA ABOLICION DE LA ESCLAVITUD
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	
UBICACION DEL BANCO	

M.V.S. SUELTO (kg/m ³)	1352
M.V.S. MAXIMO (kg/m ³)	2026
HUMEDAD OPTIMA (%)	8.1

COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLA	% RETENIDO
	EN 50.0	-
	EN 37.5	-
	% PASA	
	50.00	100
	37.50	96
	25.00	90
	19.00	88
	9.500	81
	4.750	66
	2.000	45
	0.850	33
	0.425	24
	0.250	20
	0.150	17
	0.075	15

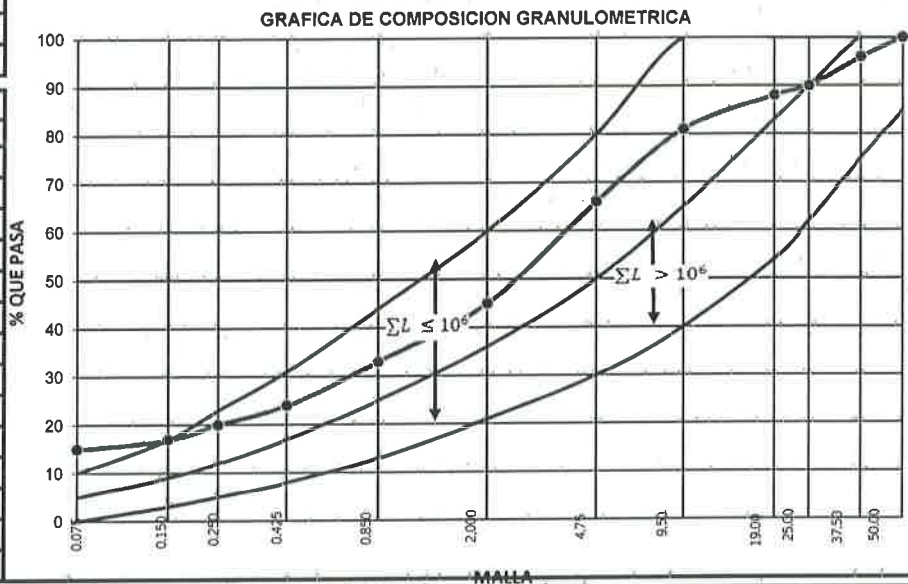

PRUEBAS EN MAT. MAYOR QUE LA MALLA Num. 9.5		PRUEBA %		ESP. SCT N-CMT-4-02-002/11		ENSAYE
				$\Sigma L \leq 10\%$	$\Sigma L > 10\%$	
ABSORCION (%)	4.65	V.R.S. ESTANDAR MIN		80	100	101%
DENSIDAD	2.37	EQUIVALENTE ARENA MIN		40	50	27%
CLASIFICACION UNIFICADA DE SUELOS		P. ALARG. Y LAJEADAS MAX		40	35	-
		DESG. DE LOS ANGELES MAX		35	30	-
SC		PRUEBAS SOBRE MATERIAL TAMIZADO POR LA MALLA Num. 0.425				
		LIMITE LIQUIDO MAX	25	25	26	
		LIMITE PLASTICO	NA	NA	17	
		INDICE PLASTICO MAX	6	6	9	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE REPORTAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL LABORATORIO

SIGNATARIO AUTORIZADO

INFORME DE MATERIALES PARA BASE DE PAVIMENTO CON CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA

METODOS ASTM EMPLEADOS: C702-11, C136-06, D698-00, D4318-10, C127-12, C128-12, D2419-09, C131-06, D4791-10


OBRA	406 DESARROLLO URBANO (FRACC MOLINO DE AGUA)	INFORME N°	13715
CLIENTE	DESARROLLO URBANO	ENSAYE N°	5618
REPRESENTANTE	ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL	FECHA DE ENSAYE	07-nov-17
ENVIADA POR	PERSONAL DE LABORATORIO	FECHA INFORME	08-nov-17

DATOS DEL MATERIAL MUESTREADO

DESC. PETROGRAFICA DEL MATERIAL	GRAVA ARENA
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	AVE DESARROLLO CUERPO DERECHO ENTRE CALLE PONIENTE Y CALLE MOLINO
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	
UBICACION DEL BANCO	TECOLOTE

M.V.S. SUELTO (kg/m ³)	1391
M.V.S. MAXIMO (kg/m ³)	1800
HUMEDAD OPTIMA (%)	7.3

COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLA	% RETENIDO
	EN 50.0	-
	EN 37.5	-
	% PASA	
	50.00	100
	37.50	95
	25.00	88
	19.00	82
	9.500	65
	4.750	47
	2.000	32
	0.850	23
	0.425	15
	0.250	13
	0.150	11
	0.075	9

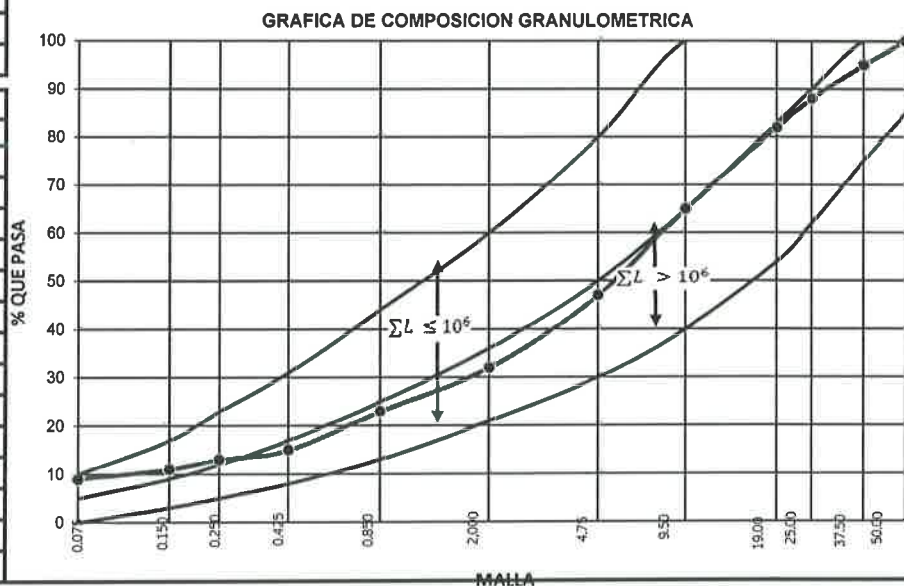

PRUEBAS EN MAT. MAYOR QUE LA MALLA Num. 9.5		PRUEBA %		ESP. SCT N-CMT-4-02-002/11		ENSAYE
				$\Sigma L \leq 10\%$	$\Sigma L > 10\%$	
ABSORCION (%)	3.78	V.R.S. ESTANDAR MIN		80	100	101%
DENSIDAD	2.36	EQUIVALENTE ARENA MIN		40	50	39%
CLASIFICACION UNIFICADA DE SUELOS		P. ALARG. Y LAJEADAS MAX		40	35	
		DESG. DE LOS ANGELES MAX		35	30	-
GP-GM		PRUEBAS SOBRE MATERIAL TAMIZADO POR LA MALLA Num. 0.425				
		LIMITE LIQUIDO MAX		25	25	24
		LIMITE PLASTICO		NA	NA	20
		INDICE PLASTICO MAX		6	6	4

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE REPORTAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL LABORATORIO

SIGNATARIO AUTORIZADO

INFORME DE MATERIALES PARA BASE DE PAVIMENTO CON CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA

METODOS ASTM EMPLEADOS: C702-11, C136-06, D698-00, D4318-10, C127-12, C128-12, D2419-09, C131-06, D4791-10


OBRA	406 DESARROLLO URBANO (FRACC VALLE DE MERCIA)	INFORME N°	13716
CLIENTE	DESARROLLO URBANO	ENSAYE N°	5619
REPRESENTANTE	ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL	FECHA DE ENSAYE	07-nov-17
ENVIADA POR	PERSONAL DE LABORATORIO	FECHA INFORME	08-nov-17

DATOS DEL MATERIAL MUESTREADO

DESC. PETROGRAFICA DEL MATERIAL	GRAVA ARENA
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	-
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	-
UBICACION DEL BANCO	TECOLOTE

M.V.S. SUELTO (kg/m ³)	1389
M.V.S. MAXIMO (kg/m ³)	1835
HUMEDAD OPTIMA (%)	7.1

COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLA	% RETENIDO
	EN 50.0	-
	EN 37.5	-
	% PASA	
	50.00	100
	37.50	97
	25.00	89
	19.00	82
	9.500	67
	4.750	48
	2.000	33
	0.850	23
	0.425	15
	0.250	13
	0.150	11
	0.075	9

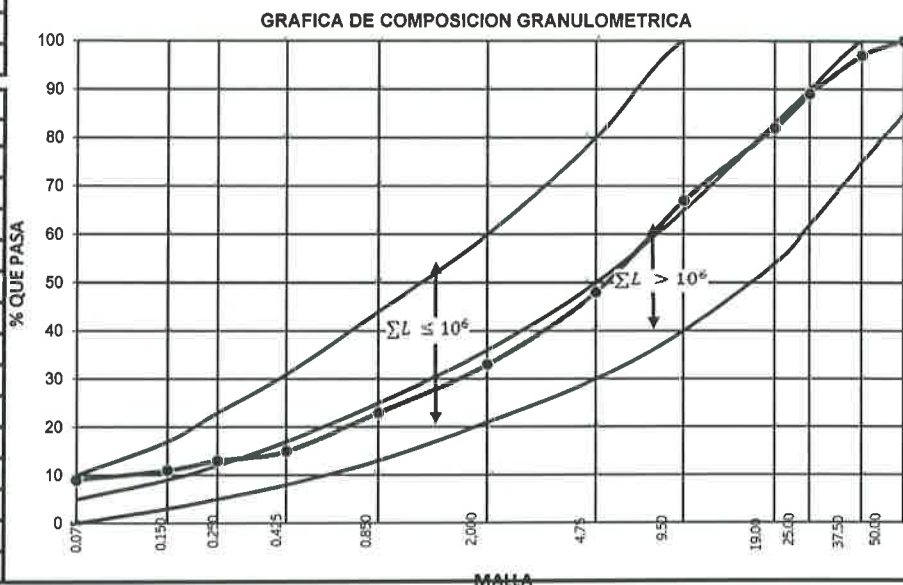

PRUEBAS EN MAT. MAYOR QUE LA MALLA Num. 9.5		PRUEBA %	ESP. SCT N-CMT-4-02-002/11		ENSAYE	
			$\sum L \leq 10^\circ$	$\sum L > 10^\circ$		
ABSORCION (%)	3.50	V.R.S. ESTANDAR MIN	80	100	100%	
DENSIDAD	2.31	EQUIVALENTE ARENA MIN	40	50	38%	
CLASIFICACION UNIFICADA DE SUELOS		S.U.C.S	P. ALARG. Y LAJEADAS MAX	40	35	
			DESG. DE LOS ANGELES MAX	35	30	-
GP-GM		PRUEBAS SOBRE MATERIAL TAMIZADO POR LA MALLA Num. 0.425				
			LIMITE LIQUIDO MAX	25	25	24
			LIMITE PLASTICO	NA	NA	19
			INDICE PLASTICO MAX	6	6	5

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE REPORTAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL LABORATORIO

SIGNATARIO AUTORIZADO

LABORATORIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.

LACOSA

CONTROL DE CALIDAD
Manuel Garcia No. 10102 Col. Deportistas
Chihuahua, Chih. C.P. 31125

INFORME DE MATERIALES PARA BASE DE PAVIMENTO CON CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA

METODOS ASTM EMPLEADOS: C702-11, C136-06, D698-00, D4318-10, C127-12, C128-12, D2419-09, C131-06, D4791-10


OBRA	406 DESARROLLO URBANO (FRACC VALDIVIA II)	INFORME N°	13717
CLIENTE	DESARROLLO URBANO	ENSAYE N°	5620
REPRESENTANTE	ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL	FECHA DE ENSAYE	07-nov-17
ENVIADA POR	PERSONAL DE LABORATORIO	FECHA INFORME	08-nov-17

DATOS DEL MATERIAL MUESTREADO

DESC. PETROGRAFICA DEL MATERIAL	GRAVA ARENA
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	-
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	-
UBICACION DEL BANCO	TECOLOTE

M.V.S. SUELTO (kg/m ³)	1386
M.V.S. MAXIMO (kg/m ³)	1815
HUMEDAD OPTIMA (%)	7.4

COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLA	% RETENIDO
	EN 50.0	-
	EN 37.5	-
	% PASA	
	50.00	100
	37.50	96
	25.00	87
	19.00	80
	9.500	64
	4.750	44
	2.000	31
	0.850	21
	0.425	14
	0.250	12
	0.150	11
	0.075	9

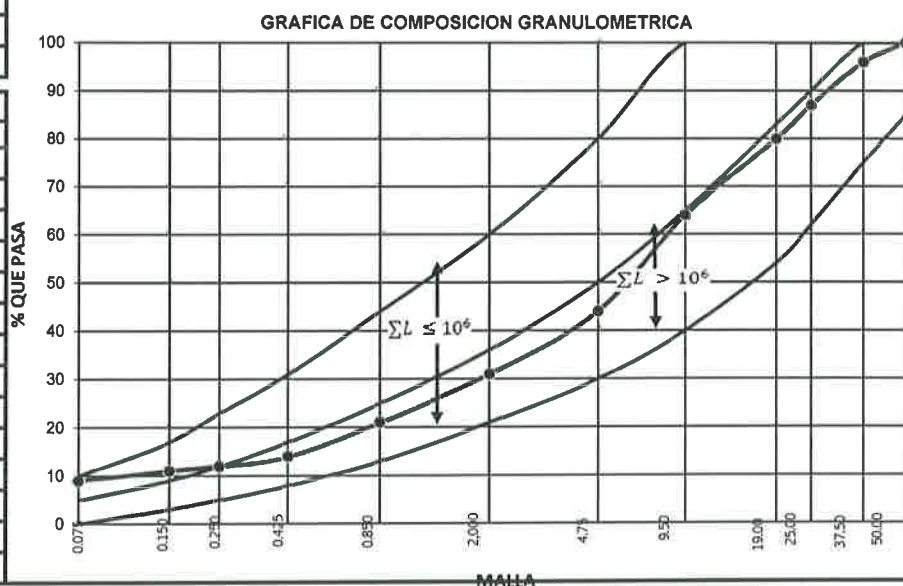

PRUEBAS EN MAT. MAYOR QUE LA MALLA Num. 9.5		PRUEBA %		ESP. SCT N-CMT-4-02-002/11		ENSAYE
				$\Sigma L \leq 10\%$	$\Sigma L > 10\%$	
ABSORCION (%)	3.45	V.R.S. ESTANDAR MIN		80	100	100%
DENSIDAD	2.25	EQUIVALENTE ARENA MIN		40	50	38%
CLASIFICACION UNIFICADA DE SUELOS		P. ALARG. Y LAJEADAS MAX		40	35	
		DES. DE LOS ANGELES MAX		35	30	-
GP-GM		PRUEBAS SOBRE MATERIAL TAMIZADO POR LA MALLA Num. 0.425				
		LIMITE LIQUIDO MAX		25	25	25
		LIMITE PLASTICO		NA	NA	20
		INDICE PLASTICO MAX		6	6	5

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE REPORTAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL LABORATORIO

SIGNATARIO AUTORIZADO

INFORME DE MATERIALES PARA BASE DE PAVIMENTO CON CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA

METODOS ASTM EMPLEADOS: C702-11, C136-06, D698-00, D4318-10, C127-12, C128-12, D2419-09, C131-06, D4791-10


OBRA	406 DESARROLLO URBANO (FRACC CALICANTO)	INFORME N°	13718
CLIENTE	DESARROLLO URBANO	ENSAYE N°	5838
REPRESENTANTE	ARQ GUILLERMO SOTO LEAL	FECHA DE ENSAYE	11/11/2017
ENVIADA POR	PERSONAL DE LABORATORIO	FECHA INFORME	21/11/2017

DATOS DEL MATERIAL MUESTREADO

DESC. PETROGRAFICA DEL MATERIAL	GRAVA ARENA
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	CALLE CIRCUITO CALICANTO LADO NORTE
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	
UBICACION DEL BANCO	EL TECOLOTE

M.V.S. SUELTO (kg/m ³)	1331
M.V.S. MAXIMO (kg/m ³)	1812
HUMEDAD OPTIMA (%)	8.1

COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLA	% RETENIDO
	EN 50.0	-
	EN 37.5	-
		% PASA
	50.00	100
	37.50	100
	25.00	90
	19.00	84
	9.500	67
	4.750	48
	2.000	31
	0.850	22
	0.425	15
	0.250	14
	0.150	12
0.075	10	

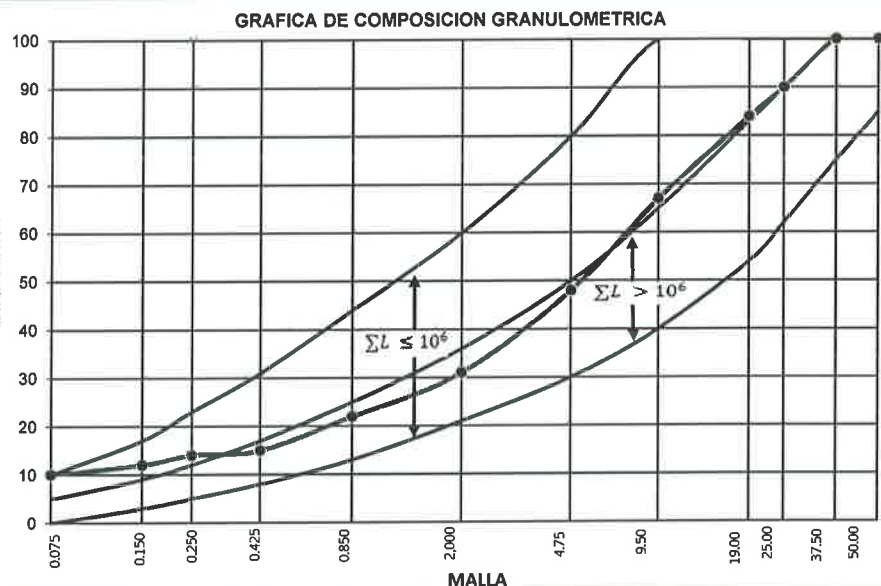

PRUEBAS EN MAT. MAYOR QUE LA MALLA Num. 9.5		PRUEBA %	ESP. SCT N-CMT-4-02-002/11		ENSAYE
			$\Sigma L \leq 10\%$	$\Sigma L > 10\%$	
ABSORCION (%)	4.56	V.R.S. ESTANDAR MIN	80	100	90%
DENSIDAD	2.30	EQUIVALENTE ARENA MIN	40	50	35%
CLASIFICACION UNIFICADA DE SUELOS		P. ALARG. Y LAJEADAS MAX	40	35	-
		DESG. DE LOS ANGELES MAX	35	30	-
GP-GM		PRUEBAS SOBRE MATERIAL TAMIZADO POR LA MALLA Num. 0.425			
		LIMITE LIQUIDO MAX	25	25	24
		LIMITE PLASTICO	NA	NA	21
		INDICE PLASTICO MAX	6	6	3

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE REPORTAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LABORATORIO

SIGNATARIO AUTORIZADO

INFORME DE MATERIALES PARA BASE DE PAVIMENTO CON CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA

METODOS ASTM EMPLEADOS: C702-11, C136-06, D698-00, D4318-10, C127-12, C128-12, D2419-09, C131-06, D4791-10


OBRA	406 DESARROLLO URBANO (FRACC ALTOSANO)	INFORME N°	13719
CLIENTE	DESARROLLO URBANO	ENSAYE N°	5852
REPRESENTANTE	ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL	FECHA DE ENSAYE	22-nov-17
ENVIADA POR	PERSONAL DE LABORATORIO	FECHA INFORME	23-nov-17

DATOS DEL MATERIAL MUESTREADO

DESC. PETROGRAFICA DEL MATERIAL	GRAVA ARENA
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	CALLE CIRCUITO ALTOSANO CUERPO LADO DERECHO
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	-
UBICACION DEL BANCO	-

M.V.S. SUELTO (kg/m ³)	1543
M.V.S. MAXIMO (kg/m ³)	1888
HUMEDAD OPTIMA (%)	12.3

COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLA	% RETENIDO
	EN 50.0	-
	EN 37.5	-
	% PASA	
	50.00	100
	37.50	89
	25.00	81
	19.00	75
	9.500	57
	4.750	40
	2.000	29
	0.850	24
	0.425	20
	0.250	18
	0.150	16
	0.075	13

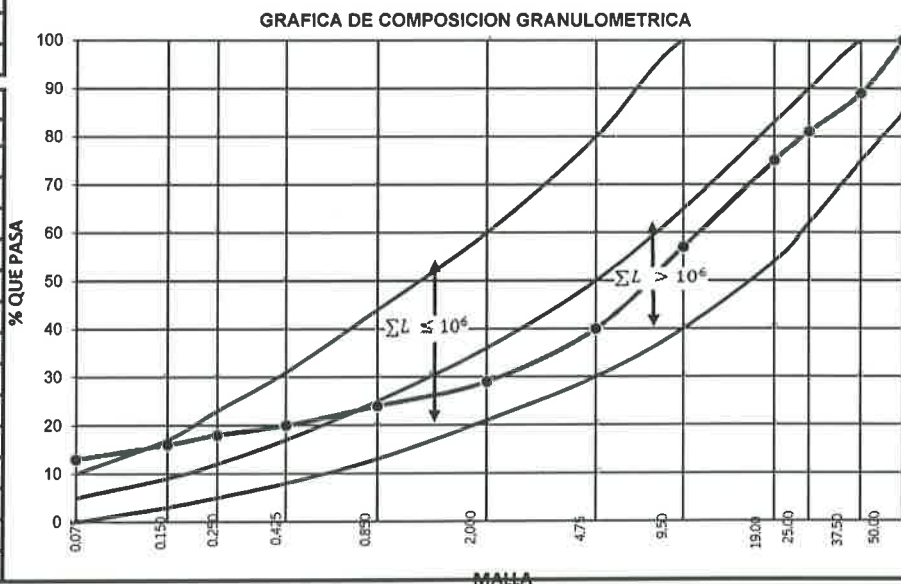

PRUEBAS EN MAT. MAYOR QUE LA MALLA Num. 9.5		PRUEBA %		ESP. SCT N-CMT-4-02-002/11		ENSAYE
				$\sum L \leq 10\%$	$\sum L > 10\%$	
ABSORCION (%)	5.89	V.R.S. ESTANDAR MIN		80	100	101%
DENSIDAD	2.45	EQUIVALENTE ARENA MIN		40	50	29%
CLASIFICACION UNIFICADA DE SUELOS		P. ALARG. Y LAJEADAS MAX		40	35	-
		DESG. DE LOS ANGELES MAX		35	30	-
GM		PRUEBAS SOBRE MATERIAL TAMIZADO POR LA MALLA Num. 0.425				
		LIMITE LIQUIDO MAX	25	25	37	
		LIMITE PLASTICO	NA	NA	27	
		INDICE PLASTICO MAX	6	6	10	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE REPORTAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL LABORATORIO

SIGNATARIO AUTORIZADO

INFORME DE MATERIALES PARA BASE DE PAVIMENTO CON CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA

METODOS ASTM EMPLEADOS: C702-11, C136-06, D698-00, D4318-10, C127-12, C128-12, D2419-09, C131-06, D4791-10


OBRA	406 DESARROLLO URBANO (FRACC QUINTA ARBOLEDAS ORIENTE)	INFORME N°	13720
CLIENTE	DESARROLLO URBANO	ENSAYE N°	5853
REPRESENTANTE	ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL	FECHA DE ENSAYE	22-nov-17
ENVIADA POR	PERSONAL DE LABORATORIO	FECHA INFORME	23-nov-17

DATOS DEL MATERIAL MUESTREADO

DESC. PETROGRAFICA DEL MATERIAL	GRAVA ARENA
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	CALLE CHIHUAHUA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	-
UBICACION DEL BANCO	-

M.V.S. SUELTO (kg/m ³)	1338
M.V.S. MAXIMO (kg/m ³)	1914
HUMEDAD OPTIMA (%)	6.2

COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLA	% RETENIDO
	EN 50.0	-
	EN 37.5	-
	% PASA	
	50.00	100
	37.50	100
	25.00	96
	19.00	90
	9.500	71
	4.750	54
	2.000	36
	0.850	27
	0.425	20
	0.250	17
	0.150	14
	0.075	12

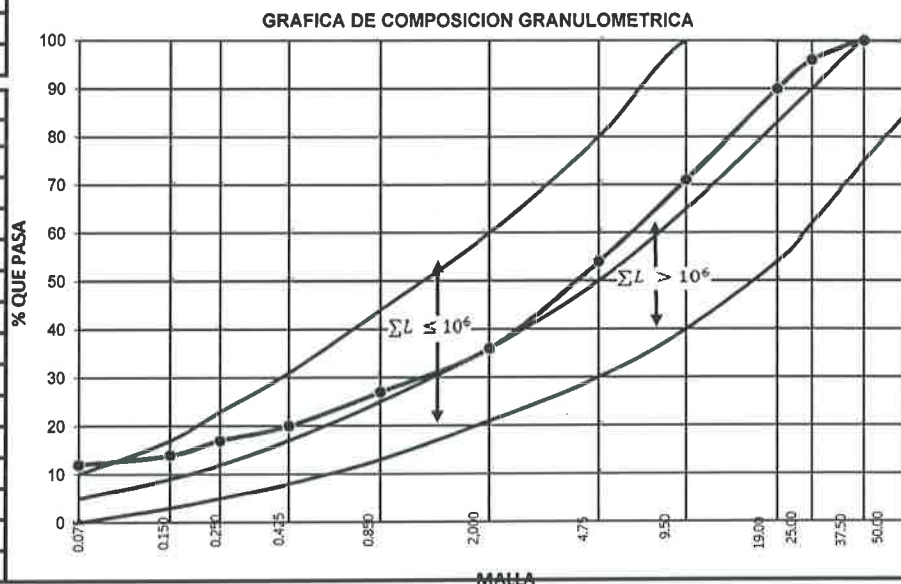

PRUEBAS EN MAT. MAYOR QUE LA MALLA Num. 9.5		PRUEBA %		ESP. SCT N-CMT-4-02-002/11		ENSAYE
				$\Sigma L \leq 10\%$	$\Sigma L > 10\%$	
ABSORCION (%)	4.75	V.R.S. ESTANDAR MIN		80	100	101%
DENSIDAD	2.38	EQUIVALENTE ARENA MIN		40	50	28%
CLASIFICACION UNIFICADA DE SUELOS		P. ALARG. Y LAJEADAS MAX		40	35	-
		DESG. DE LOS ANGELES MAX		35	30	-
GP-GC		PRUEBAS SOBRE MATERIAL TAMIZADO POR LA MALLA Num. 0.425				
		LIMITE LIQUIDO MAX		25	25	31
		LIMITE PLASTICO		NA	NA	22
		INDICE PLASTICO MAX		6	6	9

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE REPORTAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL LABORATORIO

SIGNATARIO AUTORIZADO

LABORATORIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.

LACOSA

CONTROL DE CALIDAD

Manuel Garcia No. 10102 Col. Deportistas
Chihuahua, Chih. C.P. 31125

INFORME DE MATERIALES PARA BASE DE PAVIMENTO CON CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA

METODOS ASTM EMPLEADOS: C702-11, C136-06, D698-00, D4318-10, C127-12, C128-12, D2419-09, C131-06, D4791-10


OBRA	406 DESARROLLO URBANO (FRACC QUINTA ARBOLEDAS ORIENTE)	INFORME N°	13721
CLIENTE	DESARROLLO URBANO	ENSAYE N°	5855
REPRESENTANTE	ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL	FECHA DE ENSAYE	20-nov-17
ENVIADA POR	PERSONAL DE LABORATORIO	FECHA INFORME	23-nov-17

DATOS DEL MATERIAL MUESTREADO

DESC. PETROGRAFICA DEL MATERIAL	GRAVA ARENA
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	CALLE MARACUYA LADO PONIENTE
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	-
UBICACION DEL BANCO	-

M.V.S. SUELTO (kg/m ³)	1572
M.V.S. MAXIMO (kg/m ³)	2098
HUMEDAD OPTIMA (%)	3.7

COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLA	% RETENIDO
	EN 50.0	-
	EN 37.5	-
		% PASA
	50.00	100
	37.50	97
	25.00	91
	19.00	88
	9.500	76
	4.750	54
	2.000	29
	0.850	18
	0.425	12
	0.250	10
	0.150	9
0.075	8	

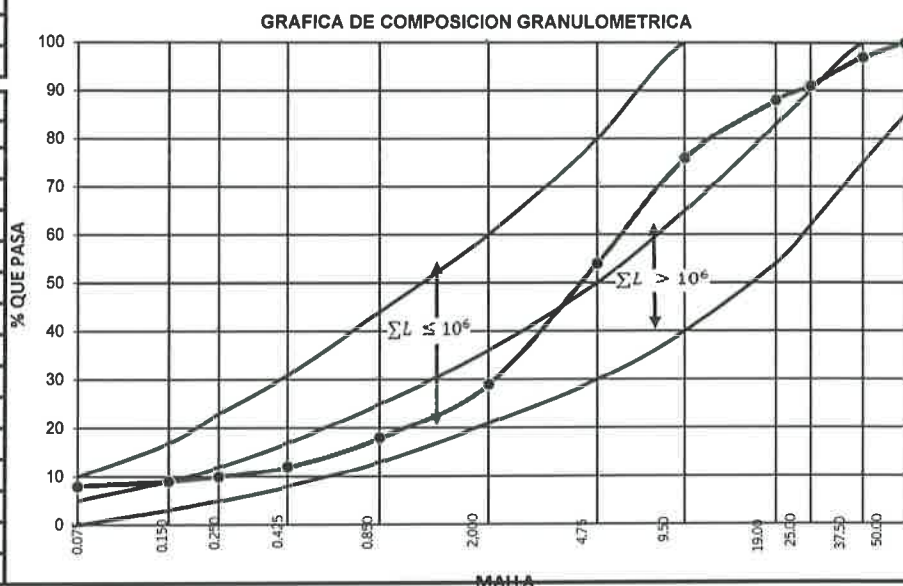

PRUEBAS EN MAT. MAYOR QUE LA MALLA Num. 9.5		PRUEBA %	ESP. SCT N-CMT-4-02-002/11		ENSAYE
			$\Sigma L \leq 10\%$	$\Sigma L > 10\%$	
ABSORCION (%)	1.10	V.R.S. ESTANDAR MIN	80	100	100%
DENSIDAD	2.65	EQUIVALENTE ARENA MIN	40	50	37%
CLASIFICACION UNIFICADA DE SUELOS		P. ALARG. Y LAJEADAS MAX	40	35	-
		DESG. DE LOS ANGELES MAX	35	30	-
GW-GM		PRUEBAS SOBRE MATERIAL TAMIZADO POR LA MALLA Num. 0.425			
		LIMITE LIQUIDO MAX	25	25	18
		LIMITE PLASTICO	NA	NA	12
		INDICE PLASTICO MAX	6	6	6

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE REPORTAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL LABORATORIO

SIGNATARIO AUTORIZADO

* ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS ESPECIMENES Y/O MUESTRAS SOMETIDAS A PRUEBA.
* PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTA INFORME SIN LA AUTORIZACION DEL LABORATORIO.

LCO-CI-IMBA

INFORME DE MATERIALES PARA BASE DE PAVIMENTO CON CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA

METODOS ASTM EMPLEADOS: C702-11, C136-06, D698-00, D4318-10, C127-12, C128-12, D2419-09, C131-06, D4791-10


OBRA	406 DESARROLLO URBANO (FRACC VISTAS DE LAS LUNAS)	INFORME N°	13722
CLIENTE	DESARROLLO URBANO	ENSAYE N°	5934
REPRESENTANTE	ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL	FECHA DE ENSAYE	04-dic-17
ENVIADA POR	PERSONAL DE LABORATORIO	FECHA INFORME	05-dic-17

DATOS DEL MATERIAL MUESTREADO

DESC. PETROGRAFICA DEL MATERIAL	GRAVA ARENA
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	CALLE CIRCUITO VISTAS DEL SENDERO LADO ORIENTE
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	-
UBICACION DEL BANCO	GCC

M.V.S. SUELTO (kg/m ³)	1593
M.V.S. MAXIMO (kg/m ³)	2205
HUMEDAD OPTIMA (%)	5.3

COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLA	% RETENIDO
	EN 50.0	-
	EN 37.5	-
		% PASA
	50.00	100
	37.50	100
	25.00	94
	19.00	87
	9.500	71
	4.750	52
	2.000	42
	0.850	28
	0.425	17
	0.250	14
	0.150	9
0.075	6	

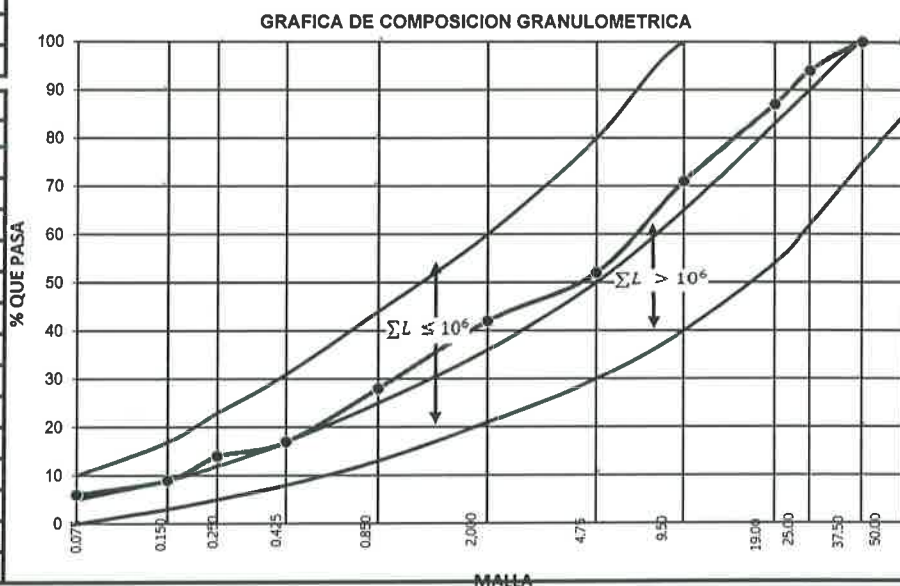

PRUEBAS EN MAT. MAYOR QUE LA MALLA Num. 9.5		PRUEBA %	ESP. SCT N-CMT-4-02-002/11		ENSAYE
			$\Sigma L \leq 10^{\circ}$	$\Sigma L > 10^{\circ}$	
ABSORCION (%)	1.46	V.R.S. ESTANDAR MIN	80	100	100%
DENSIDAD	2.61	EQUIVALENTE ARENA MIN	40	50	54%
CLASIFICACI IFICADA DE SUELOS	S.U.C.S	P. ALARG. Y LAJEADAS MAX	40	35	-
		DESG. DE LOS ANGELES MAX	35	30	-
GP-GM		PRUEBAS SOBRE MATERIAL TAMIZADO POR LA MALLA Num. 0.425			
		LIMITE LIQUIDO MAX	25	25	23
		LIMITE PLASTICO	NA	NA	NP
		INDICE PLASTICO MAX	6	6	NP

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE REPORTAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL LABORATORIO

SIGNATARIO AUTORIZADO

INFORME DE MATERIALES PARA BASE DE PAVIMENTO CON CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA

METODOS ASTM EMPLEADOS: C702-11, C136-06, D698-00, D4318-10, C127-12, C128-12, D2419-09, C131-06, D4791-10


OBRA	406 DESARROLLO URBANO (FRACC CUMBRES DE ROBINSON 3)	INFORME N°	13723
CLIENTE	DESARROLLO URBANO	ENSAYE N°	5935
REPRESENTANTE	ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL	FECHA DE ENSAYE	01-dic-17
ENVIADA POR	PERSONAL DE LABORATORIO	FECHA INFORME	02-dic-17

DATOS DEL MATERIAL MUESTREADO

DESC. PETROGRAFICA DEL MATERIAL	GRAVA ARENA
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	CALLE ALTOS DE SANTO DOMINGO
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	-
UBICACION DEL BANCO	GCC

M.V.S. SUELTO (kg/m ³)	1580
M.V.S. MAXIMO (kg/m ³)	2156
HUMEDAD OPTIMA (%)	4.3

COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLA	% RETENIDO
	EN 50.0	-
	EN 37.5	-
	% PASA	
	50.00	100
	37.50	100
	25.00	100
	19.00	99
	9.500	88
	4.750	72
	2.000	45
	0.850	30
	0.425	21
	0.250	17
	0.150	14
	0.075	11

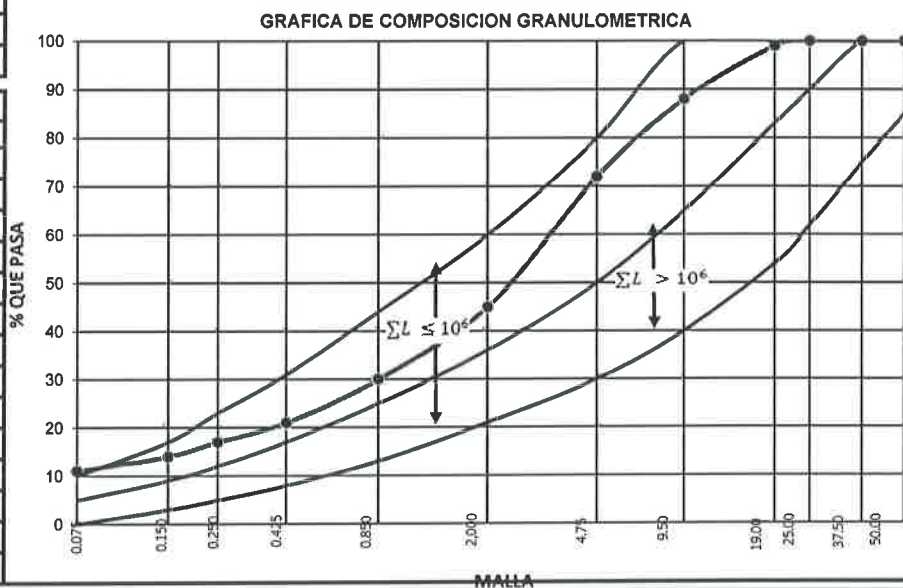

PRUEBAS EN MAT. MAYOR QUE LA MALLA Num. 9.5		PRUEBA %		ESP. SCT N-CMT-4-02-002/11		ENSAYE
				$\Sigma L \leq 10\%$	$\Sigma L > 10\%$	
ABSORCION (%)	1.18	V.R.S. ESTANDAR MIN		80	100	101%
DENSIDAD	2.61	EQUIVALENTE ARENA MIN		40	50	39%
CLASIFICACION UNIFICADA DE SUELOS		P. ALARG. Y LAJEADAS MAX		40	35	-
		DES.G. DE LOS ANGELES MAX		35	30	-
SP-SM		PRUEBAS SOBRE MATERIAL TAMIZADO POR LA MALLA Num. 0.425				
		LIMITE LIQUIDO MAX		25	25	23
		LIMITE PLASTICO		NA	NA	13
		INDICE PLASTICO MAX		6	6	9

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE REPORTAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL LABORATORIO

SIGNATARIO AUTORIZADO

INFORME DE MATERIALES PARA BASE DE PAVIMENTO CON CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA

METODOS ASTM EMPLEADOS: C702-11, C136-06, D698-00, D4318-10, C127-12, C128-12, D2419-09, C131-06, D4791-10


OBRA	406 DESARROLLO URBANO (FRACC CUMBRES DE ROBINSON 3)	INFORME N°	13724
CLIENTE	DESARROLLO URBANO	ENSAYE N°	5936
REPRESENTANTE	ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL	FECHA DE ENSAYE	02-dic-17
ENVIADA POR	PERSONAL DE LABORATORIO	FECHA INFORME	04-dic-17

DATOS DEL MATERIAL MUESTREADO

DESC. PETROGRAFICA DEL MATERIAL	GRAVA ARENA
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	CALLE ALTOS DE LA CANTERA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	
UBICACION DEL BANCO	GCC

M.V.S. SUELTO (kg/m ³)	1580
M.V.S. MAXIMO (kg/m ³)	2156
HUMEDAD OPTIMA (%)	4.6

COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLA	% RETENIDO
	EN 50.0	-
	EN 37.5	-
	% PASA	
	50.00	100
	37.50	100
	25.00	100
	19.00	97
	9.500	87
	4.750	71
	2.000	46
	0.850	32
	0.425	21
	0.250	17
	0.150	15
	0.075	13

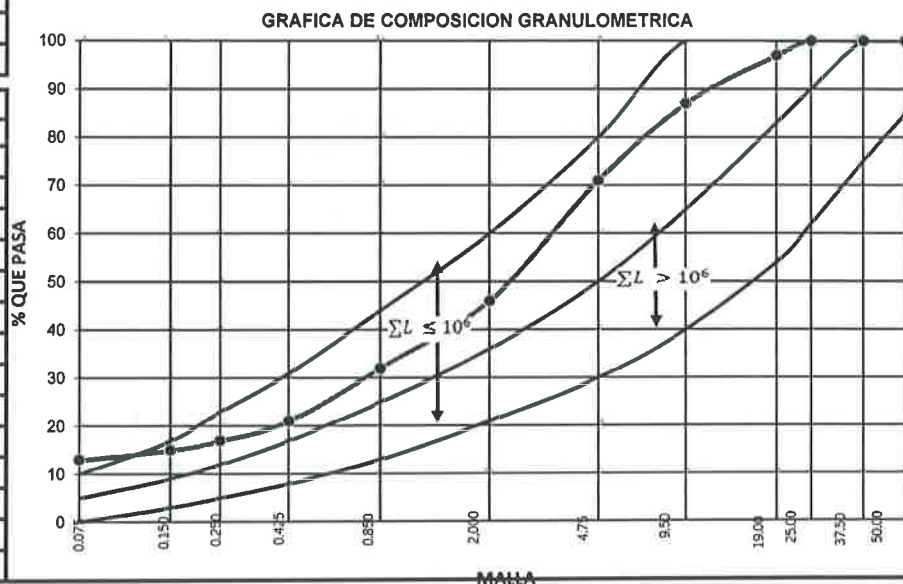

PRUEBAS EN MAT. MAYOR QUE LA MALLA Num. 9.5		PRUEBA %		ESP. SCT N-CMT-4-02-002/11	ENSAYE
				$\Sigma L \leq 10\%$	
ABSORCION (%)	1.20	V.R.S. ESTANDAR MIN		80	100%
DENSIDAD	2.56	EQUIVALENTE ARENA MIN		40	38%
CLASIFICACION UNIFICADA DE SUELOS		P. ALARG. Y LAJEADAS MAX		40	-
		DESG. DE LOS ANGELES MAX		35	-
SP-SM		PRUEBAS SOBRE MATERIAL TAMIZADO POR LA MALLA Num. 0.425			
		LIMITE LIQUIDO MAX		25	24
		LIMITE PLASTICO		NA	14
		INDICE PLASTICO MAX		6	10

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE REPORTAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL LABORATORIO

SIGNATARIO AUTORIZADO

INFORME DE MATERIALES PARA BASE DE PAVIMENTO CON CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA

METODOS ASTM EMPLEADOS: C702-11, C136-06, D698-00, D4318-10, C127-12, C128-12, D2419-09, C131-06, D4791-10


OBRA	406 DESARROLLO URBANO (FRACC CUMBRES DE ROBINSON 3)	INFORME N°	13725
CLIENTE	DESARROLLO URBANO	ENSAYE N°	5937
REPRESENTANTE	ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL	FECHA DE ENSAYE	02-dic-17
ENVIADA POR	PERSONAL DE LABORATORIO	FECHA INFORME	04-dic-17

DATOS DEL MATERIAL MUESTREADO

DESC. PETROGRAFICA DEL MATERIAL	GRAVA ARENA
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	CALLE ALTOS DE LA ESCONDIDA LADO PONIENTE ENTRE CALLE ESCONDIDA LADO SUR Y CALLE PARRA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	-
UBICACION DEL BANCO	GCC

M.V.S. SUELTO (kg/m ³)	1572
M.V.S. MAXIMO (kg/m ³)	2135
HUMEDAD OPTIMA (%)	4.5

COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLA	% RETENIDO
	EN 50.0	-
	EN 37.5	-
	% PASA	
	50.00	100
	37.50	100
	25.00	100
	19.00	99
	9.500	89
	4.750	76
	2.000	48
	0.850	30
	0.425	21
	0.250	17
	0.150	15
	0.075	12

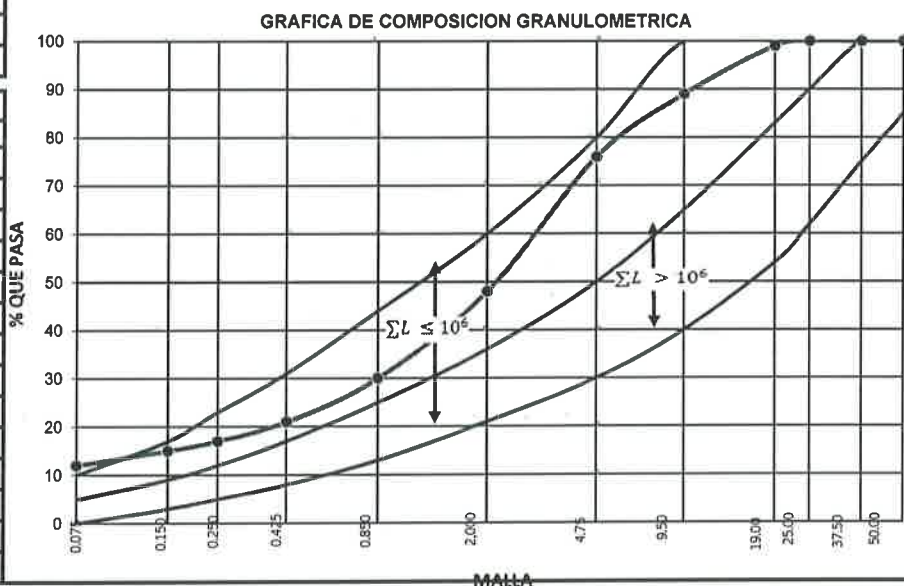

PRUEBAS EN MAT. MAYOR QUE LA MALLA Num. 9.5		PRUEBA %	ESP. SCT N-CMT-4-02-002/11		ENSAYE	
			$\Sigma L \leq 10^{\circ}$	$\Sigma L > 10^{\circ}$		
ABSORCION (%)	1.25	V.R.S. ESTANDAR MIN	80	100	100%	
DENSIDAD	2.82	EQUIVALENTE ARENA MIN	40	50	40%	
CLASIFICACION UNIFICADA DE SUELOS		S.U.C.S	P. ALARG. Y LAJEADAS MAX	40	35	-
			DESG. DE LOS ANGELES MAX	35	30	-
SP-SM		PRUEBAS SOBRE MATERIAL TAMIZADO POR LA MALLA Num. 0.425				
		LIMITE LIQUIDO MAX	25	25	21	
		LIMITE PLASTICO	NA	NA	12	
		INDICE PLASTICO MAX	6	6	9	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE REPORTAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL LABORATORIO

SIGNATARIO AUTORIZADO

INFORME DE MATERIALES PARA BASE DE PAVIMENTO CON CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA


METODOS ASTM EMPLEADOS: C702-11, C136-06, D698-00, D4318-10, C127-12, C128-12, D2419-09, C131-06, D4791-10

OBRA	406 DESARROLLO URBANO (FRACC VALLE DE MERCIA)	INFORME N°	13726
CLIENTE	DESARROLLO URBANO	ENSAYE N°	5938
REPRESENTANTE	ARQ GUILLERMO SOTO LEAL	FECHA DE ENSAYE	24/11/2017
ENVIADA POR	PERSONAL DE LABORATORIO	FECHA INFORME	25/11/2017

DATOS DEL MATERIAL MUESTREADO	
DESC. PETROGRAFICA DEL MATERIAL	GRAVA ARENA
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	CALLE VALLE DEL TRENT ACCESO
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	-
UBICACION DEL BANCO	BANCO MAR

M.V.S. SUELTO (kg/m ³)	1442
M.V.S. MAXIMO (kg/m ³)	2153
HUMEDAD OPTIMA (%)	8.3

COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLA	% RETENIDO
	EN 50.0	-
	EN 37.5	-
	% PASA	
	50.00	100
	37.50	97
	25.00	80
	19.00	74
	9.500	58
	4.750	43
	2.000	30
	0.850	23
	0.425	20
	0.250	17
	0.150	14
	0.075	12

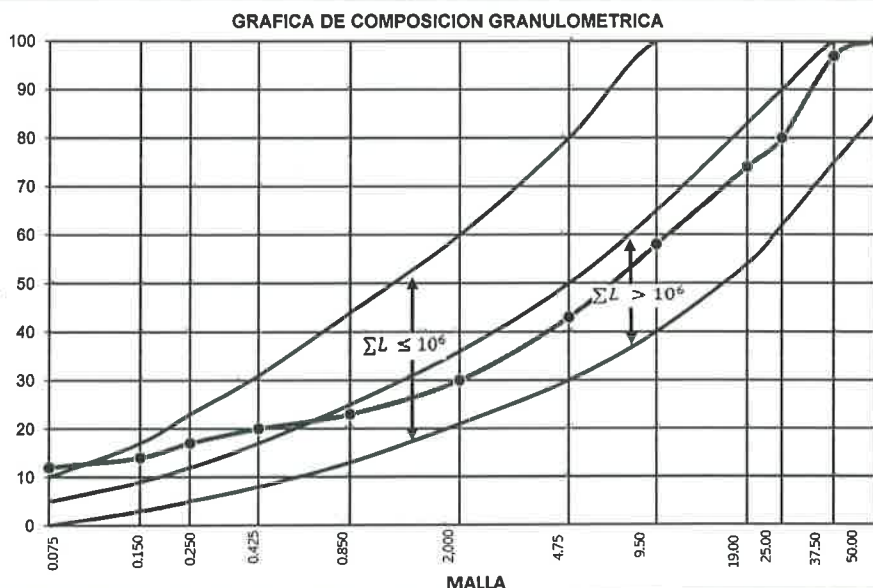

PRUEBAS EN MAT. MAYOR QUE LA MALLA Num. 9.5		PRUEBA %		ESP. SCT N-CMT-4-02-002/11		ENSAYE
				$\Sigma L \leq 10\%$	$\Sigma L > 10\%$	
ABSORCION (%)	2.31	V.R.S. ESTANDAR MIN		80	100	101%
DENSIDAD	2.56	EQUIVALENTE ARENA MIN		40	50	35%
CLASIFICACION UNIFICADA DE SUELOS		P. ALARG. Y LAJEADAS MAX		40	35	-
		DESIG. DE LOS ANGELES MAX		35	30	-
SP-SC		PRUEBAS SOBRE MATERIAL TAMIZADO POR LA MALLA Num. 0.425				
		LIMITE LIQUIDO MAX	25	25	26	
		LIMITE PLASTICO	NA	NA	15	
		INDICE PLASTICO MAX	6	6	11	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE REPORTAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LABORATORIO

SIGNATARIO AUTORIZADO

INFORME DE MATERIALES PARA BASE DE PAVIMENTO CON CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA

METODOS ASTM EMPLEADOS: C702-11, C136-06, D698-00, D4318-10, C127-12, C128-12, D2419-09, C131-06, D4791-10


OBRA	406 DESARROLLO URBANO (FRACC VALLE DE MERCIA)	INFORME N°	13727
CLIENTE	DESARROLLO URBANO	ENSAYE N°	5939
REPRESENTANTE	ARQ GUILLERMO SOTO LEAL	FECHA DE ENSAYE	24/11/2017
ENVIADA POR	PERSONAL DE LABORATORIO	FECHA INFORME	25/11/2017

DATOS DEL MATERIAL MUESTREADO

DESC. PETROGRAFICA DEL MATERIAL	GRAVA ARENA
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	CALLE CICUITO VALLE DE TRET NO 4
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	-
UBICACION DEL BANCO	BANCO MAR

M.V.S. SUELTO (kg/m ³)	1485
M.V.S. MAXIMO (kg/m ³)	2161
HUMEDAD OPTIMA (%)	8.6

COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLA	% RETENIDO
	EN 50.0	-
	EN 37.5	-
	% PASA	
	50.00	100
	37.50	98
	25.00	81
	19.00	72
	9.500	56
	4.750	41
	2.000	29
	0.850	23
	0.425	20
	0.250	17
	0.150	14
	0.075	13

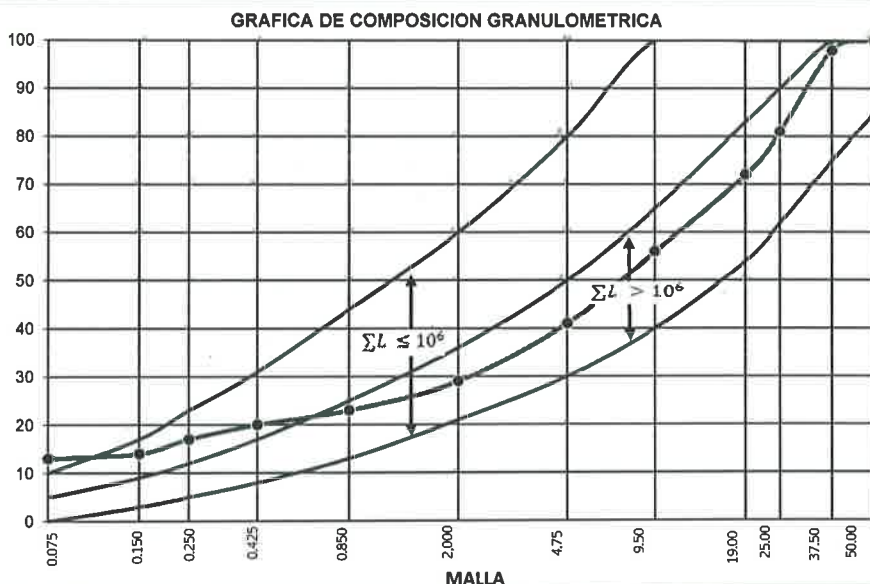

PRUEBAS EN MAT. MAYOR QUE LA MALLA Num. 9.5		PRUEBA %		ESP. SCT N-CMT-4-02-002/11		ENSAYE
				$\Sigma L \leq 10\%$	$\Sigma L > 10\%$	
ABSORCION (%)	2.29	V.R.S. ESTANDAR MIN		80	100	100%
DENSIDAD	2.53	EQUIVALENTE ARENA MIN		40	50	38%
CLASIFICACION UNIFICADA DE SUELOS		P. ALARG. Y LAJEADAS MAX		40	35	-
		DESG. DE LOS ANGELES MAX		35	30	-
GP-GC		PRUEBAS SOBRE MATERIAL TAMIZADO POR LA MALLA Num. 0.425				
		LIMITE LIQUIDO MAX		25	25	25
		LIMITE PLASTICO		NA	NA	16
		INDICE PLASTICO MAX		6	6	9

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE REPORTAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LABORATORIO

SIGNATARIO AUTORIZADO

INFORME DE MATERIALES PARA BASE DE PAVIMENTO CON CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA

METODOS ASTM EMPLEADOS: C702-11, C136-06, D698-00, D4318-10, C127-12, C128-12, D2419-09, C131-06, D4791-10


OBRA	406 DESARROLLO URBANO (FRACC VALLE DE MERCIA)	INFORME N°	13728
CLIENTE	DESARROLLO URBANO	ENSAYE N°	5940
REPRESENTANTE	ARQ GUILLERMO SOTO LEAL	FECHA DE ENSAYE	24/11/2017
ENVIADA POR	PERSONAL DE LABORATORIO	FECHA INFORME	25/11/2017

DATOS DEL MATERIAL MUESTREADO

DESC. PETROGRAFICA DEL MATERIAL	GRAVA ARENA
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	CALLE VALLE CIRCUITO DE TRET 1A
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	-
UBICACION DEL BANCO	BANCO MAR

M.V.S. SUELTO (kg/m3)	1450
M.V.S. MAXIMO (kg/m3)	2163
HUMEDAD OPTIMA (%)	8.7

COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLA	% RETENIDO
	EN 50.0	-
	EN 37.5	-
	% PASA	
	50.00	100
	37.50	97
	25.00	80
	19.00	74
	9.500	57
	4.750	45
	2.000	31
	0.850	22
	0.425	19
	0.250	17
	0.150	15
	0.075	13

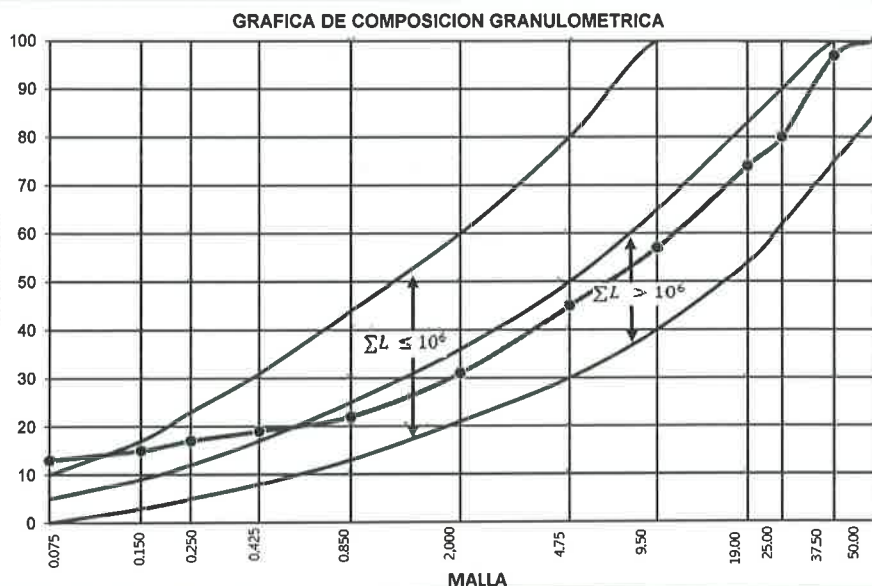

PRUEBAS EN MAT. MAYOR QUE LA MALLA Num. 9.5		PRUEBA %		ESP. SCT N-CMT-4-02-002/11		ENSAYE
				$\Sigma L \leq 10\%$	$\Sigma L > 10\%$	
ABSORCION (%)	2.32	V.R.S. ESTANDAR MIN		80	100	101%
DENSIDAD	2.45	EQUIVALENTE ARENA MIN		40	50	33%
CLASIFICACION UNIFICADA DE SUELOS		P. ALARG. Y LAJEADAS MAX		40	35	-
		DESG. DE LOS ANGELES MAX		35	30	-
GC		PRUEBAS SOBRE MATERIAL TAMIZADO POR LA MALLA Num. 0.425				
		LIMITE LIQUIDO MAX		25	25	28
		LIMITE PLASTICO		NA	NA	19
		INDICE PLASTICO MAX		6	6	9

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE REPORTAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LABORATORIO

SIGNATARIO AUTORIZADO

INFORME DE MATERIALES PARA BASE DE PAVIMENTO CON CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA

METODOS ASTM EMPLEADOS: C702-11, C136-06, D698-00, D4318-10, C127-12, C128-12, D2419-09, C131-06, D4791-10


OBRA	406 DESARROLLO URBANO (FRACC VALLE DE MERCIA)	INFORME N°	13729
CLIENTE	DESARROLLO URBANO	ENSAYE N°	5941
REPRESENTANTE	ARQ GUILLERMO SOTO LEAL	FECHA DE ENSAYE	24/11/2017
ENVIADA POR	PERSONAL DE LABORATORIO	FECHA INFORME	25/11/2017

DATOS DEL MATERIAL MUESTREADO

DESC. PETROGRAFICA DEL MATERIAL	GRAVA ARENA
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	CALLE VALLE VESSEX
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	-
UBICACION DEL BANCO	BANCO MAR

M.V.S. SUELTO (kg/m ³)	1463
M.V.S. MAXIMO (kg/m ³)	2159
HUMEDAD OPTIMA (%)	8.1

COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLA	% RETENIDO
	EN 50.0	-
	EN 37.5	-
		% PASA
	50.00	100
	37.50	98
	25.00	81
	19.00	76
	9.500	58
	4.750	47
	2.000	32
	0.850	23
	0.425	19
	0.250	18
	0.150	16
0.075	13	

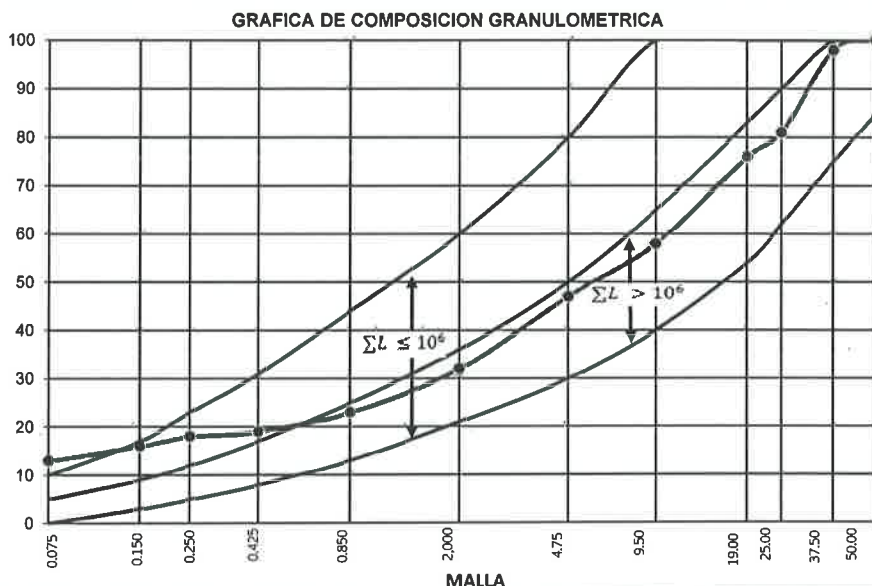

PRUEBAS EN MAT. MAYOR QUE LA MALLA Num. 9.5		PRUEBA %		ESP. SCT N-CMT-4-02-002/11		ENSAYE
				$\Sigma L \leq 10\%$	$\Sigma L > 10\%$	
ABSORCION (%)	2.29	V.R.S. ESTANDAR MIN		80	100	100%
DENSIDAD	2.46	EQUIVALENTE ARENA MIN		40	50	37%
CLASIFICACION UNIFICADA DE SUELOS		P. ALARG. Y LAJEADAS MAX		40	35	-
		DESG. DE LOS ANGELES MAX		35	30	-
GC		PRUEBAS SOBRE MATERIAL TAMIZADO POR LA MALLA Num. 0.425				
		LIMITE LIQUIDO MAX		25	25	27
		LIMITE PLASTICO		NA	NA	18
		INDICE PLASTICO MAX		6	6	9

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE REPORTAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LABORATORIO

SIGNATARIO AUTORIZADO

INFORME DE MATERIALES PARA BASE DE PAVIMENTO CON CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA

METODOS ASTM EMPLEADOS: C702-11, C136-06, D698-00, D4318-10, C127-12, C128-12, D2419-09, C131-06, D4791-10


OBRA	406 DESARROLLO URBANO (FRACC VALLE DE MERCIA)	INFORME N°	13730
CLIENTE	DESARROLLO URBANO	ENSAYE N°	5942
REPRESENTANTE	ARQ GUILLERMO SOTO LEAL	FECHA DE ENSAYE	25/11/2017
ENVIADA POR	PERSONAL DE LABORATORIO	FECHA INFORME	26/11/2017

DATOS DEL MATERIAL MUESTREADO

DESC. PETROGRAFICA DEL MATERIAL	GRAVA ARENA
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	CALLE VALLE DE KEN NO 2
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	-
UBICACION DEL BANCO	BANCO MAR

M.V.S. SUELTO (kg/m ³)	1468
M.V.S. MAXIMO (kg/m ³)	2168
HUMEDAD OPTIMA (%)	8.0

COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLA	% RETENIDO
	EN 50.0	-
	EN 37.5	-
	% PASA	
	50.00	100
	37.50	98
	25.00	81
	19.00	74
	9.500	55
	4.750	45
	2.000	31
	0.850	22
	0.425	18
	0.250	16
	0.150	15
	0.075	13

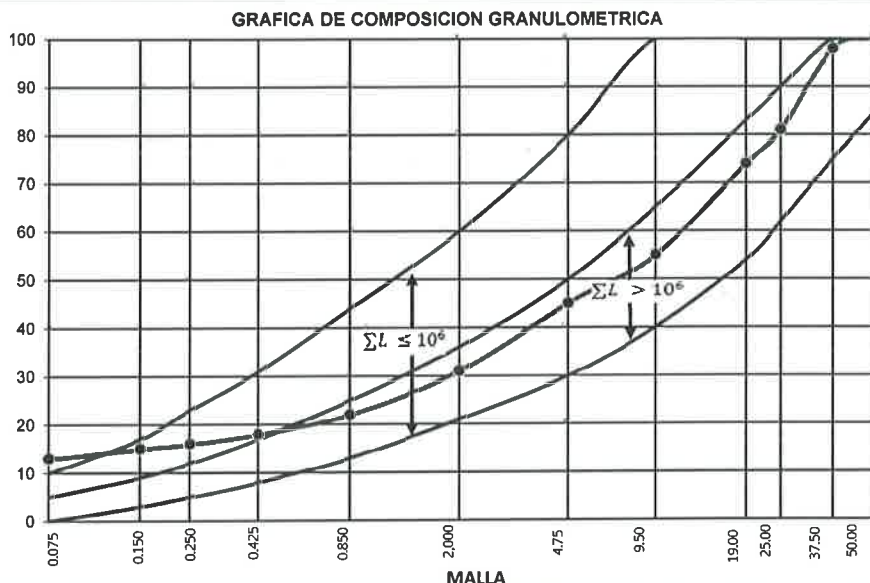

PRUEBAS EN MAT. MAYOR QUE LA MALLA Num. 9.5		PRUEBA %	ESP. SCT N-CMT-4-02-002/11		ENSAYE	
			$\Sigma L \leq 10^{\circ}$	$\Sigma L > 10^{\circ}$		
ABSORCION (%)	2.31	V.R.S. ESTANDAR MIN	80	100	100%	
DENSIDAD	2.47	EQUIVALENTE ARENA MIN	40	50	39%	
CLASIFICACION UNIFICADA DE SUELOS		S.U.C.S	P. ALARG. Y LAJEADAS MAX	40	35	-
			DESG. DE LOS ANGELES MAX	35	30	-
GC		PRUEBAS SOBRE MATERIAL TAMIZADO POR LA MALLA Num. 0.425				
			LIMITE LIQUIDO MAX	25	25	25
			LIMITE PLASTICO	NA	NA	19
			INDICE PLASTICO MAX	6	6	6

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE REPORTAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LABORATORIO

SIGNATARIO AUTORIZADO

* ESTE INFORME SOLO AFECTA A LOS ESPECIMENES Y/O MUESTRAS SOMETIDAS A PRUEBA.

* PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTA INFORME SIN LA AUTORIZACION DEL LABORATORIO.

LCO-CI-IMBA

INFORME DE MATERIALES PARA BASE DE PAVIMENTO CON CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA

METODOS ASTM EMPLEADOS: C702-11, C136-06, D698-00, D4318-10, C127-12, C128-12, D2419-09, C131-06, D4791-10


OBRA	406 DESARROLLO URBANO (FRACC VISTAS DEL NORTE II)	INFORME N°	13731
CLIENTE	DESARROLLO URBANO	ENSAYE N°	5943
REPRESENTANTE	ARQ GUILLERMO SOTO LEAL	FECHA DE ENSAYE	02-dic-17
ENVIADA POR	PERSONAL DE LABORATORIO	FECHA INFORME	04-dic-17

DATOS DEL MATERIAL MUESTREADO

DESC. PETROGRAFICA DEL MATERIAL	GRAVA ARENA
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	CALLE RIO DE BOLAÑOS LADO NORTE
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	-
UBICACION DEL BANCO	GCC

M.V.S. SUELTO (kg/m3)	1530
M.V.S. MAXIMO (kg/m3)	2145
HUMEDAD OPTIMA (%)	5.5

COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLA	% RETENIDO
	EN 50.0	-
	EN 37.5	-
	% PASA	
	50.00	100
	37.50	100
	25.00	95
	19.00	82
	9.500	67
	4.750	52
	2.000	38
	0.850	32
	0.425	21
	0.250	17
	0.150	14
	0.075	10

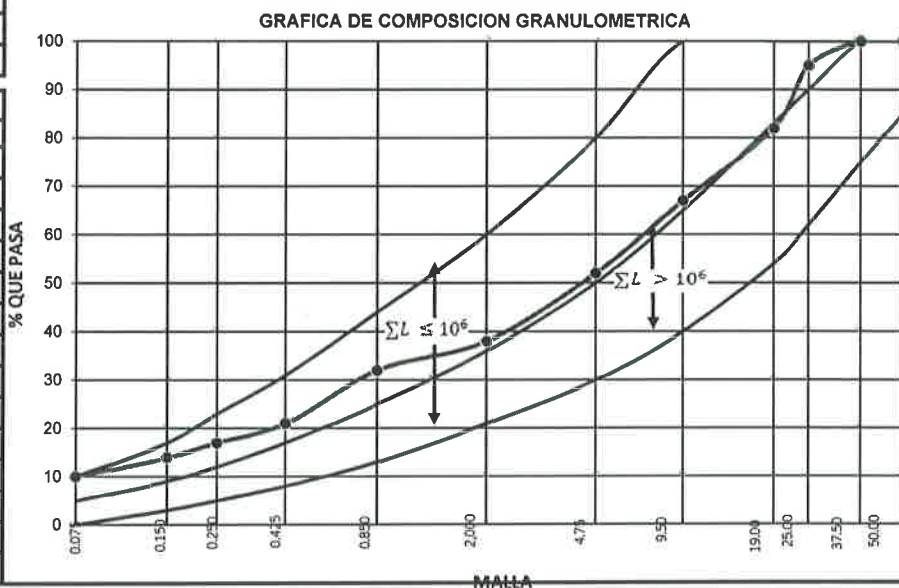

PRUEBAS EN MAT. MAYOR QUE LA MALLA Num. 9.5		PRUEBA %		ESP. SCT N-CMT-4-02-002/11		ENSAYE
				$\Sigma L \leq 10\%$	$\Sigma L > 10\%$	
ABSORCION (%)	2.20	V.R.S. ESTANDAR MIN		80	100	101%
DENSIDAD	2.61	EQUIVALENTE ARENA MIN		40	50	48%
CLASIFICACION UNIFICADA DE SUELOS		P. ALARG. Y LAJEADAS MAX		40	35	-
		DESG. DE LOS ANGELES MAX		35	30	-
GW-GM		PRUEBAS SOBRE MATERIAL TAMIZADO POR LA MALLA Num. 0.425				
		LIMITE LIQUIDO MAX		25	25	25
		LIMITE PLASTICO		NA	NA	22
		INDICE PLASTICO MAX		6	6	3

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE REPORTAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL LABORATORIO

SIGNATARIO AUTORIZADO

INFORME DE MATERIALES PARA BASE DE PAVIMENTO CON CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA

METODOS ASTM EMPLEADOS: C702-11, C136-06, D698-00, D4318-10, C127-12, C128-12, D2419-09, C131-06, D4791-10


OBRA	406 DESARROLLO URBANO (FRACC VISTAS DEL NORTE II)	INFORME N°	13732
CLIENTE	DESARROLLO URBANO	ENSAYE N°	5944
REPRESENTANTE	ARQ GUILLERMO SOTO LEAL	FECHA DE ENSAYE	02-dic-17
ENVIADA POR	PERSONAL DE LABORATORIO	FECHA INFORME	04-dic-17

DATOS DEL MATERIAL MUESTREADO

DESC. PETROGRAFICA DEL MATERIAL	GRAVA ARENA
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	CIRCUITO DE TEUTEPEC LADO SUR Y LADO NORTE
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	-
UBICACION DEL BANCO	GCC

M.V.S. SUELTO (kg/m ³)	1562
M.V.S. MAXIMO (kg/m ³)	2147
HUMEDAD OPTIMA (%)	5.6

COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLA	% RETENIDO
	EN 50.0	-
	EN 37.5	-
	% PASA	
	50.00	100
	37.50	100
	25.00	93
	19.00	81
	9.500	66
	4.750	53
	2.000	37
	0.850	30
	0.425	19
	0.250	16
	0.150	12
	0.075	11

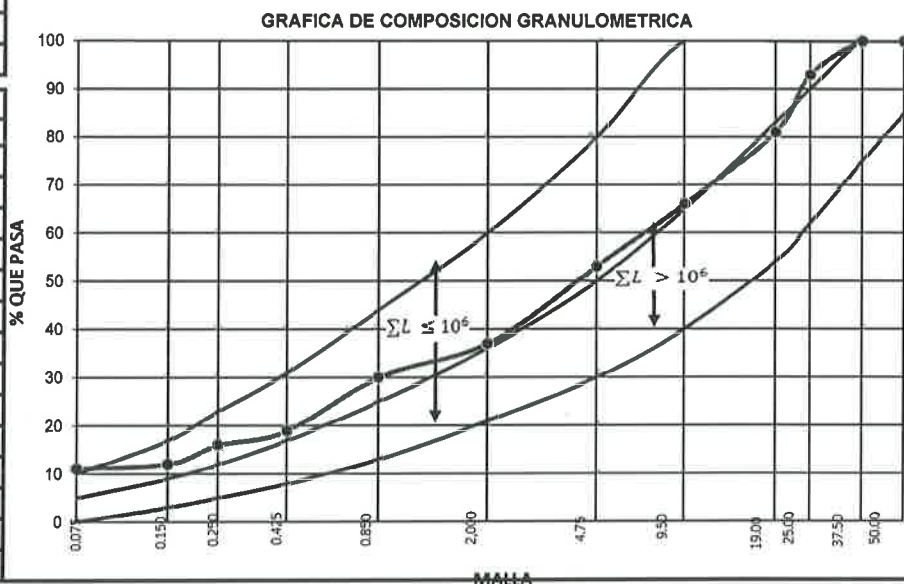

PRUEBAS EN MAT. MAYOR QUE LA MALLA Num. 9.5		PRUEBA %		ESP. SCT N-CMT-4-02-002/11		ENSAYE
				$\sum L \leq 10\%$	$\sum L > 10\%$	
ABSORCION (%)	2.20	V.R.S. ESTANDAR MIN		80	100	102%
DENSIDAD	2.64	EQUIVALENTE ARENA MIN		40	50	50%
CLASIFICACION UNIFICADA DE SUELOS		P. ALARG. Y LAJEADAS MAX		40	35	-
		DESG. DE LOS ANGELES MAX		35	30	-
GP-GM		PRUEBAS SOBRE MATERIAL TAMIZADO POR LA MALLA Num. 0.425				
		LIMITE LIQUIDO MAX		25	25	25
		LIMITE PLASTICO		NA	NA	19
		INDICE PLASTICO MAX		6	6	6

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE REPORTAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL LABORATORIO

SIGNATARIO AUTORIZADO

INFORME DE MATERIALES PARA BASE DE PAVIMENTO CON CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA

METODOS ASTM EMPLEADOS: C702-11, C136-06, D698-00, D4318-10, C127-12, C128-12, D2419-09, C131-06, D4791-10


OBRA	406 DESARROLLO URBANO (FRACC VISTAS DE LAS LOMAS)	INFORME N°	13733
CLIENTE	DESARROLLO URBANO	ENSAYE N°	5945
REPRESENTANTE	ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL	FECHA DE ENSAYE	02-dic-17
ENVIADA POR	PERSONAL DE LABORATORIO	FECHA INFORME	04-dic-17

DATOS DEL MATERIAL MUESTREADO

DESC. PETROGRAFICA DEL MATERIAL	GRAVA ARENA
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	CALLE VISTA DE LA CIMA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	-
UBICACION DEL BANCO	GCC

M.V.S. SUELTO (kg/m ³)	1601
M.V.S. MAXIMO (kg/m ³)	2215
HUMEDAD OPTIMA (%)	5.1

COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLA	% RETENIDO
	EN 50.0	-
	EN 37.5	-
		% PASA
	50.00	100
	37.50	100
	25.00	94
	19.00	88
	9.500	72
	4.750	53
	2.000	42
	0.850	28
	0.425	17
	0.250	14
	0.150	10
0.075	8	

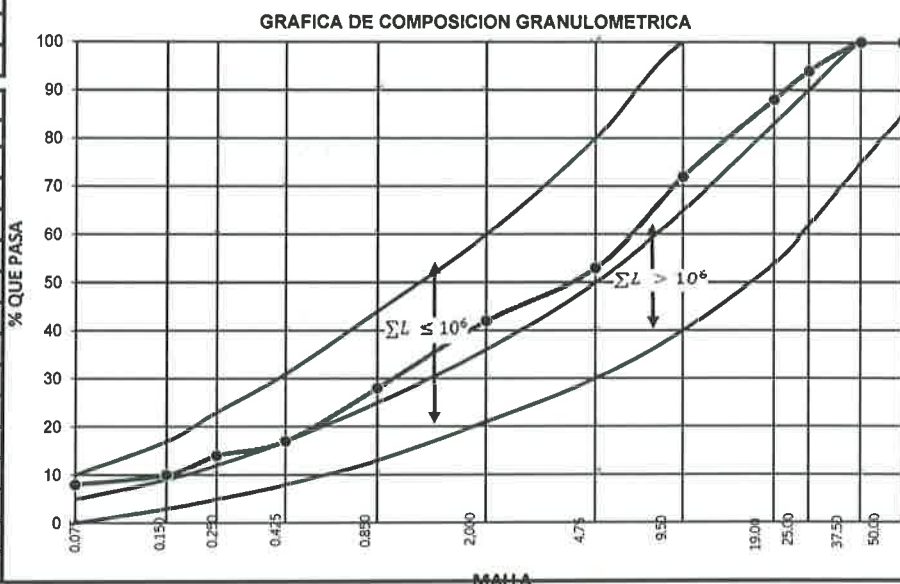

PRUEBAS EN MAT. MAYOR QUE LA MALLA Num. 9.5		PRUEBA %	ESP. SCT N-CMT-4-02-002/11		ENSAYE
			$\Sigma L \leq 10\%$	$\Sigma L > 10\%$	
ABSORCION (%)	1.46	V.R.S. ESTANDAR MIN	80	100	101%
DENSIDAD	2.61	EQUIVALENTE ARENA MIN	40	50	50%
CLASIFICACION UNIFICADA DE SUELOS		P. ALARG. Y LAJEADAS MAX	40	35	-
		DESG. DE LOS ANGELES MAX	35	30	-
GW-GM		PRUEBAS SOBRE MATERIAL TAMIZADO POR LA MALLA Num. 0.425			
		LIMITE LIQUIDO MAX	25	25	24
		LIMITE PLASTICO	NA	NA	19
		INDICE PLASTICO MAX	6	6	5

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE REPORTAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL LABORATORIO

SIGNATARIO AUTORIZADO

LABORATORIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.

LACOSA

CONTROL DE CALIDAD
Manuel Garcia No. 10102 Col. Deportistas
Chihuahua, Chih. C.P. 31125
Tels. 417-00-33 y 419-56-20

INFORME DE CONCRETO ASFALTICO TAMAÑO MAXIMO NOMINAL DE 3/4 " PARA CUALQUIER VALOR DE EJES EQUIVALENTES


OBRA	406 DESARROLLO URBANO (FRACC VINEDOS)	INFORME N°	13734
CLIENTE	DESARROLLO URBANO	ENSAYE N°	799
LOCALIZACION	AVENIDA PROLONGACION HOMERO	FECHA DE RECIBO	2017-10-31
ENVIADA POR	PERSONAL DE LABORATORIO	FECHA DE INFORME	2017-11-01

DATOS	MATERIAL PARA CAPA DE:	MEZCLA ASFALTICA
DEL	DESCRIPCION PETROGRAFICA DEL MATERIAL	ROCA TRITURADA CALIZA
	CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	TENDIDO
	TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TAMAÑO MAXIMO NOMINAL 3/4"
MUESTREO	UBICACION DEL BANCO	GLSA

P.V.S. SUELTO (kg/m3)		-
COMBINACION MATERIAL PETREOS		
ARENA EN %		-
SELLO EN %		-
GRAVA EN %		-
G R A V I T A C I O N C A	MALLA	% RETENIDO
	50.00	-
	% QUE PASA	
	37.50	100
	25.40	100
	19.00	100
	12.50	95
	9.50	88
	6.300	74
	4.750	70
	2.000	37
	0.850	20
	0.425	11
0.250	8	
0.150	6	
0.075	4	

GRAFICA DE COMPOSICION GRANULOMETRICA

Malla (mm)	% Que Pasa (Material 1)	% Que Pasa (Material 2)	% Que Pasa (Material 3)
200	5	3	2
100	10	5	3
60	15	8	5
40	20	12	8
20	30	20	12
10	45	30	20
4	70	50	35
1/4"	75	60	45
3/8"	85	75	65
1/2"	95	90	85
3/4"	100	100	95
1"	100	100	100

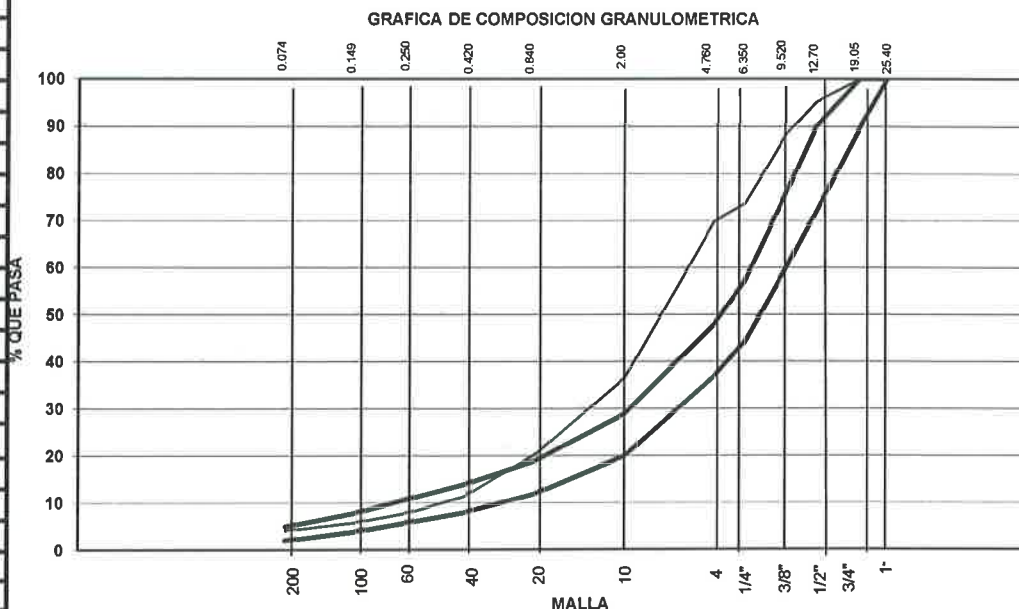

CARACTERISTICAS MATERIAL PETREO	ESPECIFICACION	ENSAYE	CARACTERISTICAS DEL ASFALTO	
DENSIDAD RELATIVA MINIMO	2.4	-	TIPO	-
DESAGASTE DE LOS ANGELES MAX (%)	30	-	PENETRACION	-
% DE TRITURACION	-	-	VISCOSIDAD	-
PARTICULAS ALARGADAS MAXIMO (%)	35	-	TEMP. RECOMENDADA	-
PARTICULAS LAJEADAS MAXIMO (%)	35	-	TEMP. DE APLICACIÓN	-
EQUIVALENTE DE ARENA MINIMO (%)	50	-	OTRA	-

CARACTERIZACION DE LA MEZCLA			CARACTERISTICAS DEL ESPECIMEN	ESPECIFICACION	ENSAYE 1	ENSAYE 2	ENSAYE 3
ASFALTO	DEL PROYECTO	ENSAYE	P.E. Kg/m³	-	2421	2434	2436
CONT. DE ASFALTO (%)	-	5.0	ESTABILIDAD kgs	817 Min	1175	1037	1131
ADITIVO USADO	MARCA	-	FLUJO mm	2-3.5	2.1	2.5	2.5
	TIPO	-	VACIOS %	3-5	3.0	2.45	2.34
	CANTIDAD	-	V.A.M. %	13% Min.	14.29	13.84	13.74
AFINIDAD			V.F.A %	65-75	79.22	82.28	82.95

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SIGNATARIO AUTORIZADO

SIGNATARIO AUTORIZADO

INFORME DE CONCRETO ASFALTICO TAMAÑO MAXIMO NOMINAL DE 3/4 " PARA CUALQUIER VALOR DE EJES EQUIVALENTES


OBRA	406 DESARROLLO URBANO (FRACC VIÑEDOS)	INFORME N°	13735
CLIENTE	DESARROLLO URBANO	ENSAYE N°	799
LOCALIZACION	AVENIDA VIÑEDOS ENCINILLAS	FECHA DE RECIBO	2017-10-31
ENVIADA POR	PERSONAL DE LABORATORIO	FECHA DE INFORME	2017-11-01

DATOS	MATERIAL PARA CAPA DE:	MEZCLA ASFALTICA
DEL	DESCRIPCION PETROGRAFICA DEL MATERIAL	ROCA TRITURADA CALIZA
	CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	TENDIDO AVENIDA VIÑEDOS ENCINILLAS
	TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TAMAÑO MAXIMO NOMINAL 3/4"
MUESTREO	UBICACION DEL BANCO	GLSA

P.V.S. SUELTO (kg/m3)		-
COMBINACION MATERIAL PETREOS		
ARENA EN %		-
SELLO EN %		-
GRAVA EN %		-
G R A V I T A C I O N C A	MALLA	% RETENIDO
	50.00	-
	% QUE PASA	
	37.50	100
	25.40	100
	19.00	100
	12.50	95
	9.50	88
	6.300	74
	4.750	70
	2.000	37
	0.850	20
	0.425	11
	0.250	8
	0.150	6
	0.075	4

GRAFICA DE COMPOSICION GRANULOMETRICA

MALLA	% QUE PASA (Sample 1)	% QUE PASA (Sample 2)	% QUE PASA (Sample 3)
200	5	3	2
100	10	6	4
60	15	10	7
40	20	15	10
20	30	25	20
10	45	40	35
4	70	55	45
1/4"	75	65	55
3/8"	85	75	65
1/2"	95	85	75
3/4"	100	95	85
1"	100	100	100

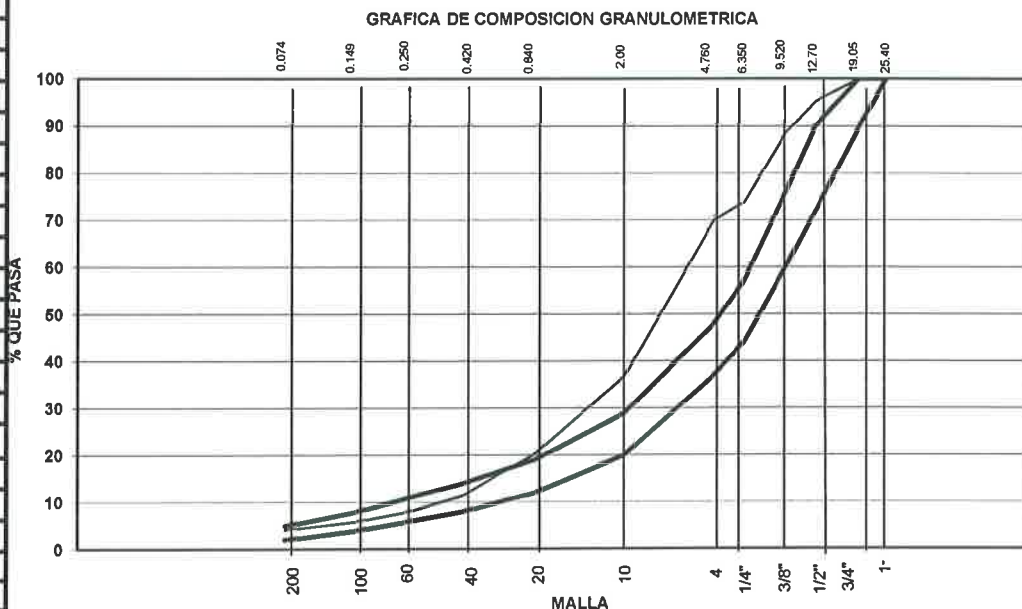

CARACTERISTICAS MATERIAL PETREO	ESPECIFICACION	ENSAYE	CARACTERISTICAS DEL ASFALTO	
DENSIDAD RELATIVA MINIMO	2.4	-	TIPO	-
ABSORCION (%)	-	-	PENETRACION	-
DESGASTE DE LOS ANGELES MAX (%)	30	-	VISCOSIDAD	-
% DE TRITURACION	-	-	TEMP. RECOMENDADA	-
PARTICULAS ALARGADAS MAXIMO (%)	35	-	TEMP. DE APLICACIÓN	-
PARTICULAS LAJEADAS MAXIMO (%)	35	-	OTRA	-
EQUIVALENTE DE ARENA MINIMO (%)	50	-		

CARACTERIZACION DE LA MEZCLA			CARACTERISTICAS DEL ESPECIMEN	ESPECIFICACION	ENSAYE 1	ENSAYE 2	ENSAYE 3
ASFALTO	DEL PROYECTO	ENSAYE	P.E. Kg/m ³	-	2416	2406	2412
CONT. DE ASFALTO (%)	-	4.9	ESTABILIDAD kgs	817 Min	1073	932	1111
ADITIVO USADO	MARCA	-	FLUJO mm	2-3.5	2.7	2.1	2.6
	TIPO	-	VACIOS %	3-5	3.1	3.54	3.32
	CANTIDAD	-	V.A.M. %	13% Min.	14.45	14.80	14.80
AFINIDAD			V.F.A %	65-75	78.21	76.06	77.27

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SIGNATARIO AUTORIZADO

SIGNATARIO AUTORIZADO

INFORME DE CONCRETO ASFALTICO TAMAÑO MAXIMO NOMINAL DE 3/4 " PARA CUALQUIER VALOR DE EJES EQUIVALENTES


OBRA	406 DESARROLLO URBANO (FRACC VINEDOS)	INFORME N°	13736
CLIENTE	DESARROLLO URBANO	ENSAYE N°	811
LOCALIZACION	CHIHUAHUA CHIHUAHUA	FECHA DE RECIBO	2017-11-06
ENVIADA POR	PERSONAL DE LABORATORIO	FECHA DE INFORME	2017-11-07

DATOS	MATERIAL PARA CAPA DE:	MEZCLA ASFALTICA
DEL	DESCRIPCION PETROGRAFICA DEL MATERIAL	ROCA TRITURADA CALIZA
MUESTREO	CLASE DE DEPOSITO MUESTREO	CALLE CIRCUITO VINEDOS BALDUZZI LADO ORIENTE
	TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TAMAÑO MAXIMO NOMINAL 3/4"
	UBICACION DEL BANCO	GILSA

P.V.S. SUELTO (kg/m3)		-
COMBINACION MATERIAL PETREOS		
ARENA EN %		-
SELLO EN %		-
GRAVA EN %		-
G R A V I M U L P O O S M I E C T I R O I N C A	MALLA	% RETENIDO
	50.00	-
	% QUE PASA	
	37.50	100
	25.40	100
	19.00	98
	12.50	95
	9.50	93
	6.300	81
	4.750	72
	2.000	32
	0.850	18
	0.425	11
	0.250	8
	0.150	6
	0.075	4

GRAFICA DE COMPOSICION GRANULOMETRICA

MALLA	% QUE PASA (Top Curve)	% QUE PASA (Middle Curve)	% QUE PASA (Bottom Curve)
200	5	4	3
100	10	8	6
60	15	12	10
40	20	18	15
20	30	25	20
10	45	35	25
4	70	55	35
1/4"	85	70	45
3/8"	95	85	60
1/2"	100	95	80
3/4"	100	100	95
1"	100	100	100

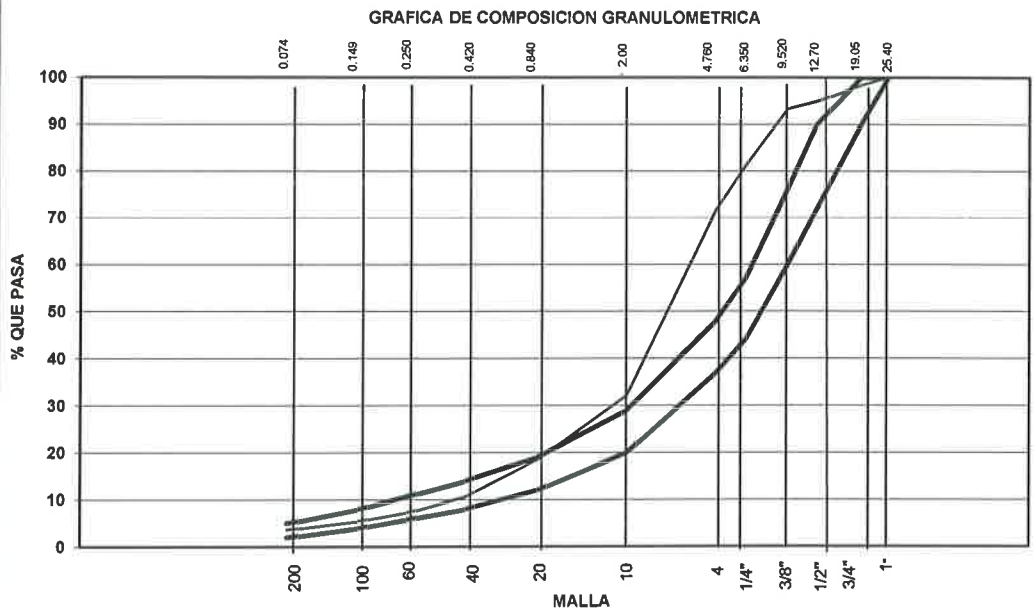

CARACTERISTICAS MATERIAL PETREO	ESPECIFICACION	ENSAYE	CARACTERISTICAS DEL ASFALTO	
DENSIDAD RELATIVA MINIMO	2.4	-	TIPO	-
ABSORCION (%)	-	-	PENETRACION	-
DESGASTE DE LOS ANGELES MAX (%)	30	-	VISCOSIDAD	-
% DE TRITURACION	-	-	TEMP. RECOMENDADA	-
PARTICULAS ALARGADAS MAXIMO (%)	35	-	TEMP. DE APLICACIÓN	-
PARTICULAS LAJEADAS MAXIMO (%)	35	-	OTRA	-
EQUIVALENTE DE ARENA MINIMO (%)	50	-		

CARACTERIZACION DE LA MEZCLA			CARACTERISTICAS DEL ESPECIMEN	ESPECIFICACION	ENSAYE 1	ENSAYE 2	ENSAYE 3
ASFALTO	DEL PROYECTO	ENSAYE	P.E. Kg/m³	-	2338	2348	2350
CONT. DE ASFALTO (%)	-	4.5	ESTABILIDAD kgs	817 Min	889	1099	1132
ADITIVO USADO	MARCA	-	FLUJO mm	2-3.5	2.7	2.8	2.5
	TIPO	-	VACIOS %	3-5	5.0	4.63	4.55
	CANTIDAD	-	V.A.M. %	13% Min.	14.91	14.54	14.47
AFINIDAD	-	-	V.F.A %	65-75	66.14	68.14	68.54

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SIGNATARIO AUTORIZADO

SIGNATARIO AUTORIZADO

INFORME DE CONCRETO ASFALTICO TAMAÑO MAXIMO NOMINAL DE 3/4 " PARA CUALQUIER VALOR DE EJES EQUIVALENTES

OBRA	406 DESARROLLO URBANO (FRACC VINEDOS)	INFORME N°	13737
CLIENTE	DESARROLLO URBANO	ENSAYE N°	813
LOCALIZACION	CHIHUAHUA CHIHUAHUA	FECHA DE RECIBO	2017-11-13
ENVIADA POR	PERSONAL DE LABORATORIO	FECHA DE INFORME	2017-11-14

P.V.S. SUELTO (kg/m3)		-
COMBINACION MATERIAL PETREOS		
ARENA EN %		-
SELLO EN %		-
GRAVA EN %		-
G R A V I M E N C A	MALLA	% RETENIDO
	50.00	-
	% QUE PASA	
	37.50	100
	25.40	100
	19.00	98
	12.50	94
	9.50	91
	6.300	80
	4.750	71
2.000	32	
0.850	18	
0.425	11	
0.250	7	
0.150	5	
0.075	3	

GRAFICA DE COMPOSICION GRANULOMETRICA

MALLA	0.075	0.149	0.250	0.420	0.840	2.00	4.750	6.350	9.520	12.70	19.05	25.40
% QUE PASA	3	5	7	11	18	32	71	80	91	94	98	100

CARACTERISTICAS MATERIAL PETREO	ESPECIFICACION	ENSAYE	CARACTERISTICAS DEL ASFALTO	
DENSIDAD RELATIVA MINIMO	2.4	-	TIPO	-
ABSORCION (%)	-	-	PENETRACION	-
DESGASTE DE LOS ANGELES MAX (%)	30	-	VISCOSIDAD	-
% DE TRITURACION	-	-	TEMP. RECOMENDADA	-
PARTICULAS ALARGADAS MAXIMO (%)	35	-	TEMP. DE APLICACIÓN	-
PARTICULAS LAJEADAS MAXIMO (%)	35	-	OTRA	-
EQUIVALENTE DE ARENA MINIMO (%)	50	-		

CARACTERIZACION DE LA MEZCLA			CARACTERISTICAS	ESPECIFI-	ENSAYE	ENSAYE	ENSAYE
ASFALTO	DEL PROYECTO	ENSAYE	DEL ESPECIMEN	CACION	1	2	3
CONT. DE ASFALTO (%)	-	4.5	P.E. Kg/m³	-	2348	2349	2356
ADITIVO	MARCA	-	ESTABILIDAD kgs	817 Min	952	1035	1145
USADO	TIPO	-	FLUJO mm	2-3.5	2.9	2.6	2.6
	CANTIDAD	-	VACIOS %	3-5	4.7	4.63	4.36
AFINIDAD	-	-	V.A.M. %	13% Min.	14.56	14.51	14.27
	-	-	V.F.A %	65-75	67.80	68.08	69.44

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SIGNATARIO AUTORIZADO


SIGNATARIO AUTORIZADO

INFORME DE CONCRETO ASFALTICO TAMAÑO MAXIMO NOMINAL DE 3/4 " PARA CUALQUIER VALOR DE EJES EQUIVALENTES

OBRA	406 DESARROLLO URBANO (FRACC MONTE VERDE I)	INFORME N°	13738
CLIENTE	DESARROLLO URBANO	ENSAYE N°	816
LOCALIZACION	CHIHUAHUA CHIHUAHUA	FECHA DE RECIBO	2017-11-14
ENVIADA POR	PERSONAL DE LABORATORIO	FECHA DE INFORME	2017-11-15

DATOS	MATERIAL PARA CAPA DE:	MEZCLA ASFALTICA
DEL	DESCRIPCION PETROGRAFICA DEL MATERIAL	ROCA TRITURADA CALIZA
	CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	CALLE LLANURA SAVAL LADO PONIENTE ENTRE LLANURA SAVAL LADO SUR Y LADO NORT
	TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TAMAÑO MAXIMO NOMINAL 3/4"
MUESTREO	UBICACION DEL BANCO	ARTURO ARMENDARIZ

P.V.S. SUELTO (kg/m3)		-
COMBINACION MATERIAL PETREOS		
ARENA EN %		-
SELLO EN %		-
GRAVA EN %		-
G R A V I T A C I O N C A	MALLA	% RETENIDO
	50.00	-
	% QUE PASA	
	37.50	100
	25.40	100
	19.00	98
	12.50	97
	9.50	89
	6.300	71
	4.750	66
	2.000	34
	0.850	20
	0.425	11
	0.250	8
	0.150	6
	0.075	4

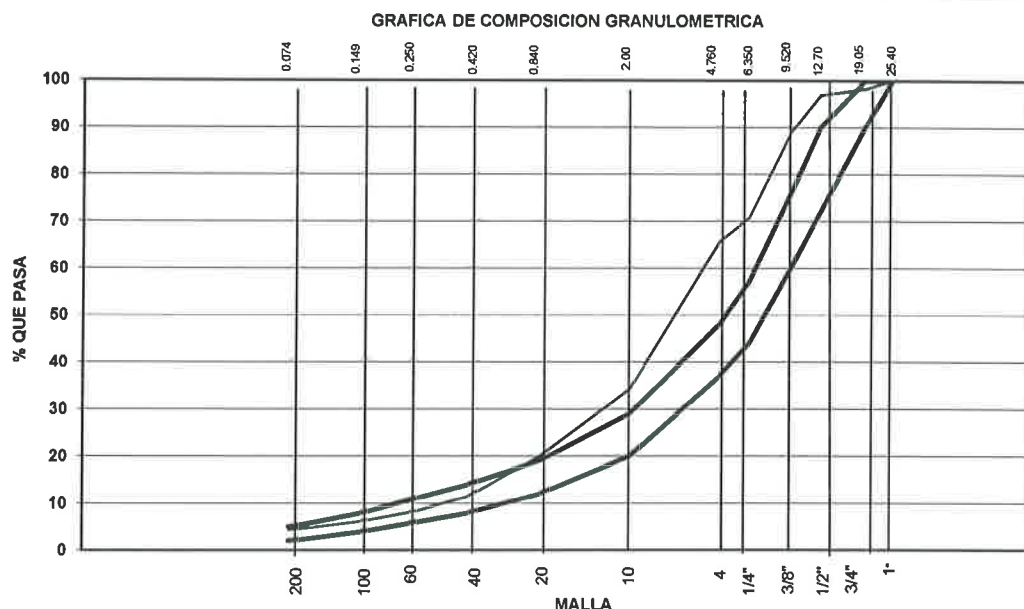

CARACTERISTICAS MATERIAL PETREO	ESPECIFICACION	ENSAYE	CARACTERISTICAS DEL ASFALTO	
DENSIDAD RELATIVA MINIMO	2.4	-	TIPO	-
ABSORCION (%)	-	-	PENETRACION	-
DESGASTE DE LOS ANGELES MAX (%)	30	-	VISCOSIDAD	-
% DE TRITURACION	-	-	TEMP. RECOMENDADA	-
PARTICULAS ALARGADAS MAXIMO (%)	35	-	TEMP. DE APLICACIÓN	-
PARTICULAS LAJEADAS MAXIMO (%)	35	-	OTRA	-
EQUIVALENTE DE ARENA MINIMO (%)	50	-		

CARACTERIZACION DE LA MEZCLA			CARACTERISTICAS DEL ESPECIMEN	ESPECIFICACION	ENSAYE 1	ENSAYE 2	ENSAYE 3
ASFALTO	DEL PROYECTO	ENSAYE	P.E. Kg/m ³	-	2370	2379	2390
CONT. DE ASFALTO (%)	-	5.3	ESTABILIDAD kgs	817 Min	1081	1149	1116
ADITIVO USADO	MARCA	-	FLUJO mm	2-3.5	2.8	3.1	3
	TIPO	-	VACIOS %	3-5	3.0	2.64	2.18
	CANTIDAD	-	V.A.M. %	13% Min.	14.76	14.43	14.02
AFINIDAD	-	-	V.F.A %	65-75	79.53	81.69	84.47

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SIGNATARIO AUTORIZADO

SIGNATARIO AUTORIZADO

INFORME DE CONCRETO ASFALTICO TAMAÑO MAXIMO NOMINAL DE 3/4 " PARA CUALQUIER VALOR DE EJES EQUIVALENTES


OBRA	406 DESARROLLO URBANO (FRACC MONTE VERDE I)	INFORME N°	13739
CLIENTE	DESARROLLO URBANO	ENSAYE N°	817
LOCALIZACION	CHIHUAHUA CHIHUAHUA	FECHA DE RECIBO	2017-11-14
ENVIADA POR	PERSONAL DE LABORATORIO	FECHA DE INFORME	2017-11-15

DATOS	MATERIAL PARA CAPA DE:	MEZCLA ASFALTICA
DEL	DESCRIPCION PETROGRAFICA DEL MATERIAL	ROCA TRITURADA CALIZA
MUESTREO	CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	CALLE LLANURA COLORIN Y CALLE LLANURA SAVAL LADO NORTE
	TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TAMAÑO MAXIMO NOMINAL 3/4"
	UBICACION DEL BANCO	ARTURO ARMENDARIZ

P.V.S. SUELTO (kg/m3)		-
COMBINACION MATERIAL PETREOS		
ARENA EN %		-
SELLO EN %		-
GRAVA EN %		-
G R A V I T A C I O N C A	MALLA	% RETENIDO
	50.00	-
	% QUE PASA	
	37.50	100
	25.40	100
	19.00	98
	12.50	97
	9.50	89
	6.300	71
	4.750	66
	2.000	34
	0.850	20
	0.425	11
	0.250	8
	0.150	6
	0.075	4

GRAFICA DE COMPOSICION GRANULOMETRICA

Malla	% Que Pasa (Límite Superior)	% Que Pasa (Límite Inferior)
200	5	2
100	8	4
60	12	7
40	15	10
20	20	12
10	30	20
4	45	35
1/4"	65	55
3/8"	85	75
1/2"	95	85
3/4"	98	95
1-	100	100

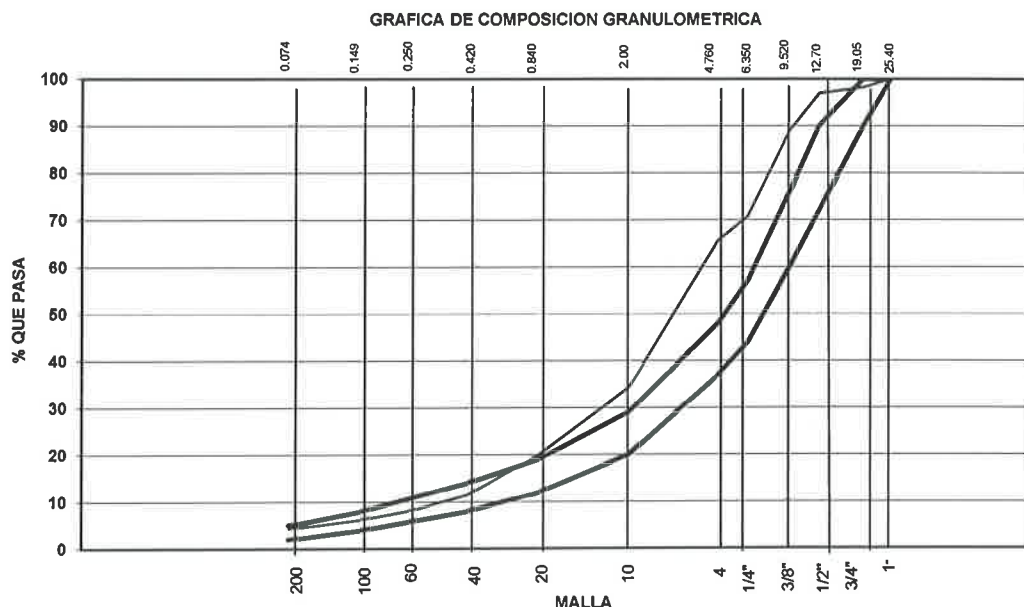

CARACTERISTICAS MATERIAL PETREO	ESPECIFICACION	ENSAYE	CARACTERISTICAS DEL ASFALTO	
DENSIDAD RELATIVA MINIMO	2.4	-	TIPO	-
ABSORCION (%)	-	-	PENETRACION	-
DESGASTE DE LOS ANGELES MAX (%)	30	-	VISCOSIDAD	-
% DE TRITURACION	-	-	TEMP. RECOMENDADA	-
PARTICULAS ALARGADAS MAXIMO (%)	35	-	TEMP. DE APLICACION	-
PARTICULAS LAJEADAS MAXIMO (%)	35	-	OTRA	-
EQUIVALENTE DE ARENA MINIMO (%)	50	-		

CARACTERIZACION DE LA MEZCLA			CARACTERISTICAS DEL ESPECIMEN	ESPECIFICACION	ENSAYE 1	ENSAYE 2	ENSAYE 3
ASFALTO	DEL PROYECTO	ENSAYE	P.E. Kg/m³	-	2365	2380	2377
CONT. DE ASFALTO (%)	-	5.2	ESTABILIDAD kgs	817 Min	1006	1078	1059
ADITIVO USADO	MARCA	-	FLUJO mm	2-3.5	2.9	3.2	3.1
	TIPO	-	VACIOS %	3-5	3.4	2.80	2.94
	CANTIDAD	-	V.A.M. %	13% Min.	14.81	14.27	14.40
AFINIDAD			V.F.A %	65-75	76.98	80.39	79.56

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SIGNATARIO AUTORIZADO

SIGNATARIO AUTORIZADO

INFORME DE CONCRETO ASFALTICO TAMAÑO MAXIMO NOMINAL DE 3/4 " PARA CUALQUIER VALOR DE EJES EQUIVALENTES


OBRA	406 DESARROLLO URBANO (FRACC VINEDOS)	INFORME N°	13740
CLIENTE	DESARROLLO URBANO	ENSAYE N°	822
LOCALIZACION	CHIHUAHUA CHIHUAHUA	FECHA DE RECIBO	2017-11-10
ENVIADA POR	PERSONAL DE LABORATORIO	FECHA DE INFORME	2017-11-11

DATOS	MATERIAL PARA CAPA DE:	MEZCLA ASFALTICA
DEL	DESCRIPCION PETROGRAFICA DEL MATERIAL	ROCA TRITURADA CALIZA
	CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	TENDIDO EN CALLE VIÑEDO VILLARINO
	TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TAMAÑO MAXIMO NOMINAL 3/4"
MUESTREO	UBICACION DEL BANCO	GILSA

P.V.S. SUELTO (kg/m3)		
COMBINACION MATERIAL PETREOS		
ARENA EN %		-
SELLO EN %		-
GRAVA EN %		-
G R A V I T A C I O N C A	MALLA	% RETENIDO
	50.00	-
	% QUE PASA	
	37.50	100
	25.40	100
	19.00	100
	12.50	98
	9.50	90
	6.300	69
	4.750	62
	2.000	35
	0.850	20
	0.425	12
	0.250	9
	0.150	6
	0.075	4

GRAFICA DE COMPOSICION GRANULOMETRICA

Malla (mm)	Top X-axis (mm)	Curve 1 (% Que Pasa)	Curve 2 (% Que Pasa)	Curve 3 (% Que Pasa)
200	0.075	4	6	8
100	0.150	9	12	15
60	0.250	12	15	18
40	0.425	15	18	22
20	0.850	20	22	25
10	2.000	30	35	40
4	4.750	45	55	65
1/4"	6.350	55	65	75
3/8"	9.520	65	75	85
1/2"	12.70	75	85	95
3/4"	19.05	85	95	100
1"	25.40	95	100	100

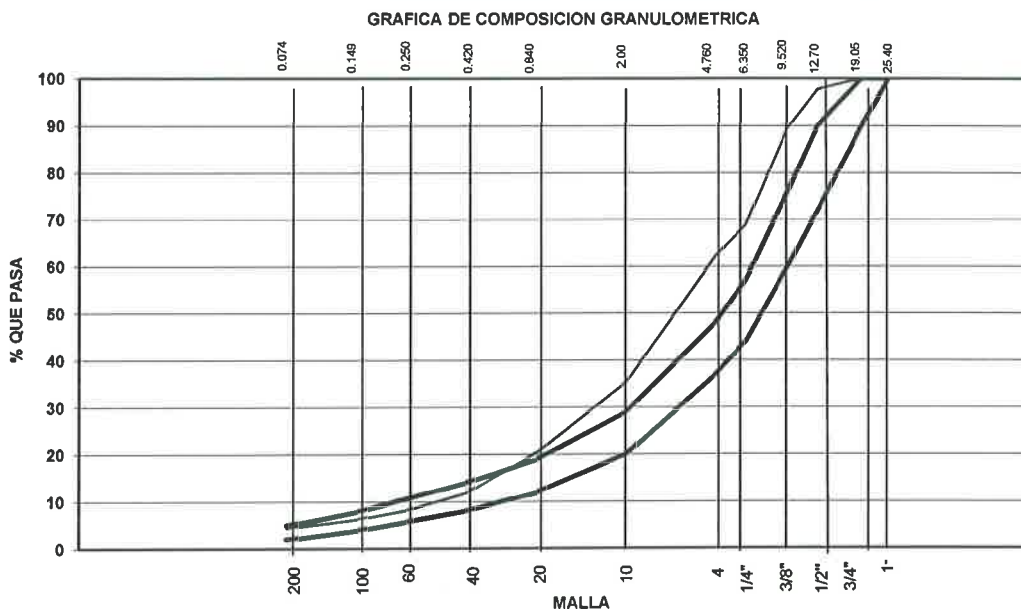

CARACTERISTICAS MATERIAL PETREO	ESPECIFICACION	ENSAYE	CARACTERISTICAS DEL ASFALTO	
DENSIDAD RELATIVA MINIMO	2.4	-	TIPO	-
ABSORCION (%)	-	-	PENETRACION	-
DESGASTE DE LOS ANGELES MAX (%)	30	-	VISCOSIDAD	-
% DE TRITURACION	-	-	TEMP. RECOMENDADA	-
PARTICULAS ALARGADAS MAXIMO (%)	35	-	TEMP. DE APLICACION	-
PARTICULAS LAJEADAS MAXIMO (%)	35	-	OTRA	-
EQUIVALENTE DE ARENA MINIMO (%)	50	-		

CARACTERIZACION DE LA MEZCLA			CARACTERISTICAS DEL ESPECIMEN	ESPECIFICACION	ENSAYE 1	ENSAYE 2	ENSAYE 3
ASFALTO	DEL PROYECTO	ENSAYE	P.E. Kg/m³	-	2393	2401	2397
CONT. DE ASFALTO (%)	-	4.6	ESTABILIDAD kgs	817 Min	1119	1222	1132
ADITIVO USADO	MARCA	-	FLUJO mm	2-3.5	2.0	2.9	2.5
	TIPO	-	VACIOS %	3-5	3.4	3.07	3.23
	CANTIDAD	-	V.A.M. %	13% Min.	13.63	13.35	13.49
AFINIDAD			V.F.A. %	65-75	75.20	77.04	76.09

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SIGNATARIO AUTORIZADO

SIGNATARIO AUTORIZADO


INFORME DE CONCRETO ASFALTICO TAMAÑO MAXIMO NOMINAL DE 3/4 " PARA CUALQUIER VALOR DE EJES EQUIVALENTES

OBRA	406 DESARROLLO URBANO (FRACC VIÑEDOS)	INFORME N°	13741
CLIENTE	DESARROLLO URBANO	ENSAYE N°	823
LOCALIZACION	CHIHUAHUA CHIHUAHUA	FECHA DE RECIBO	2017-11-10
ENVIADA POR	PERSONAL DE LABORATORIO	FECHA DE INFORME	2017-11-11

DATOS	MATERIAL PARA CAPA DE:	MEZCLA ASFALTICA
DEL	DESCRIPCION PETROGRAFICA DEL MATERIAL	ROCA TRITURADA CALIZA
	CLASE DE DEPOSITO MUESTREO	TENDIDO EN CALLE VERZENA Y DE CALLE ALBORADA A CALLE CHILLAR
	TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TAMAÑO MAXIMO NOMINAL 3/4"
MUESTREO	UBICACION DEL BANCO	GILSA

P.V.S. SUELTO (kg/m3)		-
COMBINACION MATERIAL PETREOS		
ARENA EN %		-
SELLO EN %		-
GRAVA EN %		-
G R A V I T A C I O N A	MALLA	% RETENIDO
	50.00	-
	% QUE PASA	
	37.50	100
	25.40	98
	19.00	98
	12.50	92
	9.50	81
	6.300	61
	4.750	54
	2.000	25
	0.850	14
	0.425	8
	0.250	6
	0.150	5
	0.075	3

GRAFICA DE COMPOSICION GRANULOMETRICA	

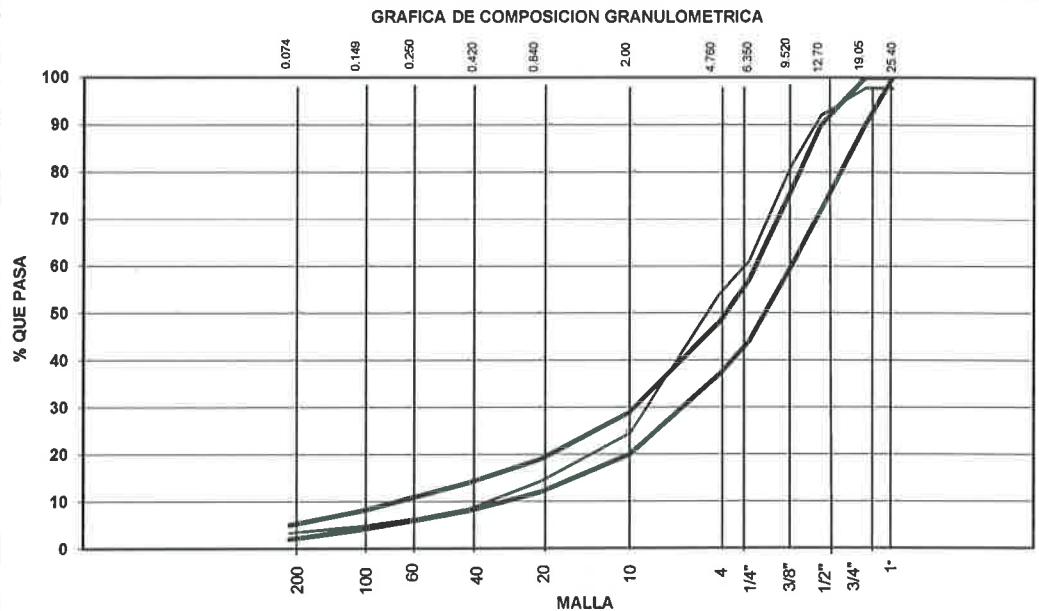

CARACTERISTICAS MATERIAL PETREO	ESPECIFICACION	ENSAYE	CARACTERISTICAS DEL ASFALTO	
DENSIDAD RELATIVA MINIMO	2.4	-	TIPO	-
ABSORCION (%)	-	-	PENETRACION	-
DESGASTE DE LOS ANGELES MAX (%)	30	-	VISCOSIDAD	-
% DE TRITURACION	-	-	TEMP. RECOMENDADA	-
PARTICULAS ALARGADAS MAXIMO (%)	35	-	TEMP. DE APLICACION	-
PARTICULAS LAJEADAS MAXIMO (%)	35	-	OTRA	-
EQUIVALENTE DE ARENA MINIMO (%)	50	-		

CARACTERIZACION DE LA MEZCLA			CARACTERISTICAS DEL ESPECIMEN	ESPECIFICACION	ENSAYE 1	ENSAYE 2	ENSAYE 3
ASFALTO	DEL PROYECTO	ENSAYE					
CONT. DE ASFALTO (%)	-	3.7	P.E. Kg/m ³	-	2355	2371	2367
ADITIVO USADO	MARCA	-	ESTABILIDAD kgs	817 Min	1136	1234	1141
	TIPO	-	FLUJO mm	2-3.5	2.1	2.3	2.5
	CANTIDAD	-	VACIOS %	3-5	5.7	5.10	5.26
AFINIDAD			V.A.M. %	13% Min.	13.96	13.37	13.52
			V.F.A %	65-75	58.82	61.87	61.06

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SIGNATARIO AUTORIZADO

SIGNATARIO AUTORIZADO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DESARROLLO
URBANO Y
ECOLOGÍA



**SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN URBANA
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
DE FRACCIONAMIENTOS
OF. No. PUF 685/17
V.T. N/A**

14 de Diciembre de 2017

**ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-**

Por este medio me permito enviarle en primer término un cordial saludo y en relación al Contrato de Prestación de Servicios **No. 083/17** de fecha 31 de julio de 2017, denominado "**Servicio de Laboratorio de Control de Calidad en Fraccionamientos**", celebrado con la persona moral denominada Laboratorio y Consultoría, S.A. de C.V.

Se envía para el trámite de pago correspondiente, la factura No. F 2042, relativa a la **Estimación No.2 y finiquito**, por un importe de \$495,053.20 (Cuatrocientos noventa y cinco mil cincuenta y tres pesos 20/100 M.N.). Así mismo se anexan al presente cuatro tantos de la siguiente documentación:

- Factura No. 1985 de fecha 15 de noviembre del 2017.
- Verificación de comprobantes fiscales por internet.
- Resumen por partidas.
- Catálogo de conceptos y precios unitarios.
- Recibo por el total del monto estimado.
- Oficio de Autorización de Afectación Presupuestal No. 2017-PDM-DU-091
- Dictamen No. 087/2017.
- Contrato No. 083/17.
- Fianza de cumplimiento No. 1833604.
- Informes de laboratorio y fotografías.



Sin más por el momento, quedamos a su disposición para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

ING. GABRIEL VALDEZ JUÁREZ

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN URBANA

C.c. p. - Archivo
GSL/GMVJ/JAVG/JMS

"2017 Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
