



OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS

R.F.C: HEFO710611J88 Domicilio: 4A No. 6901-A
Colonia: NOMBRE DE DIOS, C.P. 31110
Ciudad: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

FACTURA
SERIE: A
FOLIO: 30
FECHA: 2/10/2017 15:57:07

Documento Válido

Cliente: Municipio de Chihuahua
R.F.C.: MCI651010V22
Domicilio: Calle Mina No. 408
Colonia: Col. Centro
Ciudad: Chihuahua

C.P.: 31000,
Estado: Chihuahua

Localidad: Chihuahua
País: Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	PAGO DE ESTIMACION PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 DEL CONTRATO 85/2017 DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN CAMINOS DE ACCESO DE LAS COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL A BASE DE APLICACION DE LA LINEA CENTRAL DEL CAMINO	402,924.45	402,924.45
1.00	No aplica	0.2% D.I.F. (AL MILLAR)..... \$ 1,151.21 0.2% CMIC (AL MILLAR)..... \$ 1,151.21 SUMA DE DESCUENTO..... \$ 2,302.43 SUMA DE ESTIMACION..... \$ 575606.36 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 172,681.91 DESCUENTOS..... \$ 2,302.43 SUB-TOTAL..... \$ 400,622.03 I.V.A..... \$ 64,467.91 IMPORTE NETO A RECIBIR..... \$ 465,089.94	0.00	0.00

Importe con letra
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.

SUBTOTAL:	402,924.45
I.V.A.:	64,467.91
TOTAL:	467,392.36



✓ Efectos fiscales al pago



FIRMA DE CONFORMIDAD

1.0 B0DBB5E7-84D1-4482-8846-AF128987BABB 2017-10-02T16:57:13 a7K1EckH/G0HxLPqm DFly3SkUMLPQg+yLyXwQKWK++fQ3HVeVV43Ujp77ZMauYq2MdZrea9eZ0JEA1cAAx8Tz80WnhCmU61E +Dw+/jQrW8rRudKINIH3xdqTQnbS/fq4DCKYRor+u/GtAcFH+fp09xee0Nkew2GS79S3UX6ECOpl1A/e bDCKCu48IaNEr+5qtK89afqRf6brsRp8yvtRsG9Y1STA21F1KR4Q4s05DDxzhAs8LE2qfIestYpwtDva UNDEVCwHh0+tdcVq96V0dEzy+HecjUcK3QyP6mTnJKrD08RpXdaDbsUGZnmgw11AAFE5bPq7RPe3DuRyqA-- uMvgA== 00001000000404486074
Serie de Certificado: 00001000000406199e22
a7K1EckH/G0HxLPqmDFly3SkUMLPQg+yLyXwQKWK++fQ3HVeVV43Ujp77ZMauYq2MdZrea9eZ0JEA1cAAx8Tz80WnhCmU61E+Dw+/jQrW8rRudKINIH3xdqTQnbS/fq4DCKYRor+u/GtAcFH+fp09xee0Nkew2GS79S3UX6ECOpl1A/elbDCKCu48IaNEr+5qtK89afqRf6brsRp8yvtRsG9Y1STA21F1KR4Q4s05DDxzhAs8LE2qfIestYpwtDvaDNOEVzGwHh0+tdcVq96V0dEzy+HecjUcK3QyP6mTnJKrD08RpXdaDbsUGZnmgw11AAFE5bPq7RPe3DuRyqA--

[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/) Inicio

SECT




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT


Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:



Verificar CFDI

* Datos obligatorios


RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HEFO710611J88	OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS	MCI651010V22	Municipio de Chihuahua
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B2DBB5E7-E4D1-4482-8846- AF128987BABB	2017-10-02T15:57:07	2017-10-02T16:57:13	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$467,392.36	ingreso	Vigente	

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

**GENERADOR DE DISTANCIAS DE PINTURA APLICADA EN EL CONTRATO
085/2017 CON EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.**

UBICACIÓN	LONGITUD ML
RUTA EL CHARCO	4,840.0
EL CHARCO-SAN AGUSTIN	48,400.0
GUADALUPE	1,524.0
SIERRA AZUL	8,480.0
VALLECILLO	3,705.0
LA CUADRILLA	2,737.0

69,686.00





DIRECCION DE DESARROLLO RURAL
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

No. HOJA

FECHA

BITACORA DE OBRA

OBRA:

RECONSTRUCCION DE LA LINEA CENTRAL EN

DIRECCION:

DE LA LINEA DE LA CARRETERA DE LA
ZONA RURAL A LA ZONA URBANA
DE LA LINEA CENTRAL DEL CAMINO

GEOREFERENCIACION:

N

W

LOCALIDAD:

SECCIONAL

MUNICIPIO:

No de Obra:

91/2017

No. Of. Autorizacion

2017-1 PM 01-01

Periodo de Ejecucion:

7 JULIO AL 30 NOV

Importe de Contrato:

1,260,900.00

Importe del Anticipo:

378,288.00

VISITA DE SUPERVISION DE LA OBRA

OBELISCO - EL CHARCO

6-SEPT-2017

7:15 AM. SE INICIA CON TRABAJOS PARA PINTURA DE LINEA CENTRAL EN
TRAMO OBELISCO - EL CHARCO, CON PINTURA AMARILLA BASE SOLVENTE
Y MICROESFERA DE VIDRIO. SE TERMINA LA APLICACION 12:30 PM.

EL CHARCO - SAN AGUSTIN

6-SEPT-2017

12:45 PM. SE INICIA APLICACION DE PINTURA EN TRAMO ENTRE EL
EL CHARCO - SAN AGUSTIN HACIA LA NORIA. SE AVANZO A
KM 8.4 EN AREA DE REPARACION DE PUENTE. 3:20 PM.

SUPERVISOR DE LA OBRA DE LA D.D.R.

NOMBRE Y FIRMA

CONTRATISTA DE LA OBRA

ERNESTO C. SANTISTEBAN SCHIEBECK
NOMBRE Y FIRMA



DIRECCION DE DESARROLLO RURAL
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

No. HOJA

FECHA

BITACORA DE OBRA

OBRA: RECONSTRUCCION DE PUENTES EN EL TRAMO EL VALLESILLO
DIRECCION: LA CUADRILLA
GEOREFERENCIACION: N
W
LOCALIDAD: LA CUADRILLA
SECCIONAL: LA CUADRILLA
MUNICIPIO: LA CUADRILLA

No de Obra: 1
No Of Autorizacion: 1
Periodo de Ejecucion: 1
Importe de Contrato: 1,500,000.00
Importe del Anticipo: 378,388.00

VISITA DE SUPERVISION DE LA OBRA

EL VALLESILLO 13 SEPT 2017
8:30 AM SE INICIAN TRABAJOS DE PINTURA EN TRAMO EL VALLESILLO
TERMINANDO 12:45 PM. 3705 M.L.

LA CUADRILLA 13-SEPT-2017
1:30 PM. INICIA TRABAJOS DE PINTURA EN TRAMO LA CUADRILLA
TERMINANDO 3:15 PM 3733 M.L.

SIERRA AZUL 13 SEPT-2017
3:30 PM. SE INICIA TRABAJOS DE PINTURA EN TRAMO SIERRA AZUL
AVANZANDO AL KM 3.5

14 SEPT 2017
9:30 AM SE REINICIAN TRABAJOS DE PINTURA HASTA TERMINAR EL
EL EJIDO SIERRA AZUL 12:50 PM 8480 M.L.

SUPERVISOR DE LA OBRA DE LA D.D.R.

NOMBRE Y FIRMA

CONTRATISTA DE LA OBRA

ERNESTO O SANTIESTRAN SCHIEFELN
NOMBRE Y FIRMA



DIRECCION DE DESARROLLO RURAL
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

No. HOJA

FECHA

7 / 09 / 2017

BITACORA DE OBRA

OBRA: SEALANCHA HORIZONTAL EN TRAMO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA ZONA RURAL.
DIRECCION: LA ZONA RURAL.
GEOREFERENCIACION: N
W
LOCALIDAD: _____
SECCIONAL: _____
MUNICIPIO: _____

No de Obra: 4 / 5111
No. Of. Autorizacion: 2013-0013-06-161
Periodo de Ejecucion: 7 Julio al 30 Nov
Importe de Contrato: 1,260,960.00
Importe del Anticipo: 378,288.00

VISITA DE SUPERVISION DE LA OBRA

EL CHARCO - SAN AGUSTIN

7 SEPT - 2017

8:40 AM. SE REINICIA TRABAJO DE PIQUETEO EN EL KM 6.4, SE AVANZA HASTA COMUNIDAD DE LA CASITA 4:50 PM.

EL CHARCO - SAN AGUSTIN

8 SEPT - 2017

9:10 AM SE REINICIA TRABAJO DE PIQUETEO EN COMUNIDAD DE LA CASITA TERMINANDO TRAMO EL CHARCO - SAN AGUSTIN 3:15 PM

GUADALUPE

8 SEPT - 2017

4:10 PM. SE INICIA PIQUETEO EN TRAMO GUADALUPE, SE OBSERVA EL TRAZO EXISTENTE CON LINEA DISCRIMINATIVA EN CURVA, SE PIQUETEO CONTINUA Y SE CONSERVA EL TRAZO EN RECTAS, SE TERMINA DE PIQUETEO 5:30 PM.

SUPERVISOR DE LA OBRA DE LA D.D.R.

NOMBRE Y FIRMA

CONTRATISTA DE LA OBRA

ERNESTO C. SANTIBARRIA SCHIERCK
NOMBRE Y FIRMA

OBELISCO- EL CHARCO



PINTURA BASE SOLVENTE



APLICACIÓN CON PINTARRAYAS Y MICROESFERA.

OBELISCO- EL CHARCO



APLICACIÓN DE PINTURA EN TRAMO
OBELISCO-ELCHARCO


12 CMS DE ANCHO LA LINEA COLOR
AMARILLO.



EL CHARCO- SAN AGUSTIN




EL CHARCO- SAN AGUSTIN

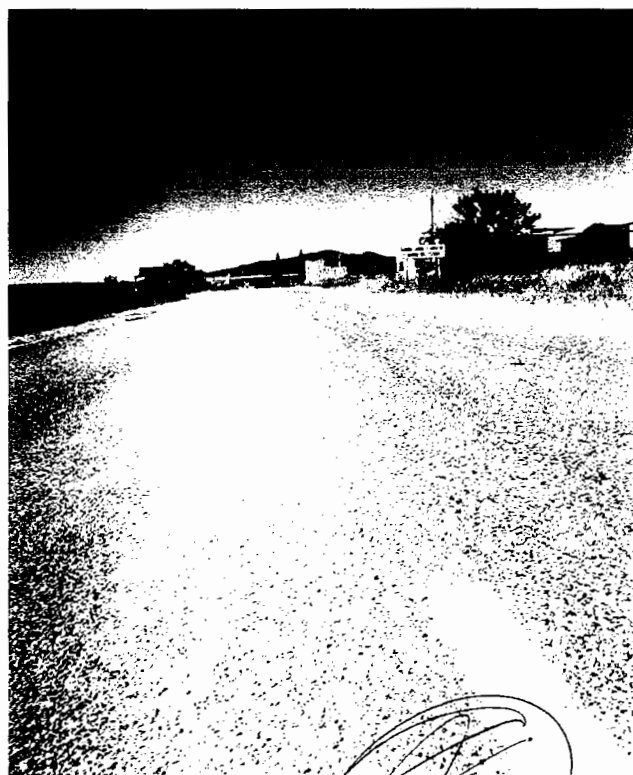


[Handwritten signature or mark]

EL VALLESILLO



LA CUADRILLA

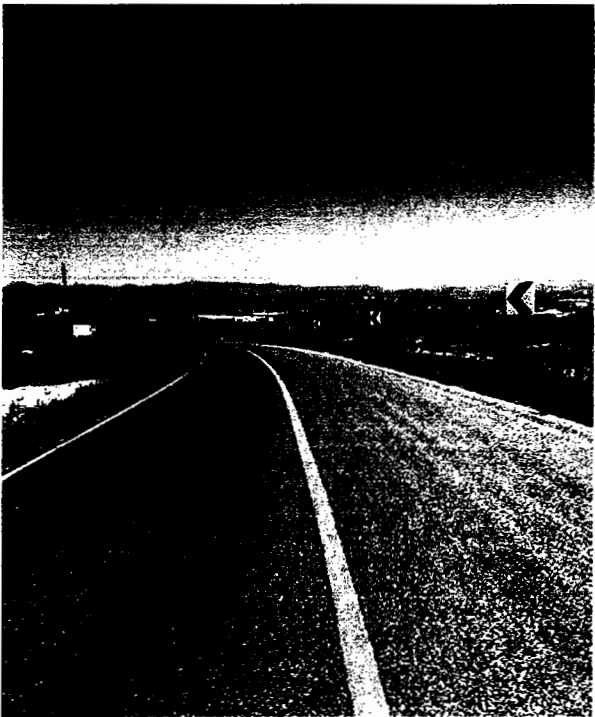


[Handwritten signature]

EL FRESNO- SIERRA AZUL



GUADALUPE

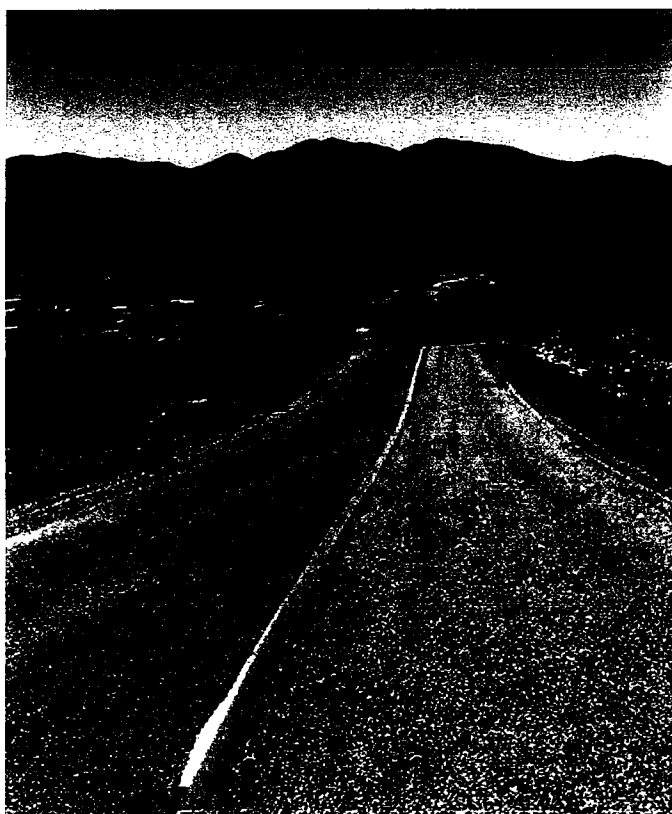

0

[Handwritten signature]
