**VALLEKAS**

CONSTRUCTORA INTEGRAL

**CONSTRUCTORA INTEGRAL
VALLEKAS S.A. DE C.V.****"REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES"**

Factura

SERIE:

FOLIO: 1769

FECHA: 20/9/2017 15:01:02

Documento VálidoCIV020508LE8 RIO DE JANEIRO No. 917 Int. No. C LOS
FRAILES,
CHIHUAHUA 31107
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: MCI651010V22
 Domicilio: MINA No. 405
 Teléfono:
 Ciudad: CHIHUAHUA
 Cantidad: Unidad

Colonia: CENTRO
 Estado: CHIHUAHUA

C.P.: 31000
 Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0	No aplica	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No. 3 (TRES) RELATIVA A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA. SEGUN CONTRATO No. 088/2017 RESUMEN SUMA ESTA ESTIMACION \$ 146,163.22 AMORT ANT \$ 43,848.97 SUBTOTAL \$ 102,314.25 IVA \$ 16,370.28 TOTAL \$ 118,684.53 DESCUENTOS 0.2% C.M.I.C. \$ 292.33 0.2% D.I.F. \$ 292.33 SUMA DESCUENTOS \$ 584.66 SALDO NETO A RECIBIR \$ 118,099.87	102,314.2500	102,314.25

Importe con letra
 CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100
 M.N.

SUBTOTAL:	102,314.25
I.V.A.:	16,370.28
TOTAL:	118,684.53



F. 1769
 20/09/2017

FIRMA DE CONFORMIDAD

METODO DE PAGO
 03

CONDICIONES DE PAGO
 CREDITO

No. CUENTA DE PAGO


Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola exhibición

Entido por

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

* Datos obligatorios

Verificar CFDI

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CIV020508LE8	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
07A729F6-7E84-42ED-9AA9-0B99B9EB5574	2017-09-20T15:01:02	2017-09-20T16:01:17	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$118,684.53	ingreso	Vigente	

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 088/2017. ✓	CONTRATADOS
OBRA: "CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA"	ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) ✓	\$ 760,345.41 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE/2017.	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 169,549.34 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, SA. DE C.V	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 223,827.89 CON IVA
RFC CIV-020508-LE8	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 393,377.23 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 146,163.22	
<u>0.00</u>		
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 146,163.22

DESCUENTOS	
0.2% C.M.I.C.	\$ 292.33
0.2% D.I.F.	\$ 292.33
SUMA DESCUENTOS	\$ 584.66
RESUMEN	
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 146,163.22
AMORT ANTICIPO	\$ 43,848.97
SUB-TOTAL	\$ 102,314.25
I.V.A.	\$ 16,370.28
TOTAL	\$ 118,684.53
(CON LETRA)	
(CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N.)	
DESCUENTOS	\$ 584.66
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 118,099.87

AUTORIZO	ELABORO
ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO	ING. SANTIAGO PEREZ BARREDA
RESIDENTE D.O.P.M	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, SA. DE C.V
	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. JAVIER VILLARREAL POSADA	ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL
	Vo. Bo.
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	



CHIHUAHUA, CHIH.,

15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 118,099.87
(CIENTO DIECIOCHO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 3 (TRES) CONTRATO No. 088/2017. POR LA CANTIDAD DE : \$ 760,345.41 INCLUYE CONVENIO
SETECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA"

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	146,163.22
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	43,848.97
	SUBTOTAL	\$ 102,314.25
	IVA	\$ 16,370.28
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO	TOTAL	\$ 118,684.53
C.M.I.C. 0.2%	292.33	
D.I.F. 0.2%	292.33	
SUMA	584.66	

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA**1.- CONTRATO**

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 760,345.41
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 223,827.89
ESTA ESTIMACION	\$ 169,549.33
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ - 393,377.22
POR EJERCER	\$ 362,077.05

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO


	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 228,103.62
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 67,148.37
ESTA ESTIMACION	\$ 50,864.80
ACUMULADO ACTUAL	\$ 118,013.17
POR AMORTIZAR	\$ 110,090.45

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% DIF	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 385.91	\$ 385.91
ESTA ESTIMACION	\$ 292.33	\$ 292.33
ACUMULADO ACTUAL	\$ 678.24	\$ 678.24

R E C I B I M O S

CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, SA. DE C.V.
CIV-020508-LE8



OBRA:	"CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA"
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA, CHIH.
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, SA. DE C.V
PERÍODO:	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE/2017.
ESTIMACIÓN No.	3 (TRES)
No. CONTRATO:	088/2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

<u>NORMALES</u>		\$	146,163.22
<u>EXCEDENTES</u>			
<u>EXTRAS</u>			

SUBTOTAL \$	146,163.22
I.V.A. \$	23,386.11
TOTAL \$	169,549.33

POR EL CONTRATISTA
ING. SANTIAGO PEREZ BARREDA
CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION
ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO



OBRA:	"CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA"
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA, CHIH.
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, SA. DE C.V
PERIODO:	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE/2017.
ESTIMACIÓN No.	3 (TRES)
No. CONTRATO:	088/2017.

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		

OBRA NORMAL								
2	ESTRUCTURA							
2.02	MARCO ESTRUCTURAL DE CONCRETO F'C=250 CON SECCION DE 30X45 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS #8 Y ESTRIBOS #3 SEGUN PLANO @ 9.0 CMS. APROXIMADOS INCLUYE CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE 3/4", ARMADO, BOMBEO, COLADO ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	8.10	8.18	0.00	8.18	\$ 1,583.30	\$ 12,951.39
2.03	TRABE T-1 DE 20X40CMS. CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON ACERO F'Y=4200 KG/CM2, 3 VARILLAS #4 LECHO INFERIOR Y 2 VAR. #4 EN EL LECHO SUPERIOR, 2 BASTONES #4 EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA LONGITUD SEGUN PLANO ESTRUCTURAL, INCLUYE CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE 3/4", 4 USOS, CRUCES DE VARILLAS, CHAFLAN A BASE DE TUINO DE 1 PULGADA, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, BOMBEO, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST ROJO DE FESTER O SIMILAR EN CALIDAD, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 4M3 DE CONCRETO A LOS 7,14 Y 28 DIAS.	ML	26.22	26.34	0.00	26.34	\$ 887.21	\$ 23,369.11
2.04	TRABE T-2 TRAPEZOIDAL DE 50CMS. DE ANCHO AHOGADA EN CUMBRERA, CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON 6 VARILLAS #4 F'Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS No.2 @ 20 CMS SEGUN PLANO. INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE 3/4", 4 USOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, BOMBEO, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST ROJO DE FESTER O SIMILAR EN CALIDAD, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 4M3 DE CONCRETO A LOS 7,14 Y 28 DIAS.	ML	13.20	12.15	0.00	12.15	\$ 577.26	\$ 7,013.71
2.05	LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=250 KG/CM2. DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE 3/4", 4 USOS ARMADA SEGUN PLANO, INCLUYE: DESCONTAR CONCRETO DE TRABES, CIMBRADO, DESCIMBRADO HABILITADO DE ACERO, BASTONES, BOMBEO, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST ROJO, DE FESTER O SIMILAR EN CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 4 M3 DE CONCRETO, A LOS 7, 14 Y 28 DIAS.	M2	126.70	125.92	0.00	125.92	\$ 797.07	\$ 100,367.05
3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS							

POR EL CONTRATISTA:

ING. SANTIAGO PEREZ BARREDA
CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO



OBRA:	"CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA"
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA, CHIH.
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, SA. DE C.V
PERIODO:	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE/2017.
ESTIMACIÓN No.	3 (TRES)
No. CONTRATO:	088/2017.

CONCEPCION		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
3.12	PASO EN LOSA PARA DUCTO DE INYECCION DE AIRE ACONDICIONADO DE 60X60 CMS, INTERIORES, INCLUYE: SARDINEL DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, DE 15X10 CMS. SIN ARMA CON CIMBRA APARENTE, CHALAN EXTERIOR DE 6X6 CMS. CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS #3 A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 1,230.98	\$ 2,461.96
SUBTOTAL							\$	146,163.22
IVA							\$	23,386.11
TOTAL							\$	169,549.33

POR EL CONTRATISTA:

ING. SANTIAGO PEREZ BARREDA
CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO

CONTRATO:	088/2017	TRAMO:	
OBRA:	"CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA"	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A DE C.V
No. DE ESTIMACION:		3 (TRES)	PERIODO 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE/2017.
MARCO ESTRUCTURAL DE CONCRETO F'C=250 CON SECCION DE 30X45 CMS.ARMADA CON 4 VARILLAS #8 Y ESTRIBOS #3 SEGUN PLANO @ 9.0 CMS. APROXIMADOS INCLUYE CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE 3/4", ARMADO, BOMBEO, COLADO ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	4.09*2	8.18	8.18ML
TOTAL		8.18	


ING. SANTIAGO PEREZ BARRERA
CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION
ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	088/2017	TRAMO:	
OBRA:	"CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA"	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A DE C.V
No. DE ESTIMACION:	3 (TRES)	PERIODO	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE/2017.
CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
TRABE T-1 DE 20X40CMS. CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON ACERO FY=4200 KG/CM2, 3 VARILLAS #4 LECHO INFERIOR Y 2 VAR. #4 EN EL LECHO SUPERIOR, 2 BASTONES #4 EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA LONGITUD SEGÚN PLANO ESTRUCTURAL, INCLUYE CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE 3/4", 4 USOS, CRUCES DE VARILLAS, CHAFLAN A BASE DE TUINO DE 1 PULGADA, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, BOMBEO, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO CON CURAFESE ROJO DE FESTER O SIMILAR EN CALIDAD, ALAMBRE RECOCIDO, PRUEBAS DE LABORATORIO POR CADA 4M3 DE CONCRETO A LOS 7,14 Y 28 DIAS.	(12.15+.51+.51)*2 26.34		26.34M
SUBTOTAL	26.34		

CROQUIS

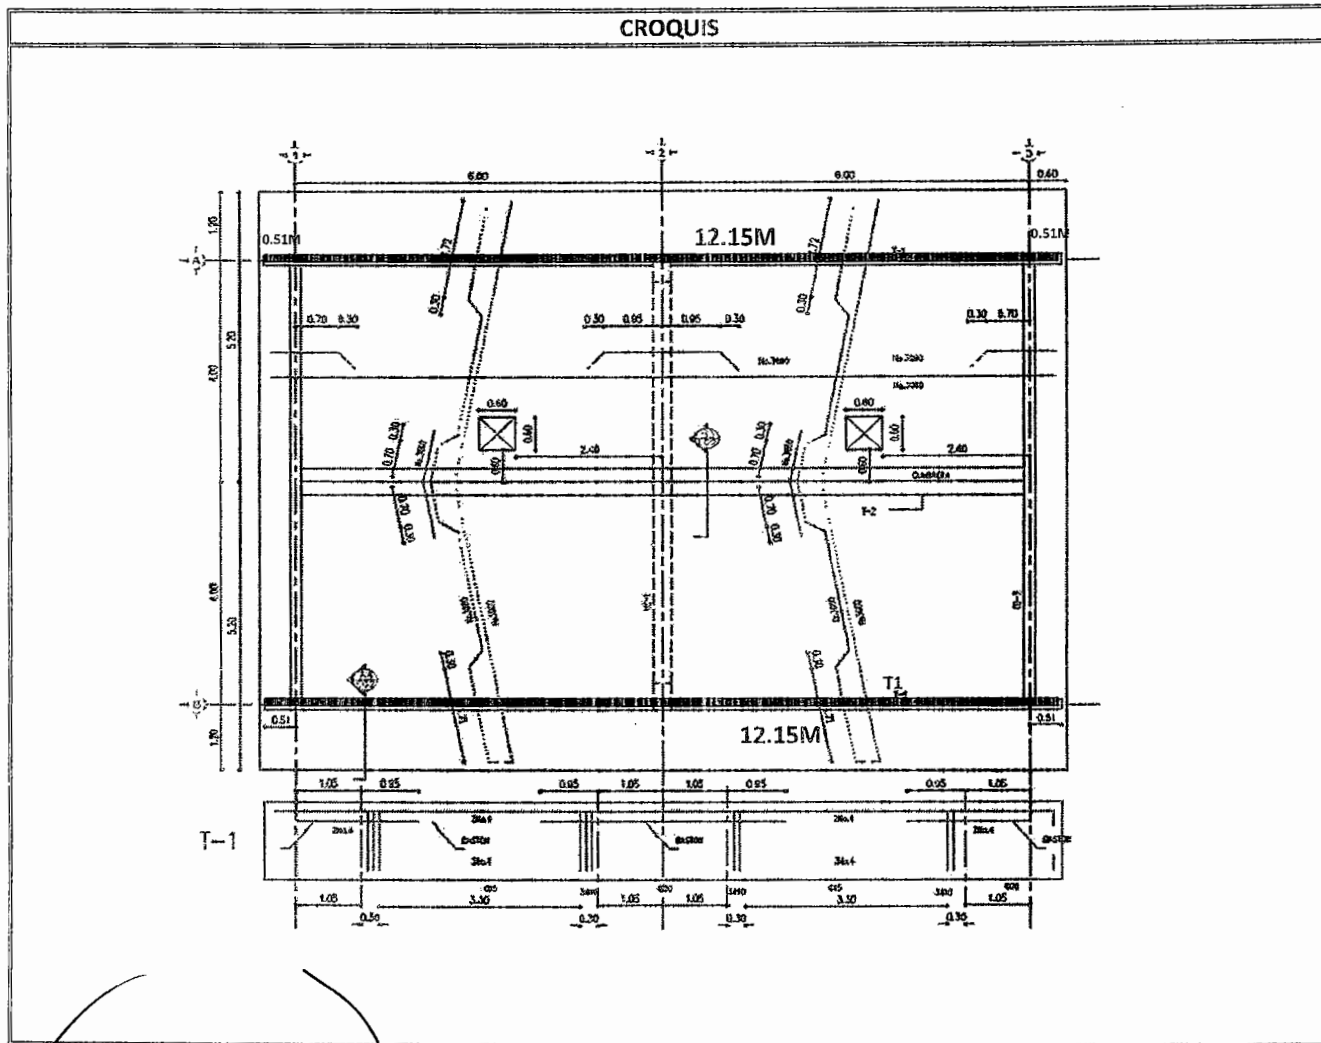


ING. SANTIAGO PEREZ BARREDA
CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION
ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	088/2017	TRAMO:	
OBRA:	"CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA"	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A DE C.V
No. DE ESTIMACION:	3 (TRES)	PERIODO 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE/2017.	
CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
PASO EN LOSA PARA DUCTO DE INYECCION DE AIRE ACONDICIONADO DE 60X60 CMS. INTERIORES, INCLUYE: SARDINEL DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, DE 15X10 CMS. SIN ARMA CON CIMBRA APARENTE, CHALAN EXTERIOR DE 6X6 CMS. CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS #3 A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	2.00		2.00PZA
	TOTAL		2.00

CROQUIS

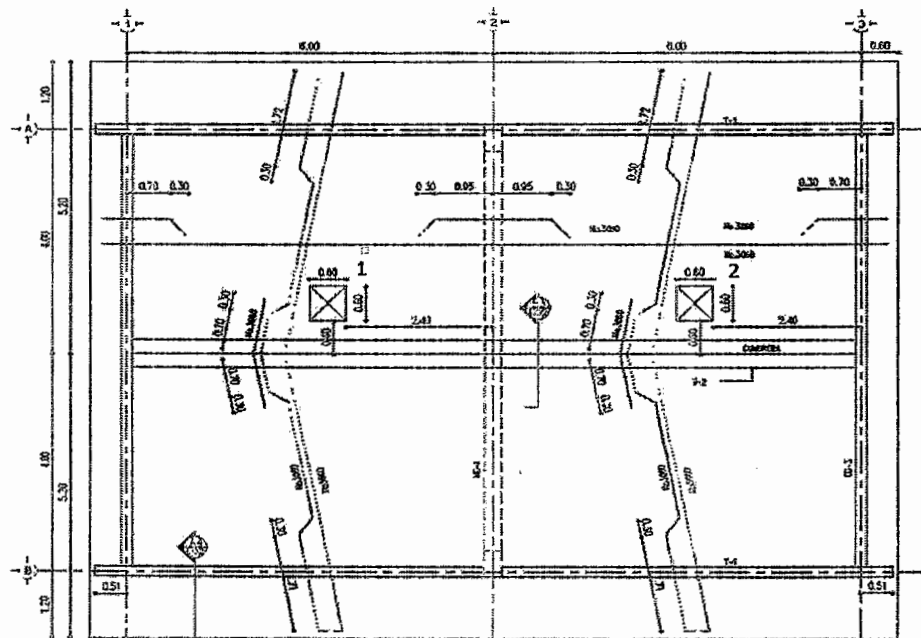

ING. SANTIAGO PÉREZ BARRERA
CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION
ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO



OBRA:	"CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA"
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA, CHIH.
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, SA. DE C.V
PERIODO:	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE/2017.
ESTIMACIÓN No.	3 (TRES)
No. CONTRATO:	088/2017.



POR EL CONTRATISTA:


ING. SANTIAGO PEREZ BARREDA
CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO



OBRA:	"CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA"
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA, CHIH.
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, SA. DE C.V
PERIODO:	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE/2017.
ESTIMACIÓN No.	3 (TRES)
No. CONTRATO:	088/2017.

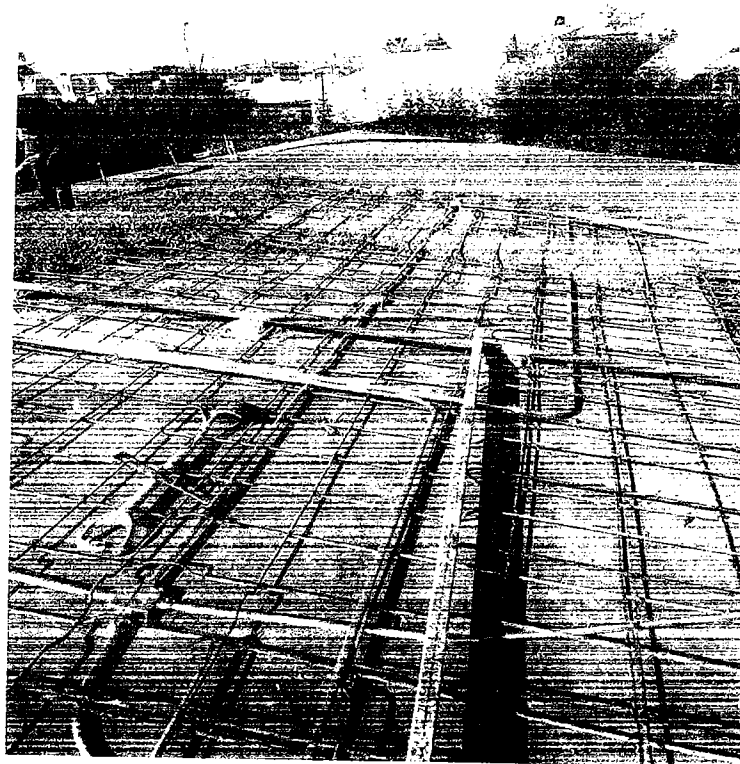

POR EL CONTRATISTA


G. SANTIAGO PEREZ BARREDA
CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO



OBRA:	"CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA"
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA, CHIH.
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V.
PERIODO:	01 AL 15 DE SEPTIEMBRE/2017.
ESTIMACIÓN No.	3 (TRES)
No. CONTRATO:	088/2017.

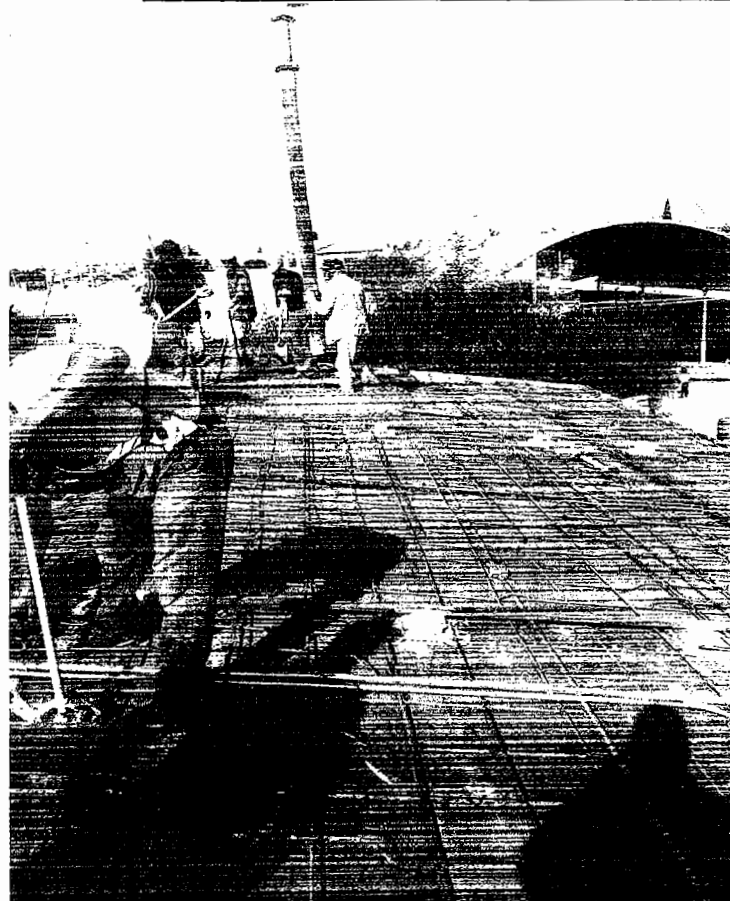

POR EL CONTRATISTA:

IC. SANTIAGO PEREZ BARREDA
CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO
