

VALLEKAS
CONSTRUCTORA INTEGRAL

**CONSTRUCTORA INTEGRAL
VALLEKAS S.A. DE C.V.**

"REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES"

Factura

SERIE:

FOLIO: 1747

FECHA: 31/8/2017 14:15:36

Documento Válido

CIV020508LE8 RIO DE JANEIRO No. 917 Int. No. C LOS
FRAILES,
CHIHUAHUA 31107
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22
Domicilio: MINA No. 408
Teléfono:
Ciudad: CHIHUAHUA
Cantidad: Unidad


Colonia: CENTRO
Estado: CHIHUAHUA

C.P.: 31000
País: MEXICO
Importe

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0	No aplica	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No. 2 (DOS) RELATIVA A LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA UBICADA EN CHIHUAHUA, CHIH. SEGUN CONTRATO No. 088/2017 RESUMEN SUMA ESTA ESTIMACION \$ 81,523.47 AMORT ANT \$ 24,457.04 SUBTOTAL \$ 57,066.43 IVA \$ 9,130.63 TOTAL \$ 66,197.06 DESCUENTOS 0.2% C.M.I.C. \$ 163.05 0.2% D.I.F. \$ 163.05 SUMA DE DESCUENTOS \$ 326.10 SALDO NETO A RECIBIR \$ 65,870.96	57,066.4300	57,066.43

Importe con letra
SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N.

SUBTOTAL:	57,066.43
I.V.A.:	9,130.63
TOTAL:	66,197.06



FIRMA DE CONFORMIDAD

METODO DE PAGO
02

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO

No. CUENTA DE PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
Emitido por:



CONTPAQ i.
Software empresarial líder y completo

Serie del Certificado del emisor: 00001000000402377560
Folio fiscal: 456A7966-5F2D-40C2-BE6A-04D76A3F5661
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Agosto 31 2017 - 15:15:41


Sello digital del CFDI
MFU13tzaTXo/COU7ivXLAlkw9YNeMb/MzLomM4gu99uEQ5CyxgwkD0ltRiRnnpDWJA6KvXlpgbMigAlo5ri568eKXOVqiaH4758s+RKSkgJp6TG+NCjz6ff3+LWkT0pDkmTkJAao5lueYx5p4TDca5/On2aFtN4FYngyoCMBV1AnGuTJvOAJ0+ZrAjNMvIWPICBdf9zFB0h3e1fFQrSu0nSbWnMLEWg9mJox8CELrpZQ+I8+Hkavd1iVjXZWThSKny nDGAezDU2TPiWlWecPch435vX2jU9oLU3YfYevhfns7KSgHukK782MejzqbnTf0boLrQBUVS+84m8KFNEQtQ==
Sello del SAT
F++Fnx3HFQ3jUE8Knfz8/sp20tbcWjt9XAIGcu7xqd8VqA4rrVE0Ld+vcbP5lLtuYicYT4Z46Ay6rA+xxaaSpI2vzFteLaYNj3SreloCDM1DPUTuchi7GIGgkxua6nke7eLF+W/7xWlruYBzefmhPtFiBI/2rCjBJm/w5DGmvl8vtm/Xg5opOAtI:UWkgc0lmM8qlVmN3LazKrC6f4LUpIzNB8E8CtRzDXphPUL+jviVRcFWLYQ8AMWBJQiQTISw2LocScxMWw8iKNHb3IpDciTikAgs745v27wbH+25hRdaTzh2kGMXWROWJXIhHmNnHKhV+vnPtYU9qvI37Lzjfq==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 456A7966-5F2D-40C2-BE6A-04D76A3F5661 2017-08-31T15:15:41 MFU13tzaTXo/COU7ivXLAlkw9YNeMb/MzLomM4gu99uEQ5CyxgwkD0ltRiRnnpDWJA6KvXlpgbMigAlo5ri568eKXOVqiaH4758s+RKSkgJp6TG+NCjz6ff3+LWkT0pDkmTkJAao5lueYx5p4TDca5/On2aFtN4FYngyoCMBV1AnGuTJvOAJ0+ZrAjNMvIWPICBdf9zFB0h3e1fFQrSu0nSbWnMLEWg9mJox8CELrpZQ+I8+Hkavd1iVjXZWThSKny nDGAezDU2TPiWlWecPch435vX2jU9oLU3YfYevhfns7KSgHukK782MejzqbnTf0boLrQBUVS+84m8KFNEQtQ== 00001000000404486074

C p

C

Q

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

CW

* Datos obligatorios

Verificar CFDI

C

RFC del emisor

Nombre o razón social del emisor

RFC del receptor

Nombre o razón social del receptor

CIV020508LE8

CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS
S.A. DE C.V.

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio fiscal

Fecha de expedición

**Fecha
certificación SAT**

PAC que certificó

456A7966-5F2D-40C2-BE6A-
04D76A3F5661

2017-08-31T14:15:36

2017-08-
31T15:15:41

MAS0810247C0

Total del CFDI

Efecto del comprobante

Estado CFDI

\$66,197.06

ingreso

Vigente

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 088/2017.	CONTRATADOS
OBRA: "CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA"	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS)	\$ 760,345.41 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 16 AL 31 DE AGOSTO/2017.	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 94,567.23 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, SA. DE C.V	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 129,260.67 CON IVA
RFC CIV-020508-LE8	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 223,827.90 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 81,523.47	
<u>0.00</u>		
<u>EXCEDENTES</u>	\$.	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 81,523.47	

DESCUENTOS		
0.2% C.M.I.C.	\$	163.05
0.2% D.I.F.	\$	163.05
SUMA DESCUENTOS	\$	326.10
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	81,523.47
AMORT ANTICIPO	\$	24,457.04
SUB-TOTAL	\$	57,066.43
I.V.A.	\$	9,130.63
TOTAL	\$	66,197.06
(CON LETRA)		
(SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 6/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	326.10
SALDO NETO A RECIBIR	\$	65,870.96

AUTORIZO	ELABORO
ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO	ING. SANTIAGO PEREZ BARREDA
RESIDENTE D.O.P.M	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, SA DE C.V
	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. JAVIER VILLARREAL ROSADA	ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL
Vo. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	




OBRA:	"CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA"	
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA, CHIH.	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, SA. DE C.V	
PERÍODO:	16 AL 31 DE AGOSTO/2017.	
ESTIMACIÓN No.	2 (DOS)	
No. CONTRATO:	088/2017	

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

<u>NORMALES</u>	\$	81,523.47
<u>EXCEDENTES</u>		
<u>EXTRAS</u>		


SUBTOTAL \$	81,523.47
I.V.A. \$	13,043.75
TOTAL \$	94,567.22

POR EL CONTRATISTA



JING. SANTIAGO PEREZ BARREDA
CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S/A DE C.V

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION



JING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO



OBRA:	"CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA"	
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA, CHIH.	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALEKAS, S.A. DE C.V.	
PERIODO:	16 AL 31 DE AGOSTO/2017.	
ESTIMACIÓN No.	2 (DOS)	
No. CONTRATO:	088/2017.	

No.	CONCEPTOS DESCRIPCION	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR		

OBRA NORMAL							
2	ESTRUCTURA						
	COLUMNA DE CONCRETO F'C=250 CON SECCION DE 30X45 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS #8, 6 VARS. #5 Y ESTRIBOS #3 @ 10 CMS. INCLUYE CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE 3/4", ARMADO, BOMBEO, COLADO ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.80	5.10	0.00	1,850.87 \$	9,439.44
3	ALBANILERIA Y ACABADOS						
	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X14 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS #3, F'Y=4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL #2 @ 15CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	41.40	44.10	0.0	207.05 \$	9,130.91
3.01	CADENA CD-2 DE REPISON DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X14 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS #3, F'Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 30CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	38.00	34.17	0.0	212.77 \$	7,270.35
3.02	CADENA CD-3 DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X20 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS #4 F'Y=4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CRUCES DE VARILLAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	15.60	15.40	0.0	303.52 \$	4,674.21
3.03	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	71.77	70.89	0.0	281.34 \$	19,944.19
3.04							

POR EL CONTRATISTA:

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION

ING. SANTIAGO PEREZ BARREDA
CONSTRUCTORA INTEGRAL VALEKAS, S.A. DE C.V.

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO



OBRA:		"CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA"									
MUNICIPIO:		CHIHUAHUA, CHIH.									
CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, SA. DE CV									
PERIODO:		16 AL 31 DE AGOSTO/2017.									
ESTIMACIÓN No.		2 (DOS)									
No. CONTRATO:		088/2017.									
No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO		IMPORTE		
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO					
3.05	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA DE ACERO 6X6-10-10, ACABADO PULIDO, CON JUNTAS FRIAS SELLADAS A BASE DE SIKAFLEX- 1A Y SIKAROD O SIMILAR EN CALIDAD, DISTRIBUIDAS SEGÚN PLANO, INCLUYE: ACABADO CON VOLTEADOR, CIMBRA APARENTE, NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	93.24	93.02	0.00	93.02	\$	296.91	\$	27,618.57	
5.09	SALIDA PARA CONTACTO DOBLE CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, CONTACTO MARCA BETECINO O SIMILAR, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	SAL	16.00	6.00	0.00	6.00	\$	574.30	\$	3,445.80	
							SUBTOTAL	\$	81,523.47		
							IVA	\$	13,043.75		
							TOTAL	\$	94,567.22		

POR EL CONTRATISTA:

ING. SANTIAGO PÉREZ BARRERA
CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO



CHIHUAHUA, CHIH.,

31 DE AGOSTO DEL 2017

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ **65,870.96**
(SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 96/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 2 (DOS) CONTRATO No. 088/2017. POR LA CANTIDAD DE : \$ 760,345.41 INCLUYE CONVENIO
SETECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA"

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ **81,523.47**
AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ **24,457.04**

	SUBTOTAL	\$ 57,066.43
	IVA	\$ 9,130.63
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO	TOTAL	\$ 66,197.06

C.M.I.C. 0.2%	163.05
D.I.F. 0.2%	163.05
SUMA	326.10

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA**1.- CONTRATO**

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 760,345.41
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 129,260.67
ESTA ESTIMACION	\$ 94,567.22
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 223,827.89
POR EJERCER	\$ 536,517.52

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 228,103.62
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 38,778.20
ESTA ESTIMACION	\$ 28,370.17
ACUMULADO ACTUAL	\$ 67,148.37
POR AMORTIZAR	\$ 160,955.25

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% DIF	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 222.86	\$ 222.86
ESTA ESTIMACION	\$ 163.05	\$ 163.05
ACUMULADO ACTUAL	\$ 385.91	\$ 385.91

RECIBIMOS

CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, SA. DE C.V.
CIV-020508-LE8

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	088/2017	TRAMO:	
OBRA:	"CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA"	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A DE CV
No. DE ESTIMACION:	2 (DOS)	PERIODO	16 AL 31 DE AGOSTO/2017.
CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
COLUMNA DE CONCRETO F'C=250 CON SECCION DE 30X45 CMS.ARMADA CON 4 VARILLAS #8, 6 VARS. #5 Y ESTRIBOS #3 @ 10 CMS. INCLUYE CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE 3/4", ARMADO, BOMBEO, COLADO ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			

ING. SANTIAGO PEREZ BARREDA
CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION
ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	088/2017	TRAMO:	
OBRA:	"CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA"	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A DE C.V
No. DE ESTIMACION:	2 (DOS)	PERIODO	16 AL 31 DE AGOSTO/2017.
CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X14 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS #3, F'Y=4200 KG/CM2. ESTRIBOS DEL #2 @ 15CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS.	EJE A ENTRE 1-3 6*2.4 ALTO 14.40 EJE B ENTRE 1-3 10 * 2.4 ALTO 24.00 EJE 1 ENTRE A-B 1 *2.85 ALTO 2.85 EJE 2 ENTRE A-B 1*2.85 ALTO 2.85 TOTAL 44.10		44.10ML

GENERADOR DE ESTIMACION

[illegible]

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS		CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
CADENA CD-2 DE REPISÓN DE CONCRETO F'C=250 KG/CM ² DE 14X14 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS #3, F'Y=4200 KG/CM ² Y ESTRIBOS DEL #2 @ 30CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS.	FACHADA PRINCIPAL EJE B ENTRE 1-3 $84+2.90+.45+.40+2.90+.82$	8.31		
TOTAL		8.31		

CONTRATO:	088/2017	TRAMO:	
OBRA:	"CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA"	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A DE C.V
No. DE ESTIMACION:	2 (DOS)	PERIODO	16 AL 31 DE AGOSTO/2017.
CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
CADENA CD-2 DE REPISON DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X14 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS #3, F'Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 30CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS.	FACHADA POSTERIOR EJE A ENTRE 1-3 .70+3.94+.60+.50+3.94+.78		34.17 ml
	TOTAL 10.46		

ING. SANTIAGO PEREZ BARREDA
CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION
 ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO


GENERADOR DE ESTIMACION


CONTRATO:	088/2017	TRAMO:										
OBRA:	"CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA"	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A DE C.V									
No. DE ESTIMACION:	2 (DOS)	PERIODO	16 AL 31 DE AGOSTO/2017.									
CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR									
CADENA CD-3 DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X20 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS #4 F'Y=4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO DEL CONCRETO, CRUCES DE VARILLAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	<table> <tr> <td>EJE 1 ENTRE A-B</td> <td>3.85+3.85</td> <td>7.70</td> </tr> <tr> <td>EJE 3 ENTRE AB</td> <td>3.85+3.85</td> <td>7.70</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>15.40</td> </tr> </table>	EJE 1 ENTRE A-B	3.85+3.85	7.70	EJE 3 ENTRE AB	3.85+3.85	7.70	TOTAL		15.40	15.40M	
EJE 1 ENTRE A-B	3.85+3.85	7.70										
EJE 3 ENTRE AB	3.85+3.85	7.70										
TOTAL		15.40										

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION
ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	088/2017	TRAMO:	
OBRA:	"CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA"	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A DE C.V

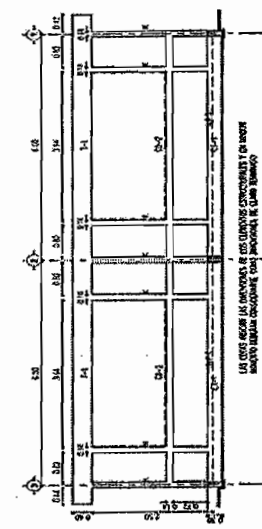
No. DE ESTIMACION:		PERIODO 16 AL 31 DE AGOSTO/2017.	
CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	FACHADA PRINCIPAL EJE B ENTRE 1-3 .82*.75*2 1.23 2.49 78*2.94*2 4.59 45*1.52*2 1.37 45*.72*2 0.65 FACHADA POSTERIOR EJE A ENTRE 1-3 .70*.74*2 1.04 1.52*.82*2 2.49 3.94*.74*2 5.83 .60*1.52*2 1.824 .50*.72*2 0.72 FACHADA LATERAL EJE 1 ENTRE A-B .80*7.70 6.16 1.42*7.70 10.93 3.85*.80*2 6.16 FACHADA LATERAL EJE 3 ENTRE A-B .96*7.70 7.39 1.54*7.70 11.86 3.85*.90/2*2 3.47 MOCHETAS 2*.72*.60 0.86 2*1.52*.60 1.82 TOTAL 70.89	FACHADA PRINCIPAL 	70.89 M2

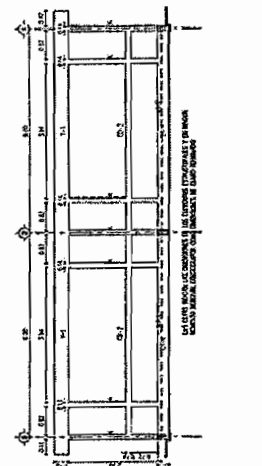CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		FACHADA POSTERIOR 	

ING. SANTIAGO PEREZ BARRERA
CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION
ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO

GENERADOR DE ESTIMACION

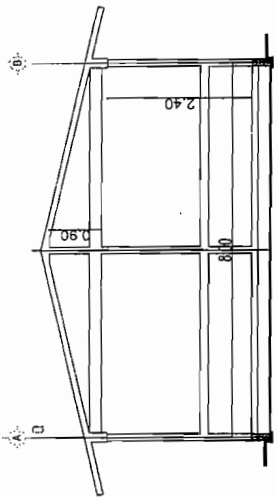CONTRATO:	088/2017	TRAMO:	
OBRA:	"CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA"	CONTRATISTA	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A DE C.V
No. DE ESTIMACION:	2 (DOS)	PERIODO	16 AL 31 DE AGOSTO/2017.
CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			


ING. SANTIAGO PEREZ BARREDA
CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION
ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	088/2017	TRAMO:	
OBRA:	"CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA"	CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A DE C.V
No. DE ESTIMACION:	2 (DOS)	PERIODO	16 AL 31 DE AGOSTO/2017.
CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA DE ACERO 6X6-10-10, ACABADO PULIDO, CON JUNTAS FRIAS SELLADAS A BASE DE SIKAFLEX- 1A Y SIKAROD O SIMILAR EN CALIDAD, DISTRIBUIDAS SEGÚN PLANO, INCLUYE: ACABADO CON VOLTEADOR, CIMBRA APARENTE, NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	EJE 1-A ENTRE 1-2 7.85*11.85 93.02		93.02M2
	TOTAL 93.02		

GENERADOR DE ESTIMACION

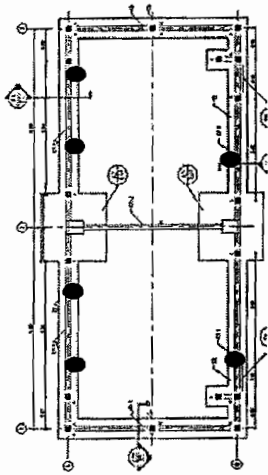
CONTRATO:	088/2017	TRAMO:	
OBRA:	"CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA"	CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A DE C.V
No. DE ESTIMACION:	2 (DOS)	PERIODO	16 AL 31 DE AGOSTO/2017.
CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
SALIDA PARA CONTACTO DOBLE CON CAJA GALVANIZADA, POLIDUCTO, CONTACTO MARCA BETECINO O SIMILAR, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	6.00		6 PZAS
TOTAL	6.00		

ING. SANTIAGO PEREZ BARREDA
CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS S.A DE C.V

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION
ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO



OBRA:	"CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA"
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA, CHIH.
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V.
PERIODO:	16 AL 31 DE AGOSTO/2017.
ESTIMACIÓN No.	2 (DOS)
No. CONTRATO:	088/2017.



POR EL CONTRATISTA:
SANTIAGO PEREZ BARRERA
CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN
ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

OBRA:	"CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA"		
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA, CHIH.		
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V		
PERIODO:	16 AL 31 DE AGOSTO/2017.		
ESTIMACIÓN No.	2 (DOS)		
No. CONTRATO:	088/2017.		



POR EL CONTRATISTA:

G. SANTIAGO PEREZ JARREDA
CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO



OBRA:	"CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA"
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA, CHIH.
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V.
PERIODO:	16 AL 31 DE AGOSTO/2017.
ESTIMACIÓN No.	2 (DOS)
No. CONTRATO:	088/2017.



POR EL CONTRATISTA


G/ SANTIAGO PEREZ BARRERA
CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO



OBRA:	"CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA"
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA, CHIH.
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V.
PERIODO:	16 AL 31 DE AGOSTO/2017.
ESTIMACIÓN No.	2 (DOS)
No. CONTRATO:	088/2017.



POR EL CONTRATISTA
S. SANTIAO GUTIERREZ BARREDA
CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN
ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO
