



URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MEXICO, S.A. DE C.V.

FACTURA

RÍO DE JANEIRO 508 INT. B PANAMERICANA CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31200

TEL: 410-80-95 FAX: 415-87-65

RFC: UEM030404J72

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION: MINA 408 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31000
RFC: MCI651010V22
USO DE CFDI: I01 Construcciones

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

VERSION: 3.3 **TIPO DE COMPROBANTE:** (I) INGRESO
SERIE: A **FOLIO:** 822
FECHA Y HORA DE EMISION: 2018-07-04T13:53:21
LUGAR DE EXPEDICION: 31200
NUMERO DE CUENTA:
FORMA DE PAGO: (03) Transferencia electrónica de fondos
REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

DIRECCION

RIO DE JANEIRO 508 B PANAMERICANA CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.P. 31200

OBSERVACIONES

METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
OBRA: MPIO-GAZAS **FOLIO PEDIDO CLIENTE:**

CFDI

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
FOLIO INTERNO PAC: 822
FOLIO FISCAL (UUID): 1285D23E-8323-4714-96B3-0C3DBAA0E97A

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000404924670
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404477432
RFC PROVEEDOR CERTIFICADO: EME000602QR9

No.	CLAVE PROD SERV	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% DESCUENTO	IMPORTE
1	72102900	ESTIMACION	ESTIMACION NO 13 CONVENIO DE LA CONSTRUCCION DE GAZAS PARA IMPLEMENTAR EL TEBOL EN LA INTERSECCION DE LA AV. COLON Y LA AV. HOMERO CONTRATO NO. 096/2017	1.00	E48	N/A	78,126.31	0.00	0.00	78,126.31
							IMPUESTO	FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
							002-IVA(TRASLADADO)	TASA	0.1600	12,500.21

CFDI RELACIONADO

TIPO DE RELACIÓN:

CFDI RELACIONADO:

(NOVENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 02/100 M.N.)

Notas

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI

Cz37goySnt2c6AN0omI63q7+mS6z1XyQWvhvkoEg6JAI
+M5JV2HEMVoHalwGIITu/0CZT54rMoZdOliaCQ9Zn3z1YYD7YAI5DIjUaxvYhKkSFKc5ac0nXgPPrdm
+OOSLASMFPu/aEUjVfQFsgL8bXQPZapeWB8Q2qQk6642aku3g+9/NelO+vM1YRw+wl16RUoDr4AZO2lobLU8DaNv8Hqz47n
+w6zVFYCI6gfyFqakbZ
+PpTQNwTXDnIsjNyYazantSAKIVXyd34nLi1BkmiaL6p2P1dhNpVvap7rG9PGXMoIqitZnDQREQw77rtze9rJPOTxMVM4yvRrC
6wrYLW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.111285D23E-8323-4714-96B3-0C3DBAA0E97A|2018-07-04T14:56:25|EME000602QR9|
Cz37goySnt2c6AN0omI63q7+mS6z1XyQWvhvkoEg6JAI
+M5JV2HEMVoHalwGIITu/0CZT54rMoZdOliaCQ9Zn3z1YYD7YAI5DIjUaxvYhKkSFKc5ac0nXgPPrdm
+OOSLASMFPu/aEUjVfQFsgL8bXQPZapeWB8Q2qQk6642aku3g+9/NelO+vM1YRw+wl16RUoDr4AZO2lobLU8DaNv8Hqz47n
+w6zVFYCI6gfyFqakbZ
+PpTQNwTXDnIsjNyYazantSAKIVXyd34nLi1BkmiaL6p2P1dhNpVvap7rG9PGXMoIqitZnDQREQw77rtze9rJPOTxMVM4yvRrC
6wrYLW==|00001000000404477432||

Sello digital SAT

PDEJXJH1wtVBL38LIS3dncrP7ewJp3lpP8tMn3aOZoorQ+NbEdiwco5FTC9Lk6tGILmwDZ6ydg97elfqVkJZ
+pvE8E5G1nR0dy11p8zoUTbrl1KJ7DZmUjv8IR6y2AMJ+dgGh
+vBDXaqZG0gu2p4c/KIRg3ZX7vhaVViDcDRQQvIGSeqoh6m20fne1UThtgEjuzaDEcJ2LNI+jsndvArDKNIRolhOskD
+9Kbm1QoWmZLXBn71j7UTzK6fa9FhFkGmyNoyD889cbKwazSrXH1zYc7shxM1MgDzKaVDMwRxnj9OekNBMPxETP8FwhS
NHq9b9SD7IVzCOzU3Lg==

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-07-04T14:56:25

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

IMPORTE		78,126.31
DESCUENTO	0.00 % (-)	0.00
IMPORTE CON DESCUENTO		78,126.31
AMORTIZACION ANTICIPO	0.00 % (-)	0.00
RETENCION GARANTIA	0.00 % (-)	0.00
	0.00 % (-)	0.00
SUBTOTAL		78,126.31
IVA	16.00 % (+)	12,500.21
RETENCION DE IVA	0.00 % (-)	0.00
RETENCION DE ISR	0.00 % (-)	0.00
TOTAL		90,626.52
AMORTIZACION	0.00 % (-)	0.00
RETENCION	0.00 % (-)	0.00
DIF	0.20 % (-)	156.25
	0.00 % (-)	0.00
	0.00 % (-)	0.00
	0.00 % (-)	0.00
SECODAM	0.00 % (-)	0.00
CMIC	0.20 % (-)	156.25
TOTAL A PAGAR		90,314.02

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
UEM030404J72	URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1285D23E-8323-4714-96B3-0C3DBAA0E97A	2018-07-04T13:53:21	2018-07-04T14:56:25	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$90,314.02	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 096/2017	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZAS PARA IMPLEMENTAR EL TREBOL EN LA INTERSECCION DE LA AV. COLÓN Y LA AV. HOMERO	ESTIMACIÓN No. 13 (Trece convenio)	\$ 36,494,082.68 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 01 al 30 de Marzo 2018	
UBICACIÓN: AV. HOMERO Y AV. TECNOLOGICO	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 90,626.53 CON IVA
CONTRATISTA: Urbanizadora y Edificadora de Mexico S.A. De C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 32,316,511.55 CON IVA
RFC UEM-030404-J72	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 32,407,138.08 CON IVA

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	<u>NORMALES</u>	\$ -	
	<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
	<u>EXTRAORDINARIO</u>	\$ 78,126.32	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 78,126.32	

DESCUENTOS

0.2% DIF	\$	156.25
0.2% CMIC	\$	156.25
SUMA DESCUENTOS	\$	312.50

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$	78,126.32
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	78,126.32
I.V.A.	\$	12,500.21
TOTAL	\$	90,626.53

(CON LETRA)

(NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS
53/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	312.50
SALDO NETO A RECIBIR	\$	90,314.03

AUTORIZO

ELABORO

Ing. Victor Mireles Villegas
RESIDENTE D.O.P.M

Urbanizadora y Edificadora de Mexico S.A. De C.V.
CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

ARO. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA
JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH.,

30 de marzo de 2018

RECIBIMOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 90,314.03
(NOVENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 3/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 13 (Trece convenii CONTRATO No. 096/2017 POR LA CANTIDAD DE : \$ 36,494,082.68 INCLUYE CONVENIO
TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y DOS PESOS 68/100 MN POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE GAZAS PARA IMPLEMENTAR EL TREBOL EN LA INTERSECCION DE LA AV. COLÓN Y LA AV. HOMERO

ALCANCE DE LA ESTIMACION		\$	78,126.32
AMORTIZACION DEL ANTICIPO			
		SUBTOTAL	\$ 78,126.32
		IVA	\$ 12,500.21
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		TOTAL	\$ 90,626.53
DIF DEL 0.2%	156.25		
CMIC DEL 0.2%	156.25		
SUMA	312.50		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO	\$	27,779,997.20
1er CONVENIO MODIFICATORIO	\$	5,938,998.57
2do CONVENIO MODIFICATORIO	\$	2,775,086.91
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$	32,316,511.55
ESTA ESTIMACION	\$	90,626.53
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$	32,407,138.08
POR EJERCER 1er CONVENIO MODIFICATORIO	\$	1,311,857.69
POR EJERCER 2do CONVENIO MODIFICATORIO	\$	2,775,086.91
POR EJERCER	\$	4,086,944.60

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO	\$	8,333,999.15
PRIMERA ASIGNACION	\$	-
ACUMULADO ANTERIOR	\$	8,333,999.15
ESTA ESTIMACION	\$	-
ACUMULADO ACTUAL	\$	8,333,999.15
POR AMORTIZAR	\$	0.00

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2 % DIF	0.2% CMIC
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 55,718.11	\$ 55,718.11
ESTA ESTIMACION	\$ 156.25	\$ 156.25
ACUMULADO ACTUAL	\$ 55,874.36	\$ 55,874.36

R E C I B I M O S

Urbanizadora y Edificadora de Mexico S.A. De C.V.
UEM-030404-J72

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZAS PARA IMPLEMENTAR EL TREBOL EN LA
INTERSECCION DE LA AV. COLÓN Y LA AV. HOMERO

CONTRATISTA Urbanizadora y Edificadora de Mexico S.A. De C.V.

UBICACIÓN AV. HOMERO Y AV. 1No. CONTRATO: 096/2017

ESTIMACIÓN No. 13 (Trece convenio)

PERÍODO: 01 al 30 de Marzo 2018

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

NORMALES

EXCEDENTES

EXTRAORDINARIO

\$

78,126.32

SUBTOTAL \$	78,126.32
I.V.A. \$	12,500.21
TOTAL \$	90,626.53


POR EL CONTRATISTA


POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS

URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MEXICO SA DE CV

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR		
OBRA EXTRAORDINARIA							
EXT-11	DEMOLICION DE MURO DE CONCRETO ARMADO EN PUENTES DE SORIANA Y VIVEBUS, DEBIDO A CAMBIO DE PROYECTO, CON EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: COMPRESORES DE AIRE, PISTOLAS DE AIRE, COMBUSTIBLE, FLETES, ACARREOS, ELEVACIONES, TRAZO, DEMOLICION, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.	M3		37.09	0.00	37.08961	\$ 824.11 \$ 30,565.92
EXT-23	Detallado de muros de concreto : rebabeo, parcheado , primer mano de pintura con llana, segunda mano de pintura con brocha. Incluye: mano de obra, consumibles, herramienta, equipo,y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2		-	1,133.20	(1,133.20)	\$ 64.03 \$ (72,558.80)
EXT-23A	Detallado de muros de concreto : rebabeo, parcheado , primer mano de pintura con llana, segunda mano de pintura con brocha. Incluye: mano de obra, consumibles, herramienta, equipo,y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2		1,133.20	0.00	1,133.20	\$ 106.00 \$ 120,119.20
TOTAL ESTIMACION							\$ 78,126.32



POR EL CONTRATISTA
 ING. HUGO ALFREDO VARGAS DURIN



POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
 ING. VÍCTOR MIRELES VILLEGAS

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONSTRUCCION DE GAZAS PARA IMPLEMENTAR EL TREBOL EN LA INTERSECCION DE LA AV. COLON Y LA AV. HOMERO

OBRA

UBICACIÓN AV. HOMERO Y TECNOLÓGICO.

CONTRATISTA

URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MEXICO S.A. DE C.V.

No: DE ESTIMACIÓN



PERIODO	1-30 MARZO 2018
---------	-----------------

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES					
	UBICACIÓN	ALTO1	ALTO2	ANCHO	LARGO	NO.VECES
OBRAS PRELIMINARES						
DEMOLICION DE MURO DE CONCRETO ARMADO EN PUENTES DE SORIANA Y VIVEBOS, DEBIDO A CAMBIO DE PROYECTO, CON EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: COMPRESORES DE AIRE, PISTOLAS DE AIRE, COMBUSTIBLE, FLETES, ACCARREOS, ELEVACIONES, TRAZO, DEMOLICION, ALBAÑILERIA, RESTA	ZAPATA MURO	0.30 0.65	0.70 0.70	4.50 2.44	19.90 19.80	1 1
						TOTAL
						77.55
						A COBRAR
						37' 08981000C
						Resto
						40.5

REPORTER FOTOGRAFICO

Vol.	A
------	---

37.06951000

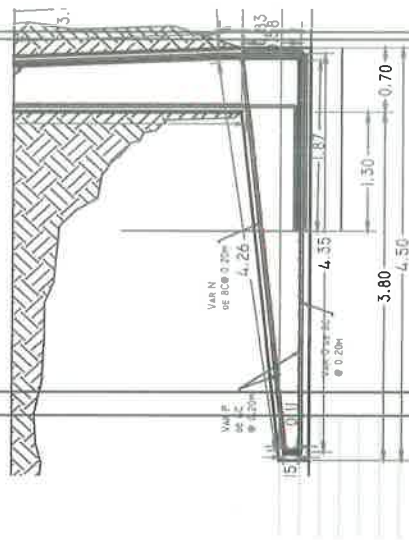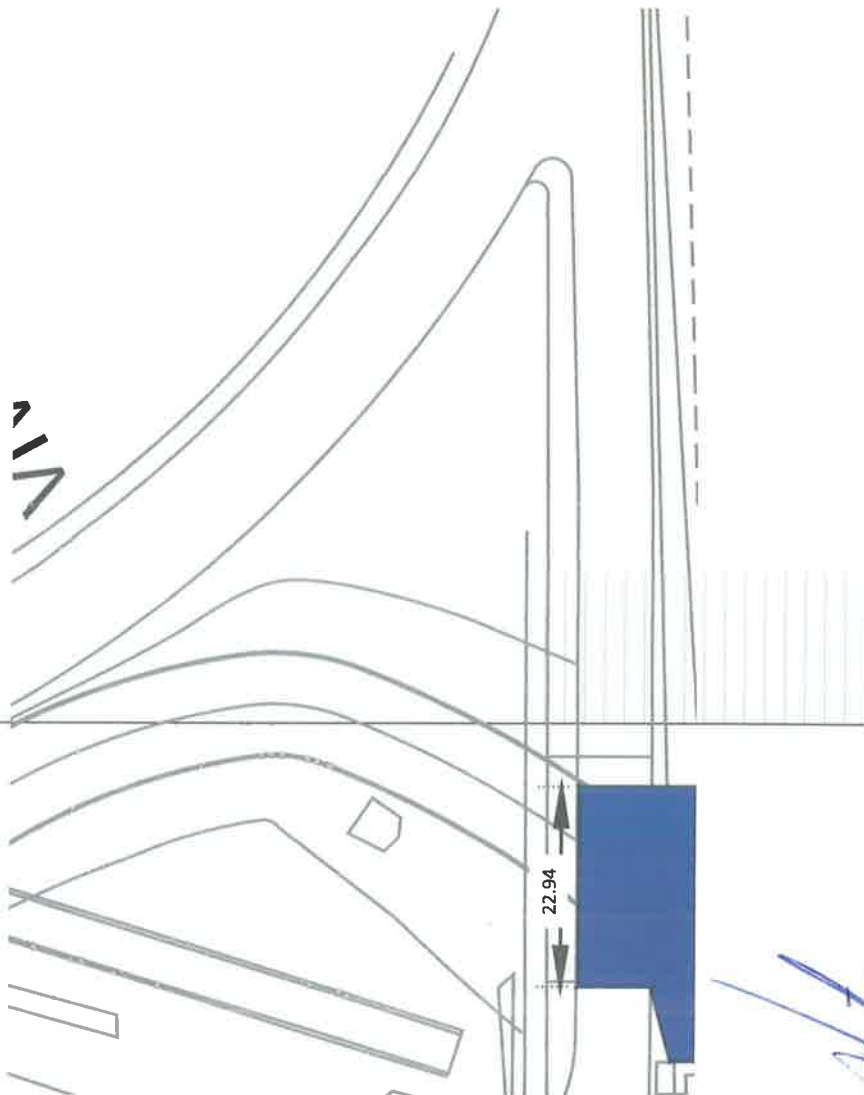


ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR DE DOPM

ING. MANUEL VALDEZ
USANTZADORA Y EDIFICADORA DE MÉXICO S.A. DE C.V.

GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCIÓN DE GAZAS PARA IMPLEMENTAR EL TREBOL EN LA INTERSECCION DE LA AV. COLON Y LA AV. HOMERO			CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UBICACIÓN	AV. HOMERO Y TECNOLÓGICO.			CONTRATISTA	URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MÉXICO S.A. DE C.V.
No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO	1-30 MARZO 2018			

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	SECCION	AREA	No VECES	TOTAL
EXT-23 Detallado de muro de concreto : retabao, parchado , primer mano de pintura con llana, segunda mano de pintura con brocha. Incluye: mano de obra, consumibles, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	UBICACIÓN	FORD	E1	144.56	144.56
			E2	165.1	165.10
		SMART	E1	100.32	100.32
			E2	109.72	109.72
		SORIANA	E1	147.4	147.40
			E2	178.9	178.90
		VIVEBUS	E1	146.7	146.70
			E2	140.5	140.50
					TOTAL 0.00
					COBRADO 1133.20
					A ESTIMAR -1133.20

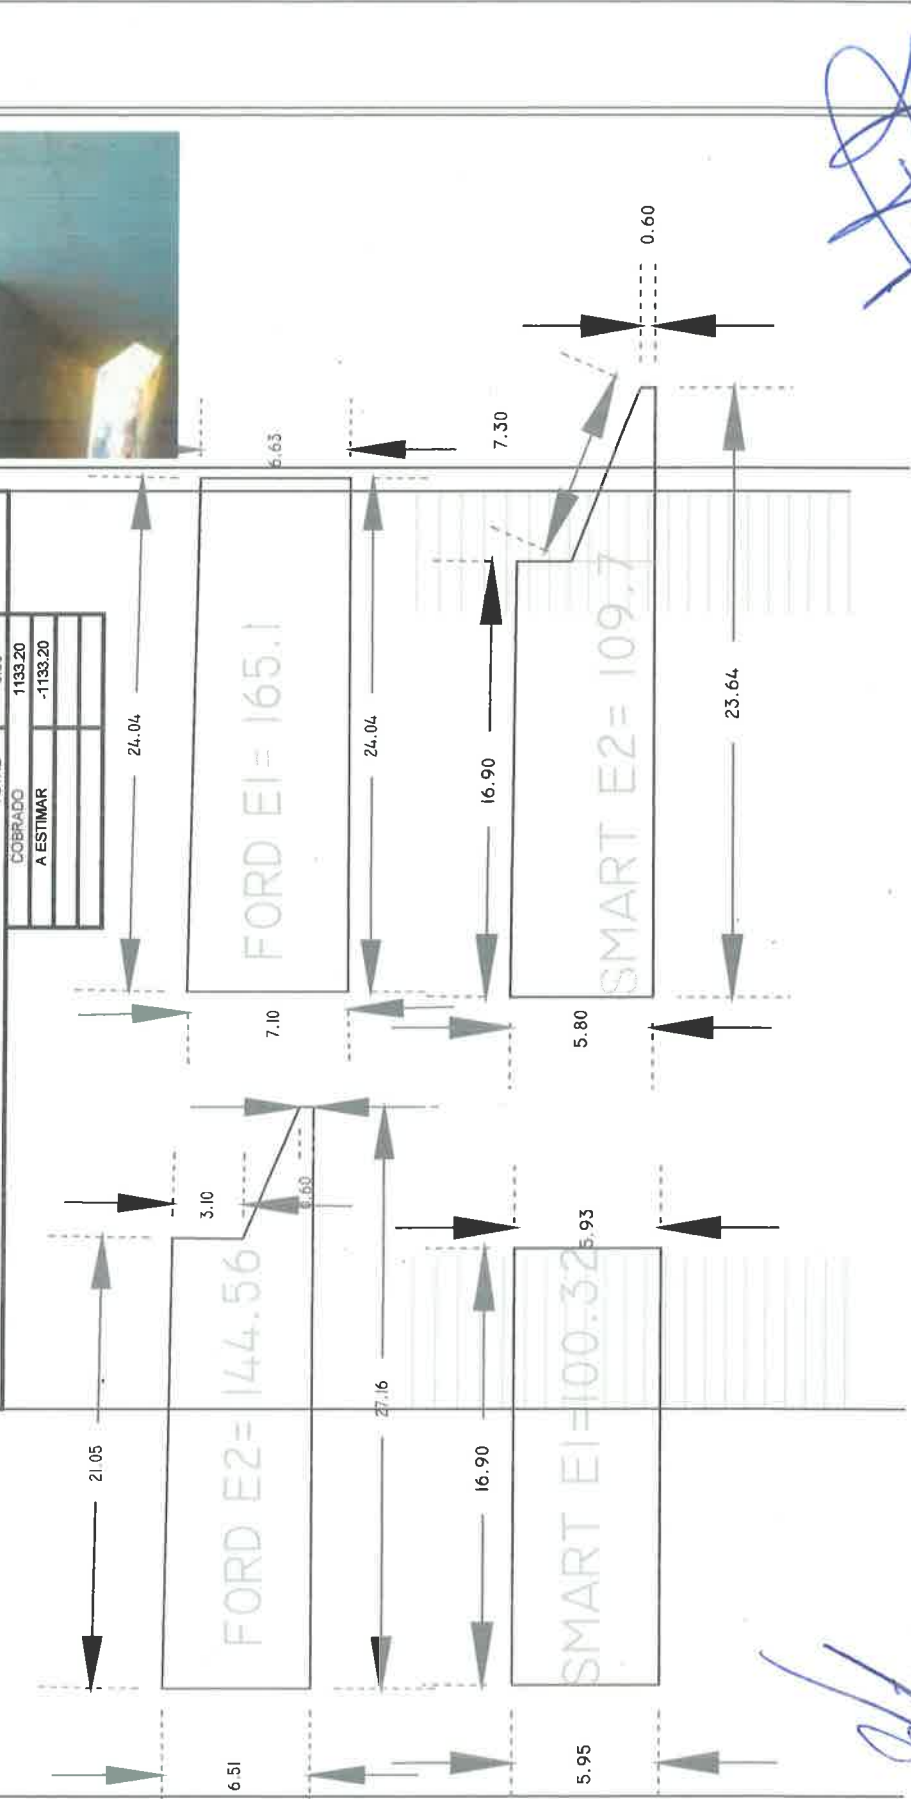

Vol.
A
ESTIMAR
-1133.20
M3


ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR DE DOPM

ING. MANUEL VALDEZ
URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MÉXICO S.A. DE C.V.

GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCIÓN DE GAZAS PARA IMPLEMENTAR EL TEBOL EN LA INTERSECCION DE LA AV. COLON Y LA AV. HOMERO	CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UBICACIÓN	AV. HOMERO Y TECNOLÓGICO	CONTRATISTA	URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MEXICO S.A. DE C.V.
No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO	1-30 MARZO 2018	

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES	SECCION	AREA	No VECES	TOTAL
EXT-23A Detallado de muro de concreto : rebaboo, parchado , primer mano de pintura con fiera, segunda mano de pintura con brocha. Incluye: mano de obra, consumibles, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	FORD	E1	144.56	1	144.56
		E2	165.1	1	165.10
	SMART	E1	100.32	1	100.32
		E2	109.72	1	109.72
	SORIANA	E1	147.4	1	147.40
		E2	178.9	1	178.90
	VIVEBUS	E1	146.7	1	146.70
		E2	140.5	1	140.50
TOTAL					1133.20
COBRADO					0.00
A ESTIMAR					1133.20

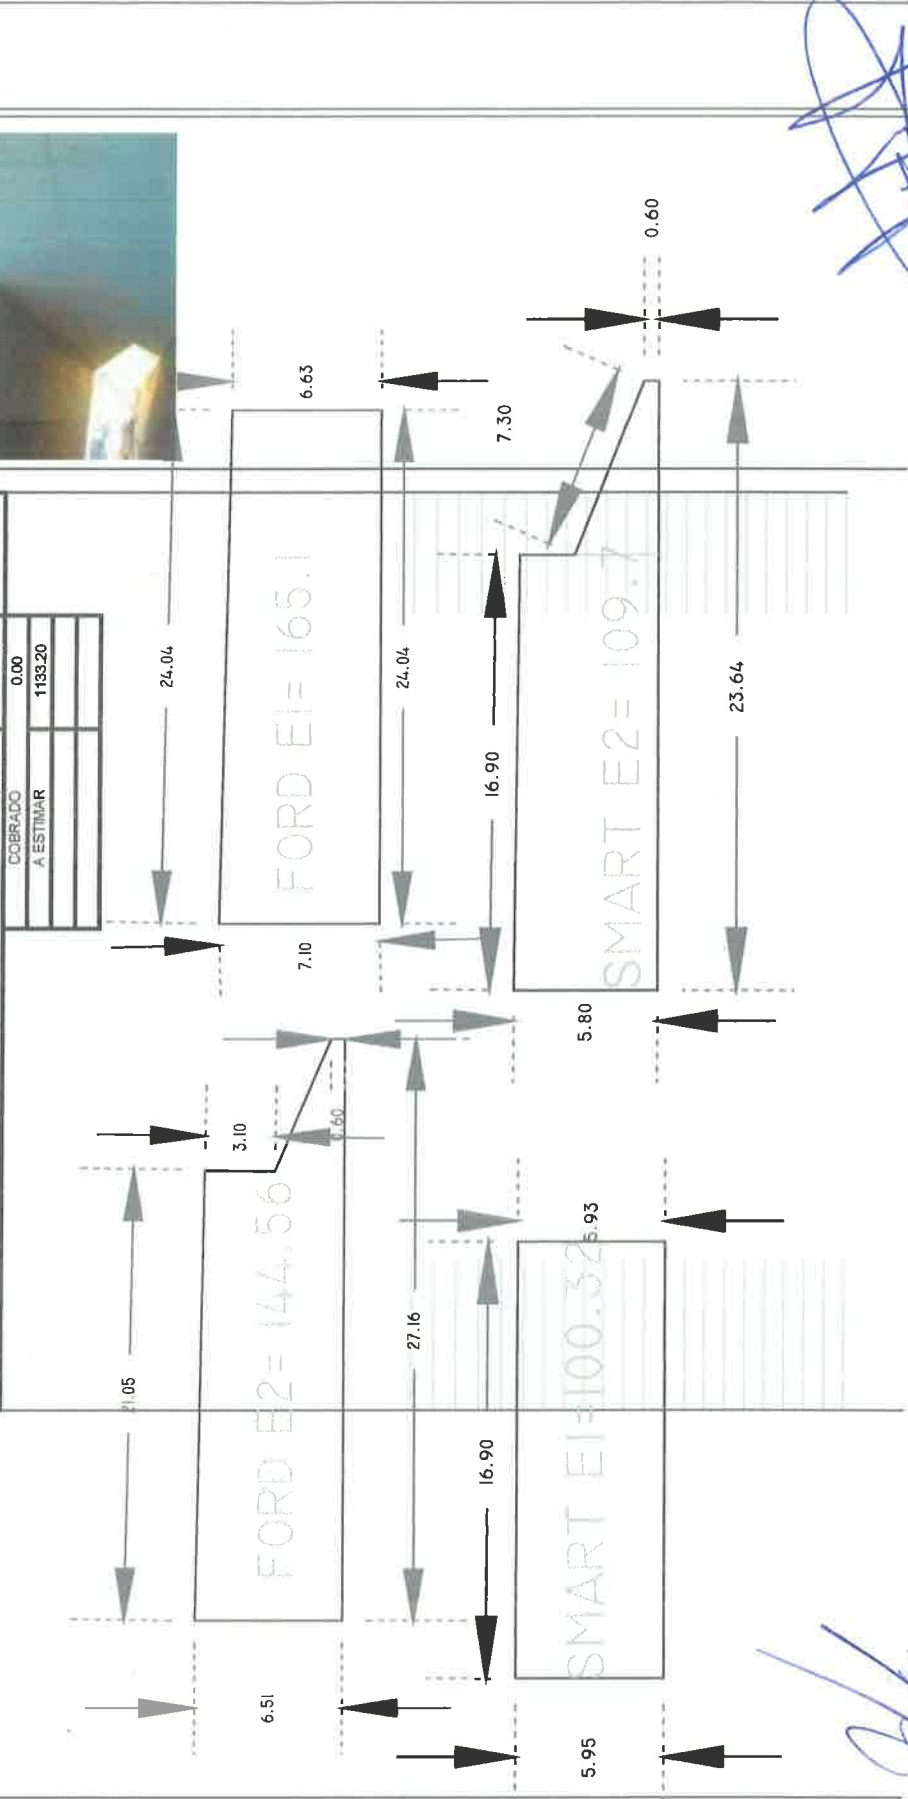

Vol. A
ESTIMAR
1133.20
M3

REPORTE FOTOGRAFICO





ING. VICTOR MIRIELES VILLEGAS
SUPERVISOR DE DOPM

ING. MANUEL VALDEZ
URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MEXICO S.A. DE C.V.

GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCIÓN DE GAZAS PARA IMPLEMENTAR EL TRESOL EN LA INTERSECCION DE LA AV. COLON Y LA AV. HOMERO			CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UBICACIÓN	AV. HOMERO Y TECNOLÓGICO.			CONTRATISTA	URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MÉXICO S.A. DE C.V.
No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO	1-30 MARZO 2018			

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES
-------------	-------------

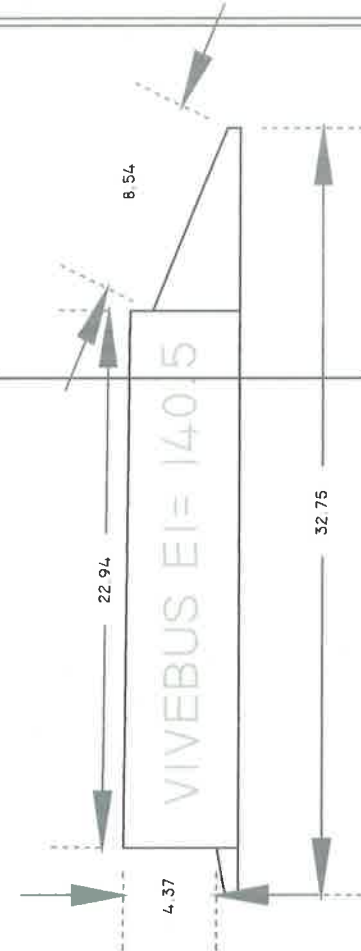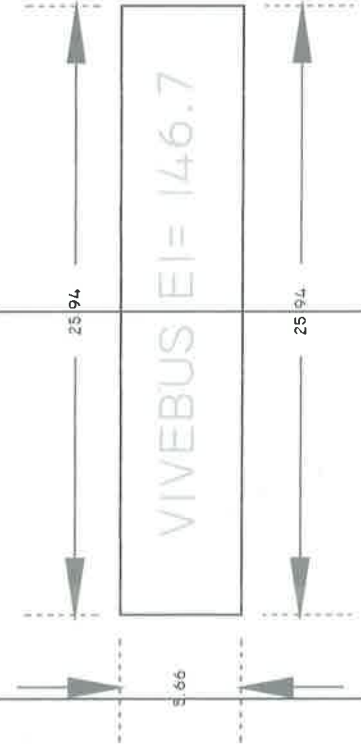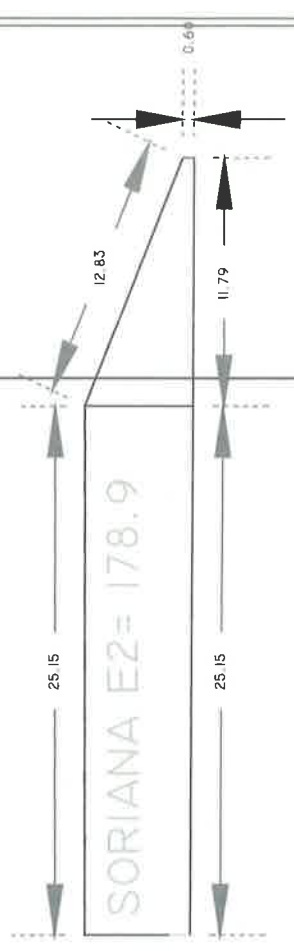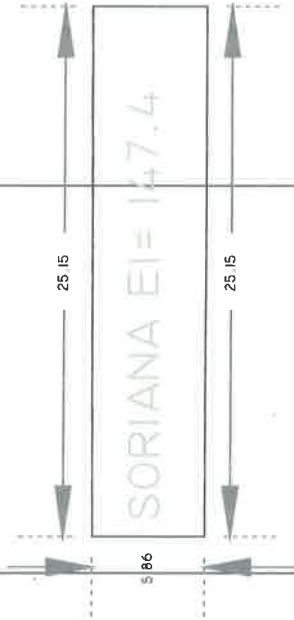

Vol. A


ESTIMAR

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR DE DOPM

ING. MANUEL VALDEZ
URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MÉXICO S.A. DE C.V.

GENERADOR

OBRA	CONSTRUCCION DE GAZAS PARA IMPLEMENTAR EL TEBOL EN LA INTERSECCION DE LA AV. COLON Y LA AV. HOMERO			CLIENTE	MUNICIPIO DE CHILAHUA
UBICACIÓN	AV. HOMERO Y TECNOLÓGICO			CONTRATISTA	URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MEXICO S.A. DE C.V.
No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO	1-30 MARZO 2018			

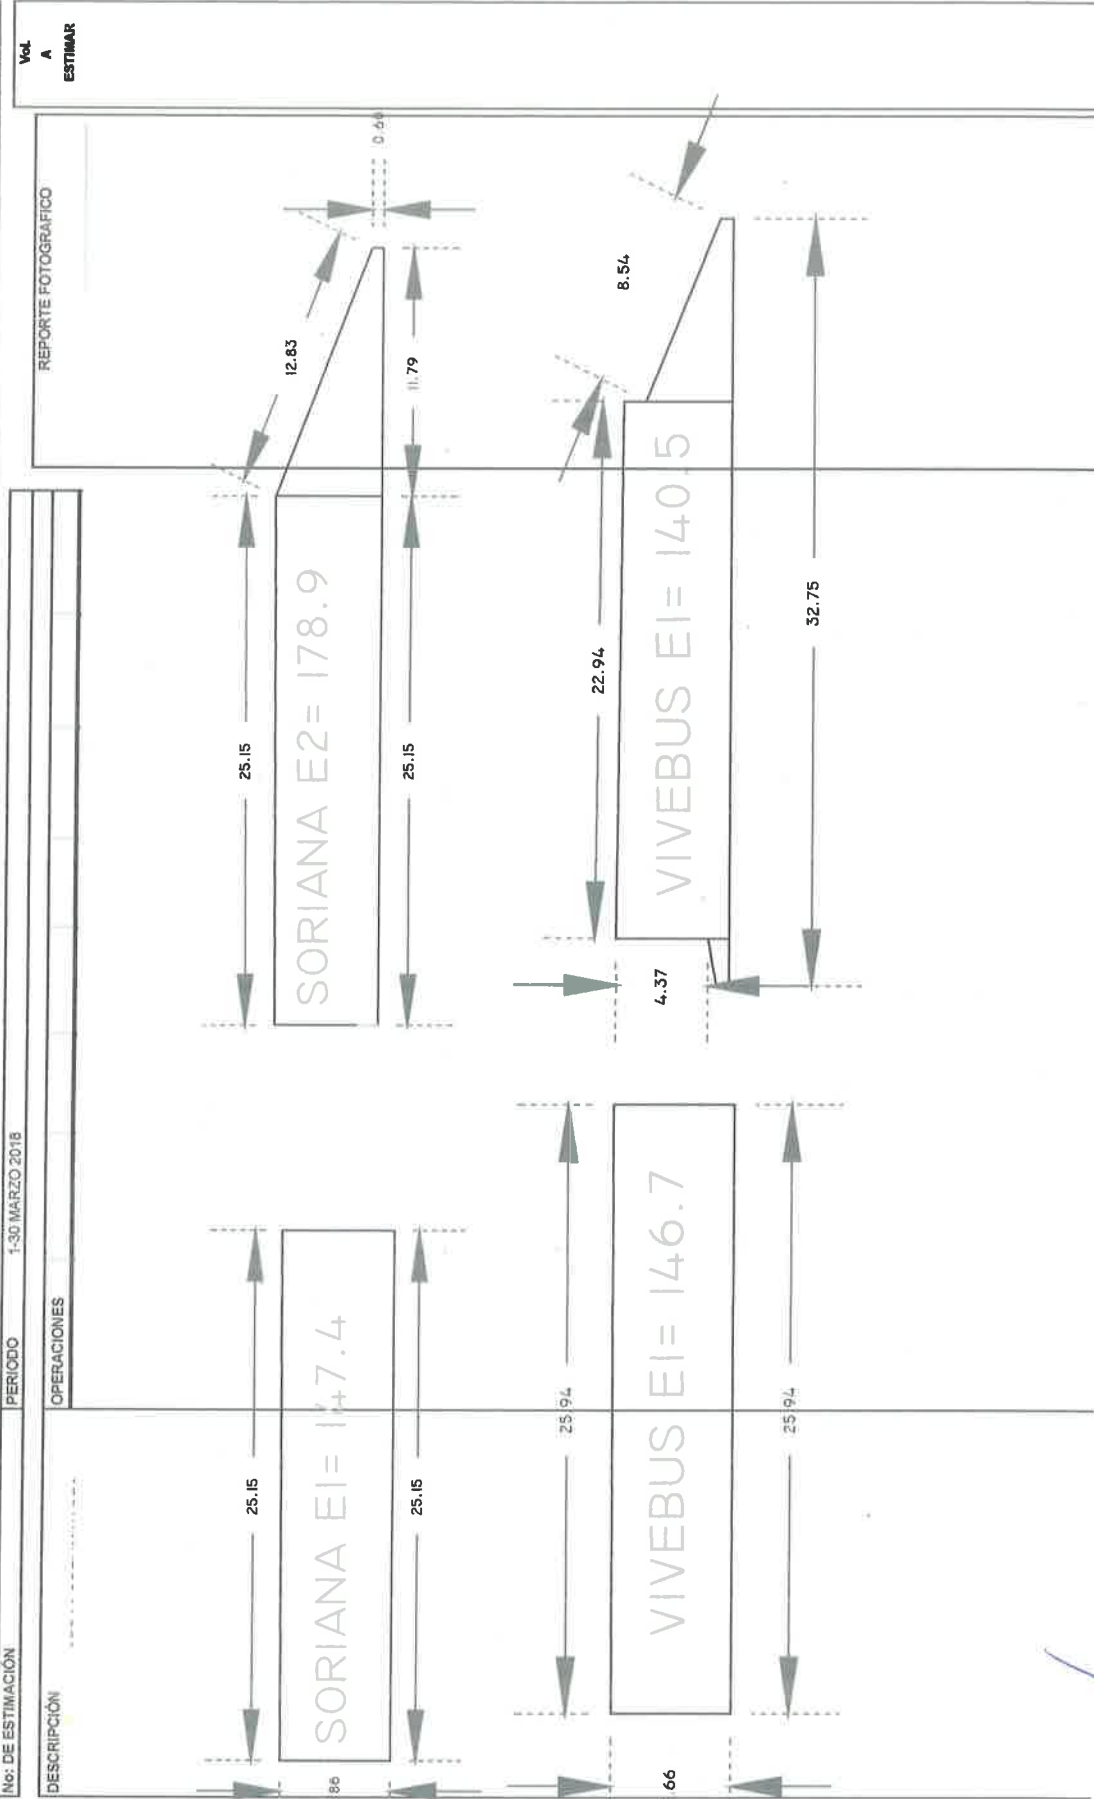

ING. VICTOR ARCELES VILLEGAS
SUPERVISOR DE DPM

ING. MANUEL VALDEZ
URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MEXICO S.A. DE C.V.
