

CONTROL DE TRAMITE DE ESTIMACIONES

DATOS GENERALES				
FOLIO	NUMERO DE ESTIMACION	3	FACTURA	665
			SALDO NETO	71,133.17
OBRA CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION HOMERO				
CONTRATISTA:	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV		UBICACIÓN	CHIHUAHUA, CHIH
RESIDENTE	ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ		CONTRATO No.	107/2017

RESUMEN DE AUTORIZACIONES				
AUTORIZACION DE:	FECHA Y FIRMA RECIBIO	FECHA Y FIRMA ENTREGA	CONTROL DE OBRA	
			FECHA Y FIRMA RECIBIDO	FIRMA Y FECHA ENTREGA
RESIDENTE	27/10/2017 ING. GLORIA M. R.	27/10/2017		
JEFE DE DEPARTAMENTO				
SUBDIRECTOR				
☒ DIRECTOR				
☐ DEP. SERV. ADM.				

EN CASO DE 1ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	

EN CASO DE 2ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	

EN CASO DE 3ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	



Dirección de Obras Públicas
Subdirección de Infraestructura Urbana
Departamento de Construcción

NOMBRE Y FECHA DE ENTREGA EN CONTROL DE OBRA

[Handwritten signature]



CHIHUAHUA, CHIH. 26 DE OCTUBRE DE 2017

ING GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No. 3 CON FACTURA 665 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION HOMERO

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 06 DE OCTUBRE AL 12 DE OCTUBRE 2017
POR UN SALDO NETO FACTURADO DE \$71,133.17 CON IVA INCLUIDO.

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE
ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN.

ACENTAMENTE
STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV
RECIBE

ING GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

SCO091026IP0

STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV

Folio Fiscal

A362A7A5-5A6D-5136-1793-9C8DDE7F6922

Serie

Folio

665

BLVD ANTONIO ORTIZ MENA, No. Ext 1605
CAMPESTRE RESIDENCIAL, C.P. 31213
CHIHUAHUA CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO

Fecha y Hora

26 / 10 / 2017 18:15:33

Datos Fiscales del Cliente

RFC: MCI651010V22

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Domicilio: MINA, No. Ext 408, Col. CENTRO, C.P. 31000

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEXICO

Tipo de Comprobante:

Factura

Moneda:

MXP

Tasa de Cambio:

1

Forma de Pago:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago:

02 - Cheque nominativo, No. Cta. NO IDENTIFICADO

Certificado del Emisor:

00001000000403852726

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
		ESTIMACION No.3 POR TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DE PROLONGACION HOMERO SEGUN CONTRATO No. 107/2017		
		ALCANCE DE LA ESTIMAICON \$ 87,602.43 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 26,280.73		
1	NO APLICA	RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO	\$ 61,321.70	\$ 61,321.70
		0.2% C.M.I.C. \$ 175.20		
		0.2% D.I.F. \$ 175.20		
		SUMA \$ 350.40		
		NETO A RECIBIR \$ 70,782.77		
		Subtotal	\$ 61,321.70	\$ 61,321.70
		IVA TASA 16%		\$ 9,811.47
		Total		\$ 71,133.17

Setenta y un mil ciento treinta y tres pesos, 17/100 MXN

Expedido en: BLVD ANTONIO ORTIZ MENA 1605 CAMPESTRE RESIDENCIAL C.P. 31213 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO.

Lugar de Expedición: CHIHUAHUA

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|A362A7A5-5A6D-5136-1793-9C8DDE7F6922|2017-10-

26T18:15:33|YymKPKpaqxnN3EjxYYx3DU4T1qPYB8nS0eKm20pWs5+FHj3EiKBpAB0C96kwoy2UaZiflx74iuyjsOEM+jQYuN4NqW5Ejz705CUBcpMfcswn7OaxLGMjMcxxOdhFECfilxZdJdad/LJAN6xq0lEbCS6tpK

MfalFkPdXPrADR5ocuww2owpuSmUz6O3oau+5NdS9e/H3edYJLSACicjWB2nand9Sls+rrHzWS9PrfxzSdKLAODuB90E7VFIH2DrcfgBM8z99Y239t142eli6yVSNmzQ55AA1192co/MUHYeUvubS0v2ENFUF7zEG91a

unCPN7KNG5q7oA/5zTO==|00001000000402636111|

Sello Digital del Emisor

YymKPKpaqxnN3EjxYYx3DU4T1qPYB8nS0eKm20pWs5+FHj3EiKBpAB0C96kwoy2UaZiflx74iuyjsOEM+jQYuN4NqW5Ejz705CUBcpMfcswn7OaxLGMjMcxxOdhFECfilxZdJdad/LJAN6xq0lEbCS6tpK/MfalFkPdXPrADR5ocuww2owpuSmUz6O3oau+5NdS9e/H3edYJLSACicjWB2nand9Sls+rrHzWS9PrfxzSdKLAODuB90E7VFIH2DrcfgBM8z99Y239t142eli6yVSNmzQ55AA1192co/MUHYeUvubS0v2ENFUF7zEG91aunCPN7KNG5q7oA/5zTO==

Número de Cuenta: NO IDENTIFICADO

Expedido En: Calle BLVD ANTONIO ORTIZ MENA, No. Ext 1605 Col. CAMPESTRE RESIDENCIAL, C.P. 31213 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Estado CHIHUAHUA, MEXICO

Folio Fiscal: A362A7A5-5A6D-5136-1793-9C8DDE7F6922

Certificado SAT:

00001000000402636111

Fecha y Hora de

2017-10-26T18:15:33

Sello Digital SAT

i4cuvQ1485AV6XQ858gNkuavzvpYUphYi2DDNm781zTi030GolekchDIUV2d2EluRF2+jZc1rxUi2dUqXWWwLkUUmijnAmeUTci9TyB9VXi69RHd2gFmuyxk5
Dgwzjln5zc2wj25KwAuWaak0aNYeVaD62Fz14IUhH/2ZKNSVVDLIME5oR3cyZD5KBYLgZIXT00jYwbFF2Dh4eMho85aLhVQXiU5ujXTfWfZp/Uab/cWfdMJ9
bviKd1l2wBcHYm6nfm3f5x/tWstWf2LJULoRsJlaikRaCgQuhfhoH7av0tH29S+XgMRIMmJaBOBfhkG7Q/c4GzLw==



★ (<http://www.gob.mx/>) > inicio

SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SCO091026IP0	STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A362A7A5-5A6D-5136-1793-9C8DDE7F6922	2017-10-26T18:15:33	2017-10-26T18:15:33	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$71,133.17	ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

[Declaración de Acreditación](https://www.gob.mx/credibilidad)
<https://www.gob.mx/credibilidad>
[Política de privacidad](https://www.gob.mx/credibilidad)
[Terminos y condiciones](https://www.gob.mx/credibilidad)
[Marco jurídico](https://www.gob.mx/credibilidad)
[Portal de Obligaciones de Transparencia](https://www.gob.mx/credibilidad)
[Sistema telefónico](https://www.gob.mx/credibilidad)
[INAI](https://www.gob.mx/credibilidad)
[Mapa de sitio](https://www.gob.mx/credibilidad)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)
[Ingresa](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)
[Juntos](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)
[Reformas](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx
[Denuncia contra servidores públicos](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)
[Quejas y denuncias en la SFO/SPSI](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

Mantente informado. Suscríbete.

usuario@ejemplo.com



Síguenos en

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 107/2017	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION HOMERO	ESTIMACIÓN No. 3	\$ 8,816,451.36 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 06 DE OCTUBRE AL 12 DE OCTUBRE 2017	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 108,741.45 CON IVA
CONTRATISTA: STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 770,398.18 CON IVA
RFC SCO 091026 IP0	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 879,139.63 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 93,742.63	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>DEVOLUCION DE LA RETENCION</u>	\$ 14,432.19	
<u>RETENCION POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE CONTRATO</u>	\$ (20,572.39)	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 87,602.43	

DESCUENTOS			
0.2% C.M.I.C		175.20	
0.2% D.I.F	\$	175.20	
SUMA DESCUENTOS	\$	350.40	
RESUMEN			
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	87,602.43	
AMORT ANTICIPO	\$	26,280.73	
SUB-TOTAL	\$	61,321.70	
I.V.A.	\$	9,811.47	
TOTAL	\$	71,133.17	
(CON LETRA)			
(SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 17/100 M.N.)			
DESCUENTOS	\$	350.40	
SALDO NETO A RECIBIR	\$	70,782.77	

AUTORIZO	ELABORO
 <u>ING GLORIA MARTINEZ RGUEZ</u> RESIDENTE D.O.P.M	 <u>STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV</u> CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
 <u>ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA</u> SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	 <u>ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA</u> JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.
Vo. Bo.	
 <u>ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL</u> DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

CHIHUAHUA, CHIH.,

12 DE OCTUBRE 2017

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE:
(SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 77/100 M.N.)
ESTIMACIÓN NUM. 3 CONTRATO No. 107/201 POR LA CANTIDAD DE : \$8,816,451.36
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.
CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION HOMERO

\$ 70,782.77
COMO PAGO A LA

POR TRABAJOS EN LA OBRA:

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 87,602.43
AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 26,280.73

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

0.2% C.M.I.C 175.20
D.I.F.O, 2 % 175.20
SUMA 350.40

SUBTOTAL \$ 61,321.70
IVA \$ 9,811.47
TOTAL \$ 71,133.17

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO
\$ 8,816,451.36 CON IVA
\$ 770,398.18 CON IVA
\$ 108,741.45 CON IVA
\$ 879,139.63 CON IVA
\$ 7,937,311.73 CON IVA

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO
\$ 2,644,935.41 CON IVA
\$ 226,097.06 CON IVA
\$ 30,485.65 CON IVA
\$ 256,582.71 CON IVA
\$ 2,388,352.70 CON IVA

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2 % C.M.I.C
ACUMULADO ANTERIOR \$ 1,299.40
ESTA ESTIMACION \$ 175.20
ACUMULADO ACTUAL \$ 1,474.60

0.2% D.I.F
\$ 1,299.40
\$ 175.20
\$ 1,474.60

RECIBIMOS

STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV
SCO 091026 IPO

OBRA:

CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION HOMERO

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH.

No. CONTRATO: 107/2017

ESTIMACIÓN No. 3

CONTRATISTA: STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV

PERÍODO: 06 DE OCTUBRE AL 12 DE OCTUBRE 2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

1 NORMALES

93,742.63

SUBTOTAL

93,742.63

I.V.A.

14,998.82

TOTAL

108,741.45

POR EL CONTRATISTA

STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONTRATISTA:

STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV

ESTIMACIÓN No. 3

PERIODO: 06 DE OCTUBRE AL 12 DE OCTUBRE 2017

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
<u>OBRA NORMAL</u>							\$	93,742.63
ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO								
11	047-E-13- b) Suministro y colocación de mampostería de tercera clase, m3 asentada con mortero de cemento-arena 1:3 utilizada en estribos y aleros , Incluye: Materiales, mano de obra, andamios, desperdicios, limpiezas, herramienta, instalada a cualquier altura y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada.		1060.00	121.32	0.00	121.32	211.87	25,704.07
INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
75	EP-16 Suministro y Colocacion de Luminaria Marca american Electric pza. Lighting Modelo ATB030BLED13MVOLTR3AOMPPCSS o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecucion.		20.00	8.00	0.00	8.00	8,504.82 \$	68,038.56

POR EL CONTRATISTA

STAHL CONSTRUCCIONES S A DEC V

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ.

G E N E R A D O R

STAHL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION HOMERO CHIHUAHUA.

FECHA: 20 DE OCTUBRE 2017
PERIODO: 06 DE OCTUBRE AL 12 DE OCTUBRE 2017
No. CONTRATO: No 107/2017
No. ESTIMACION: 3 (TRES)

CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
75	EP-16 Suministro y Colocacion de Luminaria Marca american Electric Lighting Modelo ATB030BLED13MVOLTR3AOMPCCSS o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecucion.	8.00 PZA

ANEXO CROQUIS	CANTIDAD 8.00 PZAS
	TOTAL 8.00


RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ


STAHL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
ING. IRIS SIOMARA SINECIO TRUJILLO

TESTIGO FOTOGRAFICO

STAHL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION HOMERO CHIHUAHUA.

FECHA: 20 DE OCTUBRE 2017
PERIODO: 06 DE OCTUBRE AL 12 DE OCTUBRE 2017
No. CONTRATO: No 107/2017
No. ESTIMACION: 3 (TRES)


CLAVE	CONCEPTO:	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
75	EP-16 Suministro y Colocacion de Luminaria Marca american Electric Lighting Modelo ATB030BLED13MVOLTR3AOMPPCSS o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecucion.	8.00 PZA

MANO DE OBRA



RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

STAHL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
ING. IRIS SIOMARA SINESIO TRUJILLO

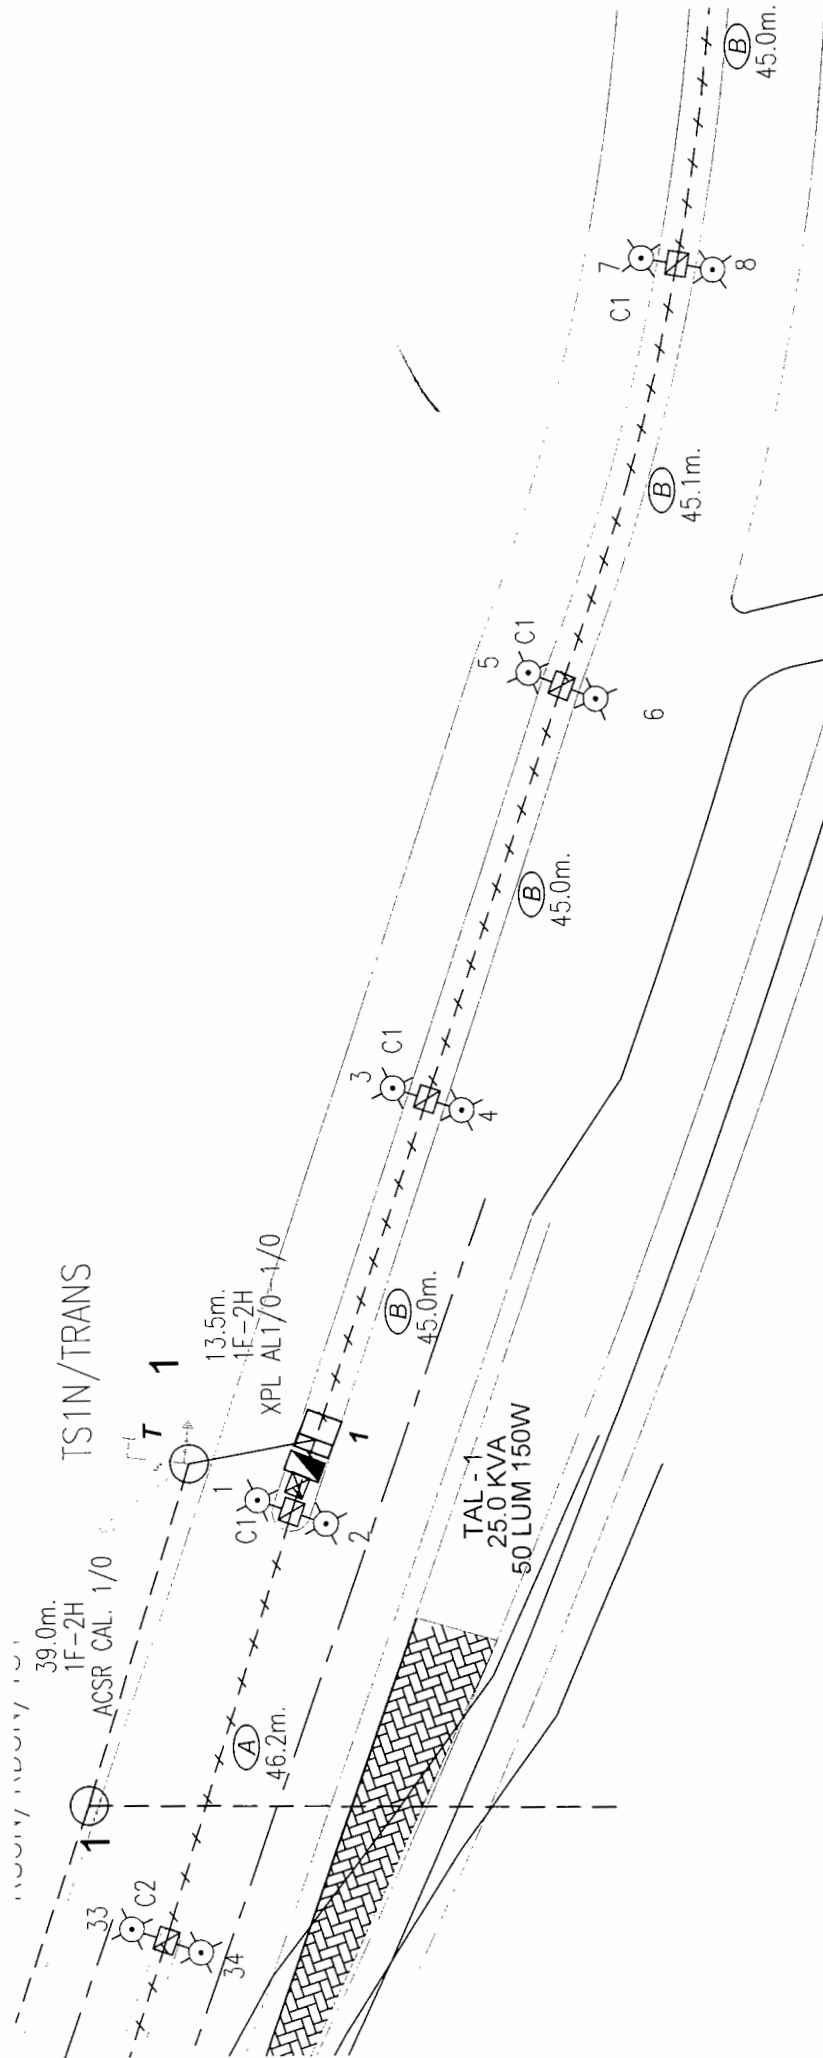

Suministro y Colocación
de luminaria


OB

G E N E R A D O R
STAHL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION HOMERO CHIHUAHUA.

FECHA: 20 DE OCTUBRE 2017
 PERIODO: 06 DE OCTUBRE AL 12 DE OCTUBRE 2017
 No. CONTRATO: No 107/2017
 No. ESTIMACION: 3 (TRES)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
11	047-E-13- b) Suministro y colocación de mampostería de tercera clase, asentada con mortero de cemento-arena 1:3 utilizada en estribos y aleros , Incluye: Materiales, mano de obra, andamios, desperdicios, limpiezas, herramienta, instalada a cualquier altura y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada.	121.32 M3

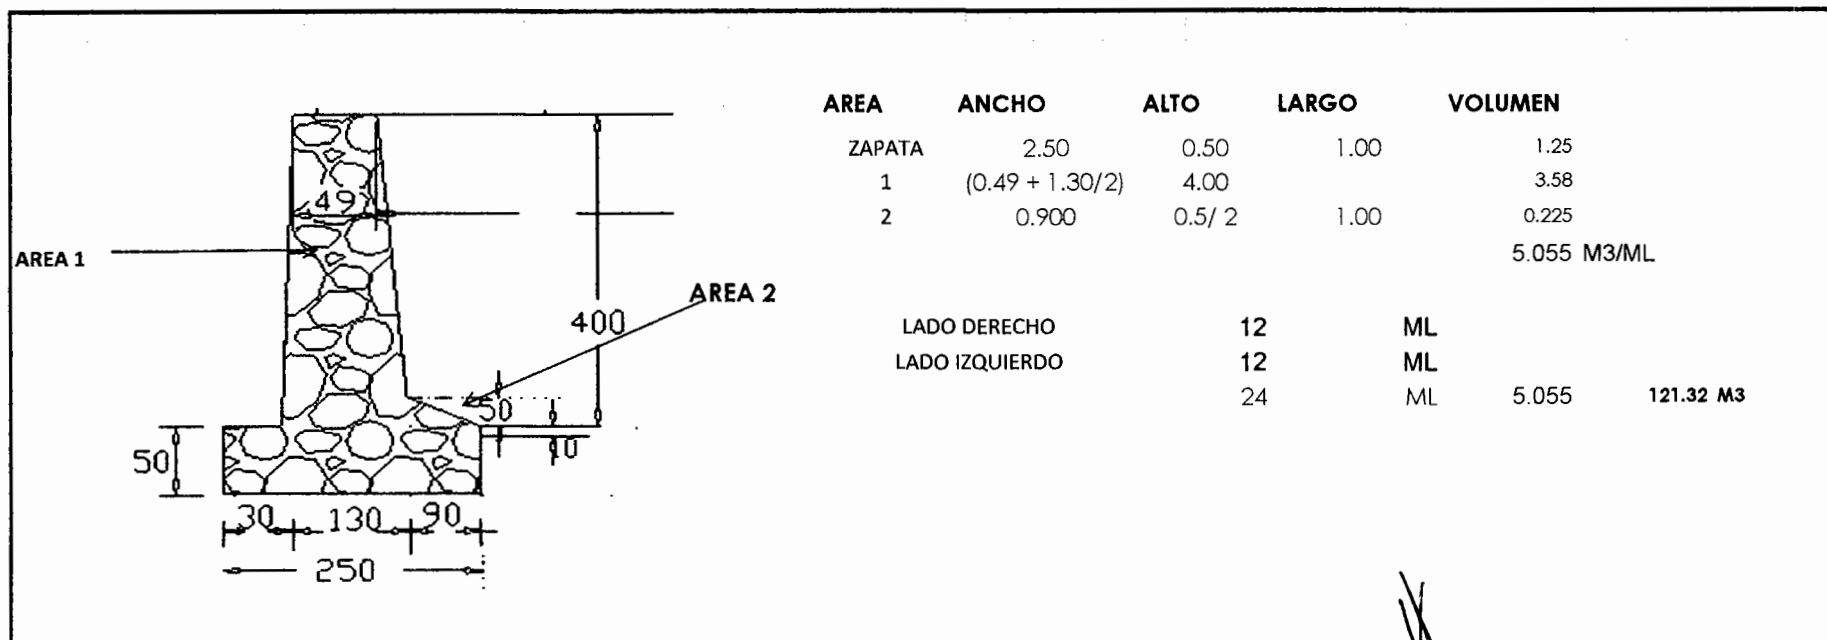

RESIDENTE DE OBRA
 ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

STAHL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
 ING. IRIS SIOMARA SINECIO TRUJILLO

T E S T I G O F O T O G R A F I C O

STAHL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION HOMERO CHIHUAHUA.

FECHA: 20 DE OCTUBRE 2017


PERIODO: 06 DE OCTUBRE AL 12 DE OCTUBRE 2017

No. CONTRATO: No 107/2017

No. ESTIMACION: 3 (TRES)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
11	047-E-13- b) Suministro y colocación de mampostería de tercera clase, asentada con mortero de cemento-arena 1:3 utilizada en estribos y aleros , Incluye: Materiales, mano de obra, andamios, desperdicios, limpiezas, herramienta, instalada a cualquier altura y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada.	121.32 M3

MANO DE OBRA

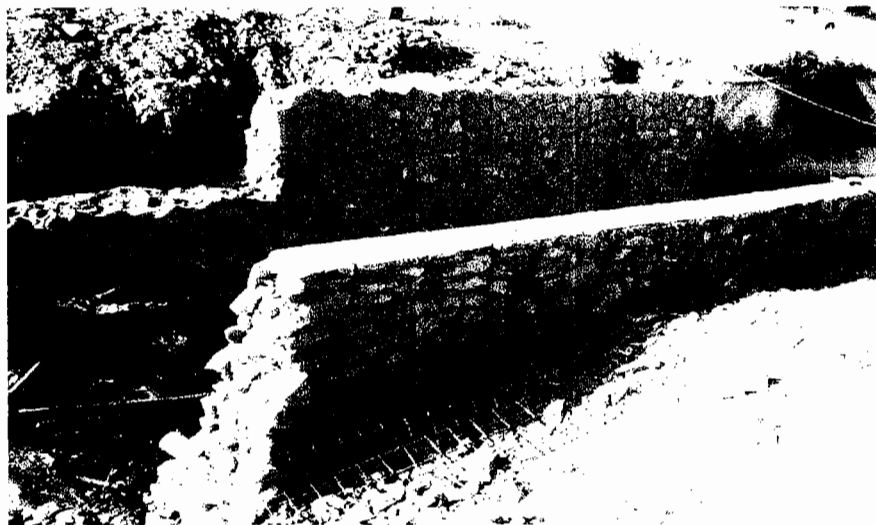

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

STAHL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
ING. IRIS SIOMARA SINEO TRUJILLO
