

PALERMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

PALERMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PCO980910RX9 ENCINO No. 104
GRANJAS, CHIHUAHUA 31100 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22
DOMICILIO: CALLE MINA No. 408
COLONIA: COL. CENTRO
ESTADO: CHIHUAHUA
TELÉFONO:

C.P.: 31000

PAÍS: MEXICO

Factura
SERIE:
FOLIO: 343
FECHA: 24/11/2017
10:20:08

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	ESTIMACION #2 (DOS) DEL PERIODO 04 AL 20 DE NOV 2017 OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO MR-40 EN VIALIDAD CH-P DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA CONTRATO No. 111/2017 IMPORTE DE ESTIMACION \$ 367,329.82 DESCUENTOS 0.2% C.M.I.C \$ 734.66 0.2% D.I.F \$ 734.66 0.5% INSP. DE OBRA \$ 1,836.65 SUMA DESCUENTOS \$ 3,305.97 RESUMEN SUMA ESTA ESTIMACION \$ 367,329.82 AMORTIZACION ANTICIPO \$ 110,198.95 DESCUENTOS \$ 3,305.97 SUB-TOTAL \$ 253,824.00 I.V.A \$ 41,140.94 SALDO NETO PARA PAGO \$ 294,965.84 CON LETRA (DOSIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N)	367,329.82	367,329.82

IMPORTE CON LETRA
DOSIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSIENTOS SETENTA Y UN
PESOS 81/100 M.N.

IMPORTE: 367,329.82
DESCUENTOS: 110,198.95
SUBTOTAL: 257,130.87
I.V.A.: 41,140.94
TOTAL: 298,271.81

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Teléfono: 155 580 81 00
Puede ser una sola exhibición
Método de Pago: No requerido
Código de Verificación: 1555808100

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401584193
Folio fiscal:	0942878B-5A5E-4587-AEEA-AD920D28C11F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404488074
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 24 2017 - 11:20:11

Sello digital del CFDI

QzmmAZd56McmU/hJa7y5pXaSVKrPnDLvr9nyHibwOT50K5xBG+kChLA1zJLuTN/vdy3cfGs5h+CV28rawKrwO+
JsuzBdPipYJ/XMPkxZN39ysfDZVEpQK0MrP4mPNOh2MzzZ7NRftKzOoxy/1TbpiT4bULP10tB17BBBj61w3/CC
GKIav+Upc/NvDzo4jKoeey15LIFMOE0wd6tGIpOR/NssK1PeJIgwtgXf1TUGVvKxv6758G2prxqnDDdAe/08L
IjsrkcJbmDB19ansEx18Yez+43CIHesz/A/S6j8K+cxDT29AkUre6Ez301bZF5uxA+gfCnT1SKtIRfvGBPNg==

Sello del SAT

0WytuxdY8aGTN0yDKNHxurhgKkq7Zj+WeANIDXgsI50VbyJZZy50uEmQtUjQd1UAbdBVo1YzqPuzEo0
tKncFs7+eo8PkdeJOFJButBbVbDMPw7G1iVml1zJsR9XjwnNCRdTNF9jaiyi1WI3ch847ChJTW4Bhmc
wxtZyJzB30BYgd08UO/CJ7qwpYdd0E17kH7RzyG89IyCiChLSgs7WCjiMOB/3t50KhGBcHGRFF5jWRc
BlekEQN20ws07VC5oMyPjZ9MAqTqoxzy2A8QuBGKcAd/2pPK6Sbjm+scZzTXRAJWp7JwlvuvIpM4+ke
s3GozelKfXsbjBmpgwDN7w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT


||1.0|0942878B-5A5E-4587-AEEA-AD920D28C11F|2017-11-24T11:20:11|QzmmAZd56McmU/hJa7y5pXaSVKrPnDLvr9nyHibwOT50K5xBG+kChLA1zJLuTN/vdy3cfGs5h+CV28rawKrwO+JsuzBdPipYJ/XMPkxZN39ysfDZVEpQK0MrP4mPNOh2MzzZ7NRftKzOoxy/1TbpiT4bULP10tB17BBBj61w3/CCGKIav+Upc/NvDzo4jKoeey15LIFMOE0wd6tGIpOR/NssK1PeJIgwtgXf1TUGVvKxv6758G2prxqnDDdAe/08L|jsrkcJbmDB19ansEx18Yez+43CIHesz/A/S6j8K+cxDT29AkUre6Ez301bZF5uxA+gfCnT1SKtIRfvGBPNg==|00001000000404488074||

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PCO980910RX9	PALERMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0942878B-5A5E-4587-AEEA-AD920D28C11F	2017-11-24T10:20:08	2017-11-24T11:20:11	MAS0810247C0

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
\$298,271.81	ingreso	Vigente









No. 1

CONTRATADO.- \$ 1'153,603.76

CONTRATO No. 111/2017

CONTRATADO.- \$ 1'153,603.76

REHABILITACION CON CONCRETO MR-40 EN VIALIDAD CH-P DE LA CIUDAD
DE CHIHUAHUA

ESTIMACION No. 2 (DOS)

PERIODO: 04 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017

CONTRATISTA: PALERMO CONSTRUCCIONES SA DE CV

\$ 367,329.82

RFC: PC0980910RX9

\$704,631.83

IMPORTE | OBSERVACIONES

CONCEPTO

PAVIMENTOS

REHABILITACION CON CONCRETO MR-40 EN VIALIDAD CH-P DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

\$ 367,329.82

IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION

\$ 367,329.82

DESCUENTOS:

FOR

ACCEPTO

EL CONTRATISTA
PATERMO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V

0.2% C.M.I.C.	\$ 734.66
0.2% D.I.F.	\$ 734.66
0.5% INSP. DE OBRA	\$ 1,836.65
SUMA DESCUENTOS	\$ 3,305.97

RESUMEN:

SIMA ESTA ESTIMACION

AMORTIZACIÓN ANTICIPADA

DESCUENTOS
SOLICITANTES

CLUB TOTAL

137

U.S.A.

SALDO NETO PARA PAGO

REVISO

Vo.Bo.

~~JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO VIAL SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA~~

ING. VICTOR AMADOR PONCE DE LEON

ADICIONADO:

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

U

CHIHUAHUA, CHIH.

28 DE NOVIEMBRE 2017

RECIBIMOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 294,965.84
(DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACION NUM. 2 (DOS) CONTRATO No. 111/2017 POR LA CANTIDAD DE : \$ 1'153,603.76
(UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 76/100 M.N.) POR LOS TRABAJOS EN LA OBRA:
REHABILITACION CON CONCRETO MR-40 EN VIALIDAD CH-P, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	367,329.82
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	110,198.95
	SUBTOTAL	\$ 257,130.87
	IVA	\$ 41,140.94
	TOTAL	\$ 298,271.81
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		
C.M.I.C. DEL 0.2 %	\$	734.66
D.I.F. DEL 0.2 %	\$	734.66
INS. DE OBRA 0.5 %	\$	1,836.65
SUMA	\$	3,305.97
MULTA POR ATRASO	\$	-
TOTAL	\$	3,305.97

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 994,486.00
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 337,302.01
ESTA ESTIMACION	\$ 367,329.82
ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION	\$ 704,631.83
POR EJERCER CONVENIO	\$ -
POR EJERCER	\$ 289,854.17

2.- AMORTIZACION ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 298,345.80
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 101,190.60
ESTA ESTIMACION	\$ 110,198.95
ACUMULADO ACTUAL	\$ 211,389.55
POR AMORTIZAR	\$ 86,956.25

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.5 % INSP OBRA	0.2 % C.M.I.C.	0.2 % D.I.F.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 1,686.51	\$ 674.60	\$ 674.60
ESTA ESTIMACION	\$ 1,836.65	\$ 734.66	\$ 734.66
ACUMULADO ACTUAL	\$ 3,523.16	\$ 1,409.26	\$ 1,409.26

RECIBIMOS

PALERMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
PCO-980910-RX9

GENERADORES

VIALIDAD CHP (CAMELLON CENTRAL)
 TRAMO NO.1 ENTRE CALLE CARLOS FUERO A CALLE 42
 AREA DE LOSAS

NO.	ANCHO 1	ANCHO 2	LARGO 1	LARGO 2	ESPEJOR FILTRO	AREA (M2)	VOLUMEN
1	3.04	3.14	4.21	4.23	0.34	13.04	4.43
2	3.14	3.15	4.02	4.06	0.31	12.71	3.94
3	3.15	3.15	3.63	3.58	0.29	11.36	3.29
4	3.15	3.15	3.95	3.96	0.32	12.46	3.99
5	3.15	3.09	4.45	4.50	0.32	13.96	4.47
6	3.09	3.12	3.76	3.78	0.30	11.71	3.51
7	3.12	3.13	3.63	3.80	0.30	11.61	3.48
8	3.13	3.10	4.11	4.06	0.27	12.72	3.43
9	3.1	3.13	3.97	4.03	0.28	12.46	3.49
10	3.13	3.12	4.09	4.10	0.27	12.80	3.46
11	3.12	3.13	3.84	3.79	0.36	11.92	4.29
12	3.13	3.14	4.29	4.46	0.43	13.72	5.90
13	3.14	3.17	3.81	3.73	0.53	11.89	6.30
14	3.17	3.13	4.11	4.17	0.40	13.04	5.22
15	3.13	3.02	3.69	3.73	0.38	11.41	4.34
16	3.02	2.98	4.19	4.23	0.41	12.63	5.18

SUBTOTAL AREA 199.44

SUBTOTAL VOLUMEN 68.72



VIALIDAD CHP (SENTIDO NORTE - SUR) CARRIL IZQUIERDO
TRAMO 2 ENTRE CALLE CARLOS FUERO A CALLE 42
AREAS DE LOSAS

NO.	ANCHO 1	ANCHO 2	LARGO 1	LARGO 2	ESPESOR FILTRO	AREA (M2)	VOLUMEN
1	3.26	3.28	3.87	3.87	0.40	12.65	5.06
2	3.28	3.37	4.09	4.16	0.40	13.72	5.49
3	3.37	3.27	4.23	4.27	0.35	14.11	4.94
4	3.27	3.24	4.06	4.08	0.33	13.25	4.37
5	3.24	3.27	3.58	3.56	0.28	11.62	3.25
6	3.27	3.27	3.96	3.97	0.31	12.97	4.02
7	3.27	3.28	4.50	4.55	0.31	14.82	4.59
8	3.28	3.26	3.78	3.82	0.32	12.43	3.98
9	3.26	3.24	3.80	3.95	0.36	12.59	4.53
10	3.24	3.26	4.06	4.01	0.32	13.11	4.20
11	3.26	3.25	4.03	4.09	0.28	13.22	3.70
12	3.25	3.24	4.10	4.11	0.30	13.32	4.00
13	3.24	3.24	3.79	3.74	0.35	12.20	4.27
14	3.24	3.28	4.46	4.63	0.41	14.82	6.08
15	3.28	3.26	3.73	3.65	0.43	12.07	5.19
16	3.26	3.29	4.17	4.22	0.45	13.74	6.18
17	3.29	3.29	3.73	3.77	0.35	12.34	4.32
18	3.29	3.29	4.23	4.24	0.41	13.93	5.71
19	3.29	3.3	4.01	4.07	0.39	13.31	5.19
20	3.3	3.28	3.92	3.90	0.29	12.86	3.73
21	3.28	3.23	3.89	3.90	0.31	12.68	3.93
22	3.23	3.22	4.20	4.28	0.37	13.67	5.06

SUBTOTAL AREA 289.43

SUBTOTAL VOLUMEN 101.79


TOTAL AREA (M2) 488.87

TOTAL FILTRO (M3) 170.51


[Handwritten signature]

CROQUIS

REHABILITACION CON CONCRETO MR-40 EN VIALIDAD CH-P DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

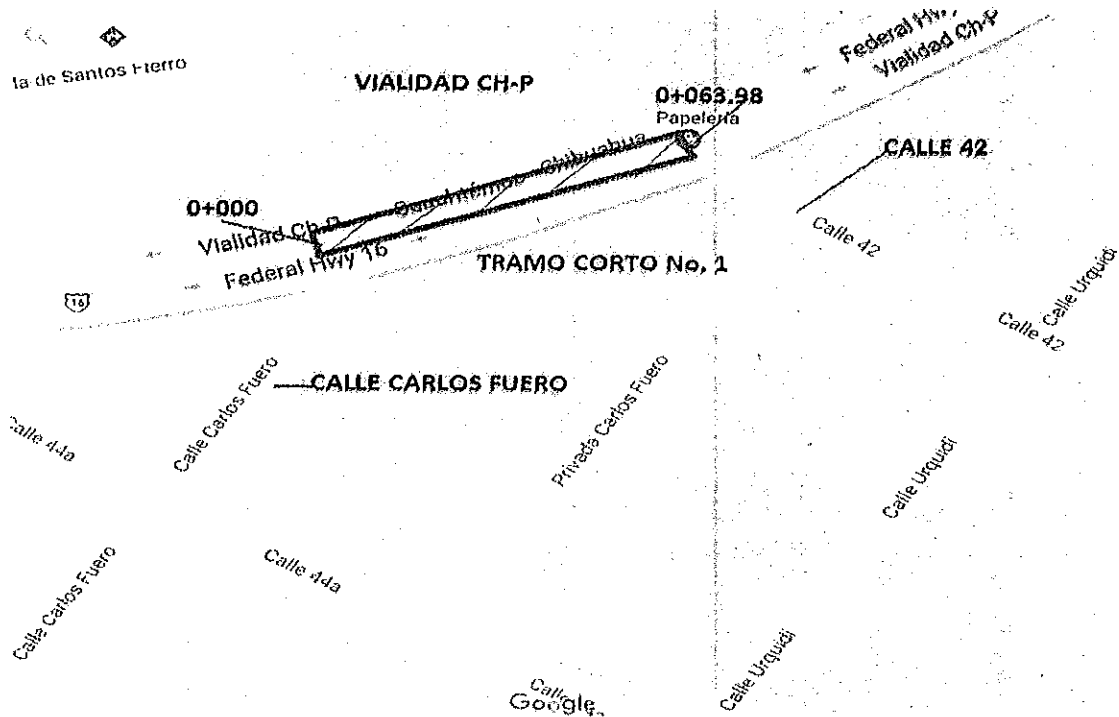

VIALIDAD CHP (CAMELLON CENTRAL); TRAMO NO1. ENTRE CALLE CARLOS FUERO A CALLE 42

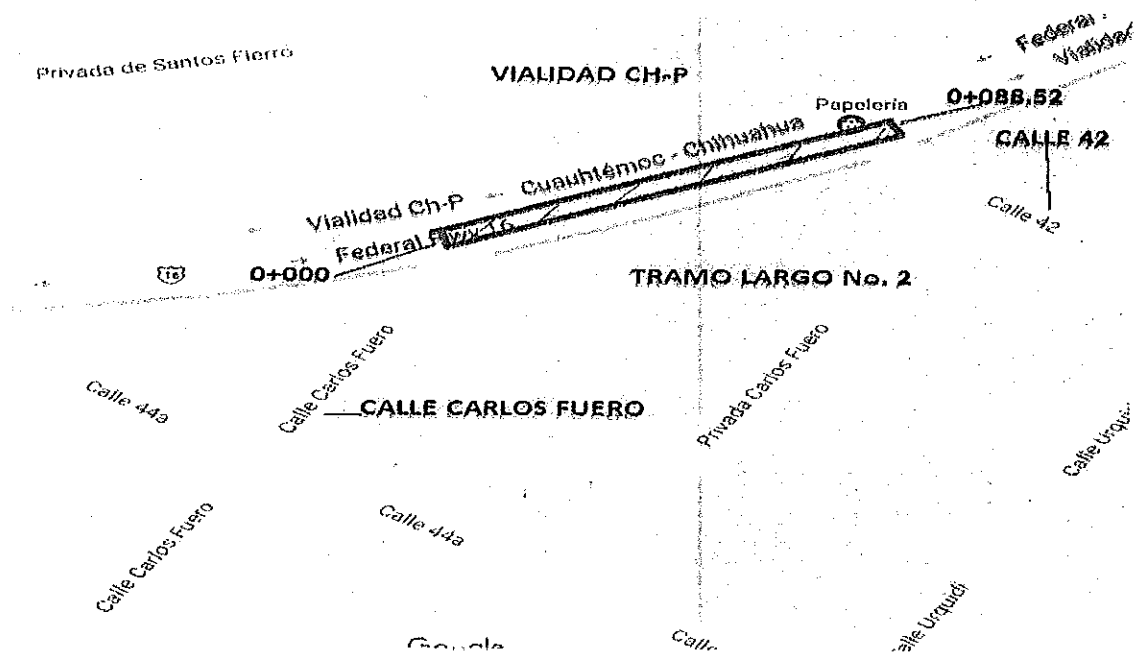

VIALIDAD CHP (CUERPO SUR, CARRIL IZQUIERDO); TRAMO NO2. ENTRE CALLE CARLOS FUERO A CALLE 42

[Handwritten signature]

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN

OBRA: REPOSICION DE LOSA
LOCALIZACION: EN VIALIDAD CH-P
CHIHUAHUA, CHIH.

FECHA: 13-nov-17

COMPACTACION DE PROYECTO	90%	ESPEJOR DE PROYECTO	20 CMS.
REPORTE DE COMPACTACION DE:	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA VIALIDAD CH-P		

PALERMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV.

ENSAYE NUM.	UBICACION		PROFUNDIDAD SONDEO EN cm.	PESO VOLUMETRICO kg/m³			HUMEDADES %		% DE COMPACT.
	ESTACION	LADO		MAXIMO	HUMEDO DEL LUGAR	SECO DEL LUGAR	OPTIMA	DEL LUGAR	
RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA CUERPO SUR - CARRIL IZQUIERDO									
TRAMO 2 ENTRE CALLE CARLOS FUERO Y CALLE 42a.									
		CEN	20	1900	1899	1767	12.7	7.5	93
		CEN	20	1900	1869	1729	12.7	8.1	91
		CEN	20	1900	1859	1710	12.7	8.7	90
RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL CAMELLON CENTRAL									
TRAMO 1 ENTRE CALLE CARLOS FUERO Y CALLE 42a.									
		CEN	20	1900	1870	1748	12.7	7.0	92
		CEN	20	1900	1867	1732	12.7	7.8	91
		CEN	20	1900	1875	1730	12.7	8.4	91

METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-416-ONNCCE-2003 15.4.2.2.1 METODO CON DENSIMETRO NUCLEAR

OBSERVACIONES:

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS SON SATISFACTORIOS.

IDENTIFICACION DEL APARATO

CPN 2

CALIBRACION DEL APARATO

13-nov-17

TECNICO : HUGO SERGIO CONTRERAS

AUTORIZO

C. FAUSTO CHAVEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN

OBRA: REPOSICION DE LOSA
LOCALIZACION: EN VIALIDAD CH-P
CHIHUAHUA, CHIH.

FECHA 17-nov-17

COMPACTACION DE PROYECTO 100% ESPESOR DE PROYECTO 15 CMS
REPORTE DE COMPACTACION DE: CAPA DE BASE CUERPO SUR
VIALIDAD CH-P

PALERMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV.

ENSAYE NUM.	UBICACION		PROFUNDIDAD SONDEO EN cm.	PESO VOLUMETRICO kg/m³			HUMEDADES %		% DE COMPACT
	ESTACION	LADO		MAXIMO	HUMEDO DEL LUGAR	SECO DEL LUGAR	OPTIMA	DEL LUGAR	
			CAPA DE BASE CUERO SUR CARRIL IZQUIERDO						
			TRAMO 2 ENTRE CALLE CARLOS FUERO Y CALLE 42a.						
		CEN	15	2220	2304	2220	7.6	3.8	100
		CEN	15	2220	2388	2287	7.6	4.4	103
		CEN	15	2220	2347	2242	7.6	4.7	101
			CAPA DE BASE CAMELLON CENTRAL						
			TRAMO 1 ENTRE CALLE CARLOS FUERO Y CALLE 42a.						
		CEN	15	2220	2359	2264	7.6	4.2	102
		CEN	15	2220	2309	2222	7.6	3.9	100
		CEN	15	2220	2335	2245	7.6	4.0	101
									
METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-416-ONNCCE-2003 15.4.2.2.1 METODO CON DENSIMETRO NUCLEAR									

FORMA 02 REV 02 04 DE FEBRERO DE 2015

METODOS DE PRUEBA NORMALIZADOS APLICADOS: NMX-C-416-ONNCE-2003 15.4.2.2.1 METODO CON DENSIMETRO NUCLEAR

LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME SOLO AFECTAN A LOS ELEMENTOS ENSAYADOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO.

OBSERVACIONES:

LOS GRADOS DE COMPACTACION OBTENIDOS SON SATISFATORIOS.

IDENTIFICACION DEL APARATO
CPN 2
CALIBRACION DEL APARATO
17-nov-17

TECNICO : HUGO SERGIO CONTRERAS

AUTORIZO

C. FAUSTO CHAVEZ RASCON
DIRECTOR GENERAL



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.
BOULEVARD DIAZ ORDÁZ 1311 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 4 10 60 32 CHIHUAHUA CHIH.
LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

INFORME DE RIEGOS

IMPREGNACION

X

LIGA


OBRA REPOSICION DE LOSA VIALIDAD CH-P ENTRE 42a. Y CARLOS FUERO
LOCALIZACION CHIHUAHUA, CHIH.
ENSAYES No. 17-nov-17
FECHA DE RECIBO 21-nov-17
FECHA DE INFORME

REPORTE DE CAMPO No. _____
PRODUCTO ASFALTICO EMPLEADO EMULSION _____
ADITIVO EMPLEADO _____
EQUIPO DE BARRIDO MECANICO _____
CONDICIONES DEL CLIMA SOLEADO _____
HORA DE INICIACION _____
CANTIDAD RECOMENDADA 1.5
CANTIDAD RECOMENDADA _____
PROFUNDIDAD MEDIA DE MAT. SECO _____
TEMPERATURA AMBIENTE 34°C
HORA DE DETERMINACION _____
TEMPERATURA DE AMPLIACION 43°
CANTIDAD EMPLEADA _____

DE KM A KM	LADO	FRANJA	LONGITUD M	ANCHO M	AREA M2	PRODUCTO ASF. REGADO LITROS	1/KM2	TEXTURA Y ACABADO DE LA CAPA LA CAPA ANTES DE SU IMPREGNACION
CUERPO SUR CARRIL			88.52	3.20	283.26	447.55	1.58	
IZQUIERDO TRAMO 2								EL RIEGO APLICADO ES ADECUADO
ENTRE CARLOS								Y CUMPLE CON LO ESPECIFICADO
FUERO Y C. 42a.								
RIEGO DE			63.98	3.20	204.73	327.56	1.60	EL RIEGO APLICADO ES ADECUADO
CAMELLON CENTRAL								Y CUMPLE CON LO ESPECIFICADO
TRAMO 1 ENTRE								
CARLOS FUERO								
Y CALLE 42a.								
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:								

EL JEFE DEL LABORATORIO

C. FAUSTO CHAVEZ RASCON.

**CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.**

R.F.C./CGS860499-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 81020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA:	REPOSICION DE LOSA	ENSAYE No.	3
LOCALIZACION:	VIALIDAD CH-P	FECHA DE RECIBO:	18-nov-17
	CHIHUAHUA, CHIH	FECHA DE INFORME:	25-nov-17

**VIGAS DE CONCRETO HIDRAULICO
LOSAS DE PAVIMENTO**

ENSAYE	FECHA ELAB.	FECHA PRUEBA	EDAD DIAS	ANCHO CMS.	PERALTE CMS.	LONGITUD A CENTROS DE APOYO	CARGA KGS.	MODULO DE RUPTURA KGS/CMS2
3-A	18-nov-17	25-nov-17	7	15.0	15.0	45.0	2150	31.2

UBICACIÓN:LOSA DE PAVIMENTO TOMADA DE CALLE CARLOS FUERO A CALLE 42
LADO DERECHO FRANJA IZQUIERDO.**MODULO DE RUPTURA DE PROYECTO**

40 Kg/Cm2

EQUIPO DE MEZCLADO: Camión revolver

G.C.C. (SUPERIOR)

CEMENTO MARCA Y TIPO: CHIHUAHUA TIPO 1**TIPO DE VIBRADOR UTILIZADO:** REGLA VIBRATORIA**ADICIONANTE:** FIBRA**REVENIMIENTO:** 13.0**TIPO DE PRUEBA:** FLEXION**PROCEDIMIENTO DE CURADO:** CUARTO HUMEDO**OBSERVACIONES:**

SE REPORTA RESISTENCIA OBTENIDA A 7 DIAS DE EDAD


EL JEFE DEL LABORATORIO

C. FAUSTO CHAVEZ RASCON

BASE IMPREGNADA



COLADO DE LOSAS

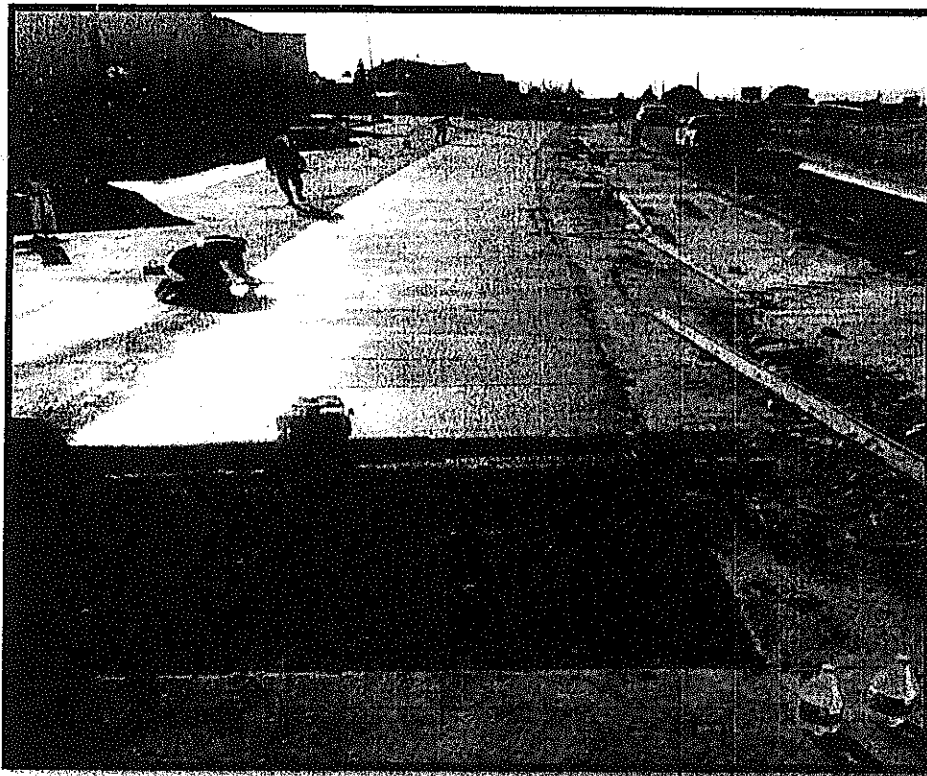


Handwritten signature

RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE



COMPACTADO DE FILTRO DE PIEDRA

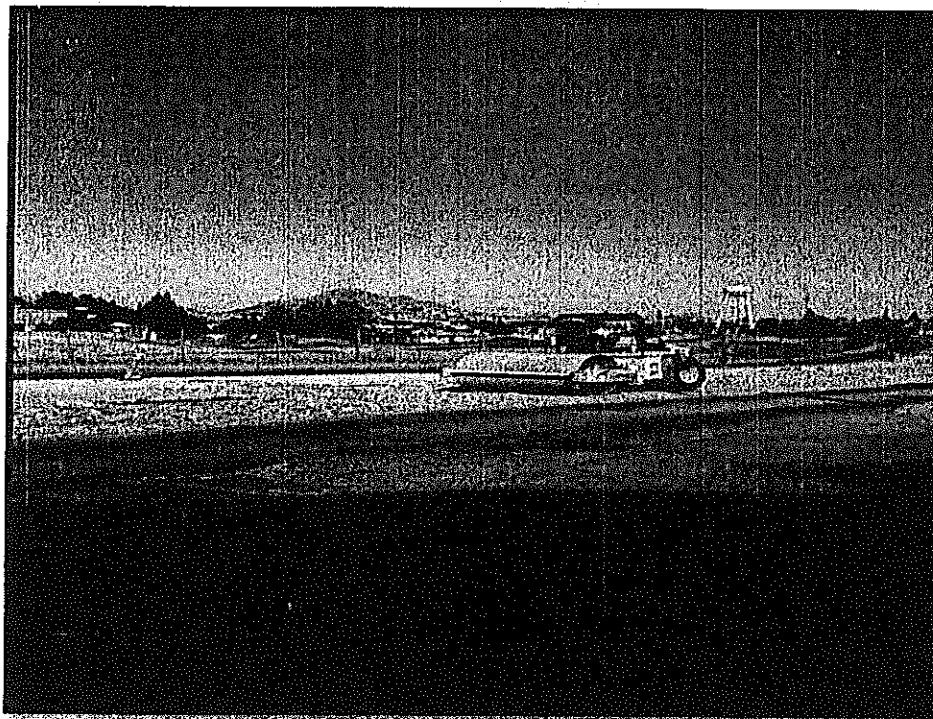

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


REHABILITACION CON CONCRETO MR-40 EN VIALIDAD CH-P DE LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA



DEMOLICION Y APERTURA CAJON



CORTE Y TERRACERIAS

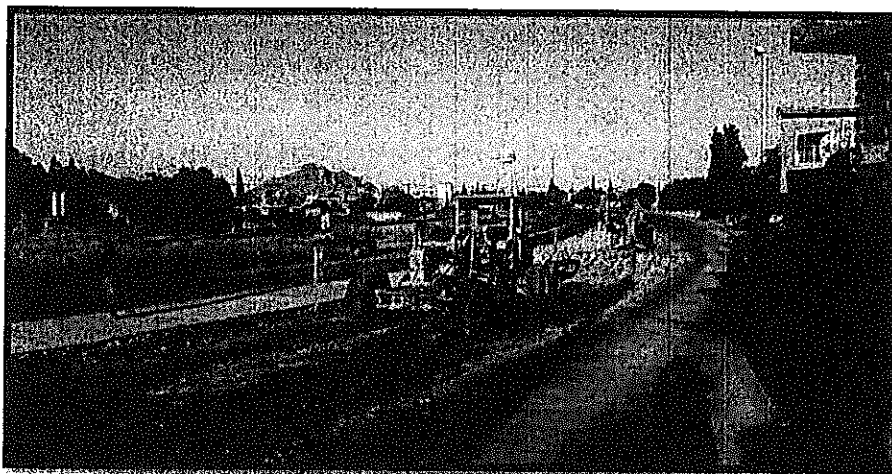

Handwritten signature

DEL SABADO, 4 DE NOVIEMBRE AL MARTES 7 DE NOVIEMBRE DEL 2017.
DURANTE ESTE PERIODO SE DEMOLIERON LAS LOSAS DE CONCRETO
EN MAL ESTADO EN LA VIALIDAD CH-P ENTRE LAS CALLES 42ª Y
CARLOS FUERO EN EL CAMELLON CENTRAL CON 63.98 MTS LINEALES
Y EN EL CARRIL IZQUIERDO DEL CUERPO SUR CON 88.52 MTS. *Enrique*

MIERCOLES, 8 DE NOVIEMBRE AL SABADO 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017.
EN ESTOS DIAS SE RETIRARON LAS LOSAS QUEBRADAS Y SE REALIZO
LA EXCAVACION PARA ALJAR EL PEDRAPLEN Y LA BASE. *Enrique*

LUNES, 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017
SE RECOMPACTO LA SUPERFICIE DESCUBIERTA *Enrique*

DEL MARTES, 14 DE NOVIEMBRE AL MIERCOLES 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017
EN ESTOS DIAS SE ACARREO, ACOMODO, AFINO Y COMPACTO EL
FILTRO DE PIEDRA *Enrique*

JUEVES, 16 DE NOVIEMBRE 2017.
SE ACARREO MATERIAL PARA BASE *Enrique*

VIERNES, 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.

FOLIO 06

EL DIA DE HOY SE COMPACTO LA BASE Y SE IMPREGNO

Enajid

SABADO, 18 DE NOVIEMBRE DE 2017


SE COLO EL CARRIL T2 QUERDO DEL CUERPO SUR ENTRE LAS CALLES 42^a Y CARLOS FUERO DE LA VIALIDAD CTP.

Enajid

LUNES, 20 DE NOVIEMBRE DE 2017

SE COLARON LAS LOSAS DE CONCRETO CON MR-40 CORRESPONDIENTES AL CAMELLON CENTRAL

Enajid



JUCA
CONSTRUCCIONES
CIVILES Y MECÁNICAS

LM

Folio Fiscal

98D7226B-C08B-11E6-8722-00155D014007

Factura Número

587

No. de serie del CSD del emisor

00001000000202702217

Fecha y Hora de emisión

2016-12-12T16:15:27

Fecha y hora de certificación

2016-12-12T16:16:15

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

Forma de Pago

Pago en una sola exhibición



Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: Chihuahua

Emisor

Razón Social: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

Calle y Número: BAHIA DE SAN QUINTIN 9303-C

Ciudad: Chihuahua

Delegación: Chihuahua

Estado: Chihuahua

Colonia: RINCONADAS DE LA SIERRA

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CP: 31124

País: MEXICO

RFC: JCC000222K64

ceptor

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Calle y Número: MINA 408

Ciudad: CHIHUAHUA

Delegación: CHIHUAHUA

Estado: Chihuahua

Colonia: CENTRO

CP: 31000

País: MEXICO

RFC: MCI651010V22

Cantidad Unidad de Medida Concepto

1.00 NA

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, ZONA 6, DEL CONTRATO NO. 205/2016 (ESTIMACIÓN 2)

Precio

843,471.95

Importe

843,471.95

ESTIMACION NUMERO 2 (DOS) SEGÚN CONTRATO NUMERO
205/2016 ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 1,204,959.93
AMORTIZACION ANTICIPO \$ 361,487.98
RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO:

0.5% INSPECCION Y VIGILANCIA \$ 6,024.80
SUMA \$ 6,024.80
NETO A RECIBIR \$ 972,402.66



RECIBIDO
20 DIC 2016
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
Y CONTROL DE OBRA

Subtotal 843,471.95 MXP
IVA 16.00% 134,955.51 MXP
Total 978,427.46 MXP

TOTAL EN LETRA

MÉTODO DE PAGO

CONDICIONES DE PAGO

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 46/100 M.N.
02

Cur for

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|98D7226B-C08B-11E6-8722-00155D014007|2016-12-12T16:15:27|MgubmThDtb+siTka8HXwA7F8PDMgaPyEaGpBNkank+cJe5RYFTIDh6eUwebDyL6sDSOVTk05KXXmUBT00J3Zf3IRatCF77aakuaNGZdVPtggw5con61TjKZWVYQdeYOIDFvWZrc=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

MgubmThDtb+siTka8HXwA7F8PDMgaPyEaGpBNkank+cJe5RYFTIDh6eUwebDyL6sDSOVTk05KXXmUBT00J3Zf3IRatCF77aakuaNGZdVPtggw5con61TjKZWVYQdeYOIDFvWZrc=

Sello digital del SAT

HBW8isba+MFYXKwA4yUoPrOVPhBh1SXZ4KZVePd6nI0mofdt+D1GGCUZRHCEdEqHJFBO4wBdDA3LA0Zlm5g5Wq9ZVGDFHv6WVCVZnMNR5BZxw0e94+dgcJzOmF09B78nYCKhs+zx04VU6ey16HPbpNb4GA8wAglICF/n5TeMSDESDN4B51ZydeEqT9F9scLbSjQvYIDw90XZdcavheWP5USxQM+enyzpPiQCMTcqq6CzL5JyBGA1qbNjsn4X4ycqQgRz14pZ0MWB09K0EYs04ghpAWHxNIDgEYWNMFp0DudoZbATOYckFLIA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

Página 1 de 1
