



Gilberto Morales Peña

Ingeniero Civil

CED. PROF. 1444298

Gilberto Ignacio Morales Peña
MOPG641106L62
Domicilio Fiscal
Calle Alondra 4964
Col. Arboledas 31166
Chihuahua Chihuahua México
Tel. 4821182

Cup 1206

Factura No: 587

FOLIO FISCAL (UUID):

EAAF33D5-3935-4C80-9B79-46A8C1BD9762

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000402534175

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2017-12-01T12:38:26

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2017-12-01T12:33:25

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCJ651010V22
DIRECCIÓN: MINA 408
CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA Chihuahua
México

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: Chihuahua, Chihuahua
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Fecha de Expedición: 01 diciembre 2017
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	REHABILITACION CON CONCRETO MR-50 EN VIALIDAD SACRAMENTO ESTIMACION 6 (SEIS) SEGUN CONTRATO NUM. 133/2017 FIRMA DEL CONTRATISTA ALCANCE DE LA ESTIMACION \$245,901.44 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$73,770.43 RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO DIF DEL 0.2% \$ 491.80 CMIC DEL 0.2% \$ 491.80 S.I.V.C.S. 0.5% \$1,229.51 SUMA \$2,213.11 NETO A RECIBIR \$197,458.86	\$ 172,131.01	\$ 172,131.01

IMPORTE CON LETRA: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS, 97/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 172,131.01
IVA(IVA 16.00%): \$ 27,540.96
TOTAL: \$ 199,671.97

SELLO DIGITAL DEL CFDI

juw4MYu+H9p7Nt0z035W1FIdXAAAYIMATpBSJfC0mLYH0N0Nj2cNMYYaeXy1eY+pvM2MA1T1U9un1c+ZF0Qx3XWk08y3nKXGQORApwB4wSdDIOcF4K7FgDR800x0ThmeegKpBC6yQVOpz95UpFdvCCc0hduYH31NNYXEsZiY+I
q4MF+H0VSc0sJpEKgX1o6zcEGhQhGEA5c4M1s3F4V16cEQ0dNOHVHSC0hL5r000xMh076w0RG8+BomUexB0Stajp9QFQ5XqN68c1yLppPvHd+VMf5+mmWBIOWGfAFEDILW3xho060Ue1WcQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

u5Jp9lvaJC2qub6mbUIC3jlc33PYw2kwgPcPQnjdPO1ITGkPcGriNQRum65YveVOYV4UFFVOhe4MCAZIGCPH9zJ2P/Yee5DOVlc0eJivCb3WYHlvaDH11QdW9c6873x1m7nAhSVPIYSXPzgzH2DBEPU78J5XSCCsT194kEslD683g
o3ZR77WpWEIu9tK3FC+Jl3XjeQOQ2vBwfmK2j0ZQR570MzFxtQeMh2WpMP0vvKecb6PgCrdvGRvIUxsaqUj4KokN5h3nkoLpLZgh6JXBdPwJCb0CKU49KmhH66WBI+LzKduGLxa3IP9eUjBrPhOA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.0EAAF33D5-3935-4C80-9B79-46A8C1BD97622017-12-01T12:38:26juw4MYu+H9p7Nt0z035W1FIdXAAAYIMATpBSJfC0mLYH0N0Nj2cNMYYaeXy1eY+pvM2MA1T1U9un1c+ZF0Qx3XWk08y3nKXGQORApwB4wSdDIOcF4K7FgDR800x0ThmeegKpBC6yQVOpz95UpFdvCCc0hduYH31NNYXEsZiY+Iq4MF+H0VSc0sJpEKgX1o6zcEGhQhGEA5c4M1s3F4V16cEQ0dNOHVHSC0hL5r000xMh076w0RG8+BomUexB0Stajp9QFQ5XqN68c1yLppPvHd+VMf5+mmWBIOWGfAFEDILW3xho060Ue1WcQ==00001000000405535779



www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son
obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710



 (<http://www.gob.mx/>) Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MOPG641106L62	Gilberto Ignacio Morales Peña	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EAAF33D5-3935-4C80-9B79-46A8C1BD9762	2017-12-01T12:33:25	2017-12-01T12:38:26	FMD100203JS7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$199,671.97	ingreso	Vigente	

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: FEDERAL - MUNICIPAL	CONTRATO No. 133/2017	CONTRATADOS
OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO MR-50 EN VIALIDAD SACRAMENTO	ESTIMACIÓN No. 6(SEIS)	\$ 3,703,443.67 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 24/11/2017 AL 30/11/2017	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 285,245.67 CON IVA
CONTRATISTA: ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 1,940,166.06 CON IVA
RFC MOPG 641106L62	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 2,225,411.73 CON IVA

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	<u>NORMALES</u>	\$ 245,901.44	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 245,901.44	

DESCUENTOS		
0.2% DIF		491.80
0.2% C.M.I.C.	\$	491.80
0.5% S.I.V.C.S.		1,229.51

SUMA DESCUENTOS \$ 2,213.11

RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	245,901.44
AMORT ANTICIPO	\$	73,770.43
SUB-TOTAL	\$	172,131.01
I.V.A.	\$	27,540.96
TOTAL	\$	199,671.97

(CON LETRA)

(CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 97/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	2,213.11
SALDO NETO A RECIBIR	\$	197,458.86

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

AUTORIZO	ELABORO
ING. VICTOR MIRELES RESIDENTE D.O.P.M.	ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION
Vo. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE: \$ 197,458.86
 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 86/100M.N.) COMO PAGO A LA
 ESTIMACIÓN NUM. 6(SEIS) CONTRATO No. 133/2017 POR LA CANTIDAD DE : \$ 3,703,443.67
 (TRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 67/100M.N.) POR TRABAJOS EN LA OBRA:
 REHABILITACION CON CONCRETO MR-50 EN VIALIDAD SACRAMENTO

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	245,901.44
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	73,770.43
	SUBTOTAL	\$	172,131.01
	IVA	\$	27,540.96
	TOTAL	\$	199,671.97
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
DIF DEL 0.2%	491.80		
CMIC DEL 0.2%	491.80		
S.I.V.C.S. 0.5%	1,229.51		
SUMA	2,213.11		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 3,703,443.67
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 1,940,166.06
ESTA ESTIMACION	\$ 285,245.67
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 2,225,411.73
POR EJERCER	\$ 1,478,031.94

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 1,111,033.09
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 582,049.82
ESTA ESTIMACION	\$ 85,573.70
ACUMULADO ACTUAL	\$ 667,623.52
POR AMORTIZAR	\$ 443,409.57

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% DIF	0.2% CMIC	S.I.V.C.S. 0.5%
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 3,345.11	\$ 3,345.11	\$ 8,362.79
ESTA ESTIMACION	\$ 491.80	\$ 491.80	\$ 1,229.51
ACUMULADO ACTUAL	\$ 3,836.91	\$ 3,836.91	\$ 9,592.30

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON
 RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A
 CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA
 PROHIBIDO EL USO PARA FINES
 DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL
 PROGRAMA"

R E C I B I M O S

ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA
 MOPG 641106L62

OBRA:

UBICACIÓN CHIHUAHUA, CHIH. No. CONTRATO: 133/2017

REHABILITACION CON CONCRETO MR-50 EN VIALIDAD SACRAMENTO

ESTIMACIÓN No. 6(SEIS)

CONTRATISTA ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA

PERIODO: 24/11/2017 AL 30/11/2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

NORMALES

245,901.44

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON
RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A
CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO
EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

SUBTOTAL	245,901.44
I.V.A.	39,344.23
TOTAL	285,245.67

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. GILBERTO L. MORALES PEÑA

ING. VICTOR MIRELES

CONTRATISTA:

ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA

PERIODO: 24/11/2017 AL 30/11/2017

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR/VOL. ESTIMADO		
OBRA NORMAL							
1	DEMOLICIONES, RETIROS Y REUBICACIONES						245,901.44
1	1 REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN AREAS PARCIALES, INCLUYENDO: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN EL AREA DEFINIDA POR REPONER, DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO INCLUYENDO RETIRO DE ESCOMBRO, RETIRO EN CASO DE SER NECESARIO DE 25CM DE BASE, COMPACTACION DEL TERRENO EXPUESTO AL 90% PRUEBA PROCTOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 25CM DE BASE MEDIDOS COMPACTOS AL 100% PRUEBA PROCTOR, COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO MR=50KG/CM2 DE 22CM DE ESPESOR.	m2	3,825.00	1,932.21	1,652.43	790.32	245,901.44 221,115.73
2	EXCAVACION DE CAPA BAJO LA CAPA DE BASE EXISTENTE PARA ALOJAR CAPA FILTRANTE DE PIEDRA, EN ESPESOR VARIABLE INCLUYE CARGA Y ACARREO AL LUGAR AUTORIZADO	m2	1,915.00	1,932.21	1,652.43	26.97	7,545.67
3	CAPA FILTRANTE DE PIEDRA DE RIO O TRITURADA DE 3 " DE DIAMETRO MAXIMO Y ESPESOR VARIABLE, EXTENDIDA EN FORMA MANUAL Y ACOMODADA CON RODILLO MECANICO, INCLUYE: ADQUISICION, CARGA, ACARREO, ABUNDAMIENTO, EXTENDIDO MANUAL Y ACOMODO MECANICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	1,915.00	1,932.21	1,652.43	61.62	17,240.04

"ESTA OBRA FUE RELIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"


"ESTA OBRA FUE RELIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



ING. CIVIL GILBERTO IGNACIO MORALES PENA
CALLE ALONDRA #4964 COL. ARBOLEDAS 31166 - TEL 6144821182 - CHIHUAHUA, CHIH.

GENERADOR DE VOLUMENES DE OBRA

REHABILITACIÓN CON CONCRETO MR-50 EN VIALIDAD SACRAMENTO


CONTRATO Nº 133/2017

OBRA:

LOCACIÓN:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
NÚMERO DE ESTIMACIÓN:

[illegible]

CROQUIS/REFERENCIA

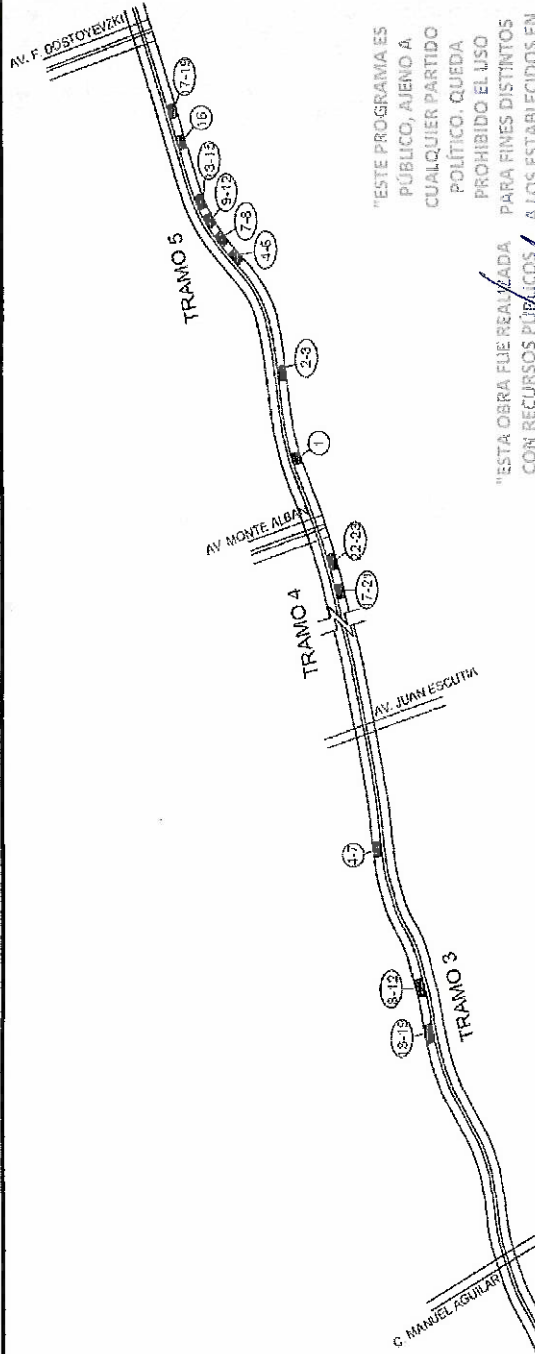


"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA."

"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES."

Fernando Carrasco O.
CONTRATISTA: ING. FERNANDO CARRASCO ORTIZ

AUTORIZO: ~~ING. VICTOR MIRELES~~



ING. CIVIL GILBERTO IGNACIO MORALES PENA
L. ARBOLEDAS 31166 - TEL 6144821182 - CHIHUAHUA, CHIH.

CALLE ALONDRA #4964 COLA

INGENIERIA INTEGRAL EN CONSTRUCCION

GENERADOR DE VOLUMENES DE OBRA

REHABILITACIÓN CON CONCRETO MR-50 EN VIALIDAD SACRAMENTO

OBRA:
LOCACIÓN:


PERIODO DE EJECUCIÓN:

NÚMERO DE ESTIMACIÓN:

CONTRATO NO 133/2017

[illegible]

CROQUIS/REFERENCIA

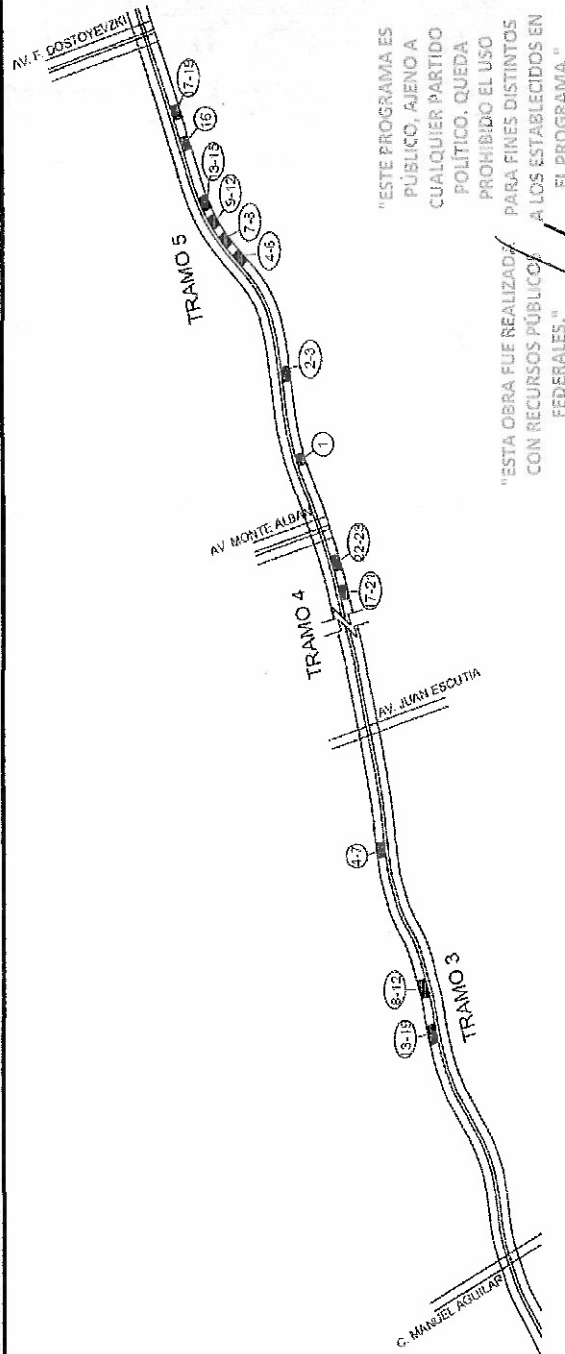

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA."

~~"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES."~~

Federico Cavasco.

CONTRATISTA: ING. FERNANDO CARRASCO ORTIZ

AUTORIZÓ: ING. Xavier Mireles



INGENIERIA INTEGRAL EN CONSTRUCCION

ING. CIVIL GILBERTO IGNACIO MORALES PENA
CALLE ALONDRA #4964 COL. ARBOLEDAS 31166 - TEL 6144821182 - CHIHUAHUA, CHIH.

OBRA:
LOCACIÓN:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
NÚMERO DE ESTIMACIÓN:


GENERADOR DE VOLUMENES DE OBRA

REHABILITACIÓN CON CONCRETO MR-50 EN VIALIDAD SACRAMENTO

CHIHUAHUA, CHIH.

24/11/17 A 30/11/17
6 (SEIS)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOSA	TRAMO	CARRIL	LARGO	ANCHO	AREA	TOTAL
3	Capa filtrante de piedra de río o triturada de 3" de diámetro máximo y espesor variable, extendida en forma manual acomodada con rodillo mecánico, incluye: adquisición, carga, acarreo, abundamiento, extendido manual y acomodo mecánico y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	4-7	3	IZQ. N-S	17.16	0.35	6.01	279.78
			8-12	3	IZQ. N-S	2.68	3.84	10.29	
			13-19	3	IZQ. N-S	8.55	3.55	30.35	
			17-21	4	DER. S-N	21.37	3.52	75.22	
			22-23	4	DER. S-N	10.70	3.48	37.24	
			1	5	DER. S-N	4.40	3.48	15.31	
			2-3	5	DER. S-N	8.60	3.48	29.93	
			4-6	5	DER. S-N	13.02	3.50	45.57	
			7-8	5	DER. S-N	8.53	3.50	29.86	

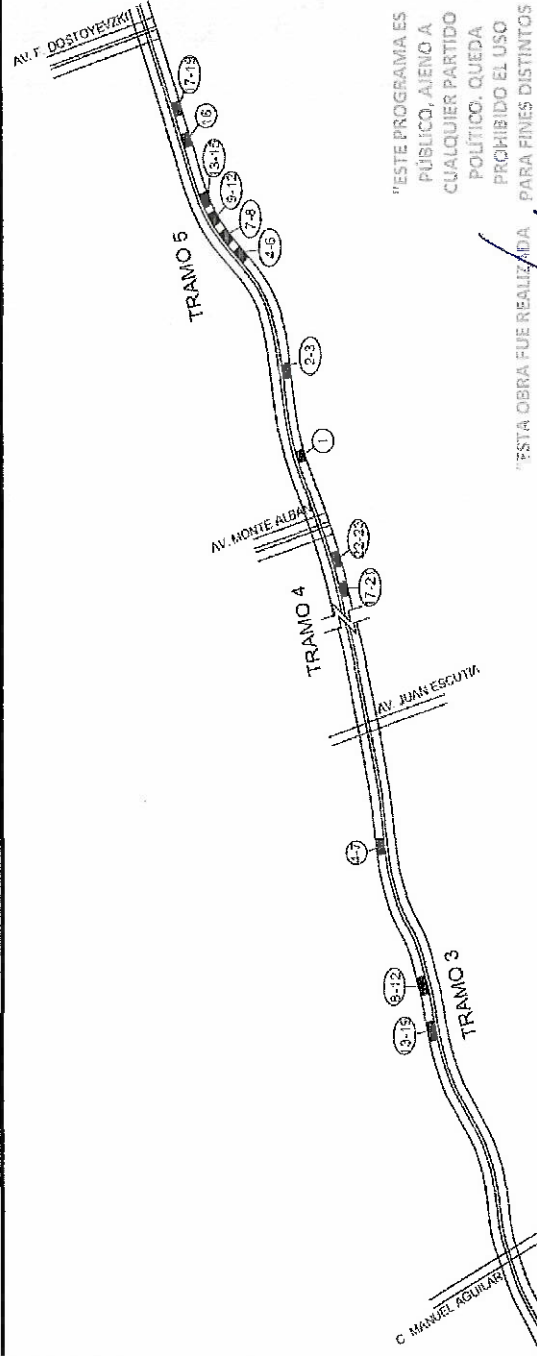

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA."

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES."

Fernando Carrasco O.
CONTRATISTA: ING. FERNANDO CARRASCO ORTIZ

AUTORIZO: INGENIERO MIRELES



INGENIERIA INTEGRAL EN CONSTRUCCION

ING. CIVIL GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA

CALLE ALONDRA #4964 COL. ARBOLEDAS 31166 - TEL 6144821182 - CHIHUAHUA, CHIH.

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO MR-50 EN VIALIDAD SACRAMENTO

LOCACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.

PERIODO DE EJECUCIÓN: 24/11/17 A 30/11/17

NÚMERO DE ESTIMACIÓN: 6 (SEIS)



CONTRATO NO. 133/2017

CLAVE

1

CONCEPTO

Reposición de pavimento de concreto en áreas parciales. Incluyendo corte con cortadora de disco en el área definida por reponer; demolición de losa de concreto incluyendo retiro de escombros, retiro en caso de ser necesario de 25cm de base, compactación del terreno expuesto al 90% prueba proctor, suministro y colocación de 25cm de base medidos compactos al 100% prueba proctor, colocación de losa de concreto MR-50kg/cm2 de 22cm de espesor.

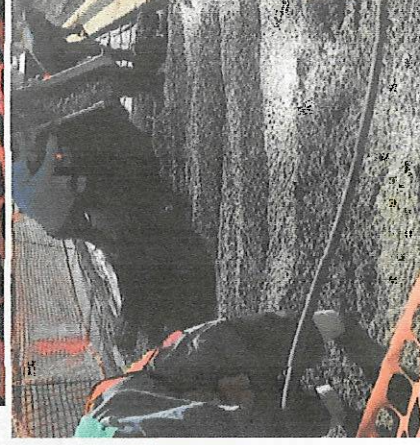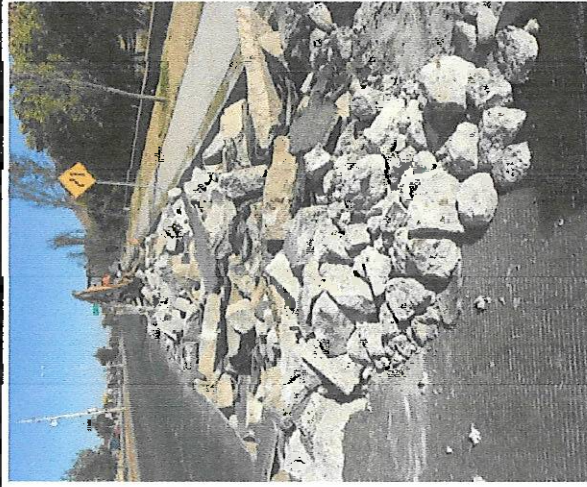

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES."

Fernando Carrasco Ortiz

CONTRATISTA: ING. FERNANDO CARRASCO ORTIZ

AUTORIZO: ING. VICTOR MIRELES



INGENIERIA INTEGRAL EN CONSTRUCCION

ING. CIVIL GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA

CALLE ALONDRA #4964 COL. ARBOLEDAS 31166 - TEL 6144821182 - CHIHUAHUA, CHIH.

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO MR-50 EN VIALIDAD SACRAMENTO

LOCACION: CHIHUAHUA, CHIH.

PERIODO DE EJECUCION: 24/11/17 A 30/11/17

NUMERO DE ESTIMACION: 6 (SEIS)

CONTRATO NO. 133/2017

CLAVE

2

CONCEPTO

Excavación de capa bajo la capa de base existente para alojar capa filtrante de piedra, en espesor variable Incluye carga y acarreo al lugar autorizado



"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA."

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES."

Fernando Carrasco Ortiz

CONTRATISTA: ING. FERNANDO CARRASCO ORTIZ

AUTORIZÓ: ING. VÍCTOR MIRELES



INGENIERIA INTEGRAL EN CONSTRUCCION

ING. CIVIL GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA
CALLE ALONDRA #4964 COL. ARBOLEDAS 31166 - TEL 6144821182 - CHIHUAHUA, CHIH.

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION CON CONCRETO MR-50 EN VIALIDAD SACRAMENTO

LOCACION: CHIHUAHUA, CHIH.

PERIODO DE EJECUCION: 24/11/17 A 30/11/17

NUMERO DE ESTIMACION: 6 (SEIS)

CONTRATO NO. 133/2017

CLAVE

CONCEPTO

3

Capa filtrante de piedra de río o triturada de 3" de diámetro máximo y espesor variable, extendida en forma manual acomodada con rodillo mecánico, incluye: adquisición, carga, acarreo, abundamiento, extendido manual y acomodo mecánico y todo lo necesario para su correcta ejecución.



"ESTE PROGRAMA ES
PÚBLICO, AJENO A
CUALQUIER PARTIDO
POLÍTICO. QUEDA
PROHIBIDO EL USO

"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES."
PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN
EL PROGRAMA."

Fernando Carrasco Ortiz

CONTRATISTA: ING. FERNANDO CARRASCO ORTIZ

AUTORIZO: ING. VICTOR MIRELES
