


GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

"REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES"

CALLE 5ª # 6301 TEL. (614) 436-1109

R.F.C. GLC-870326-EJ3


COL. PLOMEROS C.P. 31370

CMIC-55216

CHIHUAHUA, CHIH.

CLIENTE		FACTURA	
NOMBRE:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	No. 1572	
R.F.C.:	MCI651010V22	FECHA	8/12/2017 11:13:39
DIRECCION:	MINA No. 408 COL.CENTRO	FOLIO FISCAL	AC554A54-2EF9-49D6-B1D4-39AE2D1E5777
CIUDAD:	Chihuahua, Chihuahua	C.P.:	31000

DESCRIPCION	CANTIDAD/UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
ALCANCE DE LA ESTIMACION RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE \$235,944.99 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.) POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 (UNO) CONVENIO CON PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION CALLES COL. REVOLUCION ASFALTO C. SALVADOR DIAZ ENTRE INDUSTRIAS Y AMERICA LATINA, CALLE ENTRE CAMILO TORRES Y SERDAN, CENTAURO DEL NORTE. SEGUN CONTRATO 140/2017.	1.00N/A	204,991.30	204,991.30
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 0.2% DIF: \$409.98 0.2% C.M.I.C.: \$409.98 0.5% INSP. DE OBRA: \$1,024.96 SUMA: \$1,844.92	1.00N/A	0.00	0.00
NETO A RECIBIR: \$235,944.99			
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N.			



Debemos y pagaremos incondicionalmente a la orden de GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. en su domicilio 5ta. No. 6301 de esta ciudad el Diciembre 8 2017 la cantidad de \$ 237,789.91 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N.) Importe de mercancías recibidas a ml (nuestra) entera satisfacción, Este pagare causara intereses moratorios de 0.00 % mensual desde su vencimiento.

SUBTOTAL	204,991.30
I.V.A.	32,798.61
TOTAL	237,789.91

Método de Pago: 02
Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION
No. Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

SERIE DEL CERTIFICADO: 00001000000407215212

No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404486074

FECH Y HORA DE CERTIFICACION: Diciembre 8 2017 - 12:13:44

EFECTOS FISCALES AL PAGO

EXPEDIDA EN CHIHUAHUA, CHIH.,

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION

SELLO DIGITAL DEL CEDI

NdiVAdxfPg7d7+Hv5B23Qv8xbTFVxJ7JL54EqOVJeDhPQZcl24Qm9JOFU/uh7msJzqFBWBE/M00KB8YuchCEW1+3r3PqkqBawcVqxN+rsK1vpE/p08WPq5yEHV7bYnvNv154OnND+p6+R46/41IKMSIA/21/UMVC7Rh8KFJeyu99LvcIYaveCebAMJRC5Cc78WPH8dclrdTAbicndQBII/laeFF7Y/M6D4VZX7MLFGrcn6lWENRU1MdPupQFsh41LXfR24vXIKq5P5ermL4G/EAxueWUTGQ58FUQAC/44+/cMEXYy+CH4q3TrTrRabk0fu1+/H4pUPNGRMm1bU96Q==

SELLO DEL SAT

ay7BjlgXvNfBQnsAnsBE4dL3UGfPPOzaMOBY62G5dlkZHCjdQbuczw05fyH0z8tnbcmvUx1UCT09AT1Jctwx511BuBL3Ac0QoUWIX78GEropX9e6WAg/VArMQ1REb/yf/8FJWJWZFXFapvUUUOINV2E7cNX94JMKZVJDFg91Ycnb4p1ct46n17r2OwXewoMbOCUeoNOxibw9RYO87Zgcs7K6H+3r+4l3++1WbZkdhrEnXh856c+hH91Jbmghqno8TEdeCTbVUxhaIE6b1MJKV9ETWbaKucPfzx8prhLr3WzBIQT1R45CMhQcu/7Jx8Qp7L8JqQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|AC554A54-2EF9-49D6-B1D4-39AE2D1E5777|2017-12-08T12:13:44|NdiYAdzfPgD7+Hv6B
Z3Gv8xbTFVxJ7JL54EqOVJeDhPQZcI24Qm9jOFU/uh7mslZgFBWBEjM00KBYucbCFEW1+3r3PgkqBawc
VqN+rsk1vpE/p08WPq5yEHV7bYnvNy154OnND+p6+R46/41IKMSfA/2I/IUMVCT7Rh8KFJeyu99LvCI
Yev+Ce8AMIRc5Cc7BWPfH8dclrdTAbicndQBf/lqaEFF7Y/M6D4VZX7MLFGrcn6IWenRU1MdPupQFsh4t
1XIRI24vXIKq5PErmlAG/EAxueWUIGQ58FUQAC/s4+/cMEYy+CH4q3TrTrRabk0fu1+/H4pUPNGRMml
bU96Ql=|00001000000404486074||



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT


Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION



Proporcione los dígitos de la imagen*:

* Datos obligatorios

Verificar CFDI

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GLC870326EJ3	GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AC554A54-2EF9-49D6-B1D4-39AE2D1E5777	2017-12-08T11:13:39	2017-12-08T12:13:44	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$237,789.91	ingreso	Vigente	

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- [Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

- [English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)
- [Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)
- [Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

Mantente informado. Suscríbete.



Síguenos en

<https://www.facebook.com/gobmx> <https://twitter.com/gobmx>



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN

[illegible]

RESIDENCIA MUNICIPAL

DE CHIHUAHUA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Y MANTENIMIENTO

DEPTO. MANTENIMIENTO VIAL

CONTRATO No. 140/2017

OBRA: PAVIMENTACION CALLES COL. REVOLUCION ASFALTO C. SALVADOR DIAZ CASAS ENTRE INDUSTRIAS Y AMERICA LATINA, CASA ENTRE CAMILO TORRES Y SEROANI, CENTAURO DEL NTE.

ESTIMACION No. 1 (UNO) CONVENIO HOJA No. 1 DE 1

PERIODO : DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017

CONTRATISTA: GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CONCEPTO

DESCRIPCION

UNIDAD

SEGUN PROYECTO

HASTA ESTA ESTIMACION

HASTA LA EST. ANTERIOR

DE ESTA ESTIMACION

PRECIO UNITARIO (\$)

IMPORTE (\$)

	INCISO								
		PAVIMENTOS							
		CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICO							
1	EP-5	CORTE DE CAJON DE 15 CMS POR MEDIOS MECANICOS, COMPACTACION Y TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL, CAPA DE BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 95% Y RIEGO DE IMPREGNACION A BASE DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIENTO LENTO A RAZON DE 1.5 CMS/M2	M2	18,625.55	18,625.55	18,625.55	0.00	70.32	0.00
2	EP-6	FABRICACION Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO DE 2.50 CMS COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30	M2	18,069.17	18,069.17	14,732.18	3,336.99	61.43	204,991.30
3	EXT-01	RENIVELACION DE POZOS DE VISITA DE 0.0 A 1.0 M DE ALTURA, INCLUYE RETIRO DE BROCALES Y MARCOS EXISTENTES, EXCAVACION, RELLENOS CON MATERIAL DE BANCO, MADERA PARA TAPADO PROVISIONAL, SUMINISTRO DE BROCAL DE 130 KG. ARMEX PARA BROCAL, CONTRAMARCO, CONCRETO NECESARIO, LADRILLO, MORTERO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL.	PZA	0.00	20.00	20.00	0.00	7,705.85	0.00
4	EXT.02	RENIVELACION DE CAJAS DE VALVULAS TIPO 1 DE 0.0 A 1.0 M DE ALTURA, INCLUYE: RETIRO DE BROCALES Y MARCOS EXISTENTES, EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, MADERA PARA TAPADO PROVISIONAL, SUMINISTRO DE MARCO Y TAPA EXISTENTE DE 130 KT. ARMEX PARA BROCAL, CONTRAMARCO, CONCRETO NECESARIO, LADRILLO, MORTERO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL.	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,361.94	0.00
5	EXT.03	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1.00 A 4.00 M. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENOS, MATERIAL PARA RELLENOS, TUBERIA, SOLDADURA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO.	PZA	0.00	2.00	2.00	0.00	1,314.94	0.00
									\$ 204,991.30

UMAS

OTAS

IMPORTA ESTA HOJA: DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 30100 M/N

LUGAR: CHIHUAHUA, CHIH.

FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017

ESTIMO: Residente: ING. ADOLFO VILLALOBAS HERNANDEZ

REVISO: Jefe Depto. ING. VICTOR AMADOR PONCE DE LEON

ACEPTO: Contralista GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Vo Bo. Subdirector: ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION



CHIHUAHUA, CHIH.

27 DE NOVIEMBRE 2017

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION

RECIBIMOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 235,944.99
(DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACION NUM. 1 (CONVENIO) CONTRATO No. 140/2017 POR LA CANTIDAD DE : \$ 2'760,940.00
(DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) POR LOS TRABAJOS EN LA OBRA:

PAVIMENTACION CALLES COL. REVOLUCION ASFALTO C. SALVADOR DIAZ ENTRE INDUSTRIAS Y AMERICA LATINA, CASA ENTRE CAMILO TORRES
Y SERDAN, CENTAURO DEL NTE.

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	204,991.30
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-

SUBTOTAL	\$	204,991.30
IVA	\$	32,798.61
TOTAL	\$	237,789.91

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO	
C.M.I.C. DEL 0.2 %	\$ 409.98
D.I.F. DEL 0.2 %	\$ 409.98
INS. DE OBRA 0.5 %	\$ 1,024.96

SUMA	\$ 1,844.92
------	-------------

MULTA POR ATRASO	\$ -
------------------	------

TOTAL	\$ 1,844.92
-------	-------------

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION
POR EJERCER CONVENIO
POR EJERCER

CONTRATO	
\$	2,371,500.00
\$	254,295.00
\$	2,371,493.58
\$	204,991.30
\$	2,576,484.88
\$	49,303.70
\$	6.42

2.- AMORTIZACION ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO	
\$	711,450.00
\$	579,012.54
\$	132,437.46
\$	711,450.00
\$	-

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL

0.5 % INSP OBRA	0.2 % C.M.I.C.
\$ 11,857.47	\$ 4,742.99
\$ 1,024.96	\$ 409.98
\$ 12,882.43	\$ 5,152.97

0.2 % D.I.F.
\$ 4,742.99
\$ 409.98
\$ 5,152.97

RECIBIMOS

GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
GLC-870326-EJ3

GENERADORES

2. FABRICACION Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO DE 2.50 CMS COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-3

CALLE 2 DE OCTUBRE ENTRE CALLE CD. CUAUHTEMOC Y CALLE AMADA DE ARMENDARIZ (SUB TRAMO ENTRE CALLE CD. CUAHUTEMOC Y CALLE CD. DURANGO)
TODO EL ANCHO CALZADA


NO.	CAD 1	ANCHO	ANCHO PROM. (M)	LARGO PROM.	AREA (M2)	ENTRE CALLES
0	0+000	13.70				cd. Cuauhtemoc
1	0+041	13.40	13.55	41.00	555.55	
atrás	0+052.5	13.50				lucha obrera
adelante	0+145	13.10	13.30	92.50	1230.25	
atrás	0+157.5	14.00				luz corral de villa
adelante	0+251.3	14.00	14.00	93.80	1313.20	
atrás	0+264.6	14.40				cd. Madera
adelante	0+303.2	12.70	13.55	38.60	523.03	
atrás	0+368	12.80				centenario-sierra tarahumara
adelante	0+462	13.30	13.05	94.00	1226.70	
atrás	0+474	12.70				del magisterio
adelante	0+514	12.40	12.55	40.00	502.00	
atrás	0+526.7	12.40				rodolfo flores
	0+566.7	13.80	13.10	40.00	524.00	
						amada de armendariz

AREA TOTAL MORTERO ASFALTICO	5874.73
AREA PAGADA ESTIMACION 2	2537.74
DE ESTA ESTIMACION	3336.99




CROQUIS

CALLE 2 DE OCTUBRE ENTRE CALLE CD. CUAUHEMOC Y CALLE AMADA DE ARMENDARIZ (SUB TRAMO ENTRE CALLE CD. DURANGO Y CALLE AMADA DE ARMENDARIZ)

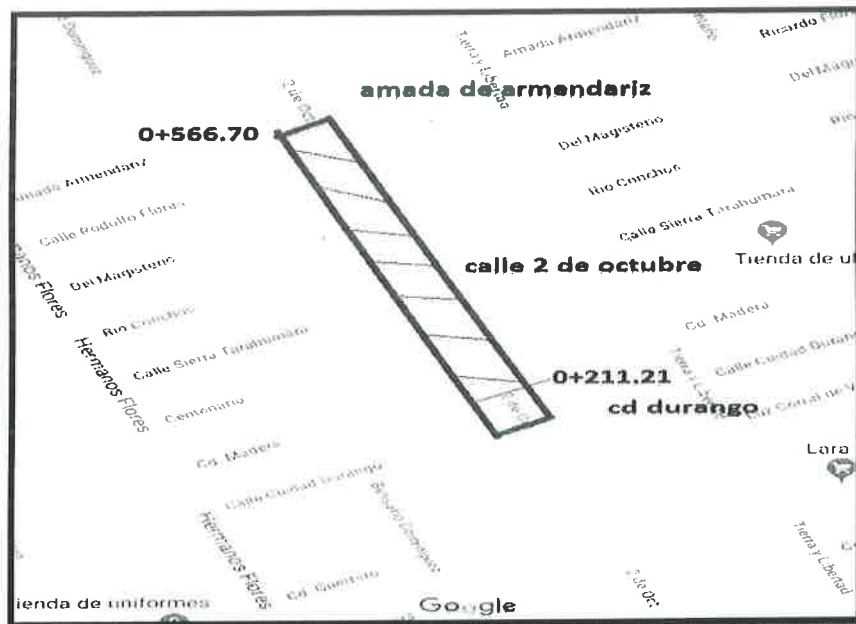

12

CALLE 2 DE OCTUBRE ENTRE CALLE CD. CUAUHEMOC Y CALLE AMADA DE ARMENDARIZ (SUB TRAMO ENTRE CALLE CD. CUAUHEMOC Y CALLE CD MADERA)

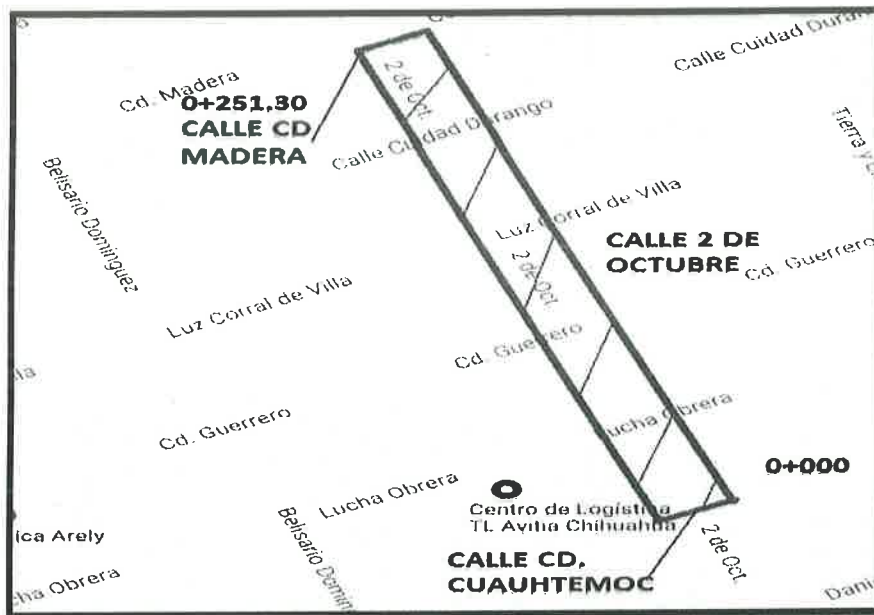

CALLE 2 DE OCTUBRE ENTRE CALLE CD. CUAUHEMOC Y CALLE AMADA DE ARMENDARIZ (SUB TRAMO ENTRE CALLE CD. MADERA Y CALLE AMADA DE ARMENDARIZ)



OBRA: 'PAVIMENTACION CALLES COL. REVOLUCION ASFALTO C. SALVADOR DIAZ CASAS ENTRE INDUSTRIAS Y AMERICA LATINA, CASA ENTRE CAMILO TORRES Y SERDAN, CENTAURO DEL NTE. '



MORTERO ASFALTICO



MORTERO ASFALTICO



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN

23-NOV-17

- Se hacen carpetas asfálticas de 3/8" en calle 2 de octubre entre
Cd. Cuauhtémoc y calle Cd. Durango.

24-NOV-17


- Se realiza limpieza del bache hundido.

25-NOV-17

- Se hacen carpetas asfálticas de 3/8" en calle 2 de octubre entre
calle Cd. Durango y calle Avda. de Amador.

27-NOV-17

- Se realiza limpieza y se terminan los trabajos al 100%.



[Handwritten signature]



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO No D-3878/2017

Chihuahua, Chih., 06 de Noviembre del 2017.

ING. EDUARDO GAMEROS TERRAZAS
PRESENTE.

Con relación a su solicitud de fecha de 09 de Octubre del 2017, en el que presenta a revisión y autorización de precios extra ordinario de la obra: "PAVIMENTACION CALLES COL. REVOLUCION ASFALTO C. SALVADOR DIAZ ENTRE INDUSTRIAS Y AMERICA LATINA, CALLE ENTRE CAMILO TORRES Y SERDAN CENTAURO DEL NORTE." Bajo el amparo del contrato No. 140/2017, ejecuta su representada, al respecto, me permito comunicar que los mismos han sido autorizados tal y como se relacionan a continuación:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO AUTORIZADO
EXT 01	RENIVELACION DE POZOS DE VISITA DE 0.0 A 1.0 M DE ALTURA, INCLUYE RETIRO DE BROCALES Y MARCOS EXISTENTES, EXCAVACION, RELLENOS CON MATERIAL DE BANCO, MADERA PARA TAPADO PROVISIONAL, SUMINSITRO DE BROCAL DE 130 KG, ARMEX PARA BROCAL, CONTRAMARCO, CONCRETO NECESARIO, LADRILLO, MORTERO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL	PZA	\$ 7,705.86
EXT 02	RENIVELACION DE CAJAS DE VALVULAS TIPO 1 DE 0.0 A 1.0 M DE ALTURA, INCLUYE: RETIRO DE BROCALES Y MARCOS EXISTENTES, EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, MADERA PARA TAPADO PROVISIONAL, SUMINISTRO DE MARCO Y TAPA EXISTENTE DE 130.KT, ARMEX PARA BROCAL, CONTRAMARCO, CONCRETO NECESARIO, LADRILLO, MORTERO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL	PZA	\$ 8,361.94
EXT 03	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1.00 A 4.00 M. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENOS, MATERIAL PARA RELLENOS, TUBERIA, SOLDADURA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO.	PZA	\$ 1,314.94
EXT 04	REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 1.00 A 4.00 M. INCLUYE: EXVACACION, RELLENOS, MATERIAL PARA RELLENOS, TUBERIA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO	PZA	\$ 1,557.12

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.c.p.- Arq. Carlos Aguilar García.-Subdirector de Infraestructura Urbana
C.c.p.-Ing. Víctor Amador Ponce de León.-Jefe del Departamento de Mantenimiento Vial e Infraestructura
C.c.p.-Ing. Adolfo Villalobos Hernández.-Residente de Obra
C.c.p.- archivo

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Juan Salazar
6/11/2017
