



Guillermo Prieto No. 101 Int. No. 3,
Col. Miguel Hidalgo, C.P. 50100
Toluca de Lerdo, Estado de México
R.F.C. CMA980529MW0

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22
DOMICILIO: CALLE MINA No. 408
COLONIA: CENTRO
ESTADO: CHIH

C.P.: 31000
PAÍS: MEXICO

Factura

SERIE: M
FOLIO: 383
FECHA: 24/11/2017
12:48:30

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	ESTIMACION NO. 3 (TRES) RELATIVO A: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO DE 17.50 X 22.5 M. EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL " JESUS REYES HERODES" NO. 2573 CON CLAVE 08EPR0817G", EN ESTA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.	60,564.83	60,564.83
1.00	No aplica	CONTRATO NO. 141/2017 AMORTIZACION DEL ANTICIPO DESCUENTOS 0.2 % CMIC \$ 121.13 0.2 % DIF \$ 121.13 SUMA DESCUENTOS \$ 242.26 SALDO NETO A RECIBIR \$ 48,934.93	-18,170.70	-18,170.70

IMPORTE CON LETRA
CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 19/100
METODO DE PAGO
Cheque nominativo NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 42,394.13
I.V.A.: 6,783.06
TOTAL: 49,177.19

FIRMA DE CONFORMIDAD



Serie del Certificado del emisor:	00001000000302744883
Folio fiscal:	9C61BFEE-C11D-48B4-A4B4-D64613379DF0
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 24 2017 - 13:48:32

Sello digital del CFDI
YxxGZAjInvHjqDeryr+EBIJBVF2LZiMtr9p2cqh0vvVzV0MOGUAzYHUb73kDz2FFGB1h7BevPG/1CehzPOCEiC WodQssBfeT1YbwR2o/f7/yfYBNTQVzZ9SLGX6nMluHYDDsQwclc345hJ6J/i7Iclz8u9ycaws+TyGUG6uglrw=

Sello del SAT
Gq1CYBD0M9yvxHrpg/1nKwSCY5ZuThVSf95Ncf7mz3ENWpyQUghMssmHYZKkkvQWq4YTKesu4b7SnoZu cbxoi3q1YyT8UrsKdC+SrccTKHLSj/J7cJ2e2XBOWf9WnX0D3cneqS3FCiZZRB/AR3/XGsD0JjJutBeh ymK2833mrp7pHQL3gDpOevfrtBgCF72G4z17aOsK5Zzjls7v77XcJADgQ0S2G3B/+6UQJgc56FOnV65m VCgdZJnhP+1K+tgjeJtYKxSpMaENpk/thSiHGxpKbXim9U8BHznnsKO4TuOvApii137oehFHRi137PI /jU5wD24rdLM3vwjsi4o1g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 9C61BFEE-C11D-48B4-A4B4-D64613379DF0 2017-11-24T13:48:32 YxxGZAjInvHjqDeryr+EBIJBVF2LZiMtr9p2cqh0vvVzV0MOGUAzYHUb73kDz2FFGB1h7BevPG/1CehzPOCEiCWodQssBfeT1YbwR2o/f7/yfYBNTQVzZ9SLGX6nMluHYDDsQwclc345hJ6J/i7Iclz8u9ycaws+TyGUG6uglrw= 00001000000404486074

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CMA980529MW0	CONSTRUCCIONES MARRO SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
--------------	---------------------	-------------------------	-------------------

9C61BFEE-C11D-48B4-A4B4-D64613379DF0	2017-11-24T12:48:30	2017-11-24T13:48:32	MAS0810247C0
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
----------------	------------------------	-------------

\$49,177.19	ingreso	Vigente
-------------	---------	---------

Handwritten signature and stamp.

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 141/2017	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO 17.50 X 22.5M. EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JESUS REYES HERODES" NO. 2753, CON CLAVE 08EPR0817G"	ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) ULTIMA	\$ 787,340.64 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 16 DE OCTUBRE -15 DE NOVIEMBRE 2017	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 70,255.20 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 717,080.57 CON IVA
RFC: CMA980529MW0	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 787,335.77 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 25,090.32	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ 35,474.51	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 60,564.83	

DESCUENTOS		
	\$	
0.2% C.M.I.C.	\$	121.13
0.2% D.I.F.	\$	121.13
SUMA DESCUENTOS	\$	242.26
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	60,564.83
AMORT ANTICIPO	\$	18,170.70
SUB-TOTAL	\$	42,394.13
I.V.A.	\$	6,783.06
TOTAL	\$	49,177.19
(CON LETRA)		
(CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	242.26
SALDO NETO A RECIBIR	\$	48,934.93

AUTORIZO	ELABORO
ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ	CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. JAVIER VILLARREAL POSADA	ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGEL
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL
Vo. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	



CHIHUAHUA, CHIH.,

15 DE NOVIEMBRE 2017

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 48,934.93
(CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 3 (TRES) ULTIMA CONTRATO No. 141/2017 POR LA CANTIDAD DE: \$ 787,340.64 INCLUYE CONVENIO
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETEMIL TRESCIENTOS CUARENTA 64/100 POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO 17.50 X 22.5M. EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JESUS REYES HEROLES"NO.2753,
CON CLAVE 08EPR0817G"

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 60,564.83

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 18,170.70

SUBTOTAL \$ 42,394.13

IVA \$ 6,783.06

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

TOTAL \$ 49,177.19

C.M.I.C. 0.2% 121.13

D.I.F. 0.2% 121.13

SUMA 242.26

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 787,340.64
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 717,080.57
ESTA ESTIMACION	\$ 70,255.20
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 787,335.77
POR EJERCER	\$ 4.87

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 203,622.58
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 185,451.88
ESTA ESTIMACION	\$ 18,170.70
ACUMULADO ACTUAL	\$ 203,622.58
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% D.I.F.

0.2% C.M.I.C.

ACUMULADO ANTERIOR	\$ 1,236.35	\$ 1,236.35
ESTA ESTIMACION	\$ 121.13	\$ 121.13
ACUMULADO ACTUAL	\$ 1,357.48	\$ 1,357.48

R E C B I M O S




OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO 17.50 X 22.5M. EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JESUS REYES HERÓLES"NO.2753, CON CLAVE 08EPR0817G"		
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA CHIHUAHUA		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.		
PERÍODO:	16 DE OCTUBRE -15 DE NOVIEMBRE 2017		
ESTIMACIÓN No.	3 (TRES) ULTIMA		
No. CONTRATO:	141/2017		

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

<u>NORMALES</u>	
REPOSICIÓN DE PISO DAÑADO	\$ 25,090.32
<u>EXCEDENTES</u>	
REPOSICIÓN DE PISO DAÑADO	\$ 35,474.51

SUBTOTAL	\$ 60,564.83
I.V.A.	\$ 9,690.37
TOTAL	\$ 70,255.20

FOR EL CONTRATISTA CONSTRUCCIONES MARRO SA. DE C.V	FOR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN D.O.P.M
	
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA	ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ



OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO 17.50 X 22.5M. EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JESUS REYES HERÓLES NO. 2753, CON CLAVE 08EP0817/G
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.
PERIODO:	16 DE OCTUBRE - 15 DE NOVIEMBRE 2017
ESTIMACIÓN No.	3 (TRES) ULTIMA
No. CONTRATO:	141/2017

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO		IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		

OBRA NORMAL								\$ 25,090.32
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

REPOSICIÓN PISO DAÑADO DE CONCRETO								
41	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO HASTA 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA.	m2	42.00	42.00		42.00	\$ 67.65	\$ 2,841.30
43	PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR. ACABADO A VUELTA DE PLANA INC. AFINE, CIMBRA, MEMBRANA DE CURADO, Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10.	m2	42.00	42.00		42.00	\$ 342.22	\$ 14,373.24
44	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN TABLERO, ARO Y SOPORTES DE CONCRETO EN CANASTA DE BASQUETEBOL. INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	pieza	2.00	2.00		2.00	\$ 716.10	\$ 1,432.20
45	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LINEA DE JUEGO EN CANCHA DE BASQUETEBOL. 5 CMS. DE ANCHO INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE. MARCA DE PINTURA COMEX TOP-DEPORTIVO.	ml	141.39	141.39		141.39	\$ 25.95	\$ 3,669.07
46	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	386.96	386.96		386.96	\$ 7.17	\$ 2,774.51

OBRA EXCEDENTE								\$ 35,474.51
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

REPOSICIÓN PISO DAÑADO DE CONCRETO								
41	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO HASTA 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA.	m2	42.00	42.00		42.00	\$ 67.65	\$ 2,841.30

FOR EL CONTRATISTA:

I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN:

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ



OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 17.50 X 22.5M, EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JESUS REYES HEROLÉS" NO. 2753, CON CLAVE 08EP0817G"	
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA CHIHUAHUA	
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.	
PERIODO:	16 DE OCTUBRE - 15 DE NOVIEMBRE 2017	
ESTIMACIÓN No.	3 (TRES) ULTIMA	
No. CONTRATO:	141/2017	

CONCEPTOS		PROYECTO			VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO			
43	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA INC. AFINE, CIMBRA, MEMBRANA DE CURADO, Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10.	m2	42.00	89.13		89.13	\$ 342.22	\$	30,502.07
45	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LINEA DE JUEGO EN CANCHA DE BASQUETBOL, 5 CMS. DE ANCHO INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MARCA DE PINTURA COMEX TOP-DEPORTIVO.	ml	141.39	4.36		4.36	\$ 25.95	\$	113.14

SUBTOTAL	\$	60,564.83
IVA	\$	9,690.37
TOTAL	\$	70,255.20

POR EL CONTRATISTA

 I.C. MARIO RODOLFO GARCIA
 CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN:

 ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ



CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.

HOJA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	141/2017	TRAMO:	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICO TIPO DOMO 17.50 X 22.50M. EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JESUS REYES HERÓLES" NO. 2753, CON CLAVE 08EPR0817G"	CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.

NO. DE ESTIMACION:	13 (TRES)	PERIODO	16 DE OCTUBRE -15 DE NOVIEMBRE 2017
--------------------	-----------	---------	-------------------------------------


CONCEPTO	41	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO HASTA 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA.	L	A	L x A	TOTAL
	3.02	2.90	8.76	8.76
	6.02	3.50	21.07	21.07
	25.75	3.50	90.13	90.13
	AREAS YA DEMOLIDAS			
	1.20	0.90	1.08	-1.08
	1.20	0.90	1.08	-1.08
	1.20	1.10	1.32	-1.32
	1.20	1.10	1.32	-1.32
	1.20	1.10	1.32	-1.32
		TOTAL		113.83
				M2 113.83

RESIDENTE D.O.P.M.

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ

CONTRATISTA ; CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.

C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

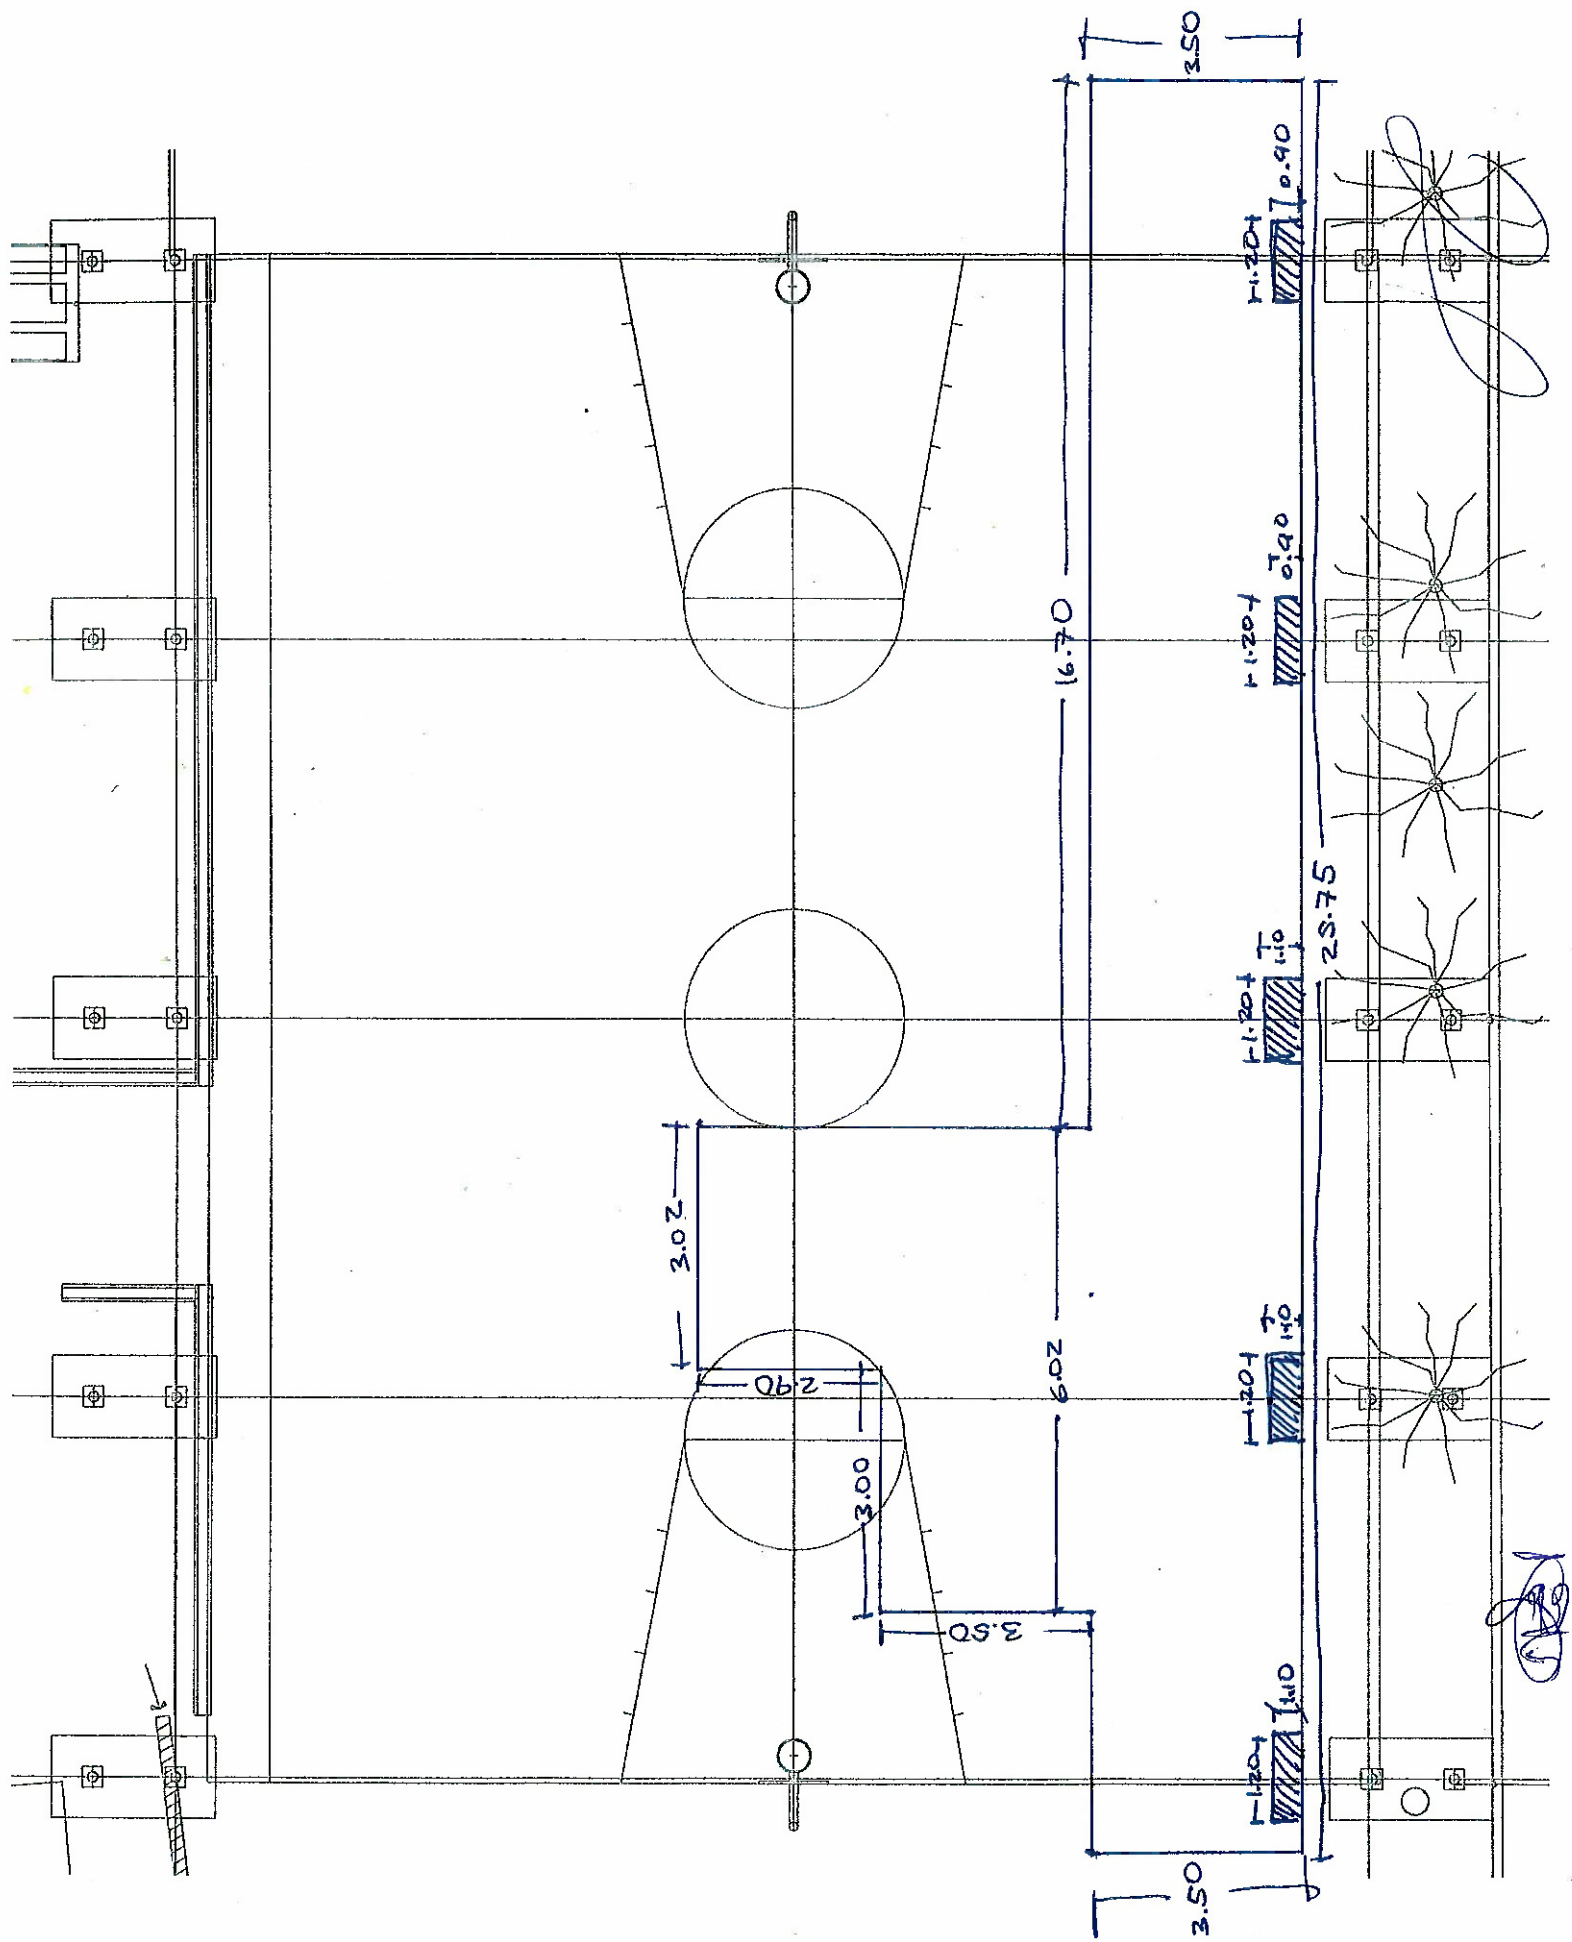



CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.

HOJA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	141/2017	TRAMO:	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICATIPO DOMO 17.50 X 22.5M. EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JESUS REYES HERODES" NO. 2753, CON CLAVE 08EP0817G"	CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	3 (TRES)	PERIODO	16 DE OCTUBRE -15 DE NOVIEMBRE 2017
--------------------	----------	---------	-------------------------------------


CONCEPTO	43	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA INC. AFINE, CIMBRA, MEMBRANA DE CURADO, Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10.	L	A	L x A	TOTAL
	3.02	2.90	8.76	8.76
	6.02	3.50	21.07	21.07
	25.75	3.50	90.13	90.13
	2.20	1.22	2.68	2.68
	2.10	1.20	2.52	2.52
	1.60	0.60	0.96	0.96
	1.70	1.20	2.04	2.04
	1.20	1.91	2.29	2.29
	1.20	0.57	0.68	0.68
				131.13

RESIDENTE D.Q.P.M.

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ

CONTRATISTA ; CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.

IC. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

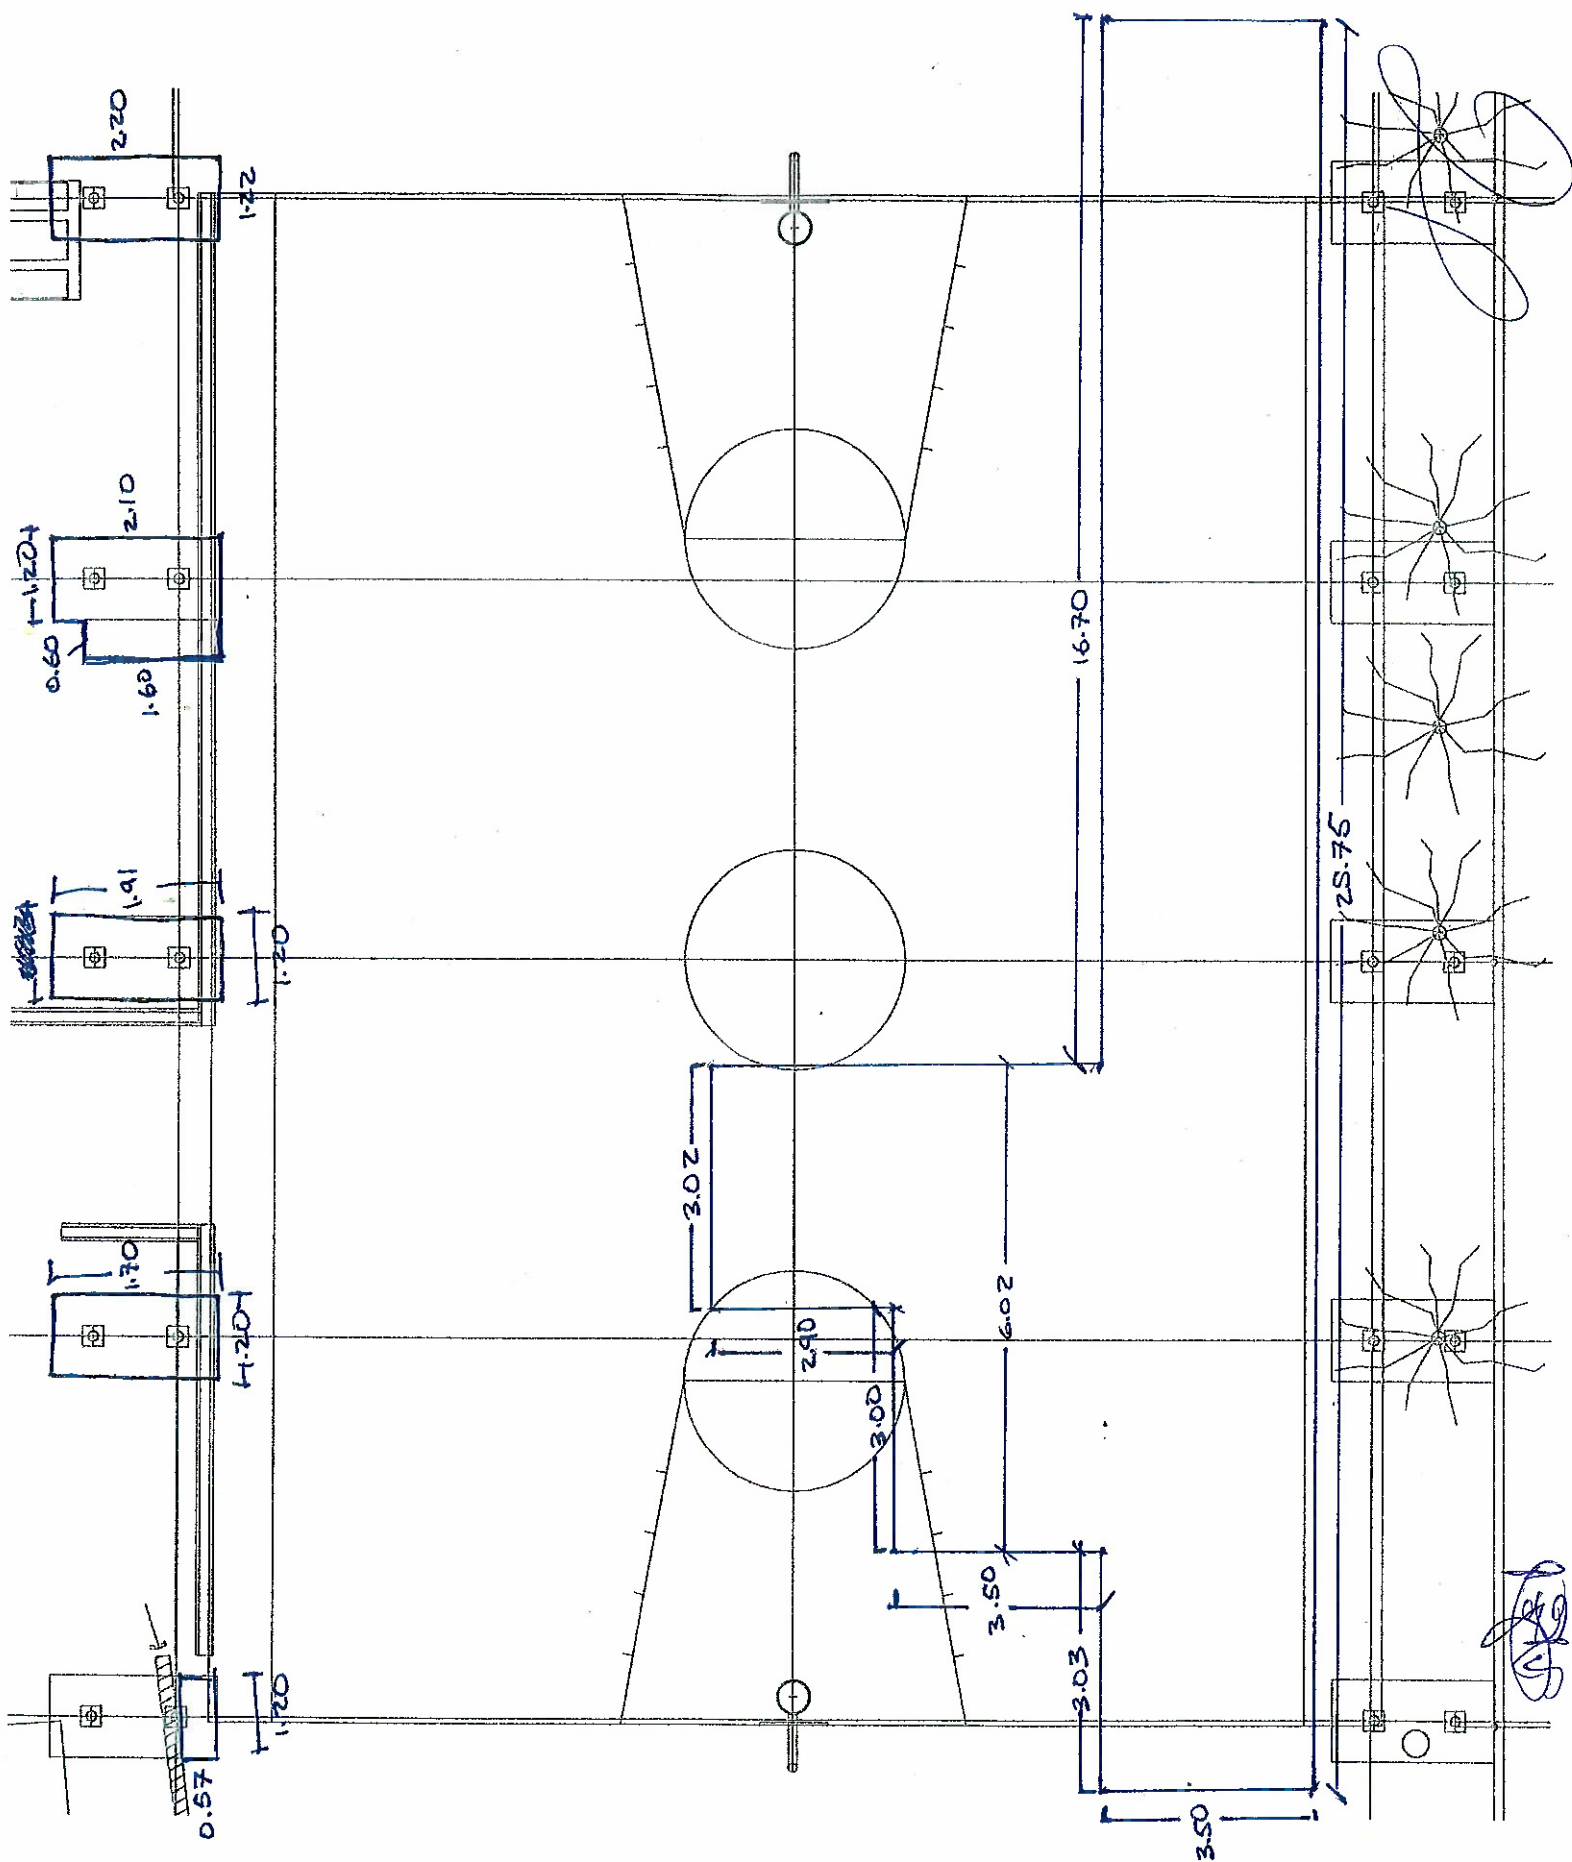



CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.

HOJA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	141/2017	TRAMO:	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBREMETÁLICATIPO DOMO 17.50 X 22.5M. EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JESUS REYES HERÓLES"NO.2753, CON CLAVE 08EPR0817G"	CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	3 (TRES)	PERIODO	16 DE OCTUBRE -15 DE NOVIEMBRE 2017
--------------------	----------	---------	-------------------------------------

CONCEPTO	44	OPERACIONES ARITMETICAS	
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN TABLERO, ARCO Y SOPORTES DE CONCRETO EN CANASTA DE BASQUETBOL. INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.			
	PZS 2	TOTAL 2.00	

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
	PZS 2.00

RESIDENTE D.O.M.

Manuel Escobedo Hernandez

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ

CONTRATISTA ; CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.

IC. MARIO RODRIGUEZ GARCIA



CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.

HOJA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	143/2017	TRAMO:	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICO TIPO DOMO 17.50 X 22.50 ML. EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JESUS REYES HERÓLES" NO. 2753, CON CLAVE 08EP0827G	CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.

Nº. DE ESTIMACION:	3 (TRES)	PERIODO	16 DE OCTUBRE - 15 DE NOVIEMBRE 2017
--------------------	----------	---------	--------------------------------------

CONCEPTO	45	OPERACIONES ARITMETICAS			
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LINEA DE JUEGO EN CANCHA DE BASQUETBOL, 5 CMS. DE ANCHO INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MARCA DE PINTURA COMEX TOP-DEPORTIVO.	L	V	L x V		
	15.00	3.00	45.00	45.00	
	22.50	2.00	45.00	45.00	
	4.80	4.00	19.20	19.20	
	3.20	2.00	6.40	6.40	
	Perimetro		30.15	30.15	
	10.05	3.00		TOTAL	145.75


CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
	ML 145.75

RESIDENTE D.Q.P.M.

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ

CONTRATISTA ; CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.

C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

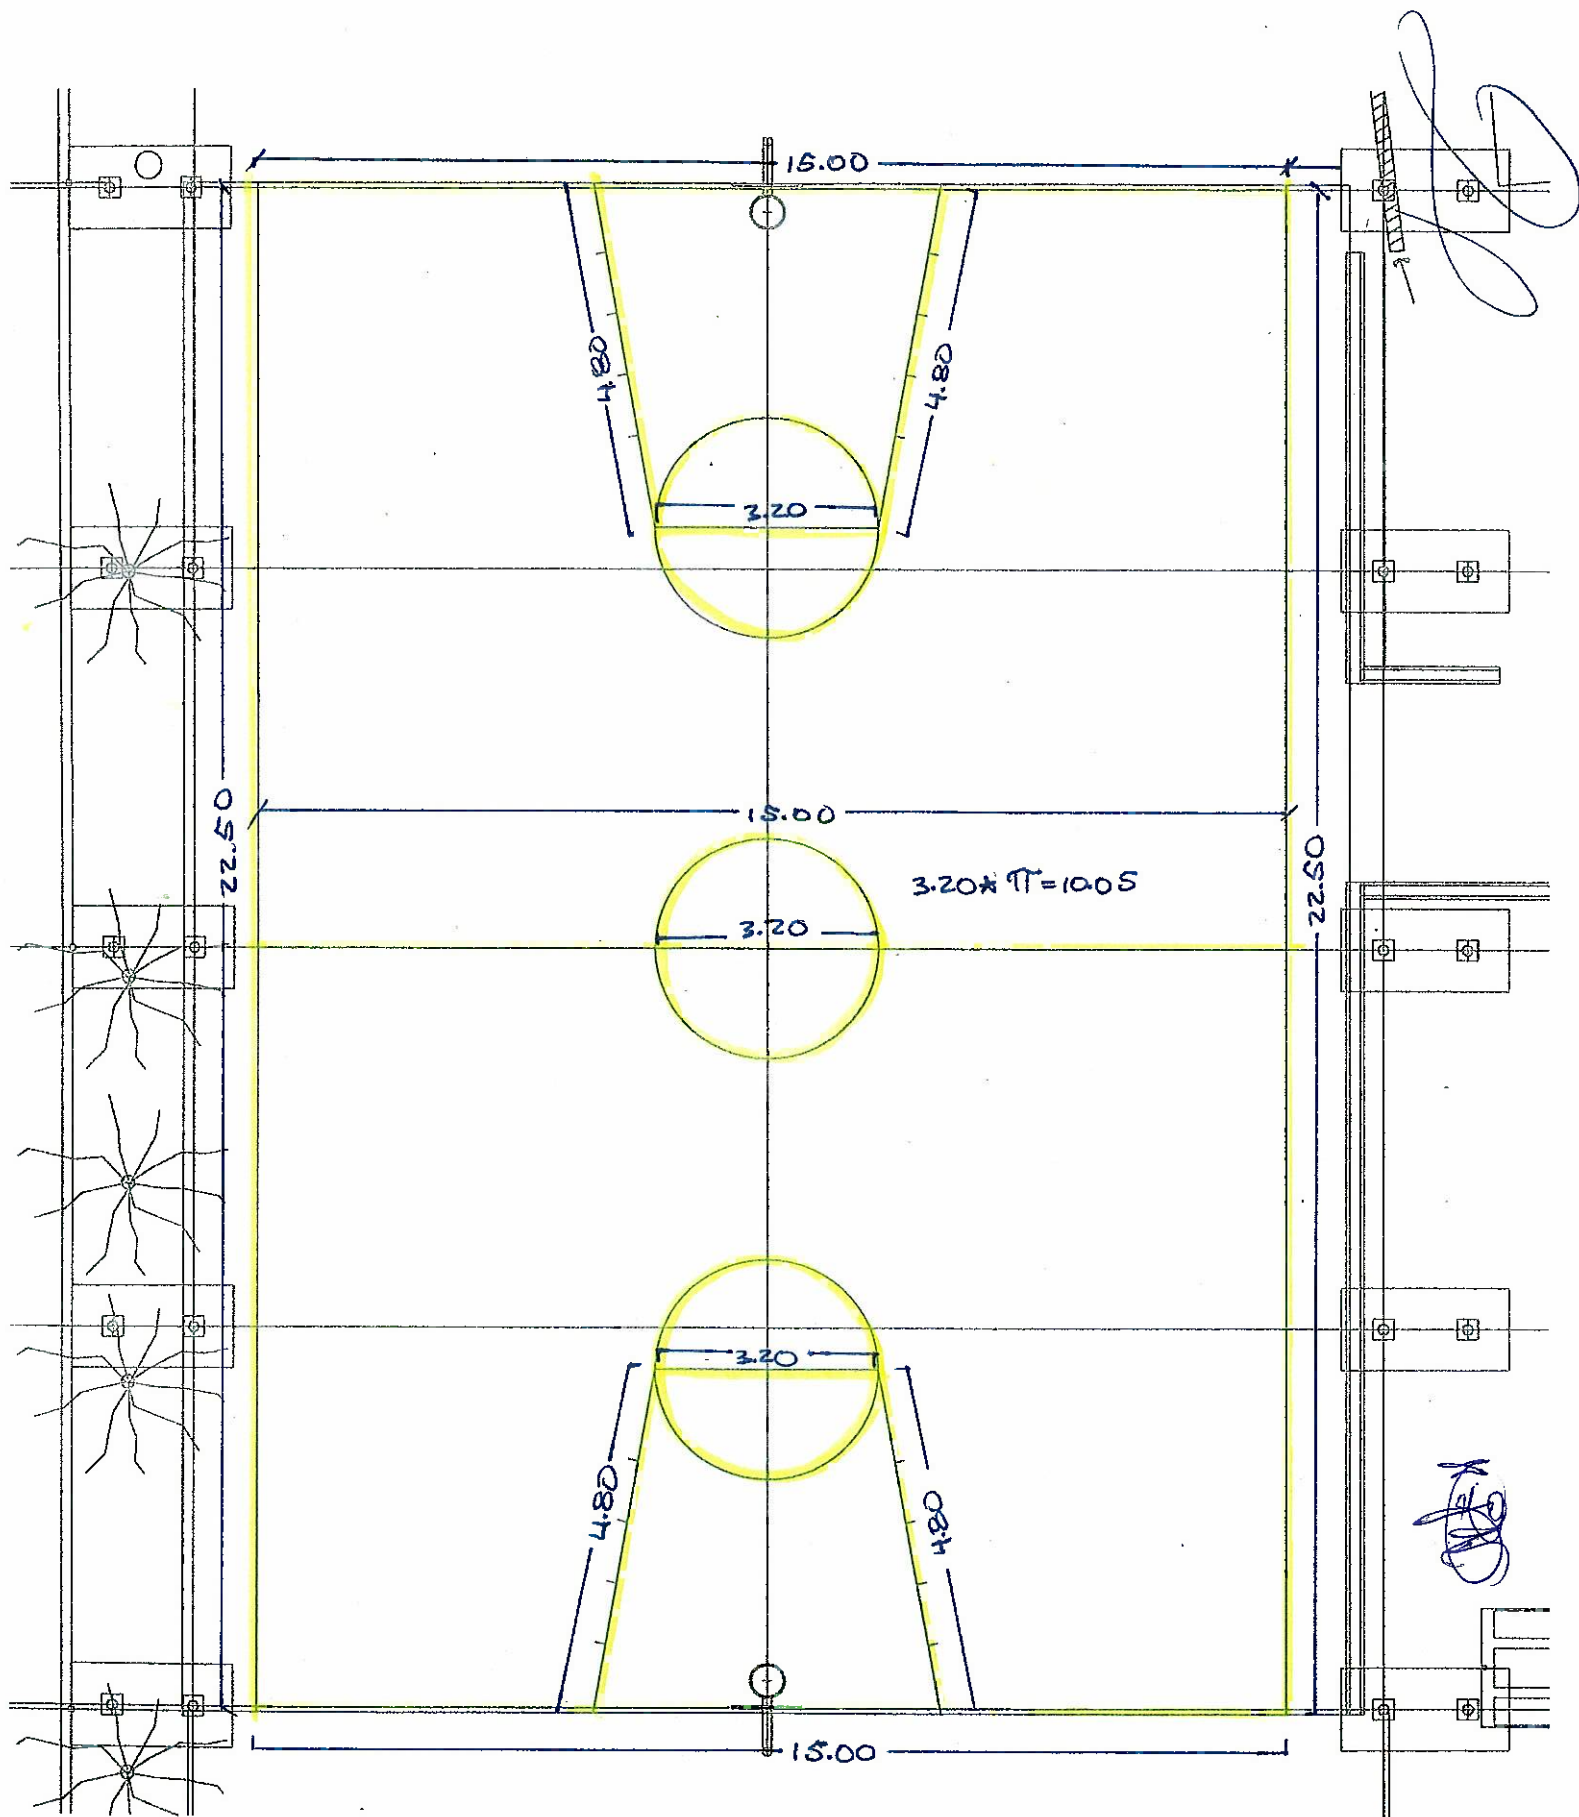



CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.

HOJA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	141/2017	TRAMO:	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICO TIPO DOMO 17.50 X 22.50M. EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JESUS REYES HERÓLES" NO. 2753, CON CLAVE 08EP0817G	CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION:	3 (TRES)	PERIODO	16 DE OCTUBRE -15 DE NOVIEMBRE 2017
--------------------	----------	---------	-------------------------------------

CONCEPTO	46	OPERACIONES ARITMETICAS		
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	L	16.92	A	22.87
	L x A	386.96		
	TOTAL			386.96



CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
	M2 386.96

RESIDENTE D.O.P.M.

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ

CONTRATISTA : CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.

ING. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

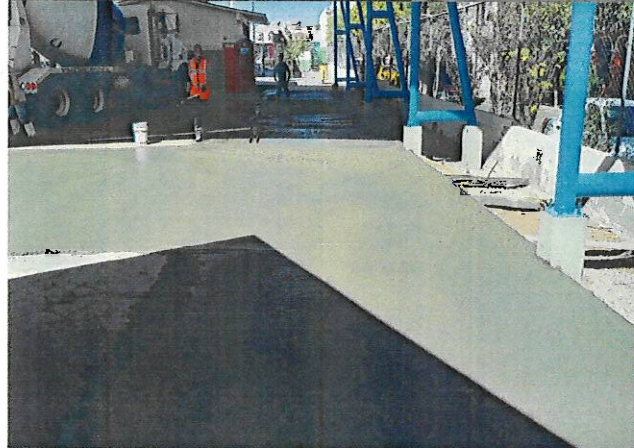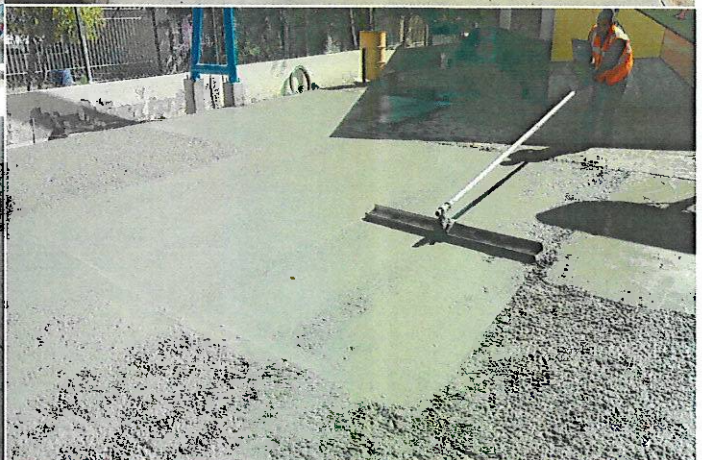

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
