

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio

SITIO




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:


RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

* Datos obligatorios

Verificar CFDI



RFC del emisor

HEFO710611J88

Nombre o razón social del emisor

OSCAR HOMERO HERMOSILLO
FRESCAS

RFC del receptor

MCI651010V22

Nombre o razón social del receptor

Municipio de Chihuahua

Folio fiscal

9B8B1299-DDDE-4727-9816-
62F0F59FB587

Fecha de expedición

2017-11-15T10:31:50

Fecha certificación
SAT

2017-11-15T11:31:55

PAC que certificó

MAS0810247C0

Total del CFDI

\$1,118,692.03

Efecto del comprobante

ingreso

Estado CFDI

Vigente



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

HOJA DE RESUMEN FINAL

No. 1

PROGRAMA:

OBRA: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CALLES Y AVENIDAS EN ZONA SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS

R.F.C. HEFO710611-J88

CONTRATO No. 144/2017 CONTRATADO \$ 1,203,915.85

ESTIMACION No. 1

PERIODO: DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2017.

IMPORTE ESTIMADO \$ 964,389.68

IMPORTE ACUMULADO \$ 964,389.68

C O N C E P T O

I M P O R T E

O B S E R V A C I O N E S

PINTURA TRAFICO

IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION

\$ 964,389.68

DESCUENTOS:

0.2 % DIF (AL MILLAR).	\$ 1,928.78
0.2 % CMIC (AL MILLAR).	\$ 1,928.78
SUMA DESCUENTOS	\$ 3,857.56

RESUMEN:

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 964,389.68
AMORTIZACION ANTICIPO (%)	
DESCUENTOS	\$ 3,857.56
SUB - TOTAL	\$ 960,532.12
I.V.A.	\$ 154,302.35
SALDO NETO PARA PAGO	\$ 1,114,834.47

CON LETRA:

(UN MILLON CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N.)

FORMULO:

RESIDENTE DE OBRA

ING. JESUS GARCIA

REVISO

JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO VIAL

ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEON

ACEPTO:

EL CONTRATISTA

OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS

No. Bo.




SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

URBANA
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

AUTORIZO:

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPTO. MEJORAMIENTO VIAL		CONTRATO No. 122 /2017 DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2017. OBRA: SEÑALAMIENTO HORIZONTAL VIAL. ZONA SUR-PONIENTE CONTRATISTA: OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS			Km. A Km. EST. No. 1		ORIGEN: HOJA No. 1 DE 1		PERIODO : DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2017.	
O B R A (ESTACION Y DESCRIPCION)	C O N C E P T O			C A N T I D A D E S				RECIO UNITARIO (\$)	IMPORTE (\$)	
	INCISO	DESCRIPCION	UNI	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION			
	1.-	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO VIAL DE 11 CM. DE ANCHO COLOR BLANCO Y AMARILLO.	ML.	83,462.33	75,466.30	-	75,466.30	\$ 7.41	\$ 559,205.28	
	2.-	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO PARA PASOS PEATONALES	M2	630.00	526.54	-	526.54	\$ 110.00	\$ 57,919.40	
	3.-	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TERMOPLASTICA EN LINEAS DE CARRIL	ML.	9,564.80	9,260.40	-	9,260.40	\$ 37.50	\$ 347,265.00	
	4.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETAS BLANCAS Y AMARILLAS	PIEZA	3,937.00	-	-	-	\$ 40.00	\$ 0.00	
S U M A S									\$ 964,389.68	
N O T A S				(NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N.) LUGAR: CHIHUAHUA, CHIH. FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2017 ESTIMO:  ING. JESUS GARAY RUIZ REVISO:  Jefe Depto. ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEON ACEPTO:  Contratista OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS Vo.Bo.  Subdirector: ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA						

RELACION DE TRABAJOS DE SEÑALAMIENTO EN ZONA SUR-PONIENTE

VIALIDAD	TRAMO	LINEA GUION PINTURA HULE CLORADO	VALIDADO CON MUNICIPIO	LINEA GUION TERMOPLASTICA	VALIDADO CON MUNICIPIO	PASOS PEATONALES PINTURA HULE CLORADO	VALIDADO CON MUNICIPIO	PASOS PEATONALES PINTURA TERMOPLASTICA	VIALETAS	VALIDADO CON MUNICIPIO
CALLE 12	MELCHOR GUASPE Y PASEO BOLIVAR	1782	2109.8			160	145.96			
AVE. CUAUHEMOC	AV. MIRADOR Y E. TALAVERA	2500	1476.6			105	67.44			
CALLE 28	TEOFILO BORUNDA Y AVE. ZARCO	2002	1807.8			100	111.7			
AVE. ZARCO	E. TALAVERA Y AVE. S. TERRAZAS	7020	10642.6			105	145.24			
GERANIOS	PFC. JUVENTUD Y AVE S. TERRAZAS	954	915.1			55	56.2			
AVE. OCAMPO	AVE. 20 DE NOV. Y M. GUASPE	3768	4226.1			105				
AVE. OCAMPO	TEOFILO BORUNDA Y NIÑOS HEROES	516	200.2							
VIAL. CH-P	PFC. R. ALMADA Y FUENTES MARES	17000	9886.3	6000	5688.9				1087	
VIAL. CH-P			1962		731					
TEOFILO BORUNDA SUR	AVE UNIVERSIDAD Y UNIV. VALLE DE MEXICO	15600	11488.4	2800	2075.7				1470	
BLVD. FUENTES MARES	AVE. OCAMPO Y PROL. AVE. PACHECO	9300	10939.7						800	
AVE 20 DE NOVIEMBRE 1	CALLE 46 Y CALLE 38	880	732.8	764.8	764.8					
AVE 20 DE NOVIEMBRE 2	CALLE 38 Y CALLE 11	8072	6661.4		0				622	
JUSTINIANI	CALLE 12 Y CALLE 46	1570	1514.3							
AVE. FLORES MAGON	AVE. 20 DE NOV. Y C. TERRAZAS	6585	5741.4							
CALLE 1ro. DE MAYO	AVE. OCAMPO Y CALLE 28	3422	1718.4							
CALLE 80	SILV. TERRAZAS Y C. SAMANIEGO	2490	2791.4							
ERNESTO TALAVERA	CUAUHEMOC A 1 DE MAYO		652							
		83,461.00	75,466.30	9,564.80	9,260.40	630.00	526.54	-	3,979.00	
			7,994.70		304.40		103.46			3,979.00

67,919.67

473.89

VALIDACION CALLE 12a

LINEA CONTINUA

MELCHOR GUASPE- BOLIVAR				
20 NOV.	36.8	3	110.4	
BOLIVAR	22.2	2	44.4	154.8

GUION

F. MARES - ZUBIRAN	24			
ZUBIRAN- TAMBOREL	45			
TAMBOREL - URUETA	24			
URUETA - P. DE LEON	24			
P. DE LEON - JJ CALVO	24			
JJ CALVO - 20 NOV	168			
20 NOV - JIMENEZ	57			
JIMENEZ - BOLIVAR	25			
	<u>391</u>	5	1955	

PEATONALES

ZUBIRAN

FRENAJE	12.9	0.4	1	5.16	
TABLON	16	3	0.4	2	38.4
					43.56

TAMBOREL

FRENAJE	13	0.4		5.2	
TABLON	17	3	0.4	20.4	
					25.6

URUETA

FRENAJE	13	0.4		5.2	
TABLON	17	3	0.4	20.4	
					25.6

PONCE DE LEON

FRENAJE	13	0.4		5.2	
TABLON	17	3	0.4	20.4	
					25.6

JJ CALVO

FRENAJE	13	0.4		5.2	
TABLON	17	3	0.4	20.4	



RESUMEN	
METRO LINEAL	2109.8
METRO CUADRADO	145.96

25.6



VALIDACION CALLE CUAUHEMOC

LINEA CONTINUA

O.P	33	2	66	
P.O	28.9	2	57.8	
CONTINUA CENTRAL	96.4	1	96.4	
	57.9	1	57.9	
	49	1	49	
	80	1	80	
	194.5	1	194.5	
				601.6

GUION

SENTIDO O-P	87			
SENTIDO P-O	88			
	175	5		875

PEATONALES

AUDITORIO

FRENAJE	7.7	0.4	1	3.08
FRENAJE	9.4	0.4	1	3.76
TABLON	20	3	0.4	24

BANCOMER

FRENAJE	9.6	0.4		3.84
FRENAJE	9.9	0.4		3.96
TABLON	24	3	0.4	28.8

RESUMEN	
METRO LINEAL	1476.6
METRO CUADRADO	67.44



VALIDACION CALLE 28

LINEA CONTINUA CENTRAL

ZARCO - T. BORUNDA	361.1	1	361.1	
	40	1	40	
	91.9	2	183.8	
	11.5	2	23	
	28.9	1	28.9	
	305.7	1	305.7	942.5
BLANCAS Z - TB	40	1	40	
	28.9	1	28.9	
TB - Z	20.5	1	20.5	
	32.9	1	32.9	
	38	1	38	160.3

GUION

ZARCO - T. BORUNDA	74			
T. BORUNDA - ZARCO	67			
	141	5		705

PEATONALES


CANALIZADORA 28 Y 14 JULIO

CANALIZADORA	16	0.4	2.5	16
CANALIZADORA	11.4	0.4	2.5	11.4
CANALIZADORA	14.1	0.4	2.5	14.1
CANALIZADORA	14.4	0.4	2.5	14.4

CANALIZADORA 28 Y 2 DE ABRIL

CANALIZADORA	14.2	0.4	5	28.4
CANALIZADORA	13.7	0.4	5	27.4

RESUMEN	
METRO LINEAL	1807.8
METRO CUADRADO	111.7



VALIDACION CALLE ZARCO

LINEA CONTINUA CENTRAL

P.O	197.5	2	395	
	112.4	2	224.8	
	43.8	2	87.6	
	77.5	2	155	
	128	2	256	
	34.4	2	68.8	
	41.9	2	83.8	
	197.2	2	394.4	
	35.9	2	71.8	
	75.9	2	151.8	
	571.5	2	1143	
	33.5	2	67	
	410.9	2	821.8	
	23.6	2	47.2	
	145.5	2	291	
	39	2	78	
	125.7	2	251.4	
	224.2	2	448.4	
	148.1	1	148.1	
	25.3	1	25.3	
O.P	178.6	1	178.6	
	46	2	92	5480.8
BLANCAS P-O	26.6	1	26.6	
	41.9	2	83.8	
	33.5	2	67	
	23.6	2	47.2	
	39	2	78	
	29.4	1	29.4	
O-P	25.3	2	50.6	
	41.6	1	41.6	
	80.8	1	80.8	
	72.3	1	72.3	
	38.1	3	114.3	
	94.1	1	94.1	
	34.3	2	68.6	
	45.1	2	90.2	
	30.2	1	30.2	
	22.1	1	22.1	
				6477.6

GUION

TALAVERA- CASAVANTES	86			
CASAVANTES- 66	149			
66- GERANIOS	108			
GERANIOS- GLORIETA	92			
GLORIETA- GERANIOS	53			
GERANIOS- 66	105			
66- CASAVANTES	149			
CASAVANTES- TALAVERA	91			
	833	5		4165

PEATONALES

BANAMEX					
FRENAJE	8.8	0.4	1	3.52	
FRENAJE	8.5	0.4	1	3.4	
TABLON	22	3	0.4	26.4	33.32
PALMORE 1					
FRENAJE	9.7	0.4		3.88	
FRENAJE	9.8	0.4		3.92	
TABLON	25	3	0.4	30	37.8
PALMORE 2					
FRENAJE	9.6	0.4		3.84	
FRENAJE	9.8	0.4		3.92	
TABLON	25	3	0.4	30	37.76
SAGARPA					
FRENAJE	9.5	0.4		3.8	
FRENAJE	9.4	0.4		3.76	
TABLON	24	3	0.4	28.8	36.36

RESUMEN	
METRO LINEAL	10642.6
METRO CUADRADO	145.24




VALIDACION CALLE GERANIOS

LINEA CONTINUA CENTRAL

	170.5	1	170.5	
	98	1	98	
	102	1	102	
	45.9	1	45.9	
	26.8	1	26.8	
				443.2
BLANCAS	26.8	1	26.8	
	40.1	1	40.1	
				66.9

GUION

ZARCO - JUVENTUD	42			
JUVENTUD - ZARCO	39			
	81	5		405

PEATONALES

CANALIZADORA GERANIOS Y VIOLETAS

CANALIZADORA	15.9	0.4	5	31.8
CANALIZADORA	12.2	0.4	5	24.4

RESUMEN	
METRO LINEAL	915.1
METRO CUADRADO	56.2



VALIDACION OCAMPO 1

LINEA CONTINUA HULE CLORADO

CONTINUA AMARILLA				
F. MARES - JUSTINIANI	228.3	2	456.6	
JUSTINIANI - TAMBOREL	104.4	2	208.8	
TAMBOREL - URUETA	422.7	2	845.4	
URUETA - BOLIVAR	936.8	2	1873.6	
	56	1	56	
				3440.4
CONTINUA BLANCA				
	22.4	2	44.8	
	33.3	1	33.3	
	24.5	1	24.5	
	20.5	1	20.5	
	23.2	1	23.2	
	15.6	1	15.6	
	53.8	1	53.8	
	64.7			215.7
GUIONES				
20 NOV- F. MARES	114	5	570	
				570

RESUMEN	
METRO LINEAL HULE CLORADO	4226.1



VALIDACION OCAMPO 2

LINEA CONTINUA HULE CLORADO

CONTINUA BLANCA	19.8	3	59.4	200.2
	35.2	4	140.8	

RESUMEN	
METRO LINEAL HULE CLORADO	200.2



TERMOPLASTICO

GUIONES

UBICACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	TOTAL
F. MARES - SAMANIEGO	140	5	700
SAMANIEGO - 80	119	5	595
80A -120	138	5	690
120 - 90	90	5	450
90 - SAMANIEGO	177	5	885
SAMANIEGO - F MARES	141	5	705
			4025

LINEA CONTINUA

F.MARES - 120a	120 A - F. MARES
17	76.6
19.1	38.5
19	11.5
21.3	44
19.3	39.6
32.9	20.6
69.3	15
21.4	31.3
46.3	17.1
18.5	21
12.5	63.4
24.1	41.8
15.5	36.3
22	12.3
20	34.9
20.9	503.9
14.5	
10.4	
14.2	
15.9	
16.7	
20.5	
15.5	
14.9	
20.3	
17.9	
18	
14	
23	
19.5	
49.2	
47	
16.3	
26.9	
16.6	
14	
11.1	
13.3	
54.2	
24.5	
32.1	
31.5	
12	
27.3	
15.2	
13.5	
17.4	
14.8	
15.9	
13.5	
15	
44.3	
1160	1663.9




VALIDADO CH-P

LINEA CONTINUA HULE CLORADO

34.5
39.1
40.2
38.7
35.7
38.8
38.9
37.3
153
65
95
84.8
49.1
57.3
55
90.5
72.4
61.4
222.8
101.1
94.2
93.6
104.5
14.4
64.3
16.4
42.8
45.9
45.8
48.2
41.3
45.8
48.2
55.7
34.1
40.6
34.5
46.5
112.7
249.9
46.5
47.5
46.3
39.3
103.4
61.7
40.8
35.8
44.2
31.5
42.5
30.9
48.3
27.7
54.7
31.5
59.2
11.2
65.5
32.3
64.2
72.6
282
75.8
156.9
32.7
191
363
4829 2 9658

CIERRE DE LINEA CONTINUA

GRANDE	3.25	43	139.75
CHICO	1.15	77	88.55
			228.3

RESUMEN	
TERMOPLASTICO	5688.9
HULE CLORADO	9886.3



VALIDACION TEOFILO BORUNDA SUR

LINEA CONTINUA HULE CLORADO

UVM- PEDRO ZULOAGA				
CONTINUA BLANCA	2711.6	1	2711.6	
	79.9	1	79.9	
	44.5	1	44.5	
	60	1	60	
				2896
CONTINUA BLANCA	34.8	2	69.6	
CRUZ ROJA A UNIVERSIDAD	29.1	2	58.2	
	26.2	2	52.4	
	473.9	1	473.9	
	238.9	1	238.9	
	91.5	2	183	
	126.9	1	126.9	
	28.6	1	28.6	
	179.7	1	179.7	
	44.5	1	44.5	1455.7
CONTINUA AMARILLA				
CRUZ ROJA A UNIVERSIDAD	107.5	1	107.5	
	40.8	1	40.8	
	62.8	1	62.8	
	1066.3	1	1066.3	
	1186.5	1	1186.5	
	412.9	1	412.9	
	454.9	1	454.9	3331.7
GUIONES				
UVM- PEDRO ZULOAGA	272	5	1360	
	140	5	700	
				2060
CRUZ ROJA A UNIVERSIDAD	15	5	75	
	5	5	25	
	35	5	175	
	120	5	600	
	40	5	200	
	86	5	430	
	48	5	240	1745

LINEA CONTINUA TERMOPLASTICO

CONTINUA	20.4	1	20.4	
	95.3	1	95.3	
				115.7
GUIONES				
	392	5	1960	
				1960




RESUMEN	
METRO LINEAL HULE CLORADO	11488.4
METRO LINEAL TERMOPLASTICO	2075.7

VALIDACION FUENTES MARES

LINEA CONTINUA HULE CLORADO

CONTINUA BLANCA

PACHECHO A OCAMPO	845.7	1	845.7	
OCAMPO A PACHECHO	808.9	1	808.9	1654.6

CONTINUA AMARILLA

PACHECO A OCAMPO	3938.4	1	3938.4	
OCAMPO A PACHECO	2046.7	1	2046.7	5985.1

GUIONES

OCAMPO A PACHECHO	322	5	1610	
PACHECO A OCAMPO	338	5	1690	3300

RESUMEN	
METRO LINEAL HULE CLORADO	10939.7



VALIDACION 20 DE NOVIEMBRE

LINEA CONTINUA HULE CLORADO

CONTINUA BLANCA	49.8	2	99.6	
	59.6	2	119.2	
	99.6	2	199.2	
	103.7	2	207.4	
	58.7	2	117.4	
	-5	2	-10	732.8

LINEA CONTINUA TERMOPLASTICO

CONTINUA	35.1	2	70.2	
	45	2	90	
	48.3	2	96.6	
	39	2	78	
				334.8

GUIONES				
F. MAGON - CH-P	44	5	220	
CH-P - F. MAGON	42	5	210	
				430

RESUMEN	
METRO LINEAL HULE CLORADO	732.8
METRO LINEAL TERMOPLASTICO	764.8



VALIDACION 20 DE NOVIEMBRE

LINEA CONTINUA HULE CLORADO

CONTINUA BLANCA			0	
C 11 A C 38	216.4	2	432.8	
	119	2	238	
C 38 A C 11	603	1	603	1273.8
CONTINUA AMARILLA				
C 11 A C 38	1592.8	1	1592.8	
C 38 A C 11	1592.8	1	1592.8	3185.6
CIERRES AMARILLA	48	1.5	72	72
GUIONES				
C 11 A C 38	238	5	1190	
C 38 A C 11	188	5	940	2130

RESUMEN	
METRO LINEAL HULE CLORADO	6661.4



VALIDACION JUSTINIANI

LINEA CONTINUA HULE CLORADO

CONTINUA BLANCA

12- OCAMPO	25.6	3	76.8	
OCAMPO- CH-P	27.5	3	82.5	
				159.3

GUIONES

12 - OCAMPO	12	5	60	
OCAMPO- CH-P	36	5	180	
CH-P - 46	223	5	1115	
				1355

RESUMEN	
METRO LINEAL HULE CLORADO	1514.3



VALIDACION FLORES MAGON

LINEA CONTINUA CENTRAL

ZARCO - 20 NOV.	222.7	2	445.4	
	22.3	2	44.6	
	534	2	1068	
	84.4	2	168.8	
	21.4	2	42.8	
	153.3	2	306.6	
	32	2	64	
	112.3	2	224.6	
	168.6	2	337.2	
	35.1	2	70.2	
				2772.2
BLANCAS Z - 20 NOV	22.3	2	44.6	
	84.4	1	84.4	
	21.4	2	42.8	
	32	2	64	
	35.1	2	70.2	306
20 NOV. - ZARCO	34.4	2	68.8	
	16.7	2	33.4	
	25.8	2	51.6	
	13.5	2	27	
	26.2	2	52.4	233.2

GUION

ZARCO - 20 NOVIEMBRE	237		
20 NOVIEMBRE - ZARCO	249		
	486	5	2430

RESUMEN	
METRO LINEAL	5741.4



VALIDACION CALLE PRIMERO DE MAYO

LINEA CONTINUA HULE CLORADO

CONTINUA AMARILLA

28- TALAVERA	276	1	276	
TALAVERA- 36	253.5	1	253.5	
36- 22	263.8	1	263.8	
22-	18.9	1	18.9	
	130.4	1	130.4	
	16.5	1	16.5	
	84.6	1	84.6	
	19.3	1	19.3	
				1063

BLANCA

18.9	1	18.9	
30.2	1	30.2	
16.5	1	16.5	
19.3	1	19.3	
20.5	1	20.5	
			105.4

GUIONES

28- OCAMPO	53	5	265	
OCAMPO - 28	57	5	285	
				550

RESUMEN	
METRO LINEAL HULE CLORADO	1718.4



VALIDACION CALLE 80

LINEA CONTINUA HULE CLORADO

CONTINUA AMARILLA				
SAMANIEGO	1243.2	1	1243.2	
	35.1	1	35.1	
	42.6	1	42.6	
BLANCA				1320.9
	35.1	1	35.1	
	25.4	1	25.4	
				60.5
GUIONES				
SAMANIEGO - CH-P	137	5	685	
CH-P - SAMANIEGO	145	5	725	
				1410

RESUMEN	
METRO LINEAL HULE CLORADO	2791.4



VALIDACION TALAVERA

LINEA CONTINUA HULE CLORADO

CONTINUA AMARILLA 652 1 652 652

RESUMEN	
METRO LINEAL HULE CLORADO	652




CALLE 12



[Handwritten signature or stamp]

CALLE CUAHUTEMOC

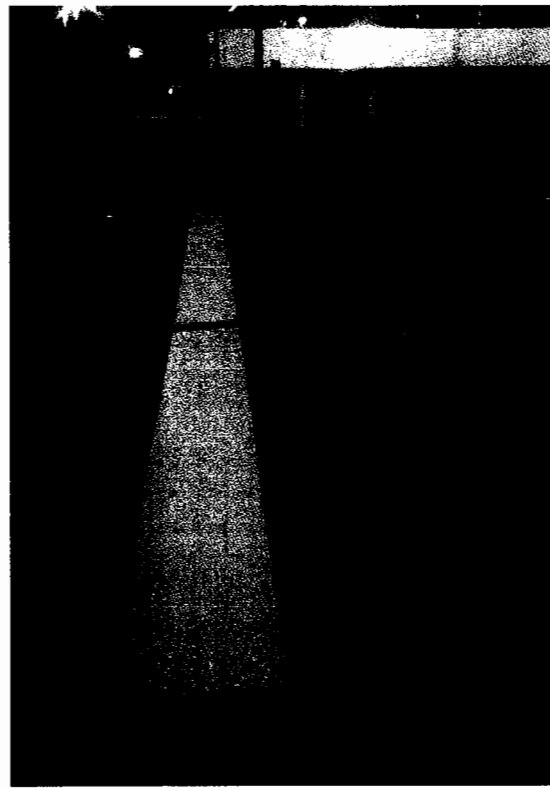


[Handwritten signature]

CALLLE 28




[Handwritten signature]

AV ZARCO




[Handwritten signature]

CALLE GERANIOS



[Handwritten signature]

CALLE OCAMPO

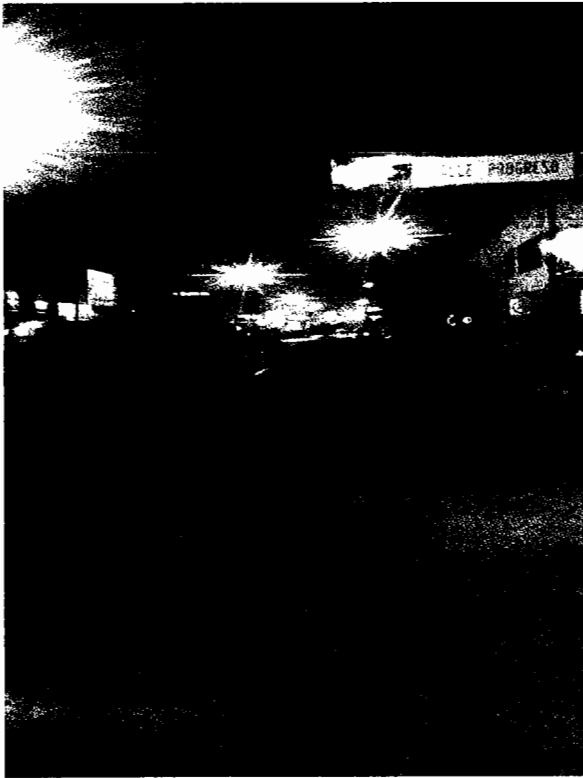

[Handwritten signature]

VIALIDAD CH-P





TEOFILO BORUNDA SUR



[Handwritten signature]

BOULEVARD FUENTES MARES

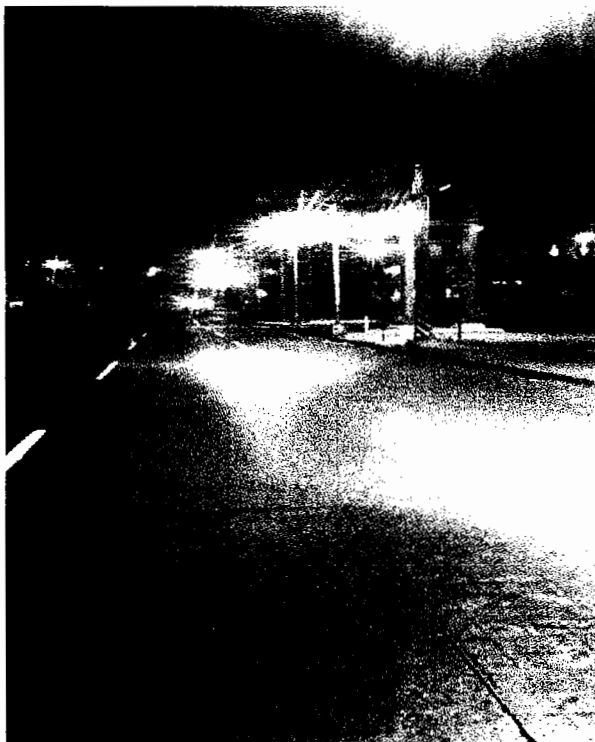

[Handwritten signature]

AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE




[Handwritten signature]

CALLE JUSTINIANI




[Handwritten signature]

CALLE FLORES MAGON

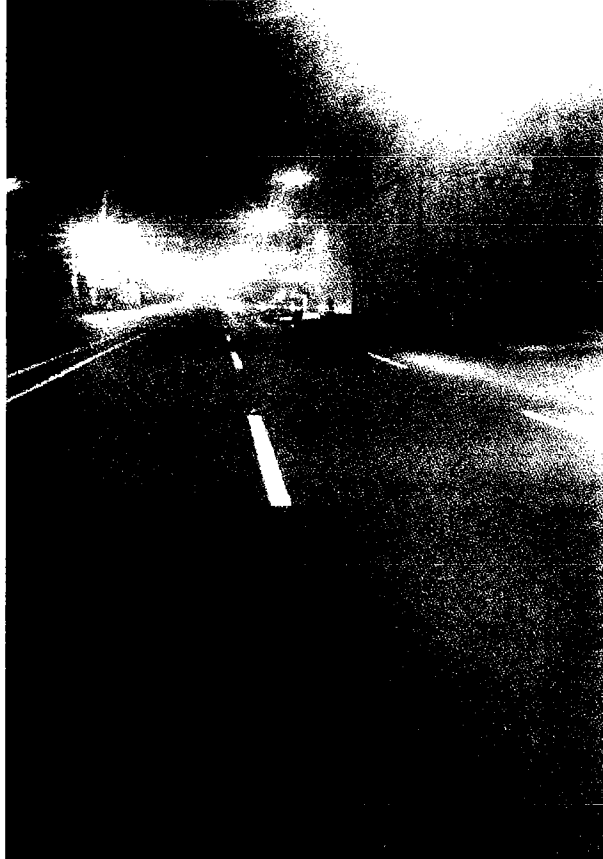

[Handwritten signature]

CALLE 1 DE MAYO

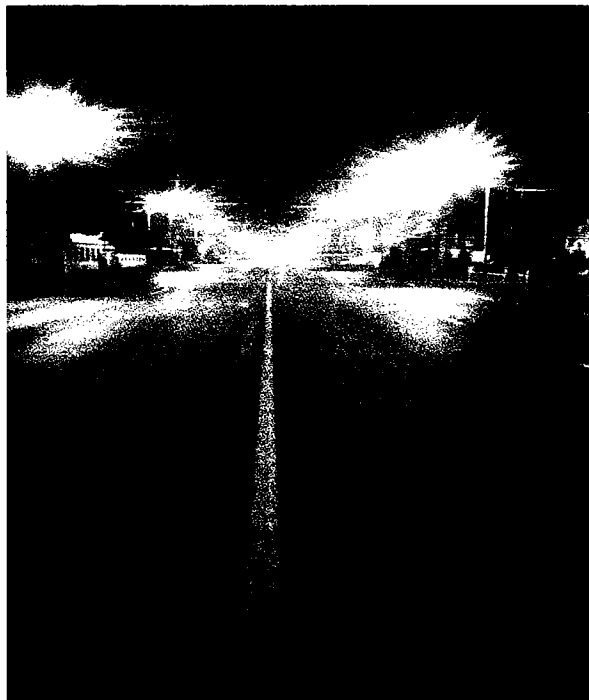

[Handwritten signature]

CALLE 80



[Handwritten signature]

CALLE ERNESTO TALAVERA



[Handwritten signature]

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: SEÑALIZACIÓN EN PAVIMENTOS DE LAS VIALIDADES
"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CALLES Y AVENIDAS EN ZONA
SUR- PONIENTE DE LA CIUDAD"
CONTRATISTA: OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS.
CONTRATO: 122/2017
MONTO: \$ 1,203,915.85
FECHA DE INICIO: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017

FIRMAS

RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.



RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA



①

- CALLE 12 -

19- SEPTIEMBRE- 2017

10:00 PM



SE INICIAN TRABAJOS DE PINTURA DE CARRETES CON PINTURA TRAFICO
BASE SOLVENTE COMENZANDO EN CALLE MELCHOR GONZALEZ HACIA EL NORTE
TERMINANDO EN PASEO BOLIVAR. 3:15 AM.

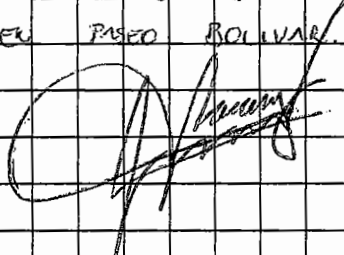

20- SEPTIEMBRE- 2017

10:30 P.M.

SE INICIAN TRABAJOS DE TRAZO Y PINTURA DE PASOS PEATONALES, TRAZO
EN TALLER DE 40 CM X 3.00 MTS EN COLOR BLANCO Y AMARILLO
TERMINANDO 4:10 AM.

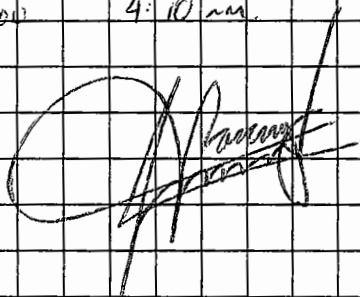

- AVE. CUANTITMOC -



21 SEPTIEMBRE 2017

10:30 PM.

SE INICIAN TRABAJOS DE PINTURA EN CARRETES DE AVE. CUANTITMOC EN SENTIDO
OESTE A PONIENTE, APLICANDO COLOR BLANCO EN GUIONES DE 5 M. Y
AMARILLO EN CAMELON SIMPLADO

SE INICIA TRAZO Y PINTURA DE PASOS PEATONALES A UN LADO DEL
MIDOTRIO MUNICIPAL



SE TERMINA 3:45 AM.



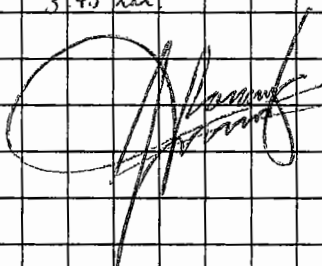


24 SEPTIEMBRE 2017

10:00 PM.

SE INICIA TRAZO DE PEATONAL EN AVE. CUANTITMOC Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE
PINTANDO EN TENSIONES BLANCO Y AMARILLO DE 40 CM CADA UNO



- CALLE 28 -	24-SEPT-2017
12:45	
SE INICIAN TRABAJOS DE TRAZO PARA PASOS PEATONALES CON LINEAS	
PARALELAS CANALIZADORAS DE 40 CM DE ANCHO EN COLOR BLANCO EN	
CRUCES DE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE 14 DE JUNIO	
SE TERMINA A 4:05 PM	
 	
- CALLE 28 -	25-SEPT-2017
10:30 PM.	
SE INICIAN TRABAJOS DE PINTURA DE CARRETES EN COLOR BLANCO EN SENTIDO	
DE NIE. CUANTITATIVO HACIA TEOFILO BORRERO	
SE APLICA LINEA CENTRAL DIVISORIA EN COLOR AMARILLO CONTINUA	
TERMINANDO 1:50 AM	
 	

-CALLE GERANIOS-



25 SEPT - 2013





10:15 PM

SE INICIO TRABAJO DE PINTURA DE CARRETES DE SUR A NORTE CON
LINEA DE DIVISION CENTRAL EN COLOR AMARILLO

SE PINTARON LINEAS CANALIZADORAS EN PASO PEATONAL EN CALLE
GERANIOS Y VIOLETAS

TERMINANDO 3:50 AM.





- AVE Ocampo -		26-SEPT-2017	
10:30 PM.			
SE INICIO TRABAJO DE PINTURA DE CARRETES EN SENTIDO NORTE-SUR			
DE PASAD BOLIVAR A MELCHOR GUASPE			
SE PINTO LINEA AMARILLA CONTINUA A UN LADO DE CARRETERA CONFIRMADO			
DE VIVEROS			
JECMM			
			
- AVE Ocampo -		27-SEPT-2017	
10:15			
SE INICIO TRABAJO PARA PINTURA DE CARRETES EN AVE Ocampo DE			
CALLE PROGRESO A NIÑOS HEROES			
11:45			
			

-VIALIDAD CH-P-

28-SEPT-2017

10:00

SE INICIA TRABAJO DE PINTURA EN CARRILES CON PINTURA TERMOPLASTICA EN
SENTIDO PONIENTE - ORIENTE HASTA EL CRUCE CON AVE. 70 DE NOVIEMBRE
Y EN SENTIDO ORIENTE - PONIENTE HASTA CALLE P.R. ALMAZON
TERMINANDO 4:05 PM





-VIALIDAD CH-P-

1-OCTUBRE-2017

10:30



SE REANUDAN ACTIVIDADES DE APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA
EN CARRILES DE CALLE SUMINISTRO A FUENTES MARES
TERMINANDO 4:00 PM.



- VIALIDAD CH-F -

2-OCTUBRE-2017

SE REALIZAN ACTIVIDADES PARA PINTURA DE LINEAS DE BATIENTAS EN COLOR
BLANCO CON PINTURA TERMOPLASTICA.








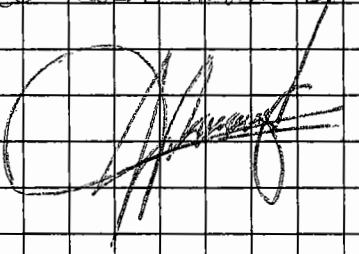

- VIALIDAD CH-P

3-OCTUBRE-2017

10:30

SE INICIA TRABAJO DE APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO BASE SOLVENTE
PARA CARRETERA SIMULADO
TERMINANDO 4:30PM.

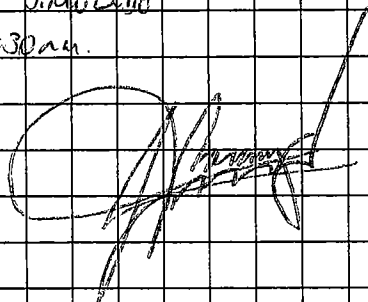- TEÓFILO BORRERO SUR -		4. OCTUBRE - 17
10:15	SE INICIA TRABAJO DE APLICACIÓN DE PINTURA EN CARRETES EN SENTIDO (ORIENTE - PONIENTE) PONIENTE - ORIENTE DE UUM A EL RELIZ Y DE CALLE MARIA LUISA A LA UNIVERSIDAD	
5:00 PM		
- TEÓFILO BORRERO SUR -		8. OCTUBRE - 17
8:00 AM	SE INICIA TRABAJO PARA APLICACIÓN DE PINTURA TERMO PLASTICA EN CARRETES DE EL RELIZ HASTA LA CALLE MARIA LUISA EN COLOR BLANCO	
4:00 PM		

-FUENTES MARTES-



8-OCTUBRE-2017

9

10:00 PM.

SE INICIA TRABAJO PARA APLICACION DE PINTURA VIAL EN LINEAS DE CARRE
EN SENTIDO OCCIDENTE-ORIENTE INICIANDO EN INTERSECCION CON AVE. OCAMPO
HASTA PROLONGACION AVENIDA PACHECO, COORDINANDO ACTIVIDADES ANTES DEL
PUENTE DE VIALIDAD CHP SENTIDO ORIENTE-POCIENTE

4:45 AM.





-FUENTES MARTES-

9-OCTUBRE-2017

10:35 PM.

SE REINICIA TRABAJOS DE APLICACION DE PINTURA VIAL CONTINUANDO CON
LINEAS DE CARRE ANTES DEL PUENTE DE VIALIDAD CH-P TERMINANDO EN
INTERSECCION CON AVE. OCAMPO. SE INICIA LA APLICACION DE LINEA CONTINUA
EN COLOR AMARILLO A UN LADO DEL CARRE CONTINUANDO PARA VIALIDAD ANTES
PROLONGACION AVE. PACHECO TERMINANDO EN INTERSECCION AVE. OCAMPO

4:50 AM.



- 20 DE NOVIEMBRE -

10- OCTUBRE - 2017

10

10:10 PM.

SE INICIA TROGATO DE APLICACION DE PINTURA TERMOPlastica EN CARRILES
Y LINEAS DE FRENATE
2:00 AM.

SE APLICÓ PINTURA BASE SOLVENTE AMARILLO PARA CAMELLÓN SIMULADO
3:30 AM. EN TRAMO DE VIAS CH-D A INTERSECCION CON FLORES MAGDALENA.

- 20 DE NOVIEMBRE -

10:30 PM.

SE INICIA APLICACION DE PINTURA BASE SOLVENTE BLANCO PARA CARRILES
EN SENTIDO ORIENTE - PONIENTE DE INTERSECCION CON FLORES MAGDALENA HASTA
CAJON 11 TERMINANDO EN FLORES MAGDALENA
3:45 AM.



- 20 DE NOVIEMBRE -

11-OCT-2017

11

10:00

SE INICIA TRABAJO DE APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO BASE SOLAMENTE COLOR
AMARILLO PARA CARRETERA SIMULADO DE LA INTERSECCION A FLORES MAGDALENA
EN LA CALLE 11 APLICANDO CIERRES EN LINEAS PARALELAS
00 AM.





- JUSTINIANO -



15-OCTUBRE-2017

10:45



SE INICIA TRABAJO DE APLICACIÓN DE PINTURA EN LINEAS DE CARRIL
INICIANDO EN CALLE 12ª TERMINANDO EN LA CALLE 46
1:15 PM



- FLORES MAGON - 16-OCTUBRE-2017
11:00 AM.
SE INICIO TRABAJO DE APLICACION DE PINTURA EN LINEAS DE CARRE
EN SENTIDO ORIENTE - PONIENTE INICIANDO EN INTERSECCION CON 70 DE MONTEMORE
HASTA CASOLINEM EN INTERSECCION CON AVE. TERCERO
2:20 AM.



- FLORES MAGON - 17-OCTUBRE-2017
10:15 PM.
SE REINICIO TRABAJO DE PINTURA EN CARRETERON SIMULADO CON COLOR
MARILLO APLICANDO LOS CIERRES EN LINEAS PARALELAS
2:30 AM.




- PRIMERIO DE MAYO -

18 OCTUBRE - 2017

10:39

SE INICIAN TRABAJOS DE APLICACION DE PINTURA EN LINEAS DE CARRIL CON TRAFICO BASE SILVESTRE COLOR BLANCO Y EN LINEA CONTINUA DIVISORIA DE SENTIDO EN COLOR AMARILLO EN TRAMO DE AVE. OCAMPO A CALLE 28

2:45




- CALLE 80 -

18 OCTUBRE - 2017

3:00 PM.

SE INICIAN TRABAJOS DE APLICACION DE PINTURA EN LINEAS DE CARRIL COLOR BLANCO DE LA CALLE SAMANIEGO A SILVESTRE TERRAZAS. TERMINANDO EN SAMANIEGO

4:50





- Calle 80' -

22 OCTUBRE 2017

10:30 PM

SE INICIAN TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA DE LINEA DIVISORIA
EN COLOR AMARILLO EN TRAMO DE SILVESTRE TERRAZA A CALLE
SAMANIEGO

12:20





- ERNESTO TRAVEIRA -

26 OCTUBRE 2017

10:15

SE INICIAN TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA PARA LINEA DE
DIVISIÓN DE SENTIDOS DE LA AVE. CUAUHTEMOC A LA PRIMERA DE MAYO

11:50



-AVE ZALCO

29 OCTUBRE 2017

7:00 AM



SE INICIA CON TRABAJOS DE PINTURA DE PASO PENTAGONES EN COLOR
BLANCO Y AMARILLO EN TABLEROS DE 40 CM
10:15 PM

PINTURA BLANCA TRAFICO BASE SOLVENTE EN LÍNEAS DE CARRIL EN
SENTIDO ORIENTE - OCCIDENTE EN TRAMO DE INTERSECCIÓN AVE CUMHUTEMAC
HACIA INTERSECCIÓN CON FLORES MAGNOLIA

TERMINANDO 1:30 AM.

INICIO DE PINTURA DE CAMELLÓN SIMULADO EN COLOR AMARILLO EN LÍNEA
CONTINUA Y CIERRES DE PARALELAS

TERMINANDO TRABAJO VIERNES 30 OCTUBRE SIENDO 4:15 AM.





Afianzadora
SOFIMEX S.A.

Bld. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes
Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-
2500

R.F.C. ASG-950531-ID1
www.sofimex.com.mx

POLIZA DE FIANZA

FIANZA
2146487
MOVIMIENTO
EMISION
DOCUMENTO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	CHIHUAHUA CHIHUAHUA, A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017
------------------------------	---

MONTO DEL MOVIMIENTO	MONTO TOTAL DE LA FIANZA	MONEDA	OFICINA	AGENTE
\$139,654.23	\$139,654.23	PESOS	2	2525

RAMO	SUBRAMO
ADMINISTRATIVAS	OBRA

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta por la suma de:

\$139,654.23 ("CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N.")

POR LA SUMA DE \$139,654.23 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS /100 M.N.). CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO INCLUYENDO EL I.V.A.

ANTE: TESORERIA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

PARA GARANTIZAR POR EL C. OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS CON DOMICILIO EN CALLE 4TA, NO. 6901-A, COLONIA NOMBRE DE DIOS, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. CON R.F.C. HEF0710611388, EL EXACTO Y TOTAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA-PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. 144/2017, DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2017, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, REPRESENTADO POR LOS CC. LIC. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN, LIC. CÉSAR GUSTAVO JÁUREGUI MORENO, C.P. AIDA CHACÓN, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE REGIDORES DE HACIENDA Y PLANEACIÓN, RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA NUESTRO FIADO C. OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS, RELATIVO A TRABAJOS REFERENTES A SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CALLES Y AVENIDAS EN ZONA SUR PONIENTE DE LA CIUDAD, CON UN IMPORTE TOTAL CONTRATADO DE \$ 1,396,542.38 (UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE I.V.A.

ESTA INSTITUCIÓN DECLARA EXPRESAMENTE: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y ESTARA EN VIGOR HASTA QUE LA OBRA HAYA SIDO RECIBIDA EN SU TOTALIDAD POR EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, ASI COMO DURANTE LA SUBSTANTACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES, MEDIOS DE DEFENSA O DE LOS JUICIOS DE SE INTERPONGAN POR LAS PARTES CONTRATANTES Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME. B) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO-A QUE SE REFIERE LA FIANZA O EXISTE ESPERA, LA VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, MANIFESTANDO EN ESTE ACTO PARA ELLO; SU EXPRESA CONFORMIDAD, HACIENDO RENUNCIA EXPRESA AL BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, POR EL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS; C) QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO, AUN CUANDO UNA PARTE DE ELLA SE SUBCONTRATE CON AUTORIZACIÓN DE EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; D) QUE EL EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA Y LA EJECUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LA OBRA GARANTIZADA, CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN DE CARÁCTER INDIVISIBLE; E) SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS, HACE RENUNCIA EXPRESA AL BENEFICIO DE PROPORCIONALIDAD QUE PUDIERA CORRESPONDERLE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2842 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA QUE PUDIERE REALIZAR EL FIADO; F) QUE ESTA FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN DEL CONTRATO, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL FIADO, SE PAGARÁ EL MONTO TOTAL GARANTIZADO EN ESTA PÓLIZA; G) QUE LA OBLIGACIÓN A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE ACTUALIZA CON EL INCUMPLIMIENTO DEL FIADO, Y SERÁ EXIGIBLE A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SE RESCINDA EL CONTRATO DE OBRA GARANTIZADO; H) QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; I) QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA SOMETERSE EXPRESAMENTE A LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 178, 282, 283, 289 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS; J) QUE EN CASO DE NO CUBRIR EL MONTO DE ESTA FIANZA EN EL PLAZO QUE SE ESTABLECE EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PAGARÁ POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UN INTERÉS CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, EN LA RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 2104, 2108, 2109 Y 2110 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL; K) QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE ESTA PÓLIZA REPRESENTA, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ESTATALES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO; L) QUE LA AFIANZADORA RECONOCE EL CARÁCTER DE LOS FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES QUE COMPARECIERON POR PARTE DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA; M) QUE LA AFIANZADORA ES CONFORME EN QUE LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO LE SEAN FORMULADOS POR CONDUCTO DE SUS AGENTES AUTORIZADOS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., N) QUE LA AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TRASVIÑA Y RETES NO. 1311, COLONIA SAN FELIPE, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.; O) TODA ESTIPULACIÓN QUE APAREZCA IMPRESA POR FORMATO POR PARTE DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. QUE CONTRAVENGA LAS ESTIPULACIONES AQUÍ ASENTADAS, LAS CUALES COMPRENDEN EL PROEMIO Y LOS INCISOS DEL A) AL O), SE CONSIDERAN NO PUESTAS.

*** FIN DE TEXTO ***

	FIRMA	
ROSAS XOSPA ENRIQUE GERENTE DE OFICINA		
SELLO DIGITAL		
23f55Tcc094nHSH2EaRTW78zeRIP6g0z0a93SeCCM7sNa+Do+wcA4f6y9YmbZs3srp64x8doYJagRntxWvVRcs8jw12Ych6pZxqTjuRnYGoW7oOcmz.fsyvb+885gyNmYIXRcdqufWxQmJWGJZC9jC4dypZRP6g=		
ROSAS XOSPA ENRIQUE		
