

CONTROL DE TRAMITE DE ESTIMACIONES

DATOS GENERALES			
FOLIO	NUMERO DE ESTIMACION	FACTURA	SALDO NETO
	1 (UNO)		570.247,42
OBRA CONSTRUCCION DE MURO EN EL ARROYO EL PICACHO			
CONTRATISTA:	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FARES SA DE CV	UBICACIÓN	COLONIA CDP
RESIDENTE	ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL	CONTRATO No.	145/2017

RESUMEN DE AUTORIZACIONES				
AUTORIZACION DE:	FECHA Y FIRMA RECIBIDO	FECHA Y FIRMA ENTREGA	CONTROL DE OBRA FECHA Y FIRMA RECIBIDO FIRMA Y FECHA ENTREGA	
☒ RESIDENTE	16/Nov/2017 <i>[Firma]</i>		14-Nov.-17 Carmen Moreno.	
☐ JEFE DE OFICINA				
☐ JEFE DEPARTAMENTO				
☒ DIRECTOR				
☐ DEP. SERV. ADM.				

EN CASO DE 1ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	14-Nov.-17
EXPLICACION	Corregir el periodo de la estimación y el monto de lo contratado.

EN CASO DE 2ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	

EN CASO DE 3ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	



Dirección de Obras Públicas Municipales
Subdirección de Infraestructura Social
Departamento de Conservación de la Infraestructura Urbana

NOMBRE Y FECHA DE ENTREGA EN CONTROL DE OBRA



Inmobiliaria y Constructora Fares S.A. de C.V.

CHIHUAHUA, CHIH. 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017

ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No. I (UNO CON FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
CONSTRUCCION DE MURO EN EL ARROYO EL PICACHO

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 18 DE SEPTIEMBRE A 17 DE
OCTUBRE DEL 2017
POR UN SALDO NETO FACTURADO DI \$570.247,42 CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y
AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FARES SA DE CV

RECIBE

ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL

R. FLORES MAGON #5021 COL. CUARTELES CP.31020 TEL: 411-44-39 CHIHUAHUA, CHIH.



Factura

SERIE: E

FOLIO: 94

FECHA: 15/11/2017 13:00:28

Documento Válido

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FARES SA
DE CVLugar de Expedición: AVE FLORES MAGON 5021, ZARCO, 31020,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICOICF900117PL2 AVE FLORES MAGON No. 5021 ZARCO,
CHIHUAHUA 31020
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: MCI651010V22
 Domicilio: MINA No. 408
 Teléfono:
 Ciudad: CHIHUAHUA

Colonia: CENTRO
 Estado: CHIHUAHUA

C.P.: 31000
 País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ARROLLO PICACHO UBICADO EN CALLE 19 DE JULIO		
		ESTIMACION NUMERO 1 (UNO)		
		SEGUN CONTRATO NUM. 145/2017		
		FIRMA DEL CONTRATISTA		
1.00	No aplica	ALCANCE DE LA ESTIMACION \$491,592.60 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -	491,592.60	491,592.60
		RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		
		0.2% I.C.I.C. \$ 983.19		
		0.2 INSTITUTO		
		0.2 D.I.F. \$983.19		
		SUMA \$1,966.37		
		NETO A RECIBIR \$568,281.05		

Importe con letra

QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N.

SUBTOTAL: 491,592.60

I.V.A.: 78,654.82

TOTAL: 570,247.42



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. Versión: 3.2
 *Efectos fiscales al pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY
 PERSONAS MORALES
 Metodo de Pago: 99
 Cuenta:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000303163625

Folio fiscal: EB0A3B6B-7298-4739-BD22-8B862E411949

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Noviembre 15 2017 - 14:00:31

Sello digital del CFDI

XBD+LW6EMosxHuDNp7v3K1jBz0tBfnF09R4/EKVYCjRjG2+k4wBD/T35n2DkFAQwdueRi64vEuWWB4s6P4nF
 Myvww+X6NqO2QTnmLpVlugA3T/1I2XF0Xg/ohAR4SkI9j5x61aKy8n0oJgTSb2YIhySiQVMJ6ae9InmYzQ5yl=

Sello del SAT

MowX7Qh4M/LPYUeoBmnz2oPUG4aiLloCfgr6nLW9UJHhefe4GQrgxGYgjxFdu3rhuMgQP624Jt3
 kM7ImVmAnuXLCJaSY4Nck5WAIQ2WceXdtA7LQaOagWr44QwAlacU4aRbbxFQ6HknC4DK1RQ29x9X
 hRa2fyopgXJS/A3rQve0ApjuJ20b0rPaIfPWPWni1X8D7/o2cOP0NJ/eOT2/xN71UleFAKIMA7CXTKn
 S5942uyAb4zhxQd6rZ0SfxEm6ALBv/z/oxCLk50mrE1TCOoawanBq47AioB Y8kIV5MyhVHdyHqUBba
 /PJGpFh4KbmL6IUkQ/n2eg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,0]EB0A3B6B-7298-4739-BD22-8B862E411949[2017-11-15T14:00:31]XBD+LW6EMosxHuDNp
 7v3K1jBz0tBfnF09R4/EKVYCjRjG2+k4wBD/T35n2DkFAQwdueRi64vEuWWB4s6P4nFMyvww+X6NqO
 2QTnmLpVlugA3T/1I2XF0Xg/ohAR4SkI9j5x61aKy8n0oJgTSb2YIhySiQVMJ6ae9InmYzQ5yl=[0000
 1000000404486074]

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

			
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ICF900117PL2	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FARES SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EB0A3B6B-7298-4739-BD22- 8B862E411949	2017-11-15T13:00:28	2017-11- 15T14:00:31	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$570,247.42	ingreso	Vigente	

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 145/2017	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE MURO EN EL ARROYO EL PICACHO	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	\$ 570.251,70 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 18 DE SEPTIEMBRE A 17 DE OCTÚBRE DEL 2017	
UBICACIÓN: COLONIA CDP	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 570.247,42 CON IVA
CONTRATISTA: INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FARES SA DE CV	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	
RFC iycfares@live.com.mx	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 570.247,42 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 461.169,87	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ 23.697,88	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 491.592,60	

DESCUENTOS

	\$	
0.2% C.M.I.C.	\$	983,19
0.2% D.I.F.	\$	983,19
SUMA DESCUENTOS	\$	1.966,38

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$	491.592,60
AMORT ANTICIPO	\$	0,00
SUB-TOTAL	\$	491.592,60
I.V.A.	\$	78.654,82
TOTAL	\$	570.247,42

(CON LETRA)

(QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	1.966,38
SALDO NETO A RECIBIR	\$	568.281,04

AUTORIZO

ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL
RESIDENTE D.O.P.M

Vo. Bo.

ING. JAVIER VILLARREAL ROSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

ELABORO

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FARES SA DE CV
CONTRATISTA

REVISO

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN
SOCIAL

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



CHIHUAHUA, CHIH.,

10 DE NOVIEMBRE DEL 2017

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 568.281,04
(QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 4/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 (UNO) CONTRATO No. 145/2017 POR LA CANTIDAD DE: \$ 570.251,70 INCLUYE CONVENIO
0,00 POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE MURO EN EL ARROYO EL PICACHO

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 491.592,60

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 491.592,60

IVA \$ 78.654,82

TOTAL \$ 570.247,42

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

C.M.I.C. 0.2% 983,19

D.I.F. 0.2% 983,19

SUMA 1.966,38

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 570.251,70
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 570.247,42
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 570.247,42
POR EJERCER	\$ 4,28

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.5% SFP.

0.2% C.M.I.C.

ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -	\$ -

RECIBIMOS

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FARES SA DE CV

lycfares@live.com.mx



OBRA: CONSTRUCCION DE MURO EN EL ARROYO EL PICACHO
MUNICIPIO: COLONIA CDP
CONTRATISTA: INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FARES SA DE CV
PERÍODO: 18 DE SEPTIEMBRE A 17 DE OCTUBRE DEL 2017
ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
No. CONTRATO: 145/2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
NORMALES		\$ 461.169,87
EXCEDENTES		\$ 30.422,74
EXTRAS		\$ -

SUBTOTAL	\$	491.592,60
I.V.A.	\$	78.654,81
TOTAL	\$	570.247,41

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FARES S.A DE C.V
ING. EVERERDO HUERECA TAPIA

ING. SANTIAGO PRIETO



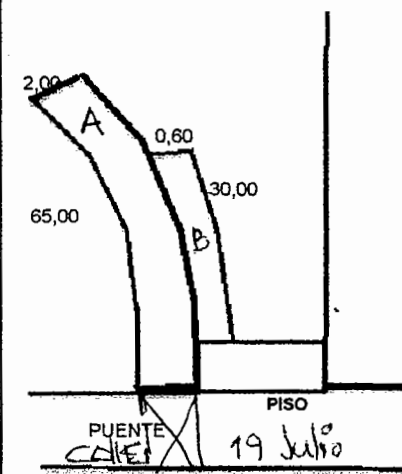
OBRA:	CONSTRUCCION DE MURO EN EL ARROYO EL PICACHO
MUNICIPIO:	COLONIA CDP
CONTRATISTA:	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FARES SA DE CV
PERIODO:	18 DE SEPTIEMBRE A 17 DE OCTUBRE DEL 2017
ESTIMACIÓN No.	1 (UNO)
No. CONTRATO:	145/2017

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO			
OBRA NORMAL								\$	461.169,87

1	TRAZO Y NIVELACION	M2	100,00		0,00	100,00	\$ 5,36	\$ 536,00
2	EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDO HASTA 2.00MTS CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	150,00		0,00	148,00	\$ 156,70	\$ 23.191,60
3	EXCAVACION EN MATERIAL "C" POR METROS MECANICOS INCLUYE ACARREO A UN PUNTO DE OBRA	M3	8,00		0,00	0	\$ 545,52	\$ -
4	MAMPOSTERIA DE 3 CLASE A BASE DE PIEDRA DE CORTE ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE DE RESISTENCIA F'C=60 KG/CM2	M3	279,00		0,00	278,70	\$ 1.470,28	\$ 409.767,04
5	CHAPEO DE CORONA EN ALEROS CON MORTERO CEM-ARENA DE 60KG/CM2 DE 4 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO ACABADO PILIDO	M2	35,00		0,00	31,75	\$ 307,07	\$ 9.749,47
6	RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL CALIZO EN CAPAS DE 20 CMS.	M3	289,00		0,00	0,00	\$ 76,00	\$ -
7	RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS.	M3	5,00		0,00	5,00	\$ 75,94	\$ 379,70
8	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	M3	70,00		0,00	70,00	\$ 124,00	\$ 8.680,00
9	DEMOLICION DE CONCRETO DE 12 CM DE ESPESOR	M2	18,80		0,00	0	\$ 75,46	\$ -
10	PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR CON SIP-TRIP @ 4 MTS INCLUYE: AAFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO A VUELTA DE PLANA	M2	19,20		0,00	17,28	\$ 491,92	\$ 8.500,38
11	LIMPIEZA DE OBRA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	56,00		0,00	56,00	\$ 6,53	\$ 365,68
12								
13	OBRA EXCEDENTE							\$ 30.422,74
14								
1	TRAZO Y NIVELACION	M2	100,00		0,00	48,00	\$ 5,36	\$ 257,28
7	RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS.	M3	5,00		0,00	271,15	\$ 75,94	\$ 20.591,13
8	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	M3	70,00		0,00	74,00	\$ 124,00	\$ 9.176,00

CONTRATO:	145/2017	TRAMO:	MURO MAMPOSTERIA
OBRA:	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 19 DE JULIO CRUCE DEL ARROYO PICACHO	CONTRATISTA	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FARES S.A DE C.V
No. DE ESTIMACION:	1 (UNO)	PERIODO	

CONCEPTO	TRAZO Y NIVELACION	OPERACIONES ARITMETICAS			
TRAZO Y NIVELACION					
		ANCHO	LARGO	AREA	M2
	A	2,00	65,00	130,00	
	B	0,60	30,00	18,00	
				148,00	

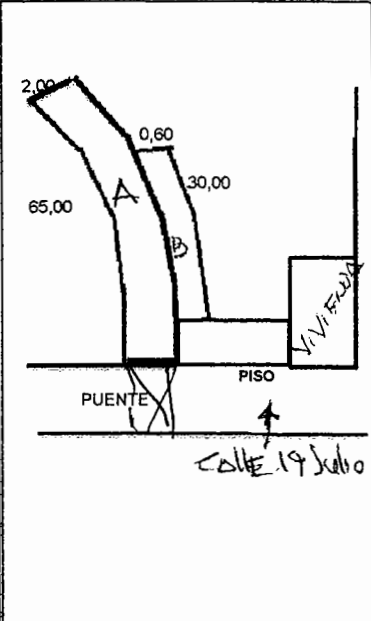
CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
	148,00 m2



RESIDENTE
ING. JESUS CASTRO DE LARA

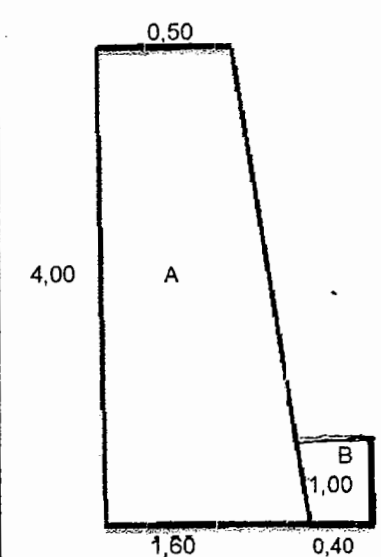


SUPERVISOR OBI
ING. SANTIAGO PRIET

CONTRATO:	145/2017			TRAMO:	MURO MAMPOSTERIA	
OBRA:	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE 19 DE JULIO CRUCE DEL ARROYO PICACHO			CONTRATISTA	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FARES S.A DE C.V	
CONCEPTO EXC. A MAQUINA	OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDO HASTA 2.00MTS CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA						148,00 m3
	ANCHO	LARGO	ALTO	VOLUMEN		
	A 2,00	65,00	1,00	130,00		
	B 0,60	30,00	1,00	18,00		
				148,00		



 RESIDENTE
 ING. JESUS CASTRO DE LARA


 SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS
 ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL


CONTRATO:	145/2017			TRAMO:	MURO MAMPOSTERIA	
OBRA:	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE 19 DE JULIO CRUCE DEL ARROYO PICACHO			CONTRATISTA	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FARES S.A DE C.V	
CONCEPTO	MAMPOSTERIA	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
MAMPOSTERIA DE 3 CLASE A BASE DE PIEDRA DE CORTE ASENTADA CON MORTERO CEM ARE DE RESISTENCIA F'C=60 KG/CM2						278,70 m3
		PROMEDIO	ALTURA	LARGO	VOLUMEN	
		A 1,05	4,00	63,50	266,70	
		B 0,40	1,00	30,00	12,00	
					278,70	



RESIDENTE
ING. JESUS CASTRO DE LARA



SUPERVISOR OBI
ING. SANTIAGO PRIET

CONTRATO:	145/2017			TRAMO:	MURO MAMPOSTERIA	
OBRA:	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 19 DE JULIO CRUCE DEL ARROYO PICACHO			CONTRATISTA	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FARES S.A DE C.V	
CONCEPTO	CHAPEO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
CHAPEO DE CORONA EN ALEROS CON MORTERO CEM-ARENA DE 60KG/CM2 DE 4 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO ACABADO PILIDO		ANCHO 0,50	LARGO 63,50	AREA 31,75		31,75 m2

RESIDENTE
ING. JESUS CASTRO DE LARA

SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS
ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL

CONTRATO:	040/2012			TRAMO:	MURO MAMPOSTERIA		
OBRA:	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 19 DE JULIO CRUCE DEL ARROYO PICACHO			CONTRATISTA	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FARES S.A DE C.V		
CONCEPTO MATERIAL CALIZO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR	
RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS.	A estacion ancho abajo ancho arriba 0+000 1,50 2,20 0+008 2,60 2,60 0+016.50 1,40 1,60 0+033 1,40 1,60 0+049.5 1,50 1,60 0+063.50 1,60 1,60 SUMA 10,00 11,20 promedio abajo 10.00/6 1,66 promedio arriba 11.20/6 1,86 (1.66+1.86)/2 1,76 A ancho alto largo volumen 1,76 2,50 57,50 253,00 B 0,40 1,00 63,50 25,40 278,40 solo se estimaran 276.15 m3					278,40	m3

RESIDENTE
ING. JESUS CASTRO DE LARA

SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS
ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL

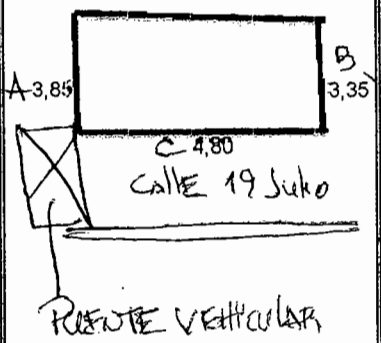
CONTRATO:	145/2017			TRAMO:	MURO MAMPOSTERIA	
OBRA:	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 19 DE JULIO CRUCE DEL ARROYO PICACHO			CONTRATISTA	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FARES S.A DE C.V	
CONCEPTO	APLANADO	OPERACIONES ARITMETICAS		CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR	
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA		VIAJES	VOLTEO			144,00 m2
		12	12			0
		CAPACIDAD	VOLUMEN			
			144 M3			



RESIDENTE
ING. JESUS CASTRO DE LARA



SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS
ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL

CONTRATO:	145/2017			TRAMO:	MURO MAMPOSTERIA	
OBRA:	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 19 DE JULIO CRUCE DEL ARROYO PICACHO			CONTRATISTA	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FARES S.A DE C.V	
CONCEPTO	RETIRO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR CON SIP-TRIP @ 4 MTS INCLUYE: AAFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO A VUELTA DE PLANA		$\frac{(3,80+2,20)}{2}$ $= 3,00$				17,28 m2
		$3,00$				
		LARGO	ANCHO	AREA		
		C 4,80	3,60	17,28		

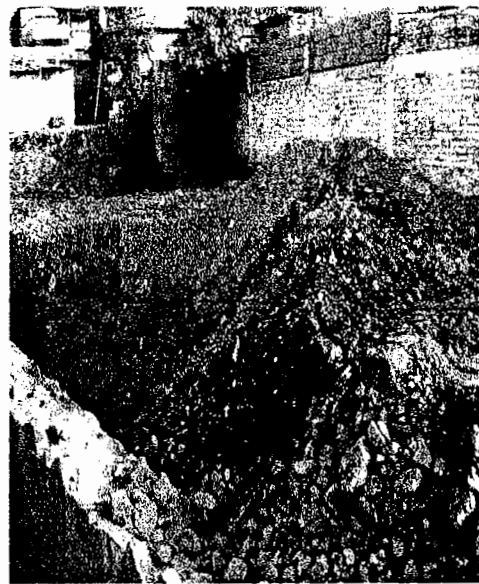
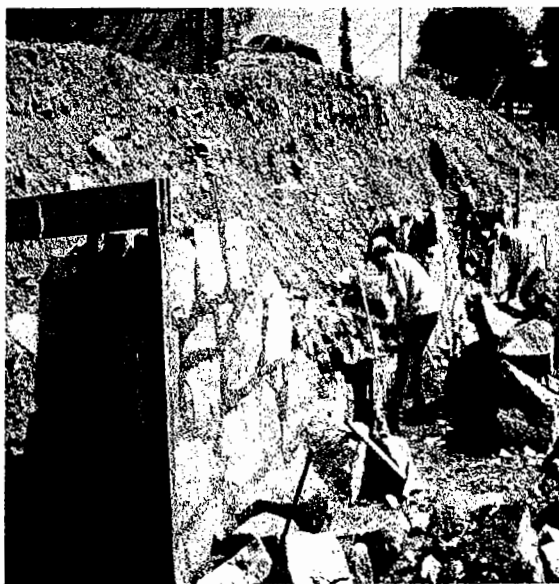
RESIDENTE.
ING. JESUS CASTRO DE LARA

SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS
ING. SANTIAGO PRIETO ECHERIVEL



Inmobiliaria y Constructora Fares S.A. de C.V.

FOTOS DE EVIDENCIA DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ARROLLO EL PICACHO



FE



Inmobiliaria y Constructora Fares S.A. de C.V.

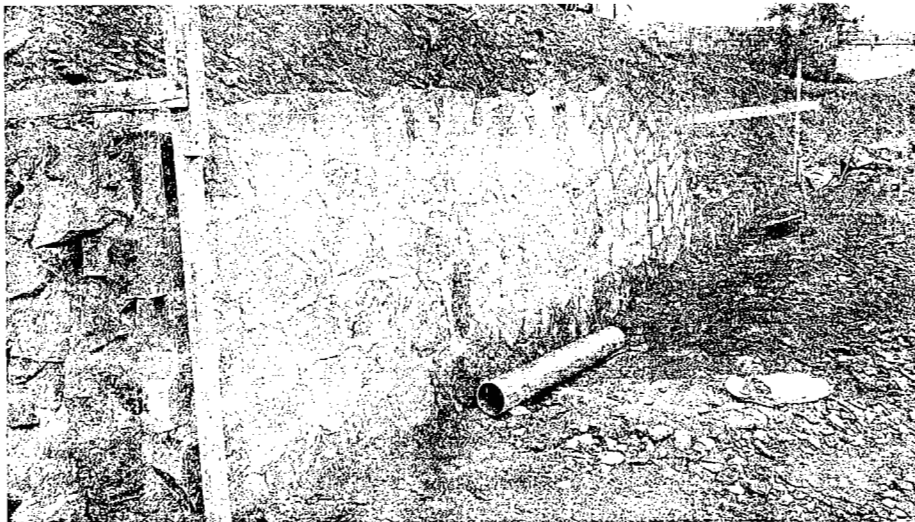


[Handwritten signature]

R. FLORES MAGON #5021 COL. CUARTELES CP.31020 TEL: 411-44-39 CHIHUAHUA, CHIH.



Inmobiliaria y Constructora Fares S.A. de C.V.



MURO DE CONTENCION C.19 DE JULIO CRUCE CON EL ARROLLO EL PICACHO
CONTRATO No. 145/2017



Inmobiliaria y Constructora Fares S.A. de C.V.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
