

ING. ARTURO DAVILA DOZAL


CHIHUAHUA, CHIH. 01 DE DICIEMBRE DEL 2017

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No. 2 CON FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
DOMO TECHUMBRE SECUNDARIA FED. ES-53, COL. NVO DELICIAS


DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 30 DE
POR UN SALDO NETO FACTURADO [\$446,390.38 CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y
AUTORIZACIÓN


ATENTAMENTE

ING. ARTURO DAVILA DOZAL

RECIBE


ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO

CHIHUAHUA, CHIH.,

01 DE DICIEMBRE DEL 2017

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 444,851.09
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 9/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 2 CONTRATO No. 161/201 POR LA CANTIDAD DE : \$ 1,165,410.00 INCLUYE CONVENIO
UN MILLON CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:

DOMO TECHUMBRE SECUNDARIA FED. ES-53, COL. NVO DELICIAS

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	384,819.29
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
SUBTOTAL	\$	384,819.29
IVA	\$	61,571.09
TOTAL	\$	446,390.38

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

C.M.I.C. DEL 0.2%	769.64
D.I.F. DEL 0.2%	769.64
SUMA	1,539.29

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO	\$	1,165,410.00
CONVENIO MODIFICATORIO	\$	-
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$	434,295.11
ESTA ESTIMACION	\$	446,390.38
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$	880,685.49
POR EJERCER	\$	284,724.51

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO	\$	-
ACUMULADO ANTERIOR	\$	-
ESTA ESTIMACION	\$	-
ACUMULADO ACTUAL	\$	-
POR AMORTIZAR	\$	-

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% C.M.I.C.

0.2% D.I.F.

ACUMULADO ANTERIOR	\$	748.78	\$	748.78
ESTA ESTIMACION	\$	769.64	\$	769.64
ACUMULADO ACTUAL	\$	1,518.42	\$	1,518.42

R E C I B I M O S

ING. ARTURO DAVILA DOZAL
DADA-650730-ER0



ING. ARTURO DAVILA DOZAL
CONSTRUCCIONES

Arturo Davila Dozal
DADA650730ERO
Domicilio Fiscal
Cerrada de Ciervo 3907
Col. Lomas del Sol 31114
Chihuahua Chihuahua México
Tel. 4403137,4197398

Factura No: 1072

FOLIO FISCAL (UUID):

69182185-4156-4EFA-8137-3D289F07B139

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000303547987

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2017-12-07T10:06:45

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2017-12-07T10:01:44

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: MINA 408
CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIHUAHUA Chihuahua
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: Chihuahua, Chihuahua
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Fecha de Expedición: 07 diciembre 2017
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	ESTIMACION 2. DOMO TECHUMBRE SECUNDARIA FED. ES-53, COL. NVO DELICIAS SEGUN CONTRATO NUM. 161/2017 RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO C.M.I.C. DEL 0.2% \$769.64 D.I.F. DEL 0.2% \$769.64 SUMA \$1,539.29 NETO A RECIBIR \$ 444,851.09 FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL CONTRATISTA	\$ 384,819.29	\$ 384,819.29

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS,
38/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 384,819.29
IVA(IVA 16.00%): \$ 61,571.09
TOTAL: \$ 446,390.38

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NAEAOVo14JeTz9x1laUyW1cKdKfVmUdyHByJcSukmy8Ag8DxP5mr6ZIO+T2z5+01fanOjy5zhmTXH2n+W5ly1cht+YD8KDaK0VL7FIZKqFMxK5NgsZ+ulC3+gMJzyxTIA5dqYW9/YySZ+N47mkD14SLJGale44=

SELLO DIGITAL DEL SAT

43L4YXGV3aW0chb75CQhSZ8Qbu3BIZWRG1MgldfLzlcY5RCQaRaNh5ChDeJOCdN5jmZcb0JpwYRWEH5aFY7k5kYC8IHMX36TAjwSRU7NaZnDDv8faZUpe5ynX1U8HocbInDQwsP8xUyQYTAHMT/zKqQwzFvD008bXB88ozhondXRFH2J42RJ6Z8PwIDGraKyF0IMNPM4Rn5WLKWSm6UEppSTXZ5cZ4+ew8DhLvgagEUKH4QgK261uon1Y2ZJm8KnebyLZf8D3KQ2mP+JIRVTHUHa96Y6TVihmbScordWbSz49RaxUk+nZKp8OrJaC=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|69182185-4156-4EFA-8137-3D289F07B139|2017-12-07T10:06:45||NAEAOVo14JeTz9x1laUyW1cKdKfVmUdyHByJcSukmy8Ag8DxP5mr6ZIO+T2z5+01fanOjy5zhmTXH2n+W5ly1cht+YD8KDaK0VL7FIZKqFMxK5NgsZ+ulC3+gMJzyxTIA5dqYW9/YySZ+N47mkD14SLJGale44=|00001000000405535779||



www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710




* Datos obligatorios




RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DADA650730ER0	Arturo Davila Dozal	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
69182185-4156-4EFA-8137-3D289F07B139	2017-12-07T10:01:44	2017-12-07T10:06:45	FMD100203JS7

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
\$446,390.38	ingreso	Vigente

Imprimir



Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 161/2017	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: DOMO TECHUMBRE SECUNDARIA FED. ES-53, COL. NVO DELICIAS	ESTIMACIÓN No. 2	\$ 1,165,410.00 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017	
UBICACIÓN: CALLE BENITO JUAREZ ESQ. FUNDADORES COL. NUEVO DELICIAS	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 446,390.38 CON IVA
CONTRATISTA: ING. ARTURO DAVILA DOZAL	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 434,295.11 CON IVA
RFC DADA-650730-ER0	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 880,685.49 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 361,811.52	
<u>EXTRAORDINARIOS</u>	\$ 23,007.77	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 384,819.29	

DESCUENTOS

0.2% C.M.I.C.	\$	769.64
0.2% D.I.F	\$	769.64
SUMA DESCUENTOS	\$	1,539.29

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$	384,819.29
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	384,819.29
I.V.A.	\$	61,571.09
TOTAL	\$	446,390.38

(CON LETRA)

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 38/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	1,539.29
SALDO NETO A RECIBIR	\$	444,851.09

AUTORIZO

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO
RESIDENTE D.O.P.M

Vo. Bo.

ING. JAVIER VILARRIAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ELABORO

ING. ARTURO DAVILA DOZAL
CONTRATISTA

REVISO

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO OIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA:

DOMO TECHUMBRE SECUNDARIA FED. ES-53, COL. NVO DELICIAS

MUNICIPIO:

CHIHUAHUA

No. CONTRATO:

161/2017

ESTIMACIÓN No. 2

CONTRATISTA: ING. ARTURO DAVILA DOZAL

PERÍODO:

23 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMB

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

NORMALES

ESTRUCTURA

EXTRAORDINARIOS

\$ 361,811.52

\$ 23,007.77


SUBTOTAL	384,819.29
I.V.A.	61,571.09
TOTAL	446,390.38

POR EL CONTRATISTA



ING. ARTURO DAVILA DOZAL

POR EL RESIDENTE DE D.O.P.M



ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO

OBRA: DOMO TECHUMBRE SECUNDARIA FED. ES-53, COL. NVO DELICIAS

MUNICIPIO: CALLE BENITO JUAREZ
ESQ. FUNDADORES
COL. NUEVO DELICIAS

Nº. CONTRATO: 161/2017
ESTIMACIÓN Nº. 2

CONTRATISTA:

ING. ARTURO DAVILA DOZAL

PERIODO: 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEM

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIO		
OBRA NORMAL							
\$ 384,819.29							
3	CUBIERTA TIPO DOMO DE 20.50 X 28.00 MTS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ES-53, UBICADA EN CALLE FUNDADORES Y BENITO JUAREZD ELA COLONIA NUEVO DELICIAS (CLAVE: 08DES006SV)						\$ 384,819.29
3.6	ESTRUCTURA SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA AUTOSOPORTANTE EN CUBIERTA, EN LAMINA CAL. 20 GALVANIZADA. TIPO K-SPAN 120 PARA ARCOS DE 19 A 22 MTS. MEDIDO EN HORIZONTAL. INCLUYE:	M2	513.50	356.60		356.60	883.16 \$ 314,934.86
3.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA AUTOSOPORTANTE EN CUBIERTA, EN LAMINA CAL. 18 GALVANIZADA. TIPO K-SPAN 120 MEDIDO EN HORIZONTAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	61.50	45.7860366		45.7860366	1023.82 \$ 46,876.66
5	EXTRAORDINARIOS						

POR EL CONTRATISTA

POR EL RESIDENTE DE D.O.P.M

ING. ARTURO DAVILA DOZAL

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO

CONTRATISTA:

ING. ARTURO DAVILA DOZAL

PERIODO: 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEM

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIOR		
EXT-01	REGISTRO SANITARIO DE 60X40X80 CMS. INTERIOR CONSTRUIDO A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15*20*40, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1.3 ACABADO PULIDO Y PISO DE CONCRETO F'C 150KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, Y MEDIA CAÑA DE 4 PULG, CON TAPA DE CONCRETO ARMADA CON ALAMBRO A CADA 14 CMS EN AMBOS SENTIDOS DE 5CMS DE ESPESOR INCLUYE MARCO DE ANGULO DE 1 1/4 X 1/4 X 3/16 Y CONTRAMARCO DE DE ANGULO DE 1 1/4 X 1 1/4 X 3/16, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE RECKOR 100 A 2 MANOS EN EL COLOR QUE SE DEFINA EN OBRA, CADENA DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS ARMADA CON 5 VARILLAS NO.3 Y ESTRIBOS NO.2 A CADA 20 CMS Y ANCLAS SEGUN PLANO	pza	2.00	3.00	3.00	2333.73 \$	7,001.19
EXT-02	TENDIDO DE TUBERIA SANITARIA DE 4 PULG. DE DIAMETRO, PARA DESCARGA DE SANITARIOS. INCLUYE. EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	574.19	44.25	44.25	150.57 \$	6,662.72
EXT-03	REINSTALACION DE CANASTA PORTERIA EXISTENTE EN CANCHA ANEXA A DOMO, INCLUYE. RESOLDADURA EN VARILLA SUELTA, SUMINISTRAR VARILLA FALTANTE, INSTALACION DE PLACA PARA TAPAR IMPERFECCIONES POR AMBOS LADOS, PINTURA, EXCAVACIONES, CONCRETO, PLANTILLA, EXCAVACION, ACARREO DE ESCOMBRO, PLACA PINTURA GENERAL EN CANASTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m3	53.50	2.00	2.00	4671.93 \$	9,343.86

POR EL CONTRATISTA

POR EL RESIDENTE DE D.O.P.M.

ING-ARTURO DAVILA DOZAL

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO

CONTRATO :	No. 161/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL
OBRA :	DOMO TECHUMBRE DE 20.50 X 28.00 SECUNDARIA FED. ES-53 COL. NUEVO DELIC	DE CHIHUAHUA
TRAMO:	UBICADA EN CALLE BENITO JUAREZ ESQ. FUNDADORES COL. NUEVO DELICIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
CONTRATISTA:	ING. ARTURO DAVILA DOZAL	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Nº DE ESTIMACIONES: DOS PERIODO: 23/11/2017 AL 30/11/2017

[illegible]

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO
RESIDENTE

ING. ARTURO DAVILA DOZAL
CONTRATISTA

1 / 8



CONTRATISTA
ING. ARTURO DAVILA DOZAL

RESIDENTE
ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO

218

CONTRATISTA:


UBICADA EN CALLE BENITO JUAREZ ESQ. FUNDADORES COL. NUEVO DELICIAS

PERIODO: 23/11/2017 AL 30/11/2017

[illegible]

RESIDENTE

CONTRATISTA

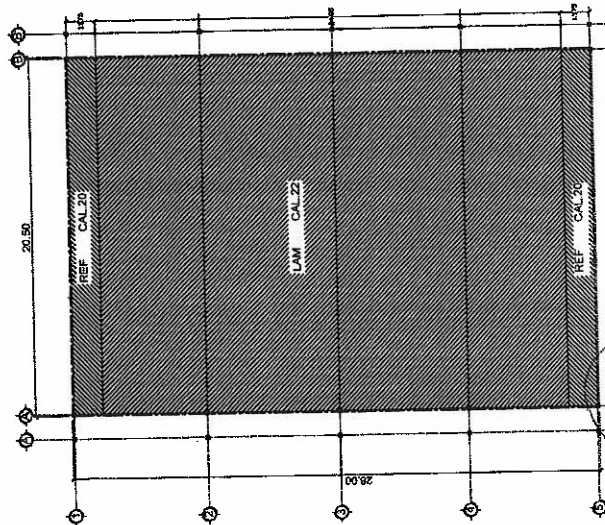

**VOLUMEN
A PAGAR**

5.7880365

318


[illegible]

CONTRATISTA
ING. ARTURO DAVILA DOZAL

418

CONTRATISTA: ING. ARTURO DAVILA DOZAL

Nº DE ESTIMACION: DOS PERIODO: 23/11/2017 AL 30/11/2017

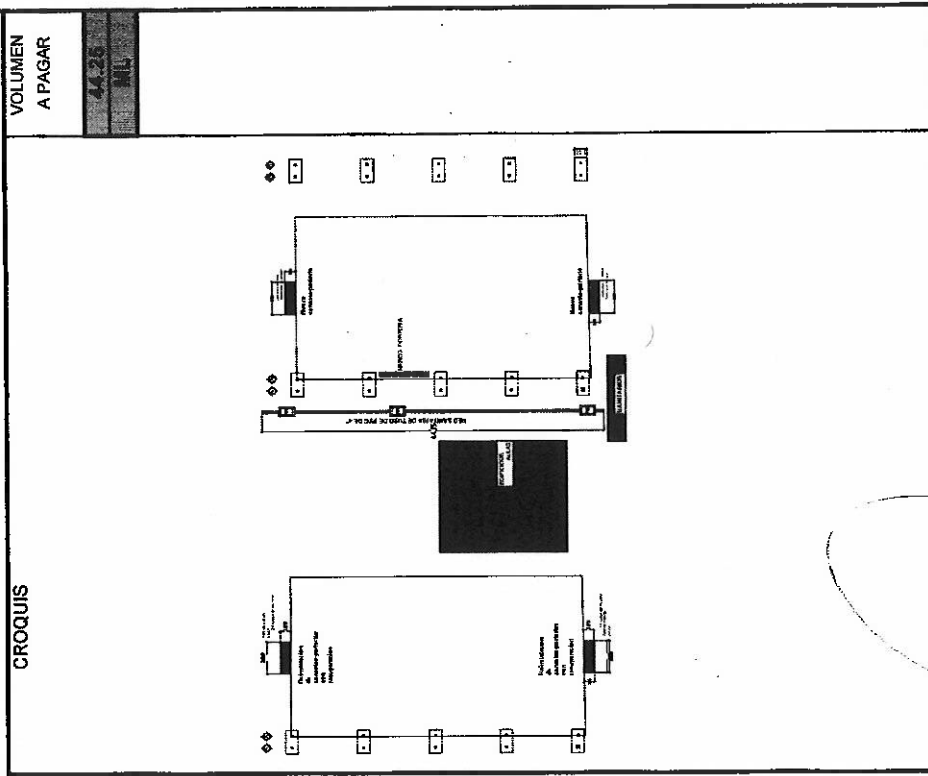[illegible]

RESIDENTE
ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO

CONTRATISTA
ING. ARTURO DAVILA DOZAL

518

UBICADA EN CALLE BENITO JUAREZ ESQ. FUNDADORES COL. NUEVO DELICIAS
ING. ARTURO DAVILA DOZAL

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR

The floor plan of the 200 PZA building is a rectangular structure with several rooms and equipment. The layout includes:

- Top Left Room:** Contains a "SINK" and "CUPBOARD".
- Top Right Room:** Labeled "ELECTRICAL ROOM".
- Central Corridor:** A long horizontal corridor with a "FIRE EXTINGUISHER" mounted on the wall. The corridor is labeled "FIRE EXTINGUISHER" and "FIRE EXTINGUISHER".
- Bottom Left Room:** Labeled "ELECTRICAL ROOM".
- Bottom Right Room:** Labeled "ELECTRICAL ROOM".
- Central Room:** A large rectangular room in the center, labeled "ELECTRICAL ROOM".
- Entrance:** Located at the bottom center, labeled "ENTRANCE".
- Windows:** Indicated by small circles along the top and bottom walls.
- Dimensions:** The overall dimensions of the building are 200' x 100'.



Arturo Davila Dozal
CONTRATISTA
ING. ARTURO DAVILA DOZAL

GENERADOR DE ESTIMACION,


HOJA:

6 / 8

CONTRATO: No. 161/2017	TRAMO:	UBICADA EN CALLE BENITO JUAREZ ESQ. FUNDADORES COL. NUEVO DELICIAS
OBRA: DOMO TECHUMBRE DE 20.50 X 28.00 SECUNDARIA FED. ES-53 COL. NUEVO DELICIAS	CONTRATISTA:	ING. ARTURO DAVILA DOZAL
No DE ESTIMACION:	DOS	PERIODO: 23/11/2017 AL 30/11/2017
FOTOS		VOLUMEN

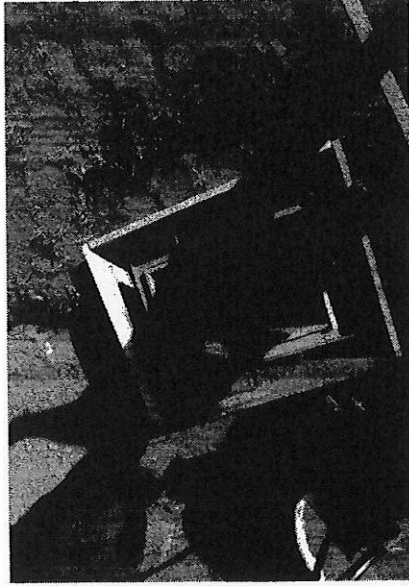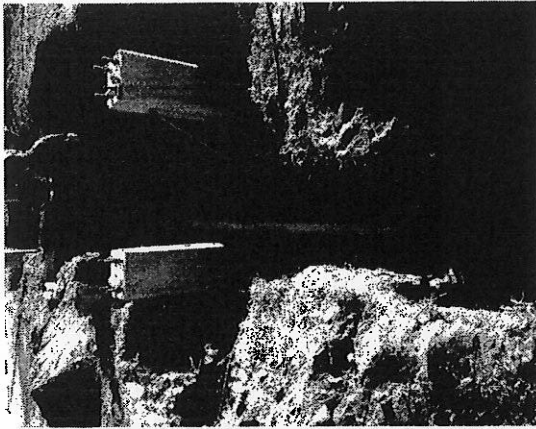


RESIDENTE
ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO


CONTRATISTA
ING. ARTURO DAVILA DOZAL

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA:

7 / 8

CONTRATO : UBICADA EN CALLE BENITO JUAREZ ESQ. FUNDADORES COL. NUEVO DELICIAS





TRAMO:

CONTRATISTA: ING. ARTURO DAVILA DOZAL

OBRA : DOMO TECHUMBRE DE 20.50 X 28.00 SECUNDARIA FED. ES-53 COL. NUEVO DELICIAS

No DE ESTIMACION: DOS PERIODO: 23/11/2017 AL 30/11/2017

FOTOS

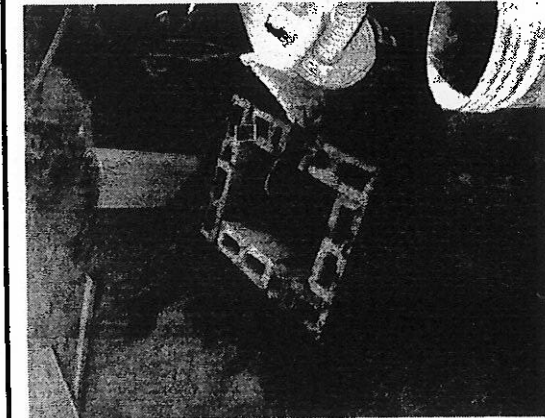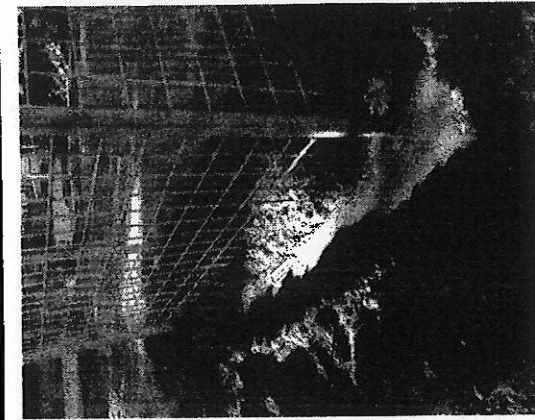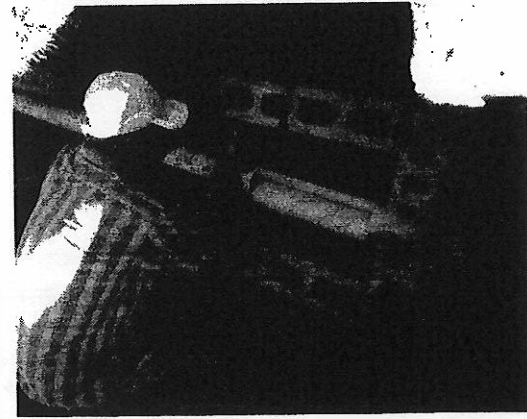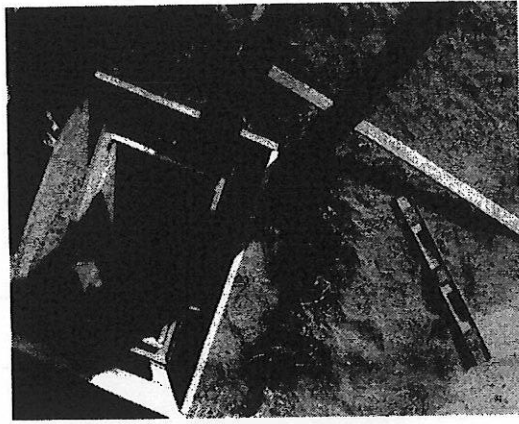

CONTRATISTA
ING. ARTURO DAVILA DOZAL





RESIDENTE
ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	TRAMO:	UBICADA EN CALLE BENITO JUAREZ ESQ. FUNDADORES COL. NUEVO DELICIAS
OBRA: DOMO TECHUMBRE DE 20.50 X 28.00 SECUNDARIA FED. ES-53 COL. NUEVO DELICIAS	CONTRATISTA:	ING. ARTURO DAVILA DOZAL

Nº DE ESTIMACION:	DOS	PERIODO: 23/11/2017 AL 30/11/2017
-------------------	-----	-----------------------------------

FOTOS

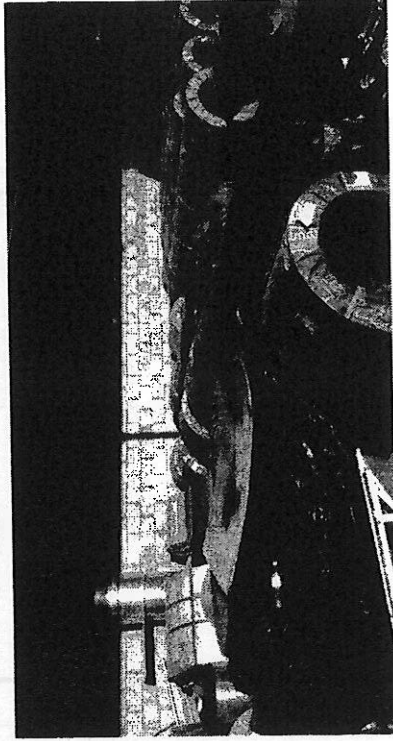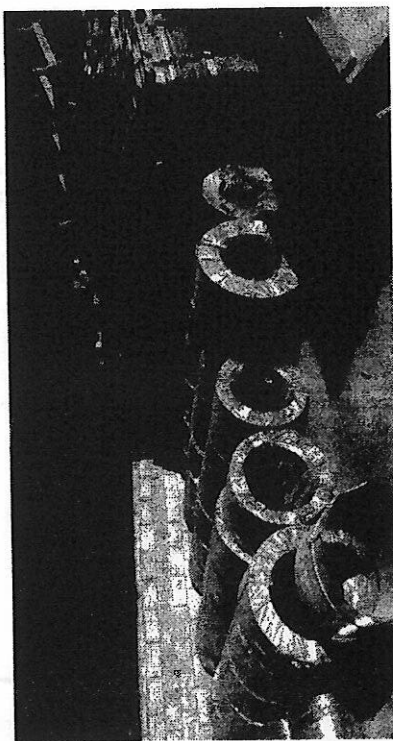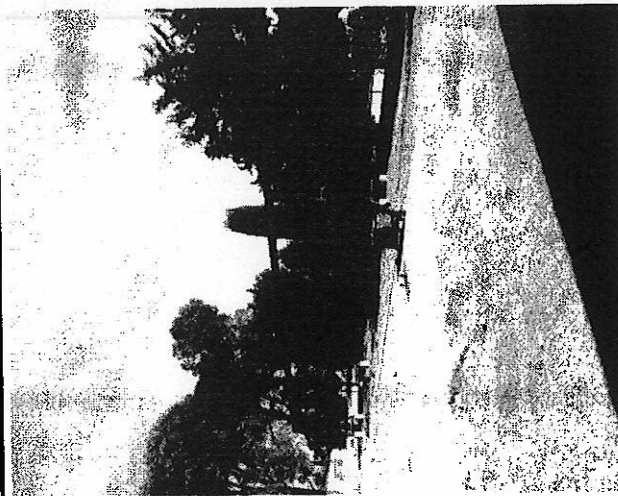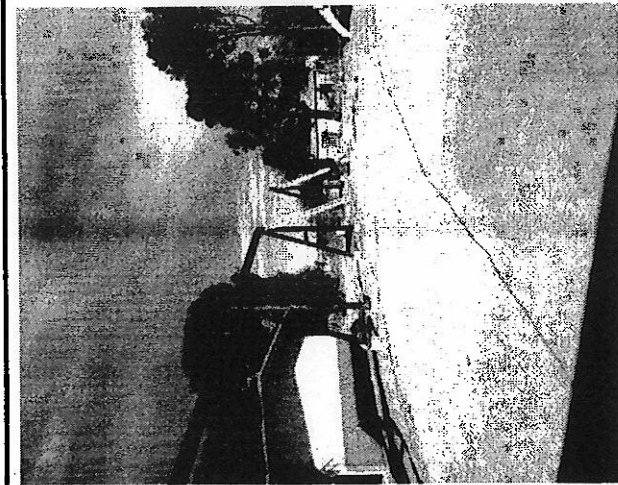

[Signature]
RESIDENTE
ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO

[Signature]
CONTRATISTA
ING. ARTURO DAVILA DOZAL



OFICIO No. CS/3997/2017

22 de Noviembre del 2017

ING. ARTURO DÁVILA DOZAL
P R E S E N T E.-

Con relación a su escrito con fecha del 21 de Noviembre del año en curso, en los que solicita la revisión de los precios extraordinarios de la obra "**DOMO TECHUMBRE SECUNDARIA FED ES-53, COL. NVO. DELICIAS**", bajo contrato No. **161/2017**. Por este conducto le comunico, que una vez revisados y analizados los mismos, se autorizan los precios unitarios que a continuación se relacionan:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO SOLICITADO	PRECIO AUTORIZADO
EXT-01	REGISTRO SANITARIO DE 60X40X80 CMS. INTERIOR CONSTRUIDO A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, ACABADO PULIDO Y PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, Y MEDIACAÑA DE 4 PULG CON TAPA DE CONCRETO ARMADA CON ALAMBRÓN A CADA 14 CMS EN AMBOS SENTIDOS DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE MARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4 X 1/4 X 3/16 Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4 X 1 1/4 X 3/16, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE RECKOR 100 A 2 MANOS EN EL COLOR QUE SE DEFINA EN OBRA, CADENA DE CONCRETO DE 15X15 CMS. ARMADA CON 5 VARS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 20 CMS. Y ANCLAS SEGÚN PLANO.	PIEZA	\$2,333.73	\$2,333.73
EXT-02	TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA DE 4 PULG DE DIÁMETRO PARA DESCARGA DE SANITARIOS, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	\$220.64	\$150.57
EXT-03	REINSTALACIÓN DE CANASTA PORTERÍA EXISTENTE EN CANCHA ANEXA A DOMO, INCLUYE: RESOLDADURA EN VARILLA SUELTA, SUMINISTRAR VARILLA FALTANTE, INSTALACIÓN DE PLACA PAR ATAPAR IMPERFECCIONES POR AMBOS LADOS, PINTURA, EXCAVACIONES, CONCRETO, PLANTILLA, ACARREO DE ESCOMBRO, PLACA, PINTURA GENERAL EN CANASTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	LOTE	\$5,671.74	\$4,671.93

A T E N T A M E N T E


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.C.P. ING. JAVIER VILLARREAL POSADA. SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
C.C.P. ING MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO. JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL.
C.C.P. ING. ADRIÁN BARRAZA CARRASCO. RESIDENTE DE OBRA
ARCHIVO / mcmc

"2017. Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Camino a la Presa Chuviscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200.4800 www.municipalidadchih.gob.mx
