



ING. ARTURO DAVILA DOZAL
CONSTRUCCIONES

Arturo Davila Dozal
DADA650730ERO
Domicilio Fiscal
Cerrada de Ciervo 3907
Col. Lomas del Sol 31114
Chihuahua Chihuahua México
Tel. 4403137,4197398

Factura No: 1091

FOLIO FISCAL (UUID):

84F0FCBD-7C63-4072-AA46-47D4A25928AF
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000303547987

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:


2017-12-14T21:34:42

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2017-12-14T21:29:41

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: MINA 408
CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIHUAHUA Chihuahua
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: Chihuahua, Chihuahua
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Fecha de Expedición: 14 diciembre 2017
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	ESTIMACION 3. DOMO TECHUMBRE SECUNDARIA FED. ES-53, COL. NVO DELICIAS SEGUN CONTRATO NUM. 161/2017 RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO C.M.I.C. DEL 0.2% \$490.90 D.I.F. DEL 0.2% \$490.90 SUMA \$981.80 NETO A RECIBIR \$ 283,742.71  FIRMA DEL CONTRATISTA	\$ 245,452.16	\$ 245,452.16

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS,
51/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 245,452.16
IVA(IVA 16.00%): \$ 39,272.35
TOTAL: \$ 284,724.51

SELLO DIGITAL DEL CFDI

oFzUaXQ1KVGfmiH18ZK91RVyzyZtv+BF7PFRfYnS8FLV8YACdoZKp+KIBO/A/90qFCbS18CEVQITJ0uLzWPlrSmgI6a/JCDhzmYs8AgR+wpYBoLHYfLedCbyTxb6AUR4jaTdJ1PZLJ3j4tohbTex00eNT06v8Q=

SELLO DIGITAL DEL SAT

4QdXp5Q35467bYDj0Kufyaa8NUOVAJH4mzn2eFL42pFHLVW4N24pF1RVsQdQOVJm842R8bXONM0dV1W8203vVwE1JOnIT5ohHM7mQhagPMIMovsemFcaYEOckh3mhF1OV8acCrV702+Hhvb1KOpnfa8B3rv0QOnHCH10wzaC8V2bLE8e5vL4HTv7HLg8CDBgRbvag3o7SRvnmkgM083dPeDX8hu+HawxIFNejYayw5ywl6S0hoxIK088CPHE5mYOV+hpEGaxXWJdHVRHm1LF66+3fVwe8G2MuzhS8ONhvSJEXp4M9057JyCzGA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.0(84F0FCBD-7C63-4072-AA46-47D4A25928AF[2017-12-14T21:34:42]oFzUaXQ1KVGfmiH18ZK91RVyzyZtv+BF7PFRfYnS8FLV8YACdoZKp+KIBO/A/90qFCbS18CEVQITJ0uLzWPlrSmgI6a/JCDhzmYs8AgR+wpYBoLHYfLedCbyTxb6AUR4jaTdJ1PZLJ3j4tohbTex00eNT06v8Q=)00001000000303547987



www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son
obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710



 (<http://www.gob.mx/>) Inicio

SHCP




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios



RFC del emisor

DADA650730ERO

Folio fiscal

84F0FCBD-7C63-4072-AA46-47D4A25928AF

Total del CFDI

\$284,724.51

Nombre o razón social del emisor

Arturo Davila Dozal

Fecha de expedición

2017-12-14T21:29:41

Efecto del comprobante

ingreso

RFC del receptor

MCI651010V22

Fecha certificación SAT

2017-12-14T21:34:42

Estado CFDI


Vigente

Nombre o razón social del receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que certificó

FMD100203JS7



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 161/2017	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: DOMO TECHUMBRE SECUNDARIA FED. ES-53, COL. NVO DELICIAS	ESTIMACIÓN No. 3	\$ 1,165,410.00 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017	
UBICACIÓN: CALLE BENITO JUAREZ ESQ. FUNDADORES COL. NUEVO DELICIAS	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 284,724.51 CON IVA
CONTRATISTA: ING. ARTURO DAVILA DOZAL	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 880,685.49 CON IVA
RFC DADA-650730-ER0	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 1,165,410.00 CON IVA

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	<u>CIMENTACION</u>	\$ 2,517.61	
	<u>ESTRUCTURA</u>	\$ 142,694.41	
	<u>ALBAÑILERIAS</u>	\$ 100,240.14	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 245,452.16	

DESCUENTOS

0.2% C.M.I.C.	\$	490.90
0.2% D.I.F	\$	490.90
SUMA DESCUENTOS	\$	981.80

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$	245,452.16
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	245,452.16
I.V.A.	\$	39,272.35
TOTAL	\$	284,724.51

(CON LETRA)

(DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
VEINTICUATRO PESOS 51/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	981.80
SALDO NETO A RECIBIR	\$	283,742.71

AUTORIZO

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO
RESIDENTE D.O.P.M

Vo. Bo.

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

ELABORO

ING. ARTURO DAVILA DOZAL
CONTRATISTA

REVISO

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH.,

14 DE DICIEMBRE DEL 2017

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 283,742.71
(DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 3 CONTRATO No. 161/201 POR LA CANTIDAD DE : \$ 1,165,410.00 INCLUYE CONVENIO
UN MILLON CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:

DOMO TECHUMBRE SECUNDARIA FED. ES-53, COL. NVO DELICIAS

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	245,452.16
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
SUBTOTAL	\$	245,452.16
IVA	\$	39,272.35
TOTAL	\$	284,724.51

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

C.M.I.C. DEL 0.2%	490.90
D.I.F. DEL 0.2%	490.90
SUMA	981.80

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 1,165,410.00
CONVENIO MODIFICATORIO	
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 880,685.49
ESTA ESTIMACION	\$ 284,724.51
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 1,165,410.00
POR EJERCER	\$ 0.00

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% C.M.I.C.	0.2% D.I.F.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 1,518.42	\$ 1,518.42
ESTA ESTIMACION	\$ 490.90	\$ 490.90
ACUMULADO ACTUAL	\$ 2,009.32	\$ 2,009.32

R E C I B I M O S

ING. ARTURO DAVILA DOZAL
DADA-650730-ERO

OBRA: DOMO TECHUMBRE SECUNDARIA FED. ES-53, COL. NVO DELICIAS

MUNICIPIO: CHIHUAHUA No. CONTRATO: 161/2017

ESTIMACIÓN No. 3

CONTRATISTA: ING. ARTURO DAVILA DOZAL PERÍODO: 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 14 DE DICIEMBRE


RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

NORMALES

CIMENTACION	\$	2,517.61
ESTRUCTURA	\$	142,694.41
ALBAÑILERIAS	\$	100,240.14


SUBTOTAL	245,452.16
I.V.A.	39,272.35
TOTAL	284,724.51

POR EL CONTRATISTA



ING. ARTURO DAVILA DOZAL

POR EL RESIDENTE DE D.O.P.M



ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO

CONTRATISTA:

ING. ARTURO DAVILA DOZAL

PERIODO: 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 14 DE DICIEMBRE

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIO		
OBRA NORMAL							
\$ 245,452.16							
	CUBIERTA TIPO DOMO DE 20.50 X 28.00 MTS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ES-53, UBICADA EN CALLE FUNDADORES Y BENITO JUAREZD ELA COLONIA NUEVO DELICIAS (CLAVE: 08DES006SV)						\$ 245,452.16
2	CIMENTACION						
2.6	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUB BASE PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO EN DESPLANTE DE ZAPATAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL RECOMENDADO POR LABORATORIO,	M3	8.64	8.64		291.39 \$	2,517.61
3	ESTRUCTURA						
3.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA AUTOSOPORTANTE EN CUBIERTA, EN LAMINA CAL. 20 GALVANIZADA. TIPO K-SPAN 120 PARA ARCOS DE 19 A 22 MTS. MEDIDO EN HORIZONTAL. INCLUYE:	M2	513.50	499.96	356.60	883.16 \$	126,606.14
3.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA AUTOSOPORTANTE EN CUBIERTA, EN LAMINA CAL. 18 GALVANIZADA. TIPO K-SPAN 120 MEDIDO EN HORIZONTAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	61.50	61.50	45.7860366	1023.82 \$	16,088.27
4	ALBANILERIA						
4.3	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR. ACABADO RAYADO CON BROCHA DE PELO, CON JUNTAS FRIAS SELLADAS A BASE DE SIKAFLEX-1A Y SIKAROD O SIMILAR EN CALIDAD, INDICADAS SEGUN PLANO, INCLUYE ACABADO CON VOLTEADOR, CIMBRA LIMITE, NIVELACION Y FORJADO DE NARIZ, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.00	15.00		268.38 \$	4,025.70

POR EL CONTRATISTA

POR EL RESIDENTE DE D.O.P.M.

ING. ARTURO DAVILA DOZAL

Pag 1 de 2

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO

OBRA: DOMO TECHUMBRE SECUNDARIA FED. ES-53, COL. NVO DELICIAS

MUNICIPIO: CALLE BENITO JUÁREZ
ESQ. FUNDADORES
COL. NUEVO DELICIAS

Nº CONTRATO: 161/2017
ESTIMACIÓN Nº. 3

CONTRATISTA:

ING. ARTURO DAVILA DOZAL

PERIODO: 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 14 DE DICIEMBRE

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIOR		
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTA-PORTERIA METALICA CON SOLERA EN PORTERIA, PINTURA ELECTROSTATICA MODELO FTPCPS10 O SIMILAR, INCLUYE CALADOS DE INSTANCIAS INVOLUCRADAS, EXCAVACION, CEPA DE CIMENTACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, TRASLADOS, FLETES, NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	2.00	2.00	2.00	39356.97 \$	78,713.94
4.5	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN LINEA DE JUEGO EN CANCHA DE BASQUETBOL, 5 CMS. DE ANCHO INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MARCA DE PINTURA COMEX TOP-DEPORTIVO.	ML	300.00	233.56	233.56	54.31 \$	12,684.64
4.6	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA	M2	574.00	574.00	574.00	8.39 \$	4,815.86

POR EL CONTRATISTA

ING. ARTURO DAVILA DOZAL

POR EL RESIDENTE DE D.O.P.M.

Pag 2 de 2

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO

HOJA 1 / 1

ING. ARTURO DAVILA DOZAL
CONTRATISTA

81.

2

CONTRATISTA
ING. ARTURO DAVILA DOZAL

28

CONTRATISTA
ING. ARTURO DAVILA DOZAL

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA:

318

[illegible]

CONTRATISTA
ING. ARTURO DAVILA DOZAL

RESIDENTE
ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO

37


John
CONTRATISTA
ING. ARTURO DAVILA DOZAL

501

RESIDENTE
ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO

CONTRATISTA
ING. ARTURO DAVILA DOZAL

315

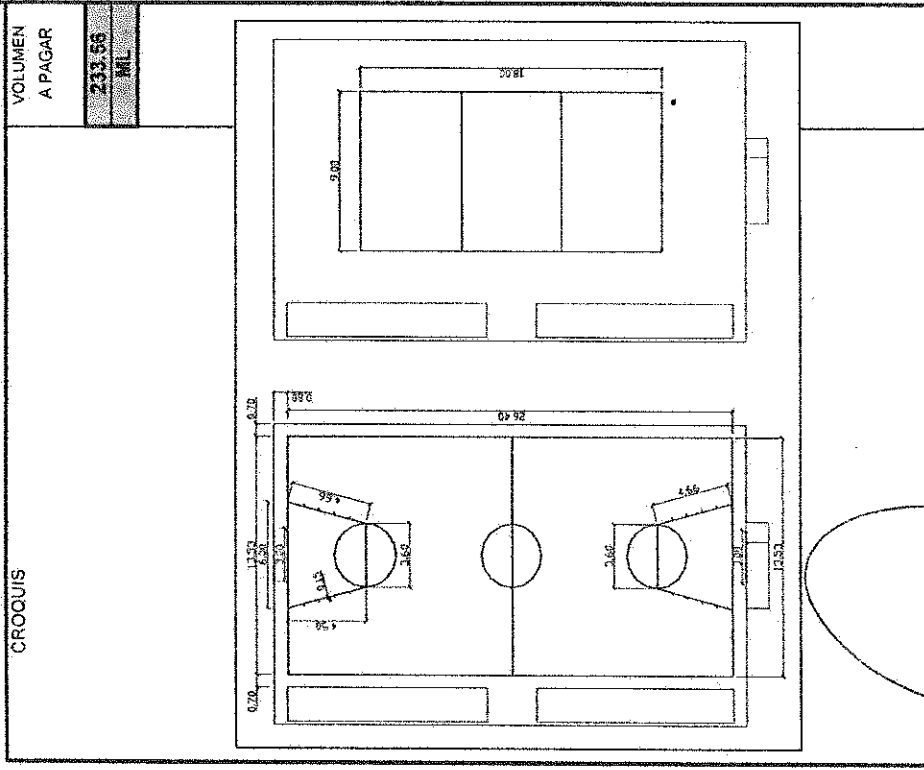[illegible]

CONTRATISTA
ING. ARTURO DAVILA DOZAL

GENERADOR DE ESTIMACION


HOJA:

7 / 8

CONTRATO : No. 181/2017	TRAMO:	UBICADA EN CALLE BENITO JUAREZ ESQ. FUNDADORES COL. NUEVO DELICIAS
OBRA : DOMO TECHUMBRE DE 20.50 X 28.00 SECUNDARIA FED. ES-53 COL. NUEVO DELICIAS	CONTRATISTA:	ING. ARTURO DAVILA DOZAL

No DE ESTIMACION: TRES PERIODO: 01/12/2017 AL 14/12/2017

CONCEPTO	EJE	TRAMO	PZA	LARGO	ANCHO	ALTO	U.	SUB-TOTAL
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA	DOMO	1	1	28.00	20.50		M2	574.00
TOTAL								574.00

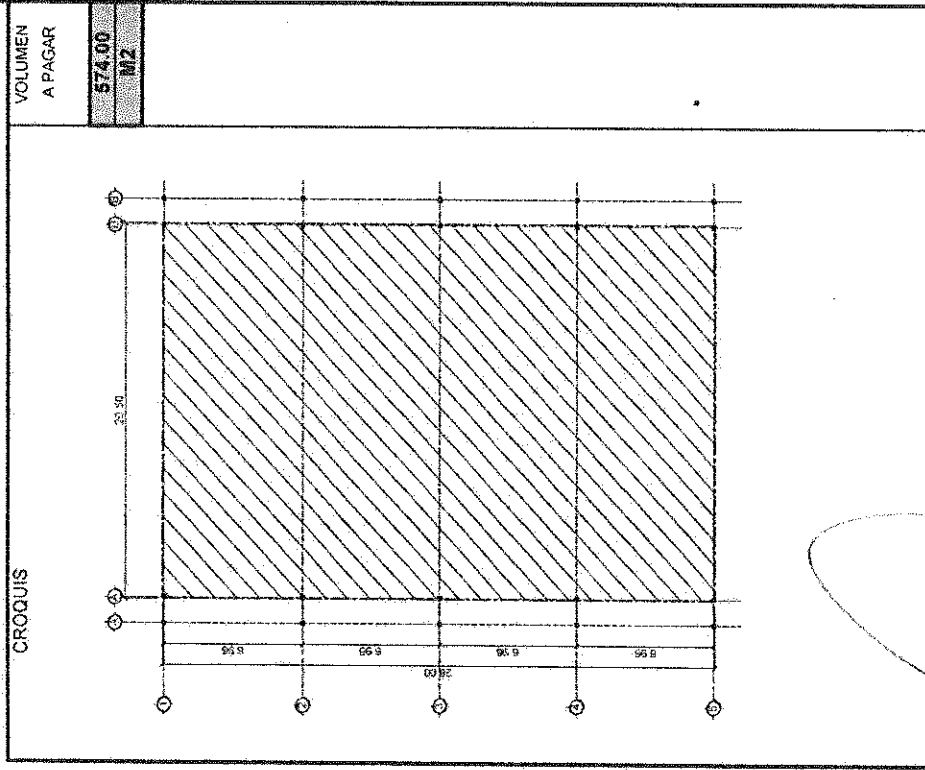

RESIDENTE
ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO

CONTRATISTA
ING. ARTURO DAVILA DOZAL

GENERADOR DE ESTIMACION




HOJA

8 / 8

CONTRATO : No. 161/2017		TRAMO:	UBICADA EN CALLE BENITO JUAREZ ESQ. FUNDADORES COL. NUEVO DELICIAS
OBRA: DOMO TECHUMBRE DE 20.50 X 28.00 SECUNDARIA FED. ES-53 COL. NUEVO DELICIAS		CONTRATISTA:	ING. ARTURO DAVILA DOZAL
No DE ESTIMACION:	TRES	PERIODO: 01/12/2017 AL 14/12/2017	

FOTOS

VOLUMEN

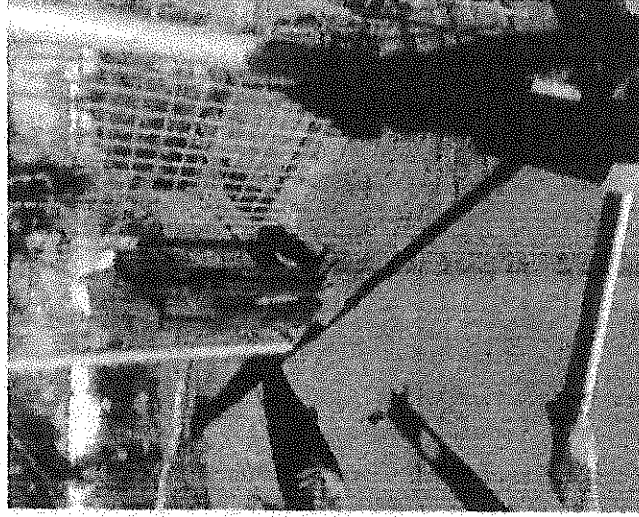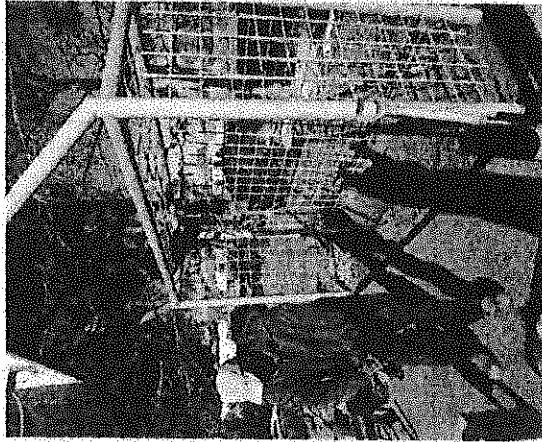

[Signature]
RESIDENTE
ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO

[Signature]
CONTRATISTA
ING. ARTURO DAVILA DOZAL
