

SEMCOR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

RFC: SMC110310DM6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31203

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 99 - Por definir

Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio

- 89

Fecha

14/8/2018 11:45:53

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Domicilio: CALLE MINA No. 408, CENTRO, C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
				REMDELACION DE PARQUE RIBERAS DE SACRAMENTO 2 ESTIMACION NUMERO 1 Convenio				
				SEGUN CONTRATO NUM. 168/17				
				FIRMA DEL CONTRATISTA				
1.00	SERVICIOS	E48 - Unidad de servicio	72151901 - Servicio de cimentación de construcciones	ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 315,403.27	315,403.27	0.00	002 - IVA - 50,464.52	315,403.27
				RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO				
				0.2% CMIC 630.81				
				0.2% D.I.F. 630.81				
				1.0% SANCION POR INCUMPLIMIENTO \$ 3,154.03				
				SUMA \$ 4,415.65				
				NETO A RECIBIR \$ 361,452.14				

Importe con letra:

TRESIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N.

Subtotal	315,403.27
Impuestos Traslados	50,464.52
Total	365,867.79

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

00001000000409966409

B371B812-16D6-4147-A199-8467E488AEC

00001000000404486074

Agosto 14 2018 - 12:45:55



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

oA8QHk3XP6ZkLZKpOJ8hbM8hDZ/nQRHGk1D7F7FzEVrOhsaQBCz2GvSC82DK1qIQOcGM8mXAYMMSmoF3iofB3M
Od89t32BCEgHRkLSle3UJTIVhUYBf7YEyOa/NIPYUgmvk5/SJUHRrGdICux+UN7z2eP7KRiKHyltMFMxoZTxD
K6gGzAJpdqhD8IznAwXduYdnUs0ZowzDyFum6UXFUcomeGZeYq5gipsQEBWS7rbt1lNZs0QMM4xtzPpJ85njFb
qu1RQIHcPoEPyPA9Bq2oi7aPM34HgGJt/IGM+DJTCa6VP2WLj0moIG6oLv/29nVar/ebnQvemOBoCOPpMOlw==

Sello del SAT

AgW2AY/sgDoQ2J+82A9e1TCBZTGzGEvxe+1S+IX9LEH9Y0wKuwTD7TcP6PRwqOUIbZ+ZabbcuozNvGE
QiT4RX68h1EGeTl3s2Merib5SDBU4NIQdTU62c0Y15jrdofSvZjcSaovsewH1mZjth/dXceO1HHTO+R/
TYFFQ4WMkxmaboTofc2aL8RicF9l1AKXfdb/SUpfQDQX1b9w1iMPkSo5l7ObbYGxSKpQoIfKbbnV6ykM
FtlpRZ2LSld0rsk1Z3ghr9rnw5dp6BRGhfFpFxy9aj4tOYf+RprkeZ15vAqecIbSjeVKdXL54m/jsllw
ah/JNxlgdU+Uh0N0grdEfQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B371B812-16D6-4147-A199-8467E488AECd|2018-08-14T12:45:55|MAS0810247C0|oA8Q
Hk3XP6ZkLZKpOJ8hbM8hDZ/nQRHGk1D7F7FzEVrOhsaQBCz2GvSC82DK1qIQOcGM8mXAYMMSmoF3iofB
3M0d89t32BCEgHRkLSle3UJTIVhUYBf7YEyOa/NIPYUgmvk5/SJUHRrGdICux+UN7z2eP7KRiKHyltM
FMxoZTxDK6gGzAJpdqhD8IznAwXduYdnUs0ZowzDyFum6UXFUcomeGZeYq5gipsQEBWS7rbt1lNZs0QM
M4xtzPpJ85njFbqu1RQIHcPoEPyPA9Bq2oi7aPM34HgGJt/IGM+DJTCa6VP2WLj0moIG6oLv/29nVar/
ebnQvemOBoCOPpMOlw=|00001000000404486074||

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SMC110310DM6	SEMCOR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B371B812-16D6-4147-A199-8467E488AECD	2018-08-14T11:45:53	2018-08-14T12:45:55	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$365,867.79	Ingreso	Vigente	



Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION SOCIAL

CONTRATO

168/2017

IMPORTE CONTRATO \$2,439,873.31 CON IVA
IMPORTE CONVENIO \$369,878.15 CON IVA

CONTRATISTA
PERIODO DE EJECUCION SEGUN CONTRATO
OBRASERVICIO

SENCOR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
19 DE OCTUBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2017
REMODELACION PARQUE RIBERAS DE SACRAMENTO NO. 2

MONTO PROGRAMADO DE CONTRATO + CONVENIO \$2,422,199.53 SIN IVA
IMPORTE PENDIENTE \$315,403.27 SIN IVA

CALCULO DE RETENCION/SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA
DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA DEL CONTRATO

CONCEPTO	IMPORTE FUERA DE PROGRAMA	SANCION / RETENCION DEL 1.0%/MES	NUMERO DE MESES DE RETRASO	IMPORTE DE SANCION	IMPORTE DE REINTEGRO	ESTIMACION No. 1 DE CONVENIO (PERIODO 18 AL 31 DE ENERO 2018)
INCISO B	\$315,403.27	\$3,154.02	1.00	\$3,154.03		
						TOTAL \$3,154.03 SIN I.V.A.

ELABORO:

ARG. HIRAM LOZANO HERNANDEZ

REVISO:

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUEGLIO

Vo.Bo.

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA

CHIHUAHUA, CHIH., ENERO 2018



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RESUMEN DE ESTIMACION



PROGRAMA: PID2017	CONTRATO No. 168/2017	CONTRATADOS \$ 2,439,873.32 CON IVA
OBRA: REMODELACIÓN PARQUE RIBERAS DE SACRAMENTO No. 2;	ESTIMACIÓN No. ESTIMACION 1 CONV	
	PERIODO EJEC.	18-ENE-2018 al 31-ENE-2018
UBICACIÓN: C. RIO MONTAGUA Y C. RIO ROJO # Col.COL. RIBERAS DE SACRAMENTO	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 365,867.79
CONTRATISTA: SEMCOR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 2,439,873.32
RFC SMC110310DM6	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 2,805,741.11

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	NORMALES	\$ 308,341.81	
	EXCEDENTES	\$ 0.00	
	EXTRAS	\$ 7,061.46	
	DEVOLUCIÓN	\$ 0.00	
	RETENCIÓN	\$ 0.00	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 315,403.27	

DESCUENTOS

--	SANCIÓN POR INCUMP.	\$ 3,154.03
0.2 %	DIF	\$ 630.81
0.2 %	CMIC	\$ 630.81
	SUMA DESCUENTOS	\$ 4,415.65

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 315,403.27
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 315,403.27
I.V.A.	\$ 50,464.52
TOTAL	\$ 365,867.79

(CON LETRA)
(TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 4,415.65
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 361,452.14

SEMCOR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

ELABORO CONTRATISTA
REVISO

HIRAM LOZANO

AUTORIZO RESIDENTE D.O.P.M
Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE:

\$ 364,606.17

(TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 17/100 M.N.)

COMO PAGO A LA ESTIMACIÓN NUM. ESTIMACION 1 CONV CONTRATO No. 168/2017 POR LA CANTIDAD DE: \$ 2,805,741.11
 DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 11/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
 REMODELACIÓN PARQUE RIBERAS DE SACRAMENTO No. 2;

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	315,403.27
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	315,403.27
IVA	\$	50,464.52
TOTAL	\$	365,867.79

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO	3,154.03
RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO	
DIF DEL 0.20%	630.81
CMIC DEL 0.20%	630.81
SUMA	1,261.62

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA**1.- CONTRATO**

IMPORTE CONTRATADO
 CONVENIO MODIFICATORIO
 ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
 ESTA ESTIMACION
 ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION
 POR EJERCER

CONTRATO

\$	2,439,873.32
\$	365,867.79
\$	2,439,873.32
\$	365,867.79
\$	2,805,741.11
\$	0.00

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
 ACUMULADO ANTERIOR
 ESTA ESTIMACION
 ACUMULADO ACTUAL
 POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$	731,962.00
\$	731,962.00
\$	0.00
\$	731,962.00
\$	0.00

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.20% DIF	0.20% CMIC
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 4,206.68	\$ 4,206.68
ESTA ESTIMACION	\$ 630.81	\$ 630.81
ACUMULADO ACTUAL	\$ 4,837.49	\$ 4,837.49

RECIBIMOS

SEMCOR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
SMC110310DM6

OBRA: REMODELACIÓN PARQUE RIBERAS DE SACRAMENTO No. 2;

UBICACIÓN: C. RIO MONTAGUA Y C. RIO ROJO # Col. COL. RIBERAS DE

ESTIMACIÓN No.: ESTIMACION 1 CONV

No. CONTRATO: 168/2017

CONTRATISTA: SEMCOR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

PERIODO: DEL 18/01/2018 AL 31/01/2018



CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
	OBRA NORMAL							
	REMODELACIÓN PARQUE RIBERAS DE SACRAMENTO No. 2							\$ 308,341.81
3	CANCHA DE FUTBOL 7X7							\$ 308,341.81
3.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO MARCA SPORTURF MODELO SUPER CUP DE 55MM. DE ALTURA Y 32 OZ. POR YARDA CUADRADA DE DENSIDAD O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACION, CON DOBLE BASE DE URETANO REFORZADA Y TERMOFUSIONADA PARA MAYOR DURABILIDAD INSTALADO EN ROLLOS DE 4.57 MTS. DE ANCHO MEDIANTE PROCESO DE COSIDO ENTRE ROLLOS CON MAQUINA DE COSER UNION ESPECIAL DE DOBLE NUDO PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS, ARENA SILICA A RAZON DE 22 KG/M2 Y CAUCHO VIRGEN SBR GRANULADO DE 3MM. A RAZON DE 8 KG/M2.	M2	1,120.260000	1,116.520000	681.140000	435.380000	\$ 455.82	\$ 198,454.91
5	MOBILIARIO URBANO							\$ 70,000.73
5.01	BANCA METROPOLITAN MODELO FTPBM16 GRAVIZADA DE LA MARCA REGISTRADA GRAVI, CON DIMENSIONES DE 1.60MTS DE LARGO X .82MTS DE ALTO DEL NIVEL DE PISO, SU RESPALDO FABRICADO CON PLACA CON PERFORACIONES CUADRADAS DE 3/8 X 3/8, LATERALES DE PLACA Y ANGULO GRAVIZADOS CON LOGOTIPO DE LA ADMINISTRACION, LOS DESCANSABRAZOS DE SOLERA, ASIENTO DE PERIFL GRAVIZADO MADERA . ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA.	PZA	11.000000	11.000000	0.000000	11.000000	\$ 4,146.19	\$ 45,608.09
5.02	BOTE DE BASURA GRAVIZADO DE LA MARCA REGISTRADA GRAVI, CON DIMENSIONES DE 1.30MTS DE LARGO, .40MTS DE ANCHO Y .1.20MTS DE ALTURA SU ESTRUCTURA CON POSTES TUBULARES EN LOS LATERALES Y AL CENTRO, AL CENTRO EL CONTENEDOR PARA BATERIAS. CALADO LA LEYENDA ORGANICO Y INORGANICO PARA CADA CEPO, GRAVIZADO EL LOGOTIPO DE LA ADMINISTRACION Y SU ESLOGAN. ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA.	PZA	8.000000	8.000000	0.000000	8.000000	\$ 3,049.08	\$ 24,392.64
7	ALUMBRADO							\$ 39,886.17
7.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR ULTRAFLOOD SERIE 75 400 W HEAVY DUTY FLOODLIGHT	PZA	6.000000	5.000000	2.000000	3.000000	\$ 13,295.39	\$ 39,886.17
	OBRA EXCEDENTE							\$ 0.00
	OBRA EXTRAORDINARIA							\$ 7,061.46
	REMODELACIÓN PARQUE RIBERAS DE SACRAMENTO No. 2							\$ 7,061.46
7	ALUMBRADO							\$ 7,061.46

9/1/18

HIRAM LOZANO
RESIDENTE D.O.P.M.

SEMCOR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

OBRA: REMODELACIÓN PARQUE RIBERAS DE SACRAMENTO No. 2;

UBICACIÓN: C. RIO MONTAGUA Y C. RIO ROJO # Col. COL. RIBERAS DE
ESTIMACIÓN No.: ESTIMACION 1 CONV
No. CONTRATO: 168/2017
PERIODO: DEL 18/01/2018 AL 31/01/2018



CONTRATISTA: SEMCOR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				UNIDAD	VOLUMEN	ACUM TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO
EXT	EXTRAS							
EXT-19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA ARBOTANTE DE 12M DE ALTURA PARA SOPORTAR REFLECTORES DE CANCHA DE FUTBOL	PZA	0.000000		0.000000	2.000000	0.000000	2.000000
								\$ 7,061.46
								\$ 7,061.46


SEMCOR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


HIRSAM LOZANO
RESIDENTE D.O.P.M.

SEMCOR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

HOJA

GENERADOR DE ESTIMACION


CONTRATO:	DOPM-22-2017-II	TRAMO:	REHABILITACION DE PARQUE RIBERAS DE SACRAMENTO II
OBRA:	REHABILITACION DE PARQUE RIBERAS DE SACRAMENTO II	CONTRATISTA	SEMCOR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.


PERIODO 18 Ene. AL 31 de Ene. del 2018

1 (UNO)


No. DE ESTIMACION:

CONCEPTO	3.13	OPERACIONES ARITMETICAS	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO MARCA SPORTURF MODELO SUPER CUP DE 55MM. DE ALTURA Y 32 OZ. POR YARDA CUADRADA DE DENSIDAD O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACION, CON DOBLE BASE DE URETANO REFORZADA Y TERMOFUSIONADA PARA MAYOR DURABILIDAD INSTALADO EN ROLLOS DE 4.57 MTS. DE ANCHO MEDIANTE PROCESO DE COSIDO ENTRE ROLLOS CON MAQUINA DE COSER UNION ESPECIAL DE DOBLE NUDO PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS, ARENA SILICA A RAZON DE 22 KG/M2 Y CAUCHO VIRGEN SBR GRANULADO DE 3MM. A RAZON DE 8 KG/M2.		Cancha 32.73 13.31 435.41 Porterías 0.00 0.00 0.00 Porterías 0.00 0.00 0.00 Total 435.4 m	


CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
 PLANTA DE CANCHA	435.4 m2




CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS
5.01 BANCA METROPOLITAN MODELO FTBKM16 GRAVIZADA DE LA MARCA REGISTRADA GRAVI, CON DIMENSIONES DE 1.60MTS DE LARGO X .82MTS DE ALTO DEL NIVEL DE PISO, SU RESPALDO FABRICADO CON PLACA CON PERFORACIONES CUADRADAS DE 3/8 X 3/8, LATERALES DE PLACA Y ANGULO GRAVIZADOS CON LOGOTIPO DE LA ADMINISTRACION, LOS DESCANSABRAZOS DE SOLERA, ASIENTO DE PERIFL GRAVIZADO MADERA. ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA.	Unidad Pza cantidad 11

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
	11 pza



CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS
5.2 BOTE DE BASURA GRAVIZADO DE LA MARCA REGISTRADA GRAVI, CON DIMENSIONES DE 1.30MTS DE LARGO, .40MTS DE ANCHO Y .1.20MTS DE ALTURA SU ESTRUCTURA CON POSTES TUBULARES EN LOS LATERALES Y AL CENTRO, AL CENTRO EL CONTENEDOR PARA BATERIAS. CALADO LA LEYENDA ORGANICO Y INORGANICO PARA CADA CEPO, GRAVIZADO EL LOGOTIPO DE LA ADMINISTRACION Y SU ESLOGAN. ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA.	Unidad Pza cantidad 8

CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR
	8 m3



CONVENIO #1

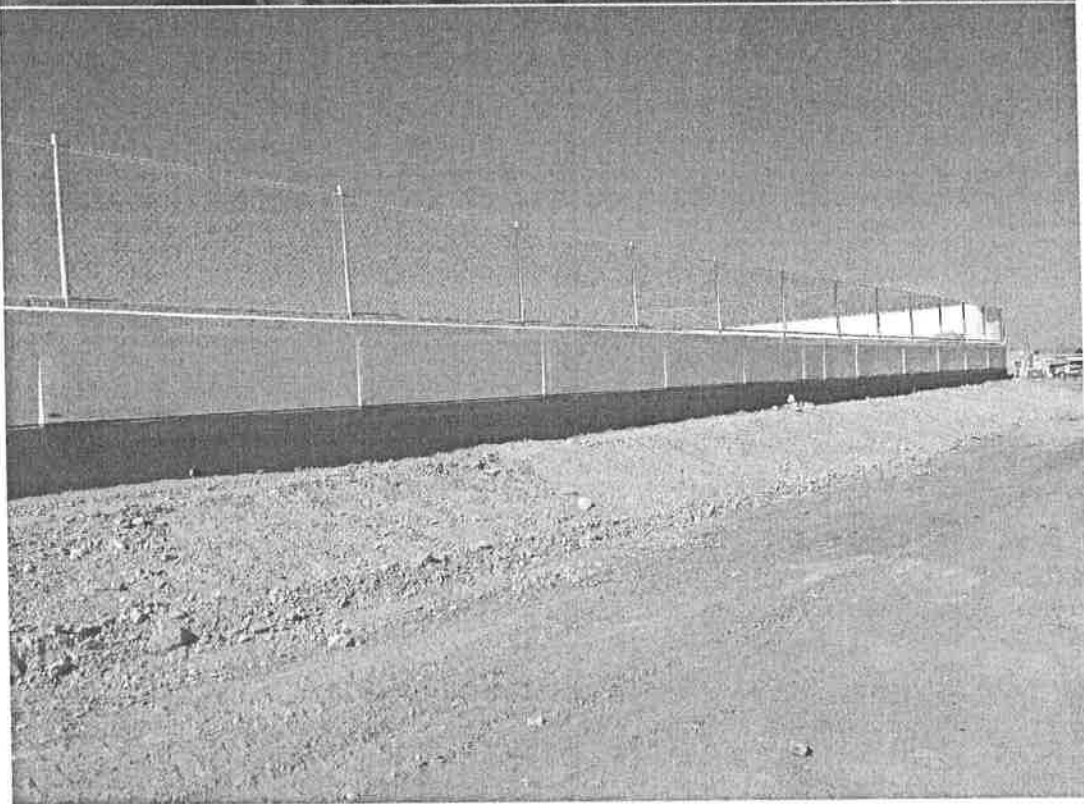


14

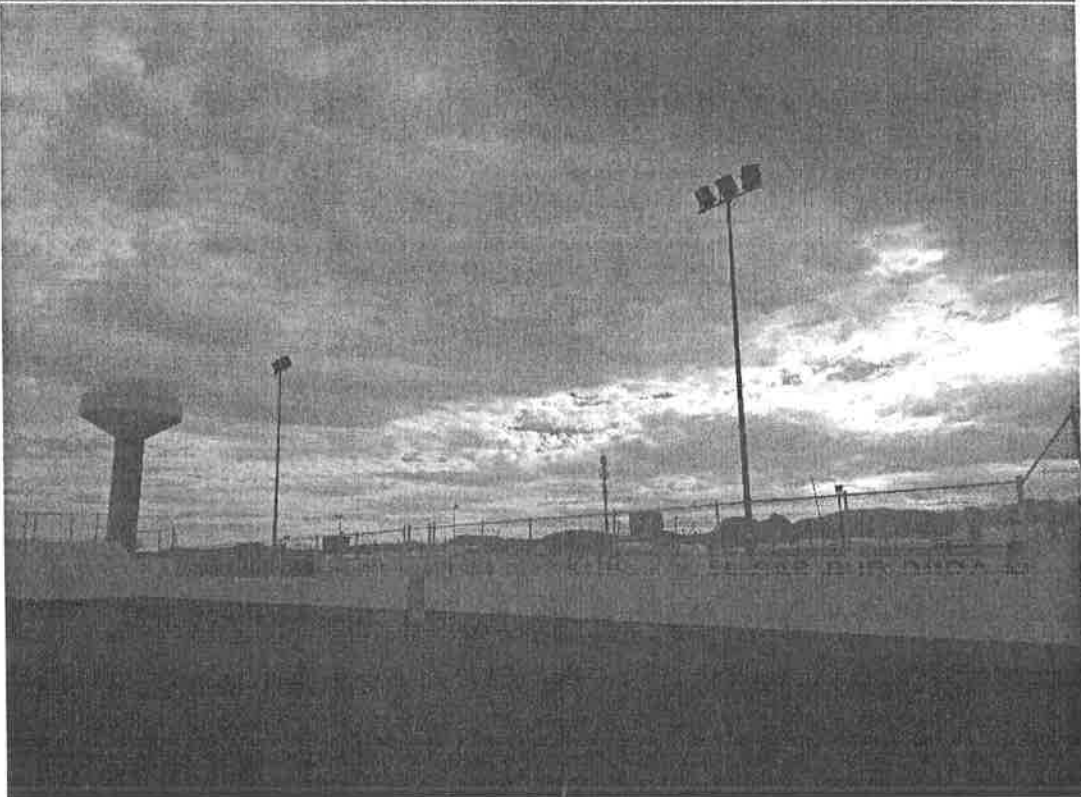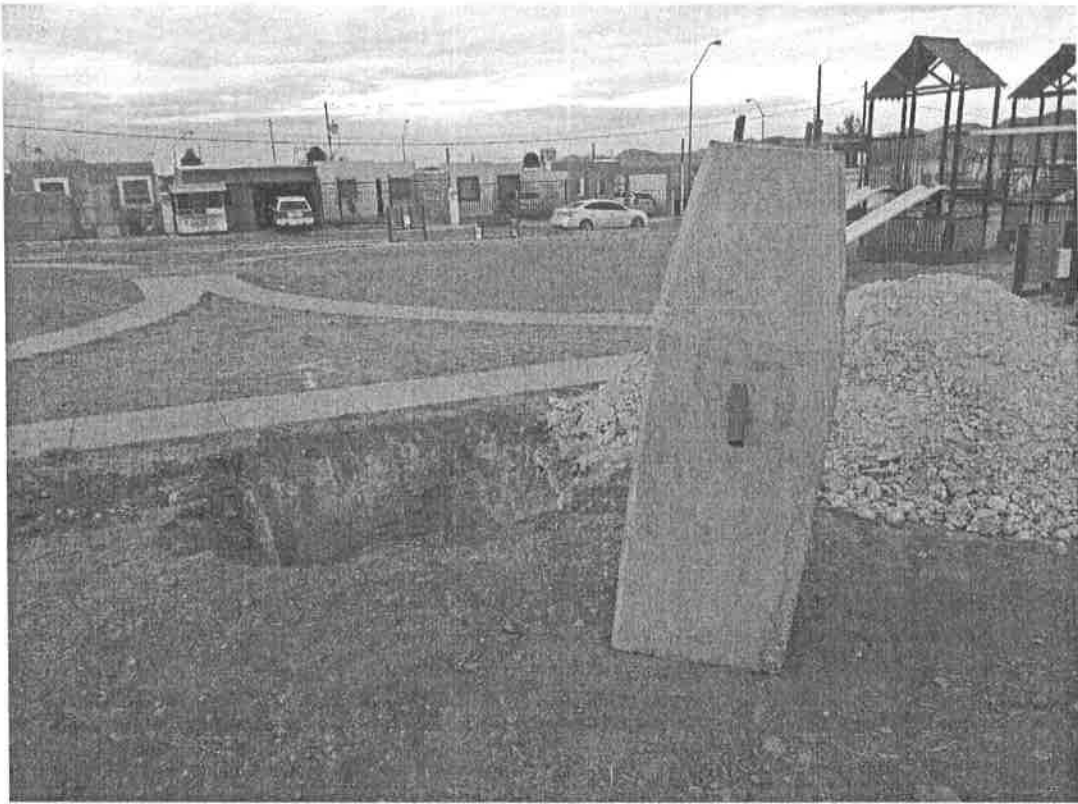



119

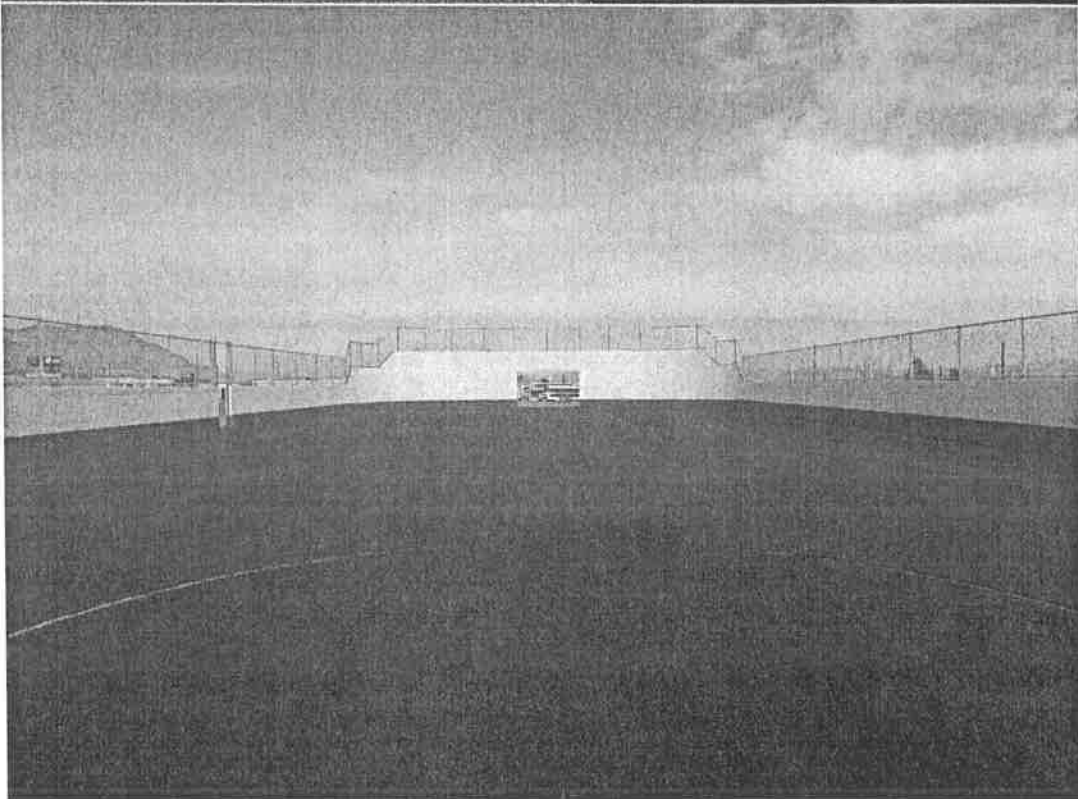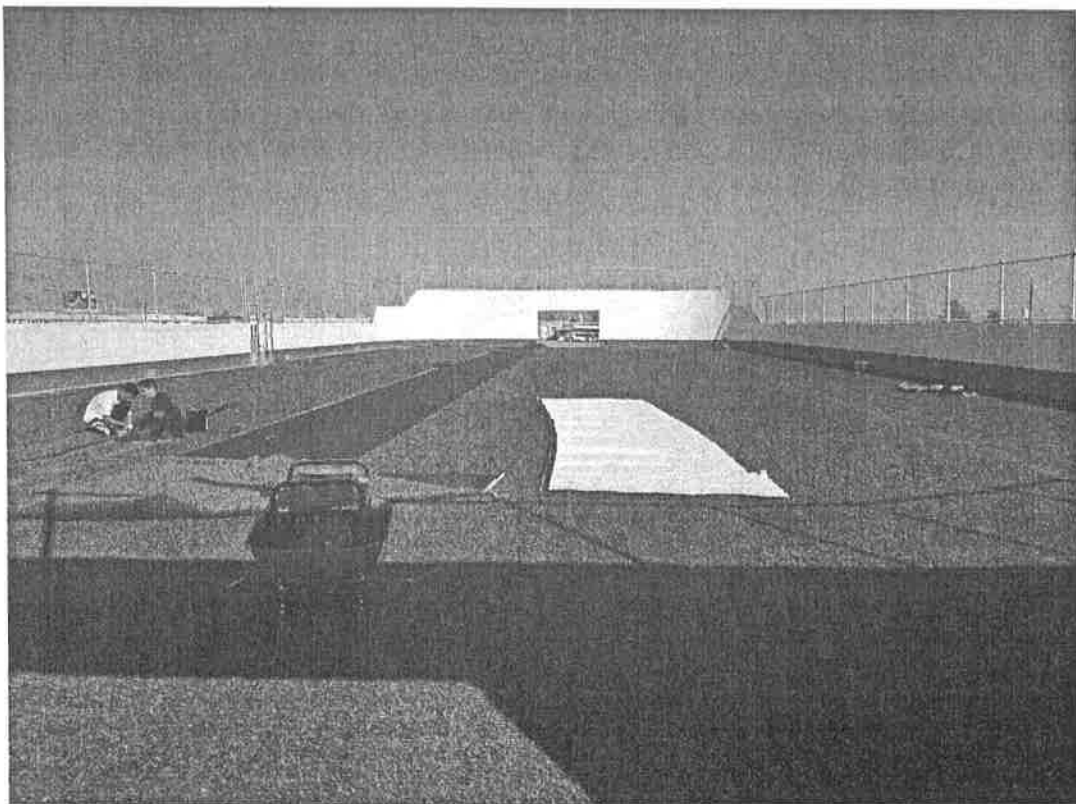



HP

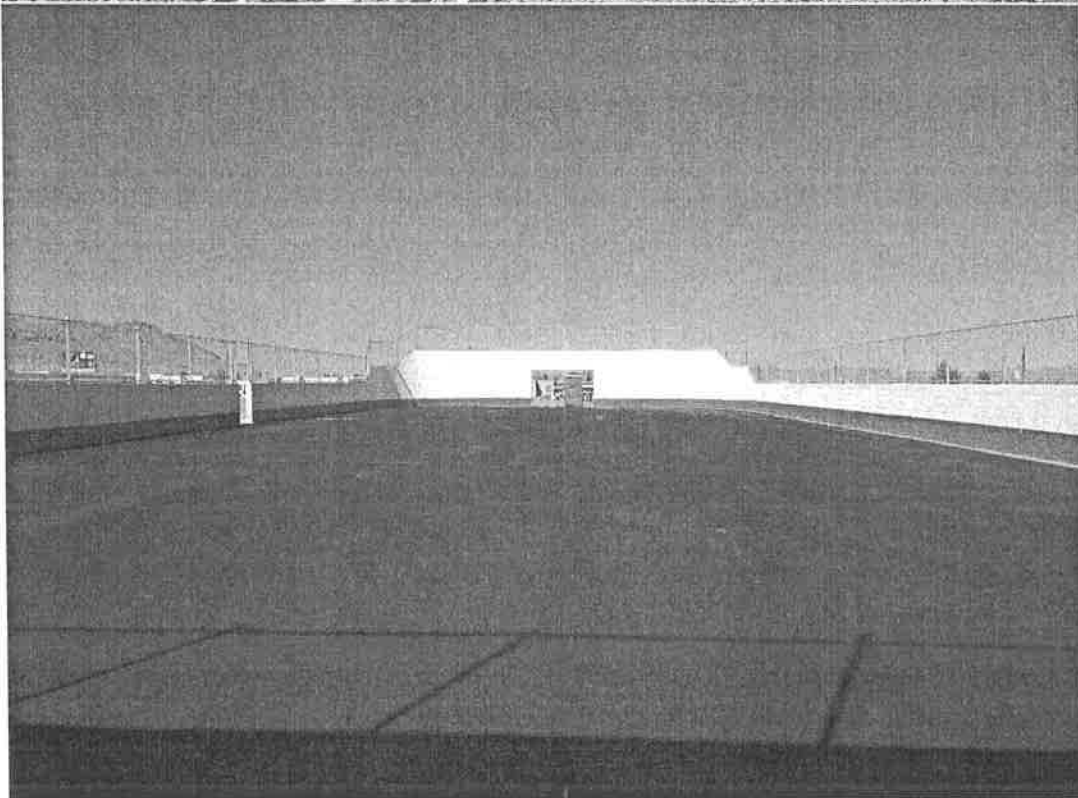

14

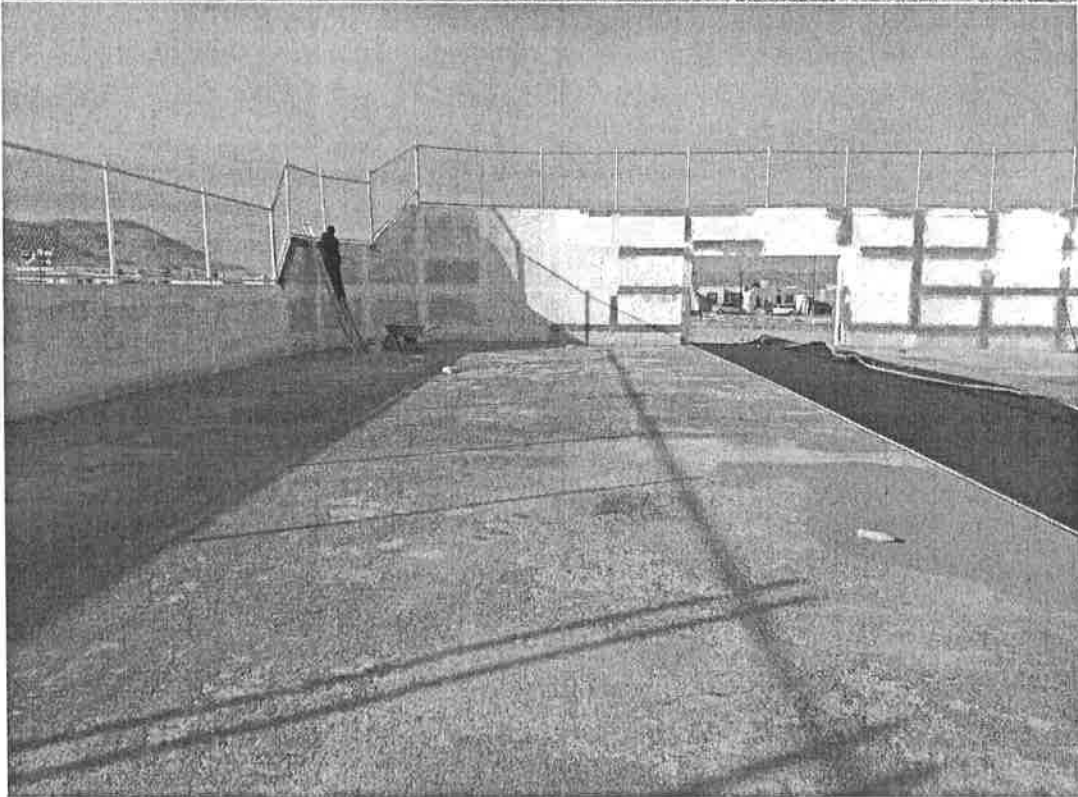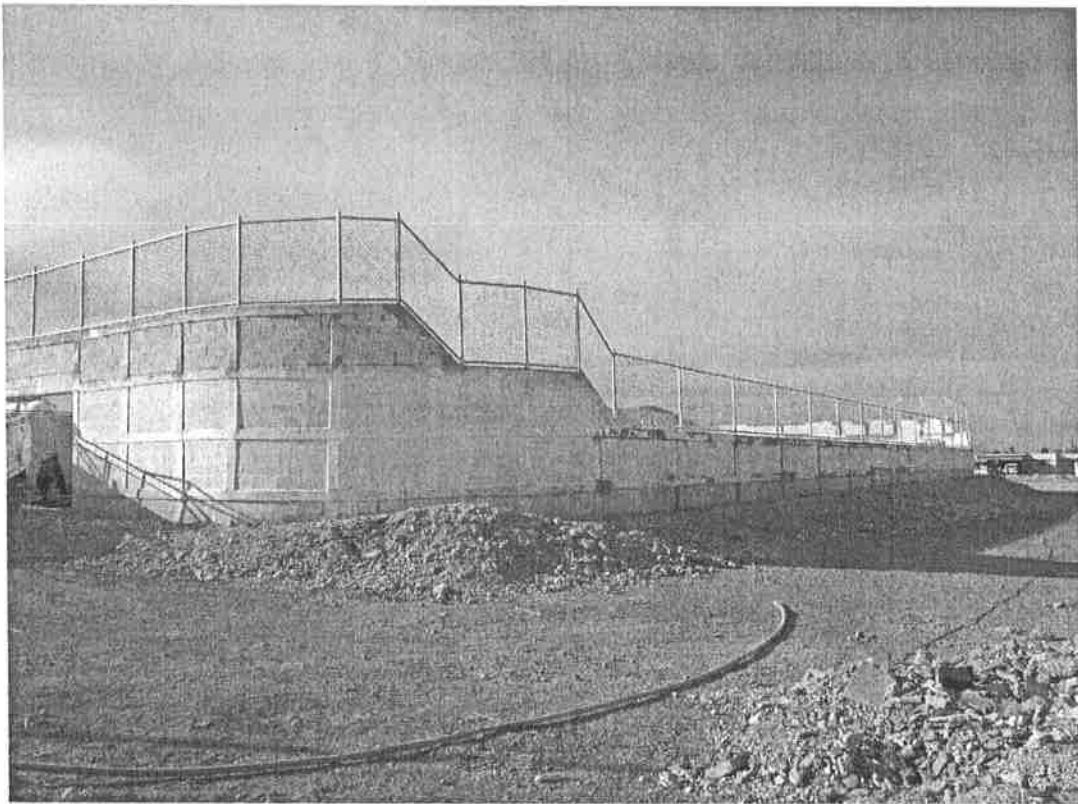

119

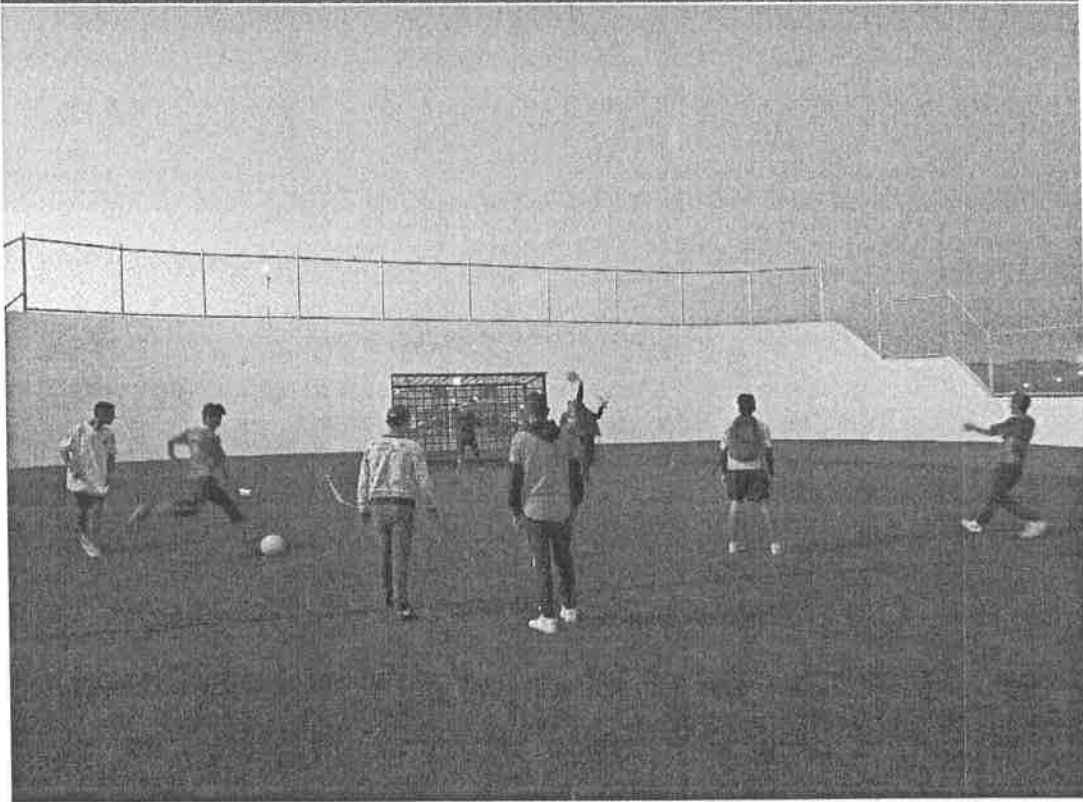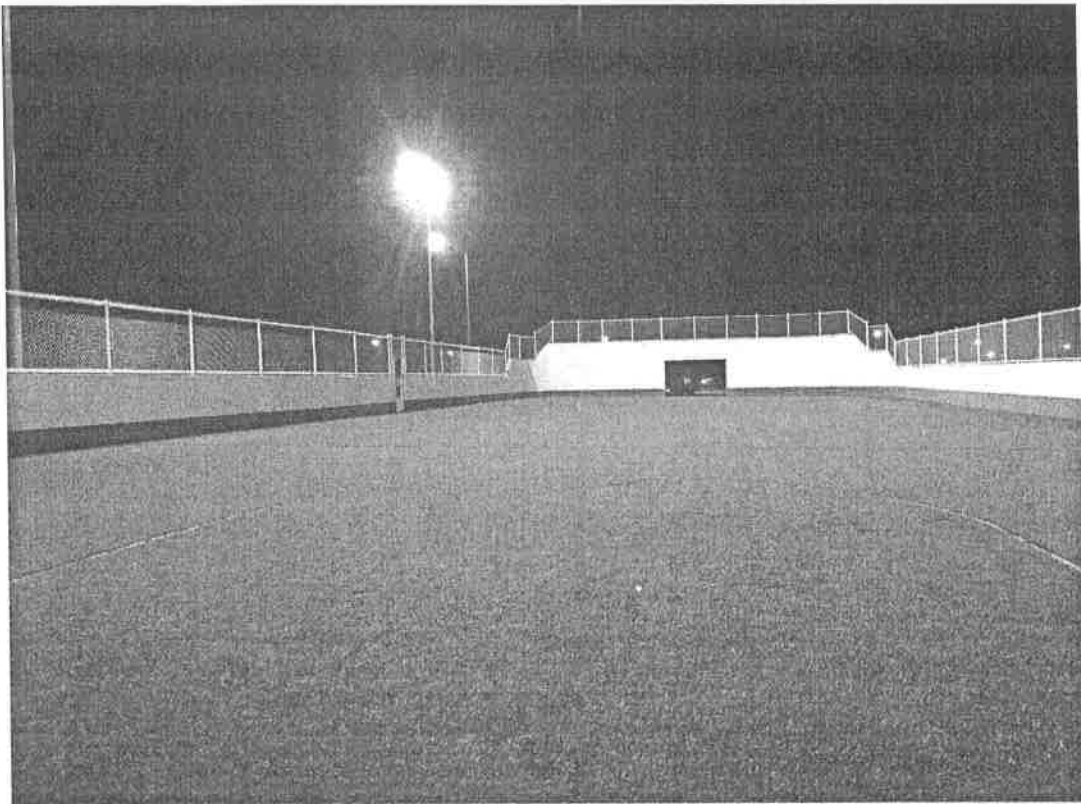

AIQ



OFICIO No. CS//2017

01 de Noviembre del 2017

C. CESAR CHAVIRA S.
DIRECTOR GENERAL DE
SEMCOR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Con relación a su escrito con fecha del 07 de noviembre del año en curso, en los que solicita la revisión de los precios extraordinarios de la obra **"REMODELACIÓN PARQUE RIBERAS DE SACRAMENTO No. 2"**, bajo contrato No. **168/2017**. Por este conducto le comunico, que una vez revisados y analizados los mismos, se autorizan los precios unitarios que a continuación se relacionan:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO SOLICITADO	PRECIO AUTORIZADO
EXT-01	ZAPATA CORRIDA DE 40 CMS DE ANCHO POR 15 CMS DE PERALTE ARMADA CON 3 VARS. #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS. #3 @30 CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C=200 KG/CM2.	ML	\$303.78	\$303.78
EXT-02	MURETE A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 20X20X40 CMS. RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4 Y ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS.	M2	\$422.51	\$422.51
EXT-03	TRABE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 20X40 CMS. ARMADA CON 2 VARILLAS DE #3 EN LECHO SUPERIOR Y 3 VARILLAS #4 EN LECHO INFERIOR Y ESTRIBOS #2 A CADA 20 CMS. INC. CIMBRA APARENTE, ARMADO Y COLADO.	ML	\$477.01	\$456.54
EXT-04	COLUMNA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON SECCIÓN DE 20X25 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2@ 20 CMS. INC. CIMBRADO APARENTE, TUINO EN ESQUINAS, ARMADO Y COLADO.	ML	\$383.84	\$383.84
EXT-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA CAL. 10.5 DE 1.50 MTS. DE ALTURA CON POSTES DE ARRANQUE DE 3" CED. 30, POSTES DE LÍNEA DE 2 1/2" CED. 30 @ 3.3 MTS. EN MURO CHICO Y @1.78 PROMEDIO EN MUROS CABECEROS, BARRA HORIZONTAL DE 1 5/8" CED. 30 SUPERIOR E INFERIOR INC. SOLDADURA EN UNIONES, PINTURA DE ESMALTE EN TUBO CED. 30	ML	\$630.36	\$630.36

Pág. 1 de 2



OFICIO No. CS//2017

01 de Noviembre del 2017

No.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO SOLICITADO	PRECIO AUTORIZADO
EXT-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA METÁLICA DE 1/4 DE ESPESOR DE 15X15 CMS INC. 4 ANCLAS DE 1/2" DE VARILLA CORRUGADA.	PIEZA	\$297.25	\$116.56
EXT-07	DREN A BASE DE HUECO EN MURO DE BLOCK RELLENO, SECCIÓN 15X20 CMS INC. APLANADO INTERIOR Y PERFILADO.	PIEZA	\$254.41	\$124.82
EXT-08	COLOCACIÓN DE PLACA DE BRONCE DE 46X26 CMS INC. CIMBRA APARENTE Y LO NECESARIO PARA RECIBIMIENTO DE PLACA SUMINISTRADA POR OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.	PIEZA	\$3,406.76	NO APLICA
EXT-09	AFINE Y COMPACTACIÓN DEL ÁREA DE DESPLANTE AL 90% CON BAILARINA, AGREGAR AGUA.	M2	\$24.44	\$19.92
EXT-10	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CRUCES DE CASTILLOS Y DALAS.	KGS	\$26.65	\$26.65

ATENTAMENTE


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C

C.C.P. ING. JAVIER VILLARREAL POSADA. SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
C.C.P. ING MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO. JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL.
C.C.P. ARQ. HIRAM LOZANO HERNÁNDEZ. RESIDENTE DE OBRA
ARCHIVO / mcmc

Pág. 2 de 2

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Camino a la Presa Chuviscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Computador 072 Ext. 5402 Tel. (614) 298-1500
