

Factura No: 246**Sergio Ivan Loya Teruel**

LOTS840731AJ4

FOLIO FISCAL (UUID):

50A5B694-6B20-40A1-9E1C-624427EF5609


Domicilio Fiscal

Sidney 4367

Col. Residencial Campestre 31213

Chihuahua Chihuahua Chihuahua México

Tel. 6144166197

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**
2017-11-24T15:07:32**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**
2017-11-24T15:02:31**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**
00001000000405535779**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**
00001000000407605133**CLIENTE:****MUNICIPIO DE CHIHUAHUA****RFC:** MCJ651010V22**DIRECCIÓN:**

MINA 408

COL. CENTRO Código Postal: 31000

CHIHUAHUA CHIHUAHUA Chihuahua Mexico

Régimen Fiscal:

Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de Expedición:

Chihuahua, Chihuahua

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición

Fecha de Expedición:24 noviembre 2017 **Clave de Moneda:**

MXN

Método de Pago:

02-Cheque nominativo

NumCtaPago:

6713

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	n/a	1	Pago por concepto de estimacion no. 1 (Uno), relativo a "Suministro y aplicación de pintura en calles y avenidas en accesos de la ciudad", según contrato No. 178/2017.	\$ 388,721.00	\$ 388,721.00

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 388,721.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 0.00**RETENCIONES DEL CONTRATO**0.2% D.I.F. \$ 777.44
0.2% C.M.I.C. \$ 777.44
SUMA \$ 1,544.88**NETO A RECIBIR \$ 449,361.48****IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS, 36/100 MXN**
SUBTOTAL: \$ 388,721.00
IVA(IVA 16.00%): \$ 62,195.36
TOTAL: \$ 450,916.36
SELLO DIGITAL DEL CFDI

MZBswFJile+it2V0V9e6Msh80ZZ84PHh4qycy1M2XoFAGDS-D0P1KFOK+iw4WWAmMKEQKIG13uGGdEITgEiMoM1uoTHDSicNAHDIPYHGvWGGocT2bxts98ZPnaM0k6NIVyRKPJ14lxQ4UAWyR5OUYKROw
 XNdhUvSK5ufzhN3IYEyMbFWEA0U1J4UHLZIGBsPmaE1gYO96RSIGUis16A9V03Jo4yrwqGn9SYthdEhPASBEVLnsNlcJe50Cb1TyWWWq7XRiSPW4KGRK120JARYXU3XbHnzJbzGEYX3h8u6Z9x9sOuPFbfx
 Qz1562ah86jg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

colHel.9cG40V3yhf7dPawUzpYOSdvsj5MvqNSjPD22nNiv5b1lehrwZCG8uJlBx0DwT3HFge343EShsyJdpe6TUHA7cf8Dc0hk1P92+JjsW/FBNH8kHdzA5iITvuiWQZa4gcQG7DOvIIKOWe3oldIP65b6VXncZoWJQ
 perVov1p5nMH3pzs59q5SaATHAJO+qFvKkhHurdYYewzuinoq9cvSIDbbYHeQpSYsCuM0M0XE/4vukJlGolzmq68WdIMF2v6h7KM5WUaM59Uj+KkVE28VIsd85ChWb+M8l94/4WZnJGqdzMO0SYCPJouA9pB8g
 Htn102w6w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|50A5B694-6B20-40A1-9E1C-624427EF5609|2017-11-24T15:07:32|MZBswFJile+it2V0V9e6Msh80ZZ84PHh4qycy1M2XoFAGDS-D0P1KFOK+iw4WWAmMKEQKIG13uGGdEITgEiMoM1uoTHDSicNAHDIPYHGvWGGocT2bxts98ZPnaM0k6NIVyRKPJ14lxQ4UAWyR5OUYKROwXNdhUvSK5ufzhN3IYEyMbFWEA0U1J4UHLZIGBsPmaE1gYO96RSIGUis16A9V03Jo4yrwqGn9SYthdEhPASBEVLnsNlcJe50Cb1TyWWWq7XRiSPW4KGRK120JARYXU3XbHnzJbzGEYX3h8u6Z9x9sOuPFbfx||00001000000405535779||

www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
 Proveedor Autorizado de Certificación
 No. SAT 55710


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

* Datos obligatorios

RFC del emisor

LOTS840731AJ4

Folio fiscal

50A6B694-6B20-40A1-9E1C-
624427EF5609

Total del CFDI

\$450,916:36

Nombre o razón social del
emisor

Sergio Ivan Loya Teruel

Fecha de expedición

2017-11-24T15:02:31

Efecto del comprobante

ingreso

RFC del receptor

MCI651010V22

Fecha certificación
SAT

2017-11-24T15:07:32

Estado CFDI

Vigente

Nombre o razón social del
receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que certificó

FMD100203JS7

Verificar CFDI

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobierno/federal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobierno/federal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- [Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

- [English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)
- [Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)
- [Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx


[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

Mantente informado. Suscríbete.



Síguenos en

<https://www.facebook.com/gobmx> <https://twitter.com/gobmx>





PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

HOJA DE RESUMEN FINAL
No. 1

PROGRAMA: OBRA: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CALLES Y AVENIDAS EN ACCESOS DE LA CIUDAD ARQ. SERGIO IVAN LOYA TERUEL R.F.C. LOTS840731AJ4	CONTRATO No. 178/2017 ESTIMACION No. 1 PERIODO: DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017. IMPORTE ESTIMADO \$ 450,916.36 IMPORTE ACUMULADO \$ 450,916.36	CONTRATADO \$ 450,916.36
C O N C E P T O	I M P O R T E	O B S E R V A C I O N E S
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CALLES Y AVENIDAS EN ACCESOS DE LA CIUDAD	\$ 388,721.00	
IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION \$ 388,721.00		
DESCUENTOS: 0.2 % DIF (AL MILLAR) \$ 777.44 0.2 % CMIC (AL MILLAR) \$ 777.44 SUMA DESCUENTOS \$ 1,554.88		
RESUMEN: SUMA ESTA ESTIMACION \$ 388,721.00 AMORTIZACION ANTICIPO (0 % \$ 0.00 DESCUENTOS \$ 1,554.88 SUB - TOTAL \$ 387,166.12 I.V.A. \$ 62,195.36 SALDO NETO PARA PAGO \$ 449,361.48		
CON LETRA: (CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 48/100 M.N.)		

FORMULO: RESIDENTE DE OBRA
ING. JESUS GARAY RUIZ

REVISO
JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO VIAL SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA
ING. VICTOR AMADOR PONCE DE LEON

ACEPTO:
EL CONTRATISTA
ARQ. SERGIO IVAN LOYA TERUEL

Vo.Bo.:
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

GENERADOR DE ESTIMACIÓN PARA MARCAS DE PAVIMENTO**Marcas en pavimento, por unidad de obra terminada (EP-232):**

Raya de 12 cm de ancho.

HULE CLORADO

ALDAMA - CHIHUAHUA					
NO. CARRILES lado izquierdo	0				
NO. CARRILES lado derecho	2				
AMARILLA CONTINUA					
CADENAMIENTO		ANCHO	LARGO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
12+000	3+000	0.12	0	2747.5	LADO INVERSO
BLANCA CONTINUA					
12+000	3+000	0.12	0	2747.5	LADO INVERSO
BLANCA SEMICONTINUA					
12+000	3+000	0.12	0	3500.00	LADO INVERSO


Marcas en pavimento, por unidad de obra terminada (EP-232):

Raya de 12 cm de ancho.

PINTURA TERMOPLÁSTICA

ALDAMA - CHIHUAHUA						
NO. CARRILES lado izquierdo	2	longitud lado izquierdo	9000	continua blanca	continua amarilla	semicontinua blanca
NO. CARRILES lado derecho	0	longitud lado derecho	9000	0	0	3158.20
AMARILLA CONTINUA						
CADENAMIENTO		ANCHO	LARGO	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
3+000	12+000	0.12	9000	0	LADO INVERSO	
BLANCA CONTINUA						
12+000	3+000	0.12	9000	0	LADO INVERSO	
BLANCA SEMICONTINUA						
12+000	3+000	0.12	9000	3261.00	LADO INVERSO	


 CONTRATISTA
 ARQ. SERGIO IVAN LOYA TERUEL


 SUPERVISOR
 ING. JESUS GARAY RUIZ

GENERADOR DE ESTIMACIÓN PARA MARCAS DE PAVIMENTO**Marcas en pavimento, por unidad de obra terminada (EP-232):****Raya de 12 cm de ancho.****AVENIDA FUERZA AÉREA****NO. CARRILES**

lado izquierdo 3

NO. CARRILES

lado derecho 3

AMARILLA CONTINUA**CADENAMIENTO**

		ANCHO	LARGO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
0+000	2+200	0.12	0	2032.5	LADO DIRECTO
2+200	0+000	0.12	0	2032.5	LADO INVERSO

BLANCA CONTINUA

0+000	2+200	0.12	0	2032.5	LADO DIRECTO
2+200	0+000	0.12	0	2032.5	LADO INVERSO

BLANCA SEMICONTINUA

0+000	2+200	0.12	2200	3200.00	SE INCLUYEN LOS TRAMOS CONTINUOS EN CARRILES DE SEMÁFORO
-------	-------	------	------	---------	--

CONTRATO NO: 178/2017

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CALLES Y AVENIDAS EN ACCESOS DE LA CIUDAD

GENERADOR DE ESTIMACIÓN PARA MARCAS DE PAVIMENTO

Marcas en pavimento, por unidad de obra terminada (EP-232):

Raya de 12 cm de ancho.

HULE CLORADO

Avenida Juan Pablo II					
NO. CARRILES lado izquierdo	3				
NO. CARRILES lado derecho	3				
AMARILLA CONTINUA					
CADENAMIENTO		ANCHO	LARGO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
0+000	6+000	0.12	0		LADO DIRECTO
6+000	0+000				LADO INVERSO
BLANCA CONTINUA					
0+000	6+000	0.12	0		LADO DERECHO
6+000	0+000	0.12	6000		LADO INVERSO
BLANCA SEMICONTINUA					
0+000	7+800	0.12	6000	5200	LADO DIRECTO
					2 CARRILES

CONTRATISTA

ARQ. SERGIO IVAN LOYA TERUEL

SUPERVISOR

ING. JESUS GARAY RUIZ

GENERADOR DE ESTIMACIÓN PARA MARCAS DE PAVIMENTO**Marcas en pavimento, por unidad de obra terminada (EP-232):**


Raya de 12 cm de ancho.

HULE CLORADO

Avenida Silvestre Terrazas					
NO. CARRILES lado izquierdo	2				
NO. CARRILES lado derecho	2				
AMARILLA CONTINUA					
CADENAMIENTO		ANCHO	LARGO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
0+000	2+640	0.12	2640	0	LADO DIRECTO
BLANCA CONTINUA					
0+000	2+640	0.12	2000	1000	LADO INVERSO
BLANCA SEMICONTINUA					
0+000	2+640	0.12	2000	600.00	LADO INVERSO



CONTRATISTA
ARQ. SERGIO IVAN LOYA TERUEL



SUPERVISOR
ING. JESUS GARAY RUIZ



CONTRATO NO: 178/2017

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CALLES Y AVENIDAS EN ACCESOS DE LA CIUDAD

ALBUM FOTOGRAFICO

TRAMO: ALDAMA - CHIHUAHUA

SUBTRAMO: Av. Fza. Aérea - Lombardo Toledano

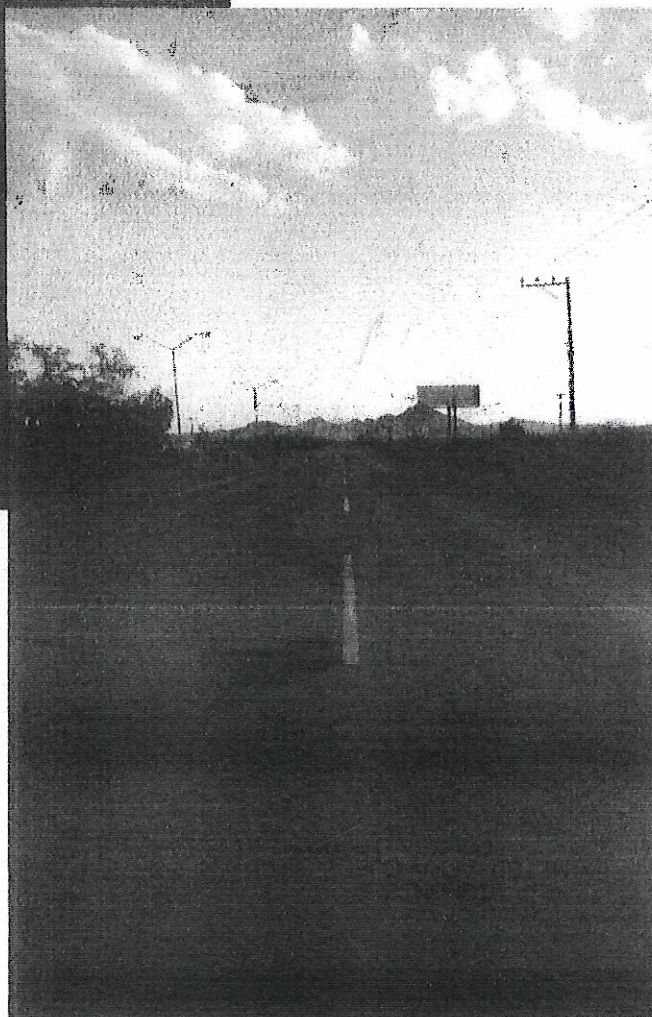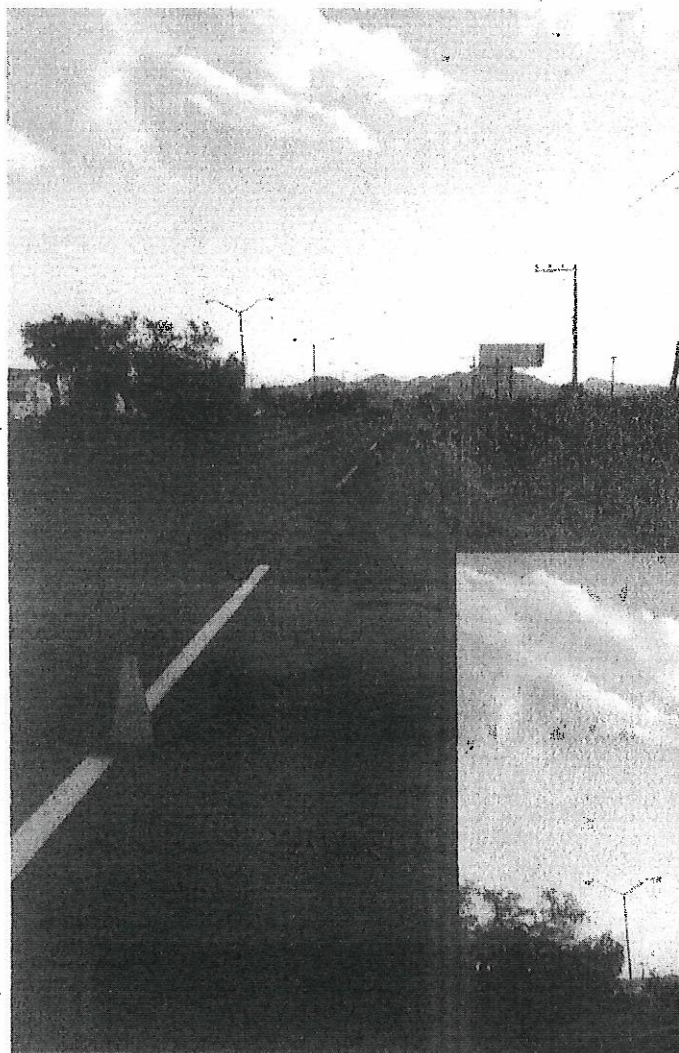

CONTRATISTA

ARQ. SERGIO IVAN LOYA TERUEL

SUPERVISOR

ING. JESUS GARAY RUIZ

CONTRATO NO: 178/2017

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CALLES Y AVENIDAS EN ACCESOS DE LA CIUDAD

ALBUM FOTOGRÁFICO

TRAMO: ALDAMA - CHIHUAHUA

SUBTRAMO: RESTAURANTE EL SIROCO - AVE. LOMBARDO TOLEDANO



CONTRATISTA
ARQ. SERGIO IVAN LOYA TERUEL

SUPERVISOR
ING. JESUS GARAY RUIZ


CONTRATO NO: 178/2017


SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CALLES Y AVENIDAS EN ACCESOS DE LA CIUDAD


ALBUM FOTOGRAFICO

TRAMO: ALDAMA - CHIHUAHUA

SUBTRAMO: RESTAURANTE EL SIROCO - AVE. LOMBARDO TOLEDANO

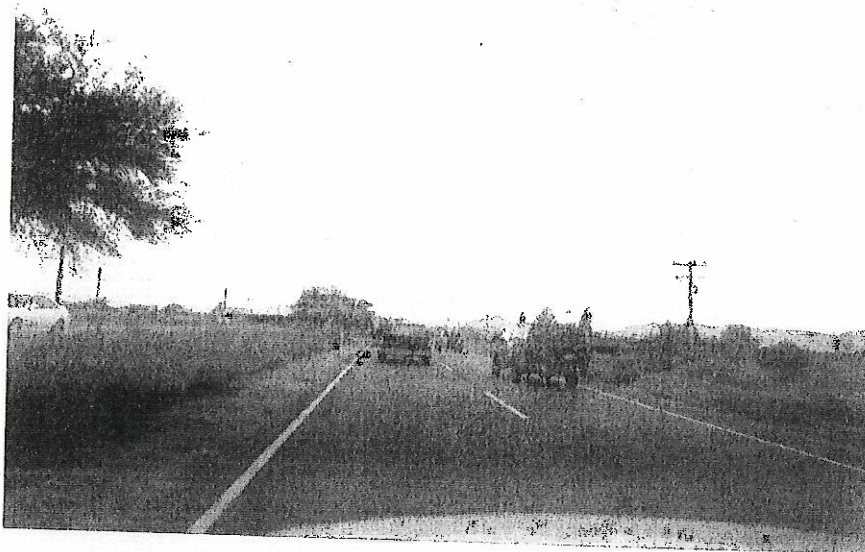


CONTRATISTA
ARQ. SERGIO IVAN LOYA TERUEL


SUPERVISOR
ING. JESUS GARAY RUIZ



CONTRATO NO: 178/2017

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CALLES Y AVENIDAS EN ACCESOS DE LA CIUDAD

ALBUM FOTOGRAFICO

TRAMO: ALDAMA - CHIHUAHUA


SUBTRAMO: RESTAURANTE EL SIROCO - AVE. LOMBARDO TOLEDANO

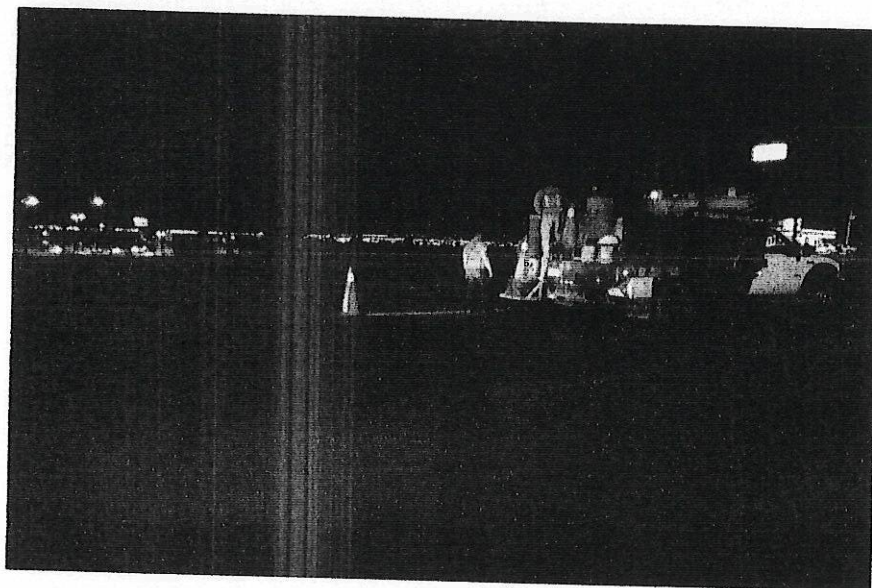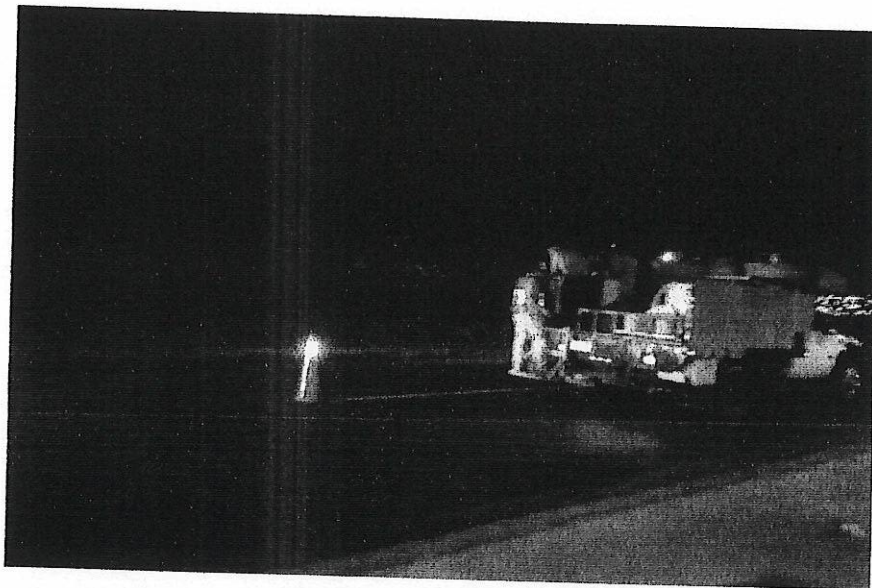


CONTRATISTA
ARQ. SERGIO IVAN LOYA TERUEL

SUPERVISOR
ING. JESUS GARAY RUIZ

AV. FUERZA AEREA MEXICANA

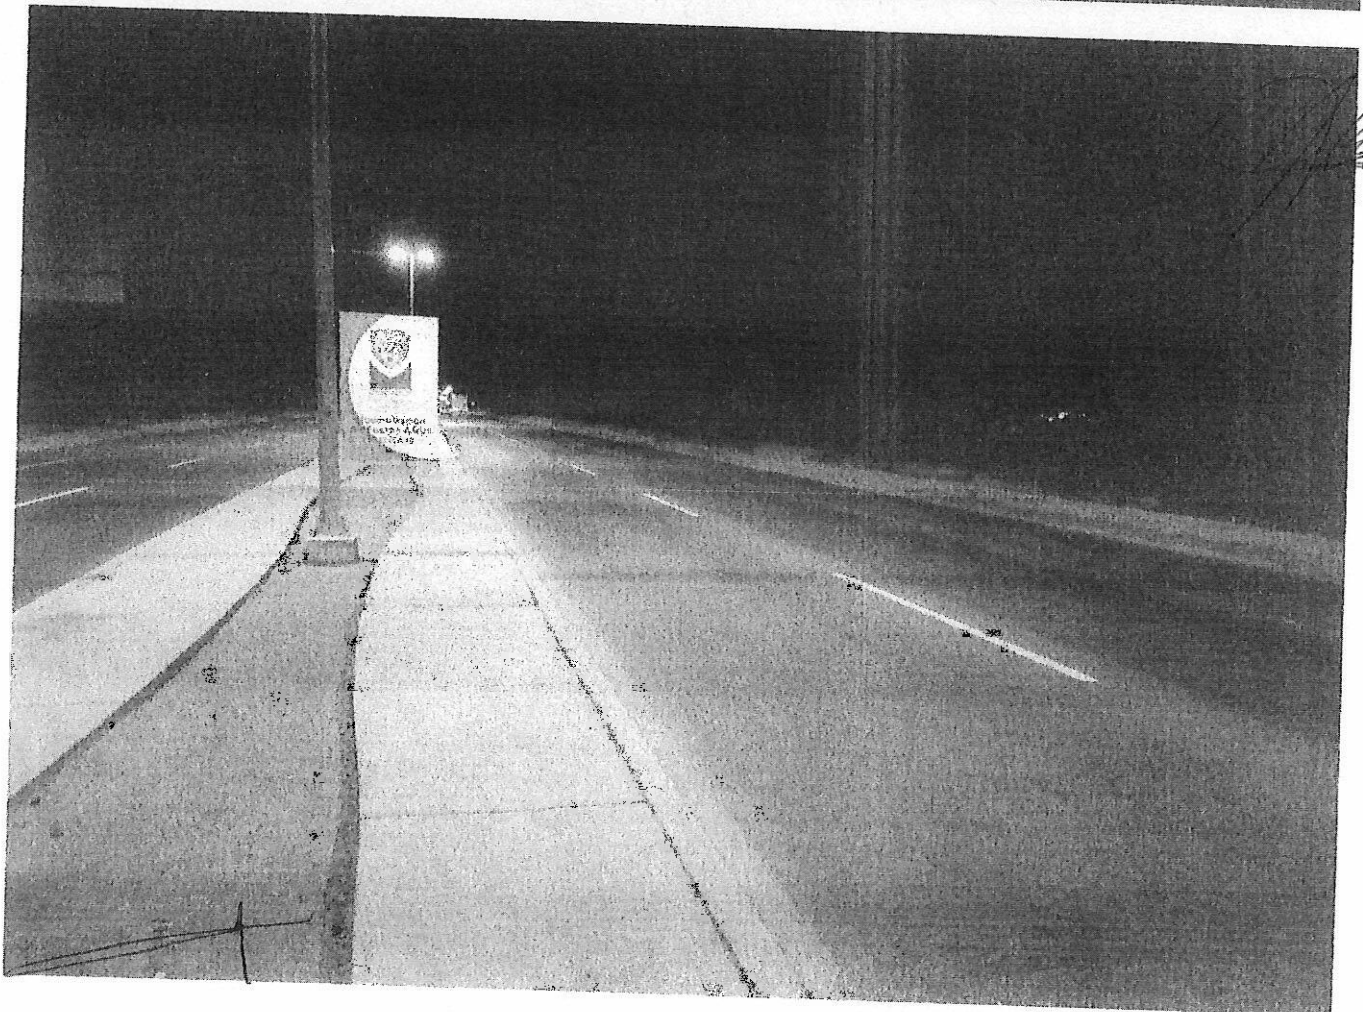



AV. FUERZA AEREA MEXICANA


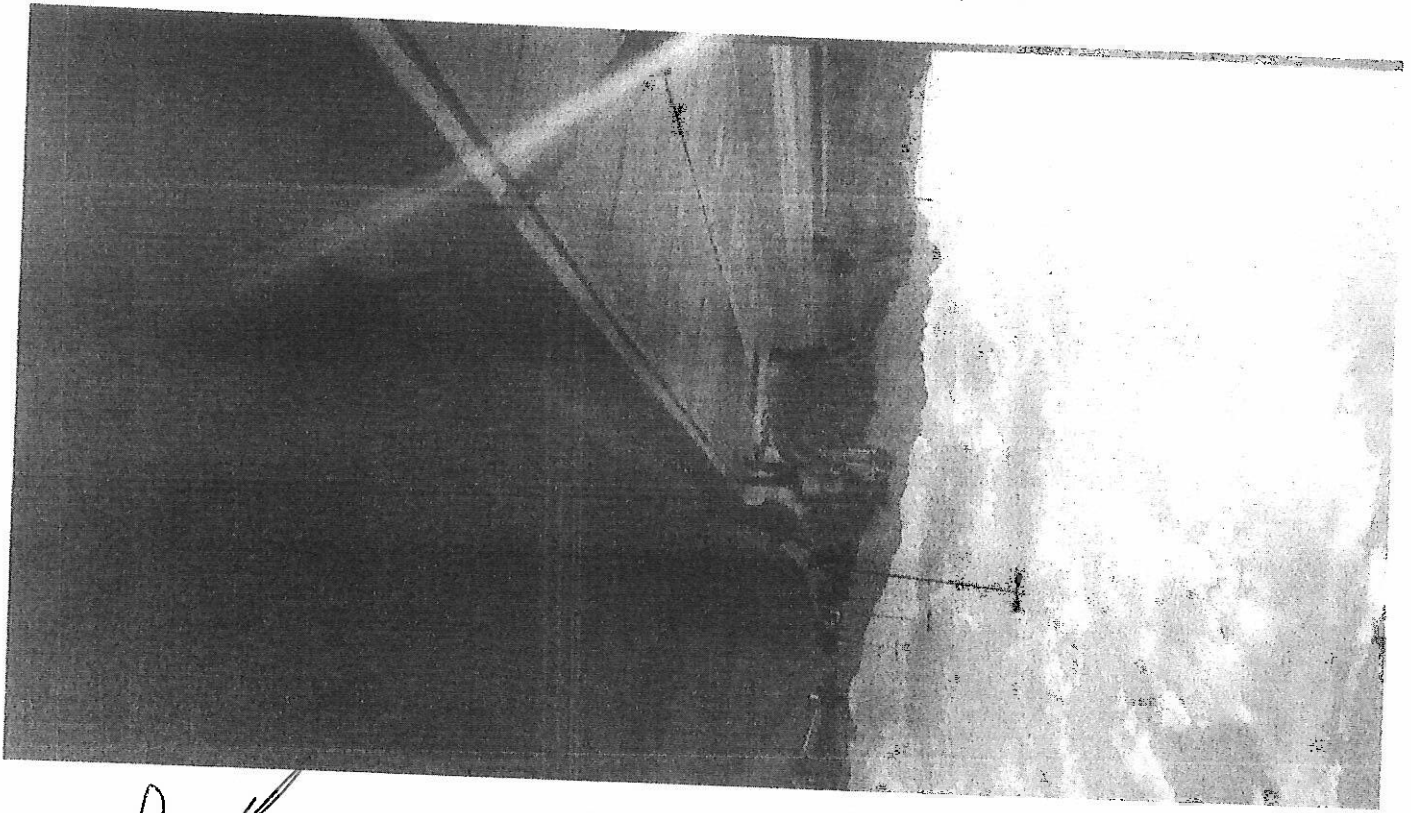


[Handwritten signature]



1-21-82 MONTE MEXICANA

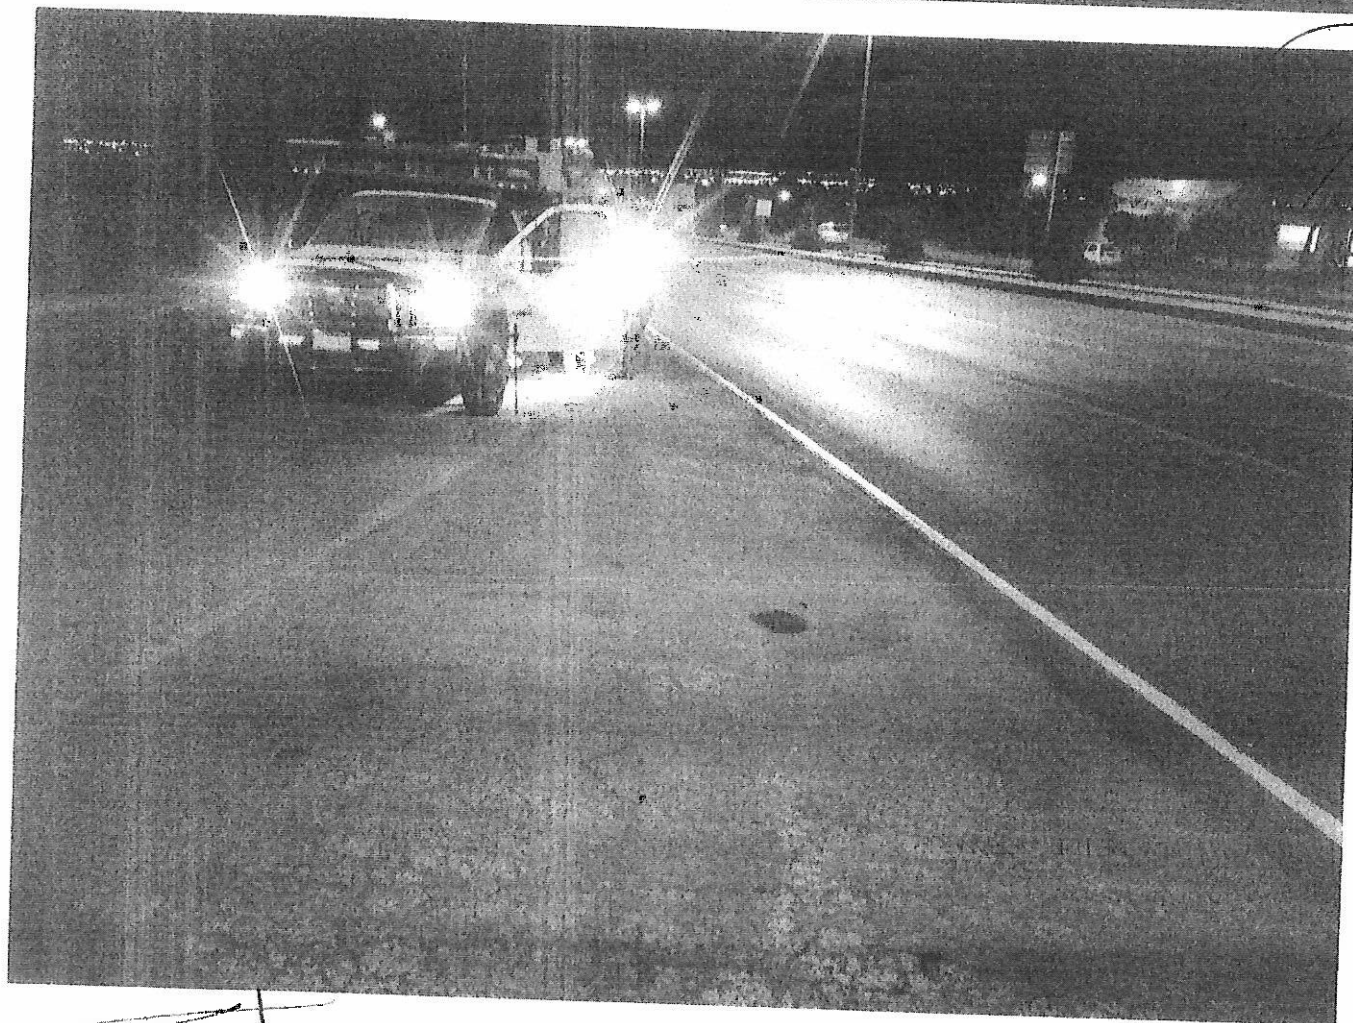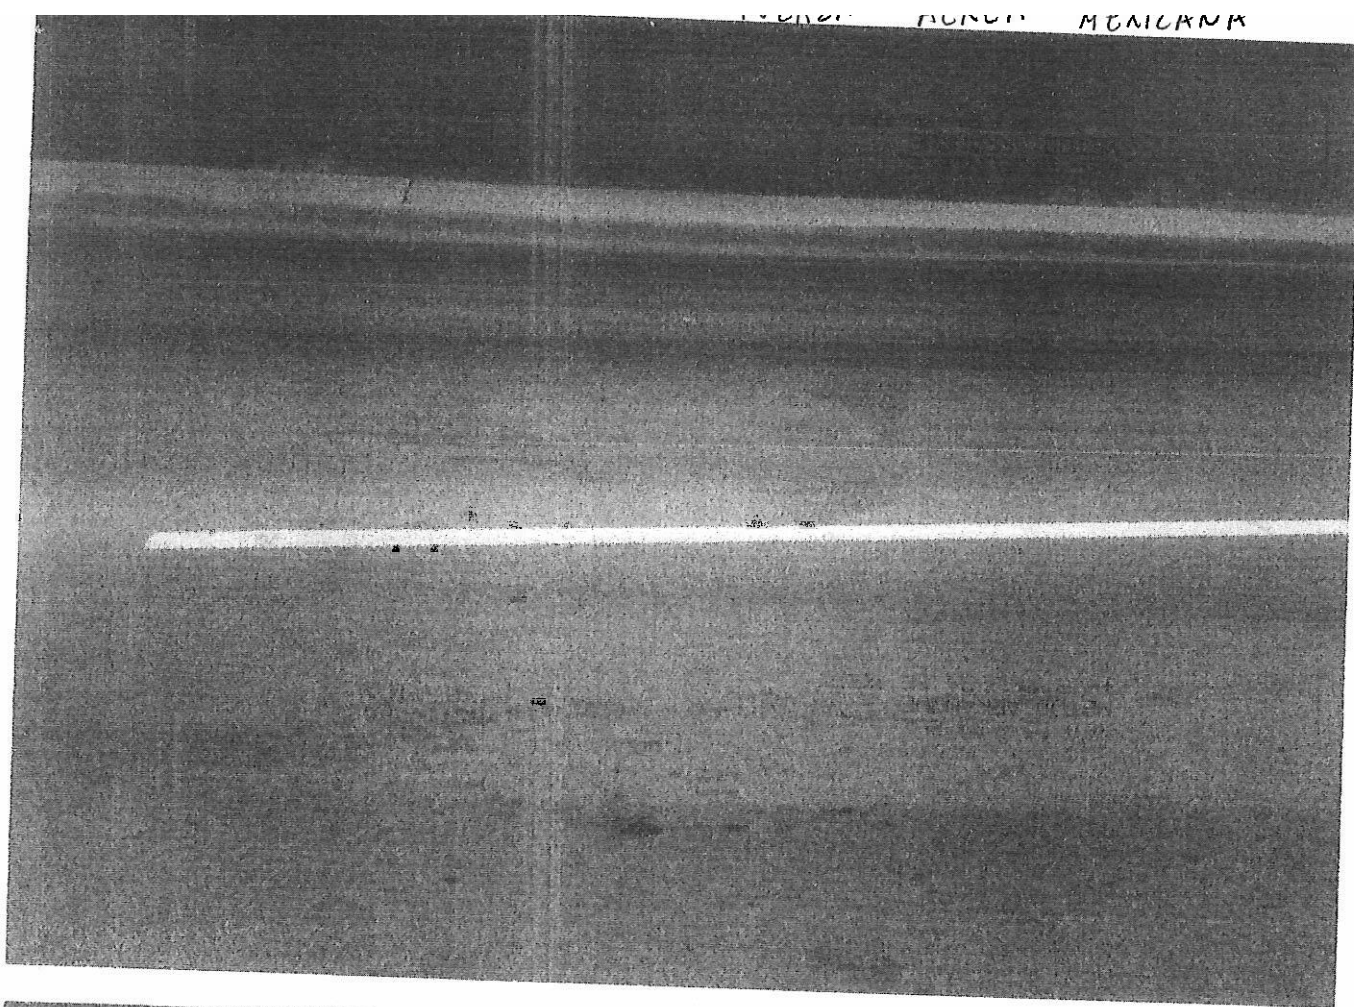

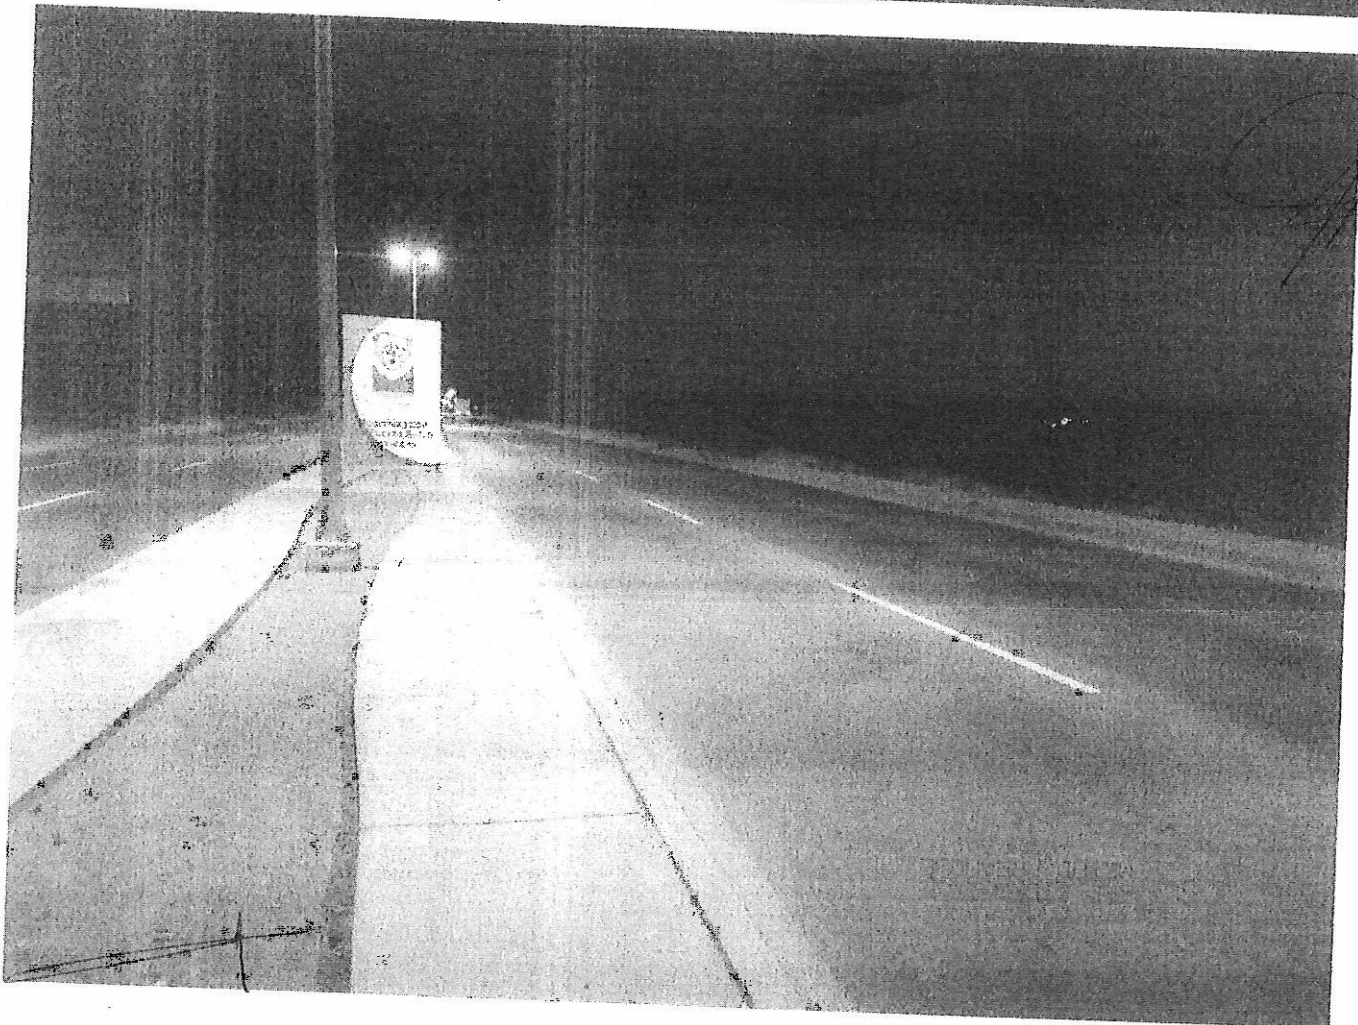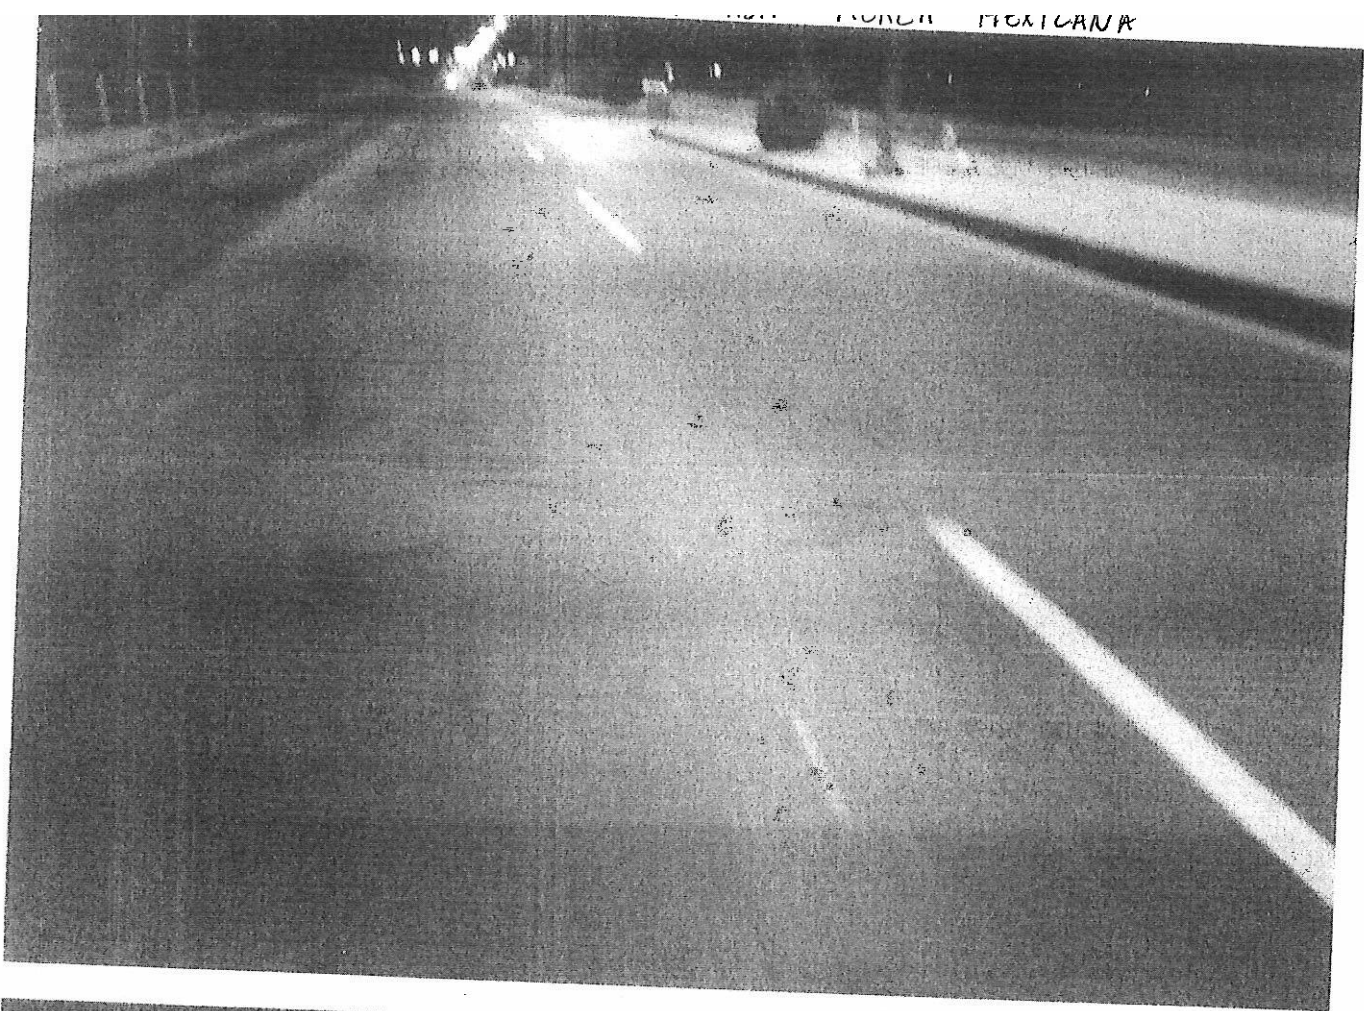


Handwritten signature

AV. SILVESTRE TERRAZAS



[Handwritten signature]

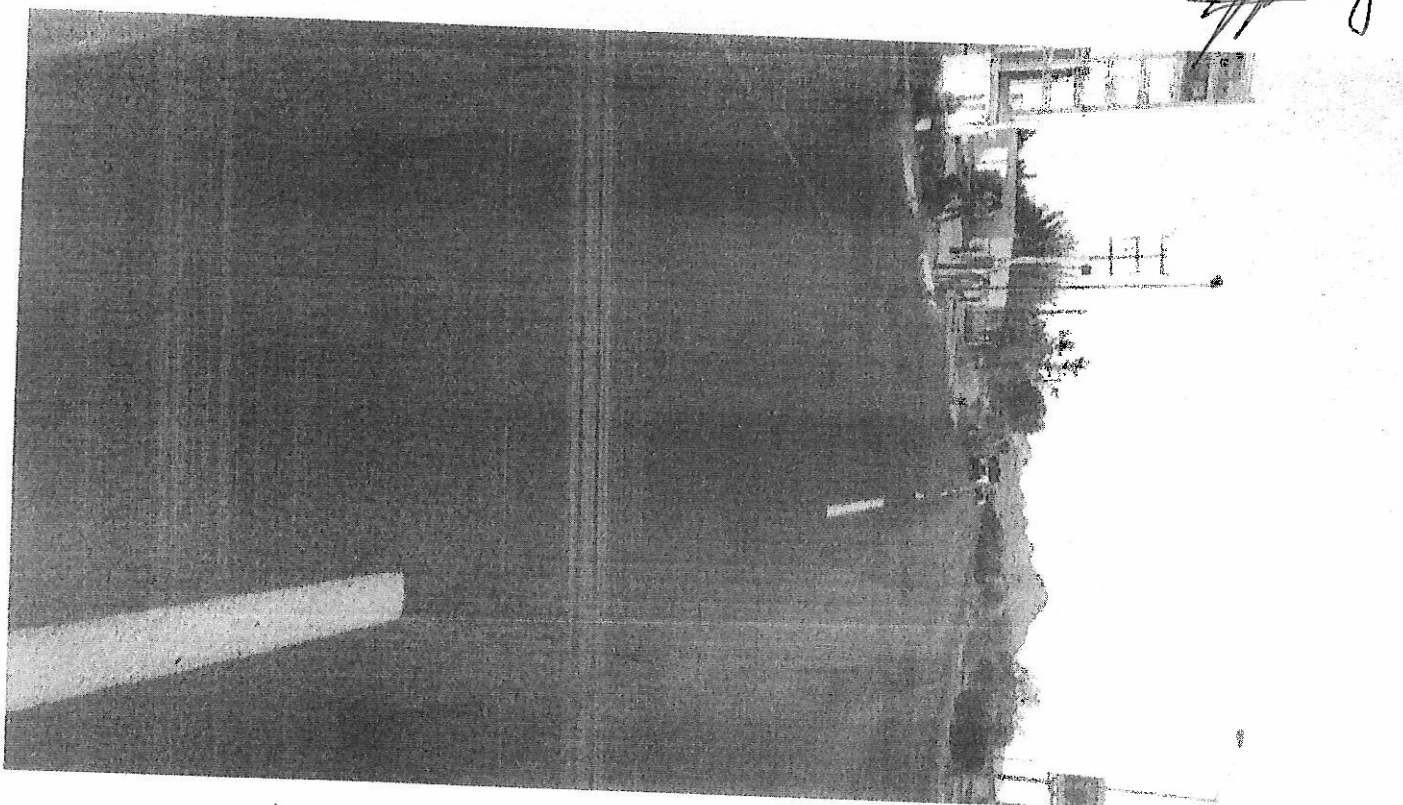


[Handwritten signature]



BLV. JUAN PABLO II



Handwritten signature or mark.

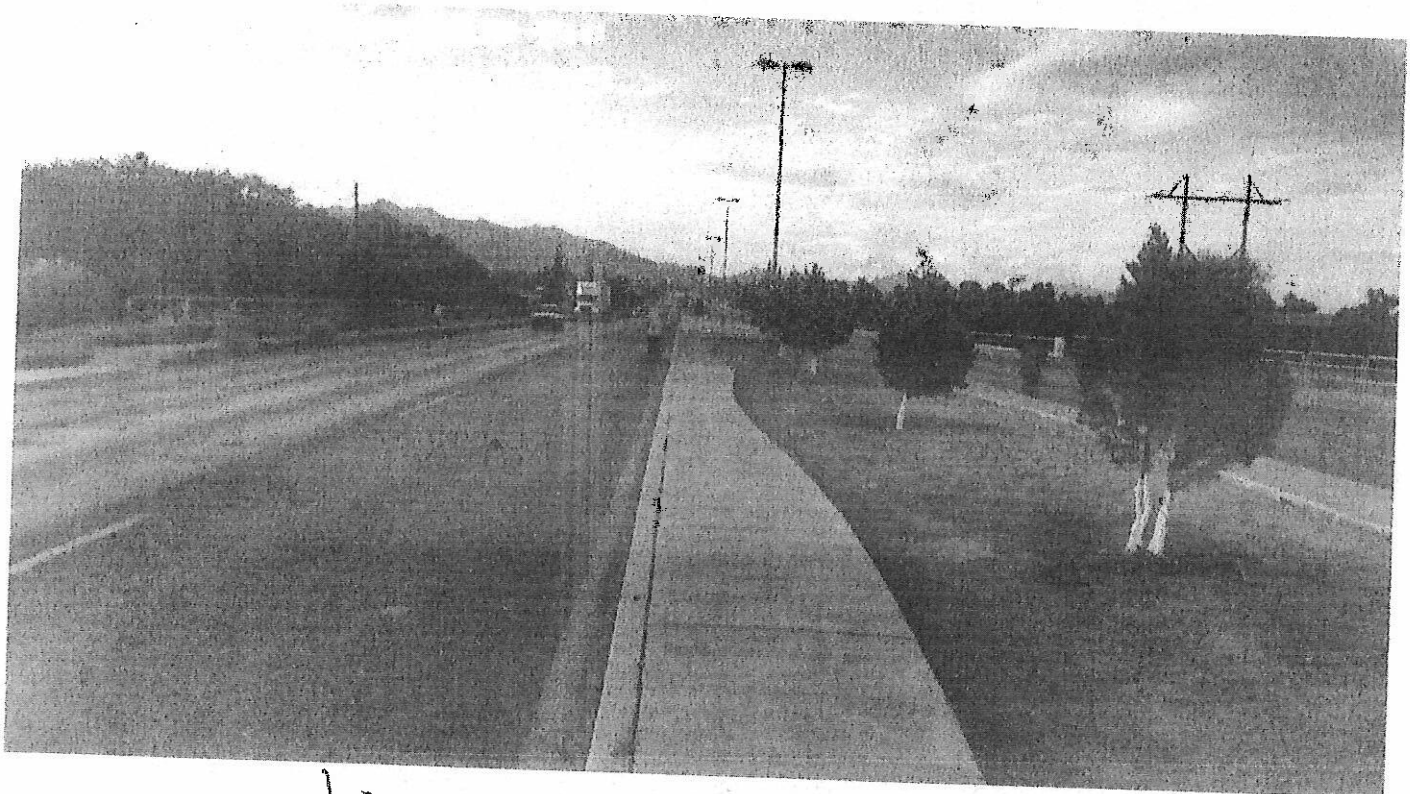

Handwritten signature or mark.

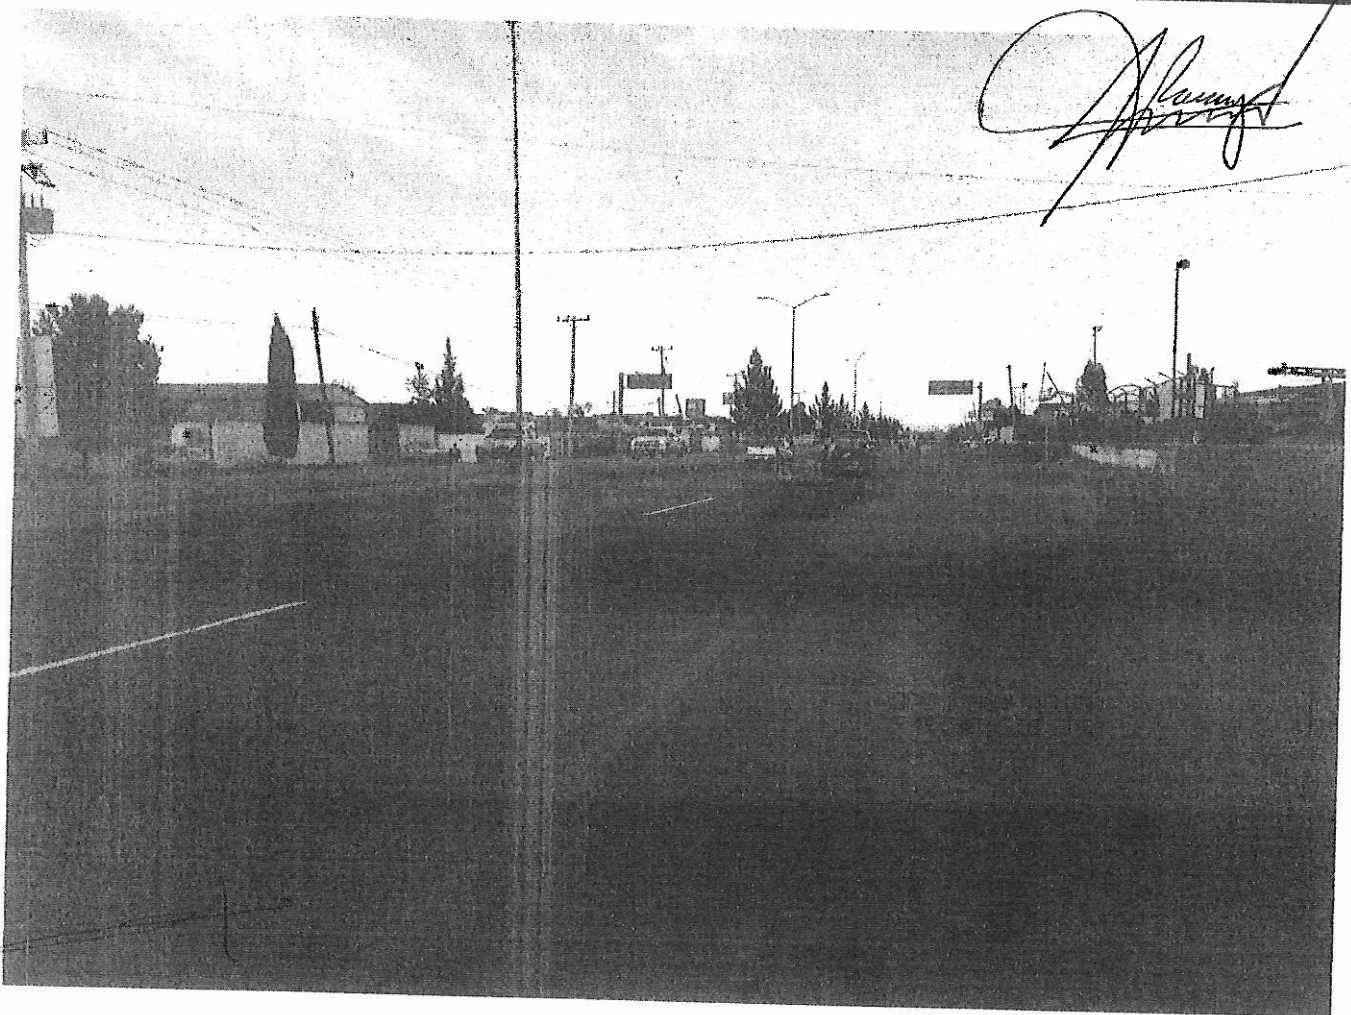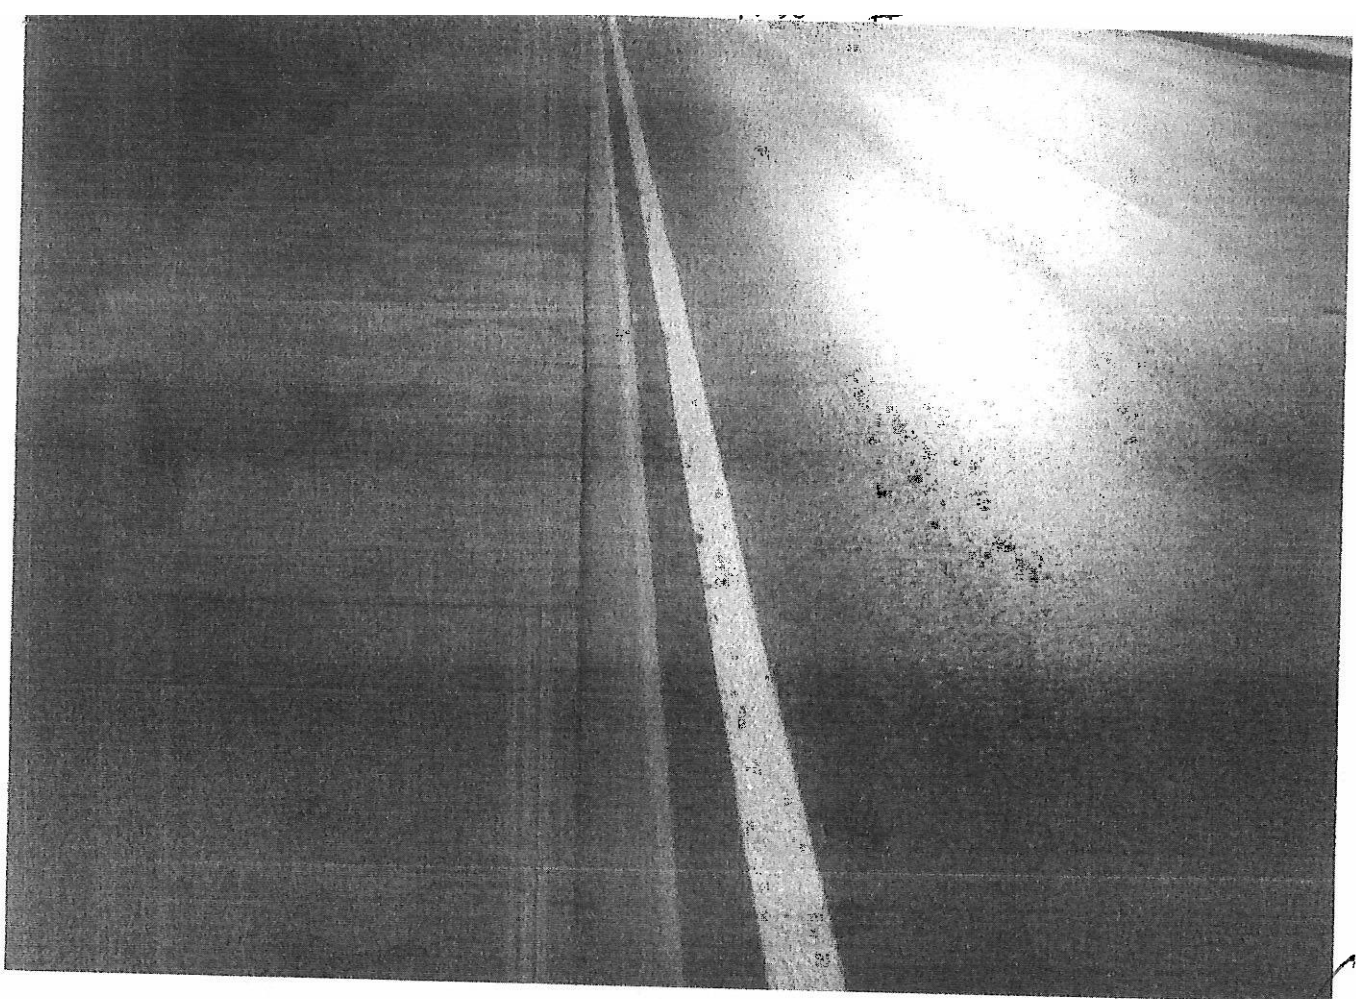

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: Suministro y aplicación de pintura en calles y
avenidas en arcos de la ciudad

CONTRATISTA: Sergio Iván López Toral

CONTRATO: 178/2017

MONTO: \$ 388,721.00 ^{1/10} \$ 450,916.36 ^{1/10}

FECHA DE INICIO: 17/nov/2017



FECHA DE TERMINACIÓN: 30/nov/2017

FIRMAS

RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.


RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

Se iniciaron los trabajos el día 17/nov/2012
realizando la pintura con hule clorado en el tanque de
la Curritosa Aldera de Fierro Aeres Mexicana en
Lombardo Toladero (La Jirón). Se establecieron
horas y horarios de trabajo con el personal de Vigilancia
entre semana en horario nocturno y en fin de semana
matutino.



18/nov/2012



Se continúan trabajos de pintura de hule clorado en la
Curritosa Aldera en el tanque de Fierro Aeres Mexicana
a Lombardo Toladero.



Carbon



19/NOV/17

SE INICIAN TRABAJOS DE PINTURA EN HULE COLORADO EN EL TRAMO CARRETERA ALDAMA, SUBTRAMO FUERZA AEREA MEXICANA - DEST. EL SIROCO, SE COMIENZA A LAS 4 DE LA MAÑANA.



21/NOV/17

SE COMIENZA TRABAJOS DE HULE COLORADO EN EL TRAMO FALTANTE DE LA CARRETERA ALDAMA, DEL DEST. EL SIROCO A ALERIDA FEA AEREA MEXICANA, FALTA POR APILAR EL COLOR AMARILLO EN BAYAS CONTINUA. A SU VEZ SE COMIENZA EN EL OTRO CUERPO (CUERPO DIRECTO) CON PINTURA TERMOPLASTICA.



22/nov/2013

Se trabaja en la avenida Fuerza Aérea Mexicana del Tron de curadon aldea a J. Pablo II, trabajandose en ambas se-pas, en linea continua y semicontinua

[Signature]

[Signature]

26/nov/2013

Está día se hacen las pinturas con hilo clorado del tron Fuerza Aérea Mexicana.

[Signature]

[Signature]

23/nov/2013

Se continúan los trabajos de la Avenida Juan Pablo II, del tron de la Fuerza Aérea Mexicana al Loteado Toledo, con pintura de hilo clorado.

[Signature]



[Signature]

Stallora

Carbón

28/NOV/17

COMIENZAN TRABAJOS DE PINTURA CON HULE NEGRO EN AV. JUAN PABLO II, EN EL CUERPO ITORIERDO, CON DIRECCIÓN DE PZA. MERCA MEXICANA A LOMBARDO TOLEDANO, EN CALLES SEMI CONTINUAS.





29/NOV/17

SE COMIENZA LA PINTURA EN AV. SILVESTRE TERRAZAS DEL SUBTRAMO DEL ENTORQUE A PRESA CHILHATUA A CAVEIZO SE VA EMPERNA CON BLANCA CONTINUA Y BLANCA SEMI CONTINUA.

30/NOV/17

CON ESTA FECHA SE TERMINAN LOS CONCEPTOS TRABAJOS EN SU TOTALIDAD REFERENTE A ESTE CONTRATO, REALIZANDO UNOS GUIONES FALTANTES EN CARB. ALDAMA CON TERMOPLASTICA



Station 41

Carbón
