



CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE S.A. DE C.V.

RFC: CSR851106HAB

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31214

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 99 - Por definir Folio - 878
 Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido Fecha 10/7/2018 11:01:01
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: ICM010502TX1 Uso CFDI: I01 - Construcciones
 Domicilio: Juárez y Sexta No. 601, Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
				ESTIMACION No. 6 (SEIS) NOMBRE DE LA OBRA: CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES CONTRATO No. 197/2017			
1.00	ESTIMACION	E48 - Unidad de servicio	72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios	ALCANCE DE LA ESTIMACION: \$15,521.25 AMORTIZACION DEL ANTICIPO: \$4,656.99	10,864.26	002 - IVA - 1,738.28	10,864.26
				RETENCIONES: 0.2% C.M.I.C. \$31.04 0.2% D.I.F. \$31.04 0.5% INSP. Y VIGILANCIA \$77.61 TOTAL DESCUENTOS \$139.69			

Importe con letra:
 DOCE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 54/100 M.N.
 Importe para Efectos de Pago:
 DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.
 Condiciones de Pago
 CONTADO DIFERIDO

Subtotal 10,864.26
 IVA 16% 1,738.28
 Total 12,602.54
 Otras deducciones y Retenciones 139.69
 Para Efecto de Pago 12,462.85

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000403515334
 Folio fiscal 2CB8BF7D-0E8C-423B-A466-3129C6FBC3A1
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Julio 10 2018 - 12:01:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

mugPgbqBxae1tvee3S7xIL+rr11PjN+g+yR7FcuCTO47FOYI2corPvF8VILWaSM5/csT8BoTZlq1a7y/3/Zu
 z0woW7+JuqplXvJdZyKhZT3qT6IL8a1lBwsnEBcsLkIWZmR0eCt1zpFK+f9JTs2QGirfolhV6MTNUleQTd7Qr
 Lq7RHfOJPosxbzAVkMC6IVJ9YtHe8I5aSkdS3Wt2AtSnITLU4xsMO162nX6aBzmWDFOSNUqKk5NZ0CIYw9CvU
 7COR2q5kD5+U80EM6mxvFZ+P6uKbhL8pxqlapaBbv3uRdgvsc2BxBKATYp4xC0VIFTz7acplzSBDuFUr1xag==

Sello del SAT

pM2Qp7xjDEevDVq37Dnmdq1Rk4EnA2nA+LnBEDm3TRuUdbA06+twawpgbo3brre0QTYlRX0IPW6I3ZAG
 IEBPuxLuR9gQ1cZxOcO4fhm0IHJUT6OIHMdIZW9Z2T6NngJnPC/WFeU0FWcqhAETobYXW/Ts80Vef9OI
 9ILc7/OADa+L8zLLKng1GF14afA6pXcm3pWyXyLHtz8MOz8De71j/FDBoFXw+5cJIA6IJJeBx+JIS3b2
 e8x4I21zze+G83KTKTonurIKcpB8xJl64bjomQt7U9VQwFZAWO5JfNTOOeTImXB6umayDrUQmag4T/D
 YNI0tw4W13V3ILrcmz/Pg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2CB8BF7D-0E8C-423B-A466-3129C6FBC3A1|2018-07-10T12:01:04|MAS0810247C0|mugP
 gbqBxae1tvee3S7xIL+rr11PjN+g+yR7FcuCTO47FOYI2corPvF8VILWaSM5/csT8BoTZlq1a7y/3/
 Zu0woW7+JuqplXvJdZyKhZT3qT6IL8a1lBwsnEBcsLkIWZmR0eCt1zpFK+f9JTs2QGirfolhV6MTNU
 leQTd7QrLq7RHfOJPosxbzAVkMC6IVJ9YtHe8I5aSkdS3Wt2AtSnITLU4xsMO162nX6aBzmWDFOSNUq
 Kk5NZ0CIYw9CvU7COR2q5kD5+U80EM6mxvFZ+P6uKbhL8pxqlapaBbv3uRdgvsc2BxBKATYp4xC0VIFT
 z7acplzSBDuFUr1xag==|00001000000404486074||

RFC del emisor**Nombre o razón social del emisor****RFC del receptor****Nombre o razón social del receptor**

CSRS1106HAR

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL
ROBLE SA DE CV

JCM010502TX1

INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO
DE CHIRIHUAHA**Folio fiscal****Fecha de expedición****Fecha
certificación
SAT****PAC que certificó**2C0B9D77D-0E8C-4218-A466-
3129C6FBC3A1

2018-07-10T11:01:01

2018-07-
10T12:01:04

MAS0610247CD

Total del CFDI**Efecto del comprobante****Estado CFDI**

\$12,602.54

Ingreso

Vigente

RESUMEN DE ESTIMACION



PROGRAMA: —	CONTRATO No. 197/2017	CONTRATADOS \$ 1,960,706.10 CON IVA
OBRA: Centro Cultural y de Exposiciones;	ESTIMACIÓN No. ESTIMACION 6	
	PERIODO EJEC.	24-ABR-2018 al 25-ABR-2018
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA # Col.CIUDA DE CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 18,004.65
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 1,942,699.03
RFC CSR851106HAB	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 1,960,703.68

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	NORMALES	\$ 15,153.20	
	EXCEDENTES	\$ 0.00	
	EXTRAS	\$ 368.05	
	DEVOLUCIÓN	\$ 0.00	
	RETENCIÓN	\$ 0.00	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 15,521.25	

DESCUENTOS

0.2% CMIC	\$ 31.04
0.2% DIF	\$ 31.04
0.5% INSP. Y VIG.	\$ 77.61
SUMA DESCUENTOS	\$ 139.69

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 15,521.25
AMORT ANTICIPO	\$ 4,656.99
SUB-TOTAL	\$ 10,864.26
I.V.A.	\$ 1,738.28
TOTAL	\$ 12,602.54

(CON LETRA)

(DOCE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 54/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 139.69
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 12,462.85

P.P.
CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V.

ELABORO CONTRATISTA
REVISO

ARC. MONSERRAT TORRES M.

AUTORIZO RESIDENTE D.O.P.M
Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE:

\$ 12,462.85

(DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.)

COMO PAGO A LA ESTIMACIÓN NUM. ESTIMACION 6 CONTRATO No. 197/2017 POR LA CANTIDAD DE:

\$ 2,139,377.59

DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
Centro Cultural y de Exposiciones;

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	15,521.25
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	4,656.99
SUBTOTAL	\$	10,864.26
IVA	\$	1,738.28
TOTAL	\$	12,602.54

RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

CMIC DEL 0.20%	31.04
DIF DEL 0.20%	31.04
INSP. Y VIG. DEL 0.50%	77.61
SUMA	139.69

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO	\$	1,960,706.10
CONVENIO MODIFICATORIO	\$	178,671.49
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$	1,942,699.03
ESTA ESTIMACION	\$	18,004.65
ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION	\$	1,960,703.68
POR EJERCER	\$	178,673.91

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO	\$	588,211.83
ACUMULADO ANTERIOR	\$	582,809.71
ESTA ESTIMACION	\$	5,402.11
ACUMULADO ACTUAL	\$	588,211.82
POR AMORTIZAR	\$	0.01

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.20% CMIC	0.20% DIF	0.50% INSP. Y VIG.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 3,349.48	\$ 3,349.48	\$ 8,373.70
ESTA ESTIMACION	\$ 31.04	\$ 31.04	\$ 77.61
ACUMULADO ACTUAL	\$ 3,380.52	\$ 3,380.52	\$ 8,451.31

RECIBIMOS

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V.
CSR851106HAB

OBRA: Centro Cultural y de Exposiciones;

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA # Cdl. CIUDA DE CHIHUAHUA
ESTIMACIÓN No.: ESTIMACION 6
No. CONTRATO: 197/2017
PERIODO: DEL 24/04/2018 AL 25/04/2018



CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V.

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Nº.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM TOTAL	ACUM. ANTERIOR		
OBRA NORMAL							
CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICION							
1	PABELLON CULTURAL CASA SIGLO XIX						\$ 15,153.20
1.27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO REFLECTOR DE LED DE 30 WTS. MARCA LUMINE MODELO 6500, O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR NEGRO SUSPENDIDAS EN ESTRUCTURA METALICA , INCLUYE SALIDA ELECTRICA	PZA	12.000000	12.000000	8.000000	4.000000	\$ 1,106.42
2	CAFÉ CULTURAL CASA SIGLO XIX						\$ 10,727.52
2.309999999	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 49 X 37 CM EMPOTRADA EN MUEBLE DE BARRA, INCLUYE LLAVE MEZCLADORA Y SALIDA HIDROSANITARIA INCLUYE INCLUYE PEGAMENTO DE PRIMERA, CONEXIONES, CODOS, COPLES, CONECTORES, TEES, YEEES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS, MANIOBRAS, ALMACENAJES, ACARREOS, FLETES, CORTES, DESPERDICIOS, SOPORTERIA, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	\$ 10,727.52
OBRA EXTRAORDINARIA							
EXT-044	RESANE EN COLUMNA METALICA TIPO HSS CON DIMENSIONES DE 0.15m X 0.15m A BASE DE BONDO Y PINTURA PARA DAR ACABADO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	0.000000	1.460000	0.000000	1.460000	\$ 252.09
OBRA EXCEDENTE							\$ 0.00

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MONSERRAT TORRES M.
RESIDENTE D.O.P.M.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

ESTIMACION No. 6 (SEIS)
PERIODO: DEL 24 DE ABRIL DEL 2018 AL 25 DE ABRIL DEL 2018
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE S.A. DE C.V.
No. CONTRATO: 197/2017
OBRA:

CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CLAVE	PARTIDA DESCRIPCION	UNIDAD	SEGUN PPTO	CANTIDADES DE OBRA			PRECIO UNITARIO (\$)	IMPORTE ESTIMADO (\$)
				ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION		
1	PABELLON CULTURAL CASA SIGLO XIX SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO REFLECTOR DE LED DE 30 WTTs. MARCA LUMINE MODELO 6500, O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR NEGRO SUSPENDIDAS EN ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE SALIDA ELECTRICA	PZA	12.00	12.00	8.00	4.00	\$ 1,106.42	\$4,425.68
2	CAFÉ CULTURAL CASA SIGLO XIX SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 48 X 37 CM EMPOTRADA EN MUEBLE DE BARRA, INCLUYE LLAVE MEZCLADORA Y SALIDA HIDROSANITARIA INCLUYE INCLUYE PEGAMENTO DE PRIMERA, CONEXIONES, CODOS, COPLES, CONECTORES, TEES, YEEES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS, MANIOBRAS, ALMACENAJES, ACARREOS, FLETES, CORTES, DESPERDICIOS, SOPORTERIA, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 10,727.52	\$10,727.52
3	EXTRAORDINARIOS RESANE EN COLUMNA METALICA TIPO HSS CON DIMENSIONES DE 0.15m X 0.15m A BASE DE BONDO Y PINTURA PARA DAR ACABADO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	0.00	1.46	0.00	1.46	\$ 252.09	\$368.05
EXTRA- 044								
SUBTOTAL: I.V.A. 16 % TOTAL ESTIMADO:								\$15,521.25 \$ 2,483.40 \$ 18,004.65

SUPERVISOR

ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE S.A. DE C.V.

ARQ. JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS
SUPERVISOR




(SEIS) 9

[illegible]

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE S.A. DE C.V.


ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO

ARQ. JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS
SUPERVISOR



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CROQUIS	DESCRIPCION
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO REFLECTOR DE LED DE 30 WTTs. MARCA LUMINE MODELO 6500, O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR NEGRO SUSPENDIDAS EN ESTRUCTURA METALICA , INCLUYE SALIDA ELECTRICA	

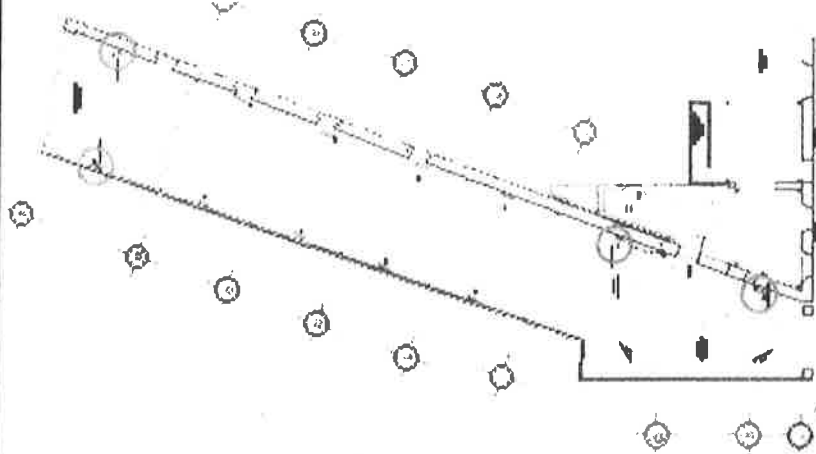

SUPERVISOR


ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE S.A. DE C.V.



ARQ. JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS
SUPERVISOR



ESTIMACION No. 6 (SEIS)
PERIODO: DEL 24 DE ABRIL DEL 2018 AL 25 DE ABRIL DEL 2018
CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE S.A. DE C.V.**
No. CONTRATO: 197/2017
OBRA: CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

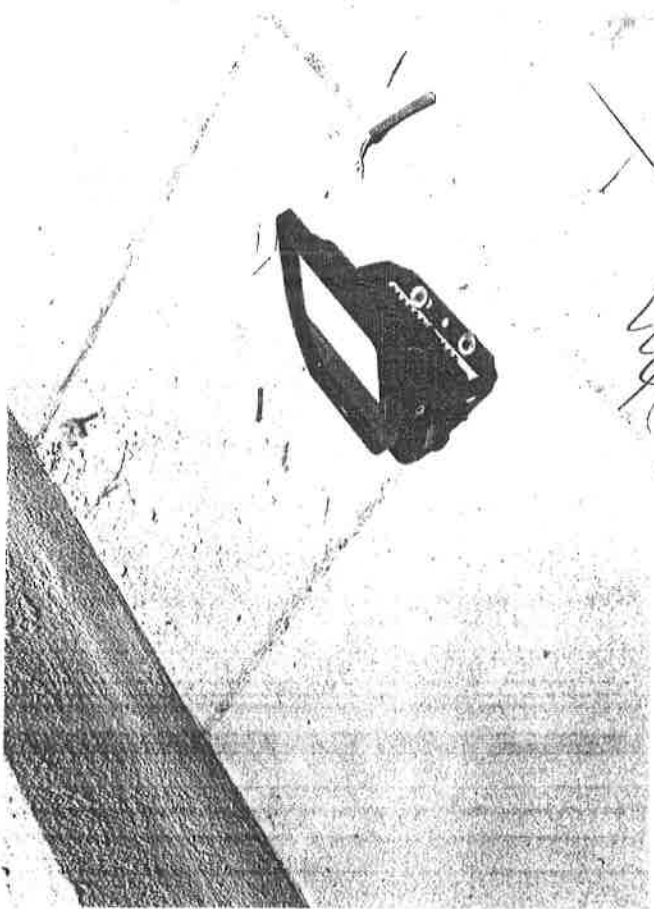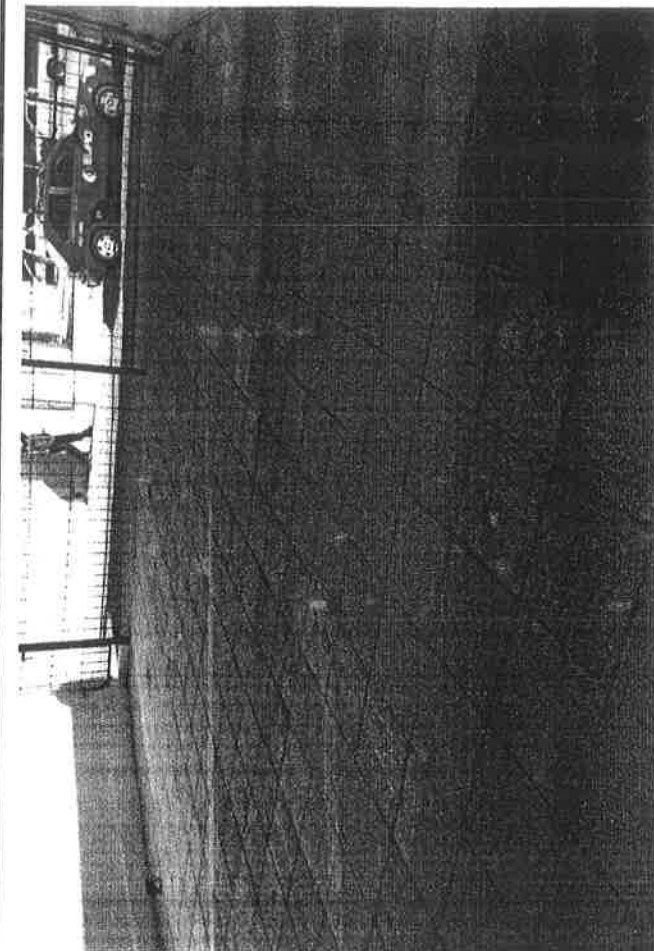FOTO	DESCRIPCION
	

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO REFLECTOR DE LED DE 30 WTTs. MARCA LUMINE MODELO 6500, O SIMILAR EN CALIDAD, COLOR NEGRO SUSPENDIDAS EN ESTRUCTURA METALICA , INCLUYE SALIDA ELECTRICA

SUPERVISOR

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE S.A. DE C.V.

ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO

ARQ. JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS
SUPERVISOR



(STES) 9



PARTIDA

SUPERVISOR

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE S.A. DE C.V.

ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO

ARQ. JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS
SUPERVISOR



ESTIMACION No. 6 (SEIS)
PERIODO: DEL 24 DE ABRIL DEL 2018 AL 25 DE ABRIL DEL 2018
CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE S.A. DE C.V.**
No. CONTRATO: 197/2017
OBRA: CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CROQUIS	DESCRIPCION
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 49 X 37 CM EMPOTRADA EN MUEBLE DE BARRA, INCLUYE LLAVE MEZCLADORA Y SALIDA HIDROSANITARIA INCLUYE PEGAMENTO DE PRIMERA, CONEXIONES, CODOS, COPLES, CONECTORES, TEES, YEES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS, MANIOBRAS, ALMACENAJES, ACARREOS, FLETES, CORTES, DESPERDICIOS, SOPORTERIA, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	



SUPERVISOR


ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE S.A. DE C.V.



ARQ. JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS
SUPERVISOR



ESTIMACION No. 6 (SEIS)
PERIODO: DEL 24 DE ABRIL DEL 2018 AL 25 DE ABRIL DEL 2018
CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE S.A. DE C.V.**
No. CONTRATO: 197/2017
OBRA: CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

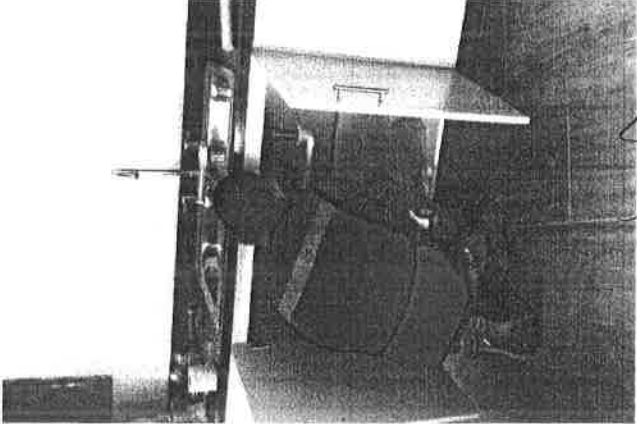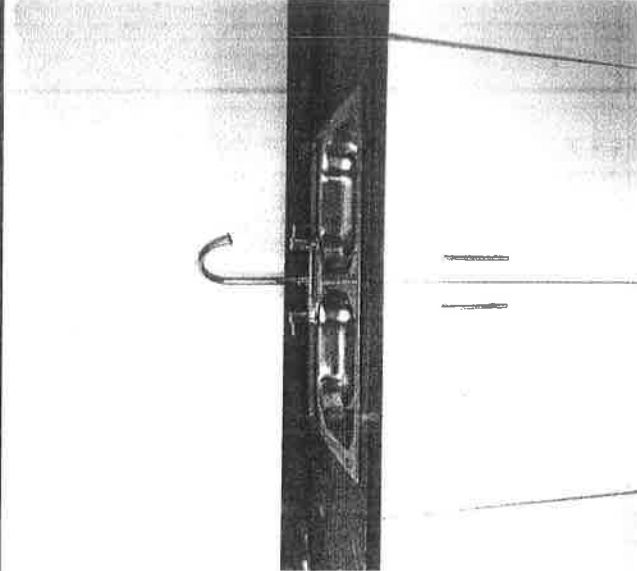FOTO	DESCRIPCION
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 49 X 37 CM EMPOTRADA EN MUEBLE DE BARRA, INCLUYE LLAVE MEZCLADORA Y SALIDA HIDROSANITARIA INCLUYE PEGAMENTO DE PRIMERA, CONEXIONES, CODOES, CONECTORES, TEES, YEEES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS, MANIOBRAS, ALMACENAJES, ACARREOS, FLETES, CORTES, DESPERDICIOS, SOPORTERIA, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. 

SUPERVISOR

ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE S.A. DE C.V.

ARQ. JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS
SUPERVISOR



OBRA: CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES



PARTIDA

SUPERVISOR

ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL RDLE S.A. DE C.V.

ARQ. JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS
SUPERVISOR




ESTIMACION No. 6 (SEIS)
PERIODO: DEL 24 DE ABRIL DEL 2018 AL 25 DE ABRIL DEL 2018
CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE S.A. DE C.V.**
No. CONTRATO: 197/2017
OBRA: CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CROQUIS	DESCRIPCION
	RESANE EN COLUMNA METALICA TIPO HSS CON DIMENSIONES DE 0.15m X 0.15m A BASE DE BONDO Y PINTURA PARA DAR ACABADO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

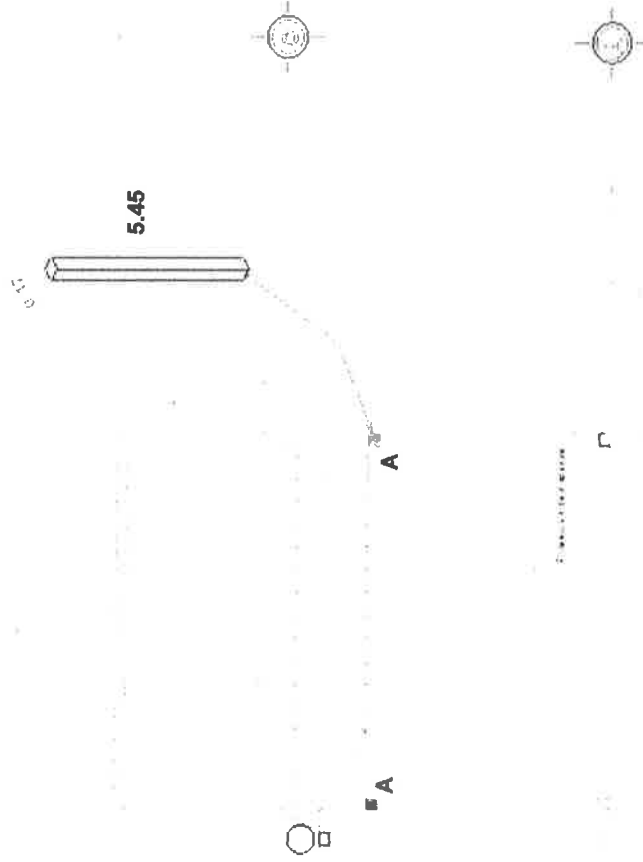

SUPERVISOR

ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO


CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE S.A. DE C.V.

ARQ. JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS



SUPERVISOR



ESTIMACION No. 6 (SEIS)
PERIODO: DEL 24 DE ABRIL DEL 2018 AL 25 DE ABRIL DEL 2018
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE S.A. DE C.V.
No. CONTRATO: 197/2017
OBRA: CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

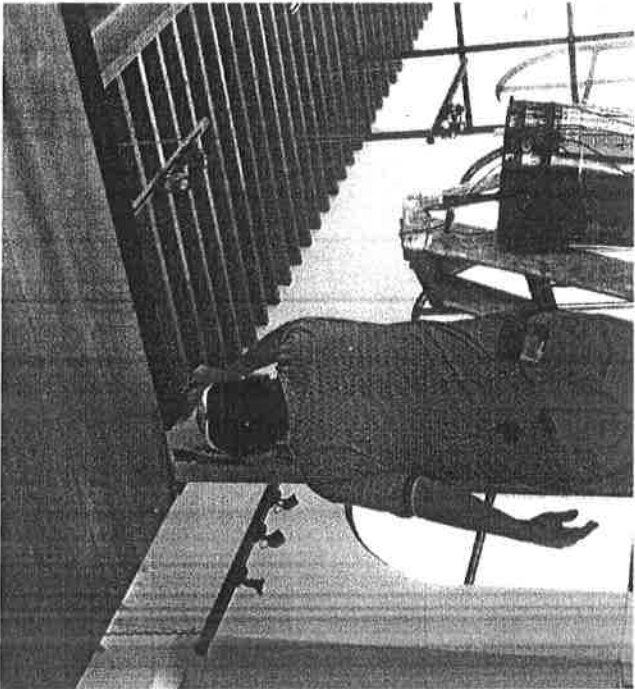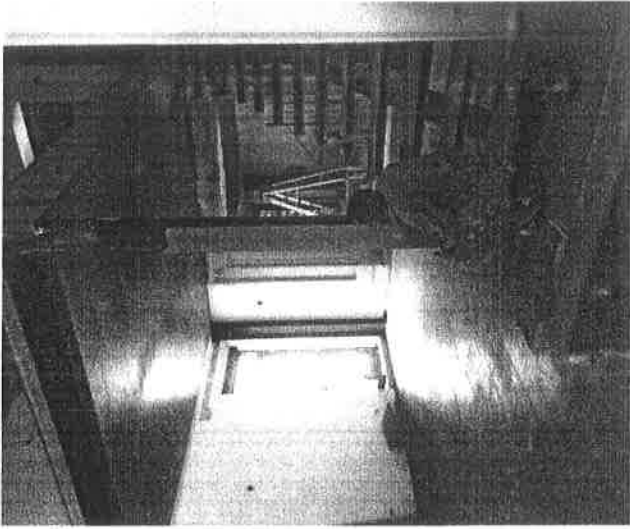FOTO	DESCRIPCION
	RESAME EN COLUMNA METALICA TIPO HSS CON DIMENSIONES DE 0.15m X 0.15m A BASE DE BONDO Y PINTURA PARA DAR ACABADO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 

SUPERVISOR

ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE S.A. DE C.V.

ARQ. JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS
SUPERVISOR



OFICIO No. CS/573/2018

02 de Marzo del 2018

ARQ. JUAN DOMINGO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ.
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.

Con relación a su escrito con fecha del 28 de Febrero del año en curso, en los que solicita la revisión de los precios extraordinarios de la obra **"CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES"**, bajo contrato No. **197/2017**. Por este conducto le comunico, que una vez revisados y analizados los mismos, se autorizan los precios unitarios que a continuación se relacionan:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO SOLICITADO	PRECIO AUTORIZADO
EXT-42	COLUMNA A BASE DE PERFIL OR DE 8"X8"X3/8", INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, ACABADO A BASE DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE CON MENSULAS DE ACERO PARA NIVELACION DEL BASTIDOR. INCLUYE, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	\$3,019.38	\$3,019.38
EXT-43	FABRICACIÓN DE ESCALÓN CON DIMENSIONES DE 1.80X0.70X0.20M A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE; CIMBRA, VACIADO DE CONCRETO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PIEZA	\$1,091.90	\$1,091.90
EXT-44	RESANE EN COLUMNA METALICA TIPO HSS CON DIMENSIONES DE 0.15m X 0.15m A BASE DE BONDO Y PINTURA PARA DAR ACABADO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$252.09	\$252.09
EXT-45	DEMOLICIÓN DE MOLDURA DE CANTERA EN PABELLÓN A UNA ALTURA DE 4.00M, INCLUYE; ANDAMIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$216.27	\$216.27
EXT-46	FABRICACIÓN DE MOLDURA A BASE DE LAMINA NEGRA CAL. 24 CON UN DESARROLLO DE 0.94, INCLUYE; SOLDADURA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$282.79	\$282.79



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

OFICIO No. CS/629/2018

02 de Marzo del 2018

ARQ. JUAN DOMINGO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ.
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.

Con relación a su escrito con fecha del 28 de Febrero del año en curso, en los que solicita la revisión de los precios extraordinarios de la obra **"CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES"**, bajo contrato No. **197/2017**. Por este conducto le comunico, que una vez revisados y analizados los mismos, se autorizan los precios unitarios que a continuación se relacionan:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO SOLICITADO	PRECIO AUTORIZADO
EXT-48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS SOBRE CRISTAL TEMPLADO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO OVAL DE 2 1/2", INCLUYE: HERRAJES, FIJACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$ 1,725.93	\$ 870.92

A T E N T A M E N T E
"JUNTOS, UNA MEJOR CIUDAD"


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.P. ING. JAVIER VILLARREAL POSADA. SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
C.C.P. ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO. JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL.
C.C.P. ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO. RESIDENTE DE OBRA
ARCHIVO / mcmc
