

Copy 722

RFC: UEM030404J72

780106-1-930

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet



A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*

RFC emisor*

RFC receptor*

Proporcione los dígitos de la imagen*



* Datos obligatorios

RFC del emisor

UEM03040472

Nombre o razón social del emisor

URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE
MEXICO, S.A. DE C.V.

RFC del receptor

MC1651010V22

Nombre o razón social del receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio fiscal

Fecha de expedición

2017-11-30T13:33:42

Fecha certificación SAT

2017-11-30T13:36:35

PAC que certificó

EME000602QR9

Total del CFDI

Efecto del comprobante

Estado CFDI

\$1,697,977.62

Ingreso

Vigente

Handwritten signature in blue ink.

Verificar CFDI

Enlaces

- Declaración de Accesibilidad (<https://www.gob.mx/accesibilidad>)
- Política de privacidad (<https://www.gob.mx/privacidad>)
- Términos y Condiciones (<https://www.gob.mx/terminos>)
- Marco Jurídico (<http://www.ordenjuridico.gob.mx>)
- Portal de Obligaciones de Transparencia (<http://portaltransparencia.gob.mx>)
- Sistema Infomex (<https://www.infomex.org.mx/gobierno/infomex/home.action>)
- INAI (<http://inicio.inal.org.mx/SitePages/Inai.aspx>)
- Mapa de sitio (<https://www.gob.mx/sitemap>)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. Leer más (<https://www.gob.mx/que-es-gobmx>)

- English (<https://www.gob.mx/en/index>)
- Temas (<https://www.gob.mx/temas>)
- Reformas (<http://reformas.gob.mx>)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información

gobmx@funcionpublica.gob.mx

Denuncia contra servidores públicos (<https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54>)

Mantente informado. Suscríbete.

usuario@ejemplo.com



Síguenos en

(<https://www.facebook.com/gobmx>) (<https://twitter.com/gobmx>)



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL		CONTRATO No. 096/2017	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE GAZAS PARA IMPLEMENTAR EL TIREBOL EN LA INTERSECCION DE LA AV. COLÓN Y LA AV. HOMERO		ESTIMACIÓN No. 9 (Nueve)	\$ 27,779,997.20 CON IVA ✓
PERÍODO EJEC. 24 al 29 Noviembre 2017 ✓		IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 2,437,690.63 CON IVA ✓
UBICACIÓN: AV. HOMERO Y AV. TECNOLÓGICO		ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 20,969,447.41 CON IVA ✓
CONTRATISTA: Urbanizadora y Edificadora de México S.A. De C.V.		IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 23,407,138.04 CON IVA ✓
RFC UEM-030404-J72			

TIPO DE OBRA		IMPORTE	OBSERVACIONES
NORMALES		\$ 300,198.62 ✓	
EXCEDENTES		\$ 785,021.96 ✓	
EXTRAORDINARIO		\$ 1,016,236.86 ✓	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 2,101,457.44 ✓	

DESCUENTOS		
0.2% DIF	\$ 4,202.91 ✓	
0.2% CMIC	\$ 4,202.91 ✓	
SUMA DESCUENTOS	\$ 8,405.82 ✓	
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 2,101,457.44 ✓	
AMORT ANTICIPO	\$ 630,437.23 ✓	
SUB-TOTAL	\$ 1,471,020.21 ✓	
I.V.A.	\$ 235,363.23 ✓	
TOTAL	\$ 1,706,383.44 ✓	
(CON LETRA)		
(UN MILLON SETECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$ 8,405.82 ✓	
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 1,697,977.62 ✓	

AUTORIZO		
Ing. Victor-Miguel Villiegas	RESIDENTE D.O.P.M	Vo. Bo.
Ing. Carlos Aguilar Garcia	SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	Vo. Bo.
Ing. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA	JEFE DE AREA DE CONSTRUCCION.	Vo. Bo.
REVISO		
CONTABILISTA		
Urbanizadora y Edificadora de México S.A. De C.V.		
ELABORO		
		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
		ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

RECIBIMOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE:
 ESTIMACION NUM. 9 (Nueve) CONTRATO NO. 096/2017 POR LA CANTIDAD DE : \$ 27,779,997.20
 (UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N.)
 COMO PAGO A LA
 CONSTRUCCION DE GAZAS PARA IMPLEMENTAR EL TEBOL EN LA INTERSECCION DE LA AV. COLÓN Y LA AV. HOMERO
 POR TRABAJOS EN LA OBRA:

ALANCE DE LA ESTIMACION

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

SUBTOTAL
 IVA
 TOTAL

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

DIF DEL 0.2%
 CMIC DEL 0.2%

SUMA

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
 CONVENIO MODIFICATORIO
 ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
 ESTA ESTIMACION
 ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
 POR EJERCER

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
 PRIMERA ASIGNACION
 ACUMULADO ANTERIOR
 ESTA ESTIMACION
 ACUMULADO ACTUAL
 POR AMORTIZAR

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR
 ESTA ESTIMACION
 ACUMULADO ACTUAL
 0.2 % DIF
 0.2% CMIC

R E C I B I M O S

Urbanizadora y Edificadora de Mexico S.A. De C.V.
 UEM-030404-072

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZAS PARA IMPLEMENTAR EL TREBOL EN LA INTERSECCION DE LA AV. COLÓN Y LA AV. HOMERO

UBICACIÓN AV. HOMERO Y AV. 1No. CONTRATO: 096/2017
ESTIMACIÓN No. 9 (Nueve)

CONTRATISTA Urbanizadora y Edificadora de Mexico S.A. De C.V.

PERÍODO: 24 al 29 Noviembre 2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
NORMALES		
	<u>EXCEDENTES</u>	\$ 300,198.62 ✓
	<u>EXTRAORDINARIO</u>	\$ 785,021.96 ✓
		\$ 1,016,236.86 ✓

SUBTOTAL \$	2,101,457.44 ✓
I.V.A. \$	336,233.19 ✓
TOTAL \$	2,437,690.63 ✓

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MEXICO SA DE CV

ING. VÍCTOR MIRELES VILLEGAS

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZAS PARA IMPLEMENTAR EL TREBOL EN LA INTERSECCION DE LA AV. COLÓN Y LA AV. HOMERO

UBICACIÓN AV. HOMERO Y / No. CONTRATO: 096/2017

CONTRATISTA:

Urbanizadora y Edificadora de Mexico S.A. De C.V.

ESTIMACIÓN No. 9 (Nueve)
PERIODO: 24 al 29 Noviembre 2017

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIORVOL.		
	OBRA NORMAL						\$ 300,198.62
	TERRACERIAS						
	TERRAPLENES						\$ 52,347.28
16	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL HUMECTADO CALIDAD SUBRASANTE DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA: DE LA ELEVACION DE LA SUBRASANTE EN CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES PARA NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %). INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	1,400.00	565.17 ✓	322.90 ✓	242.27 \$ 216.07	\$ 52,347.28 ✓
	SUPERESTRUCTURA:						
	TRABAJO DIVERSOS						\$ 231,162.36
31	PARAPETO METALICO PARA CALZADA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA: TIPO T-34.3.1. A BASE DE TUBO DE 3" CED. 40 Y PLACAS DE ACERO DE 1/2" Y 3/8" DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, PINTURA, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	m	230.00	85.80 ✓	0.00 ✓	85.80 \$ 2,694.20	\$ 231,162.36 ✓
	PAVIMENTACIÓN						
	MATERIALES ASFALTICOS						\$ 16,688.98
37	MATERIALES ASFALTICOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA: ASFALTOS REBAJADOS: EMPLEADOS EN RIEGOS: EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO MEDIO O SUPERESTABLE EN RIEGO DE IMPREGNACION. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	lt	6,675.00	1,997.56 ✓	447.98 ✓	1,549.58 \$ 10.77	\$ 16,688.98 ✓
	OBRA EXCEDENTE						\$ 785,021.96
	SUBESTRUCTURA						
	ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO						\$ 801,153.80
22	SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO CON LIMITE ELASTICO MAYOR O IGUAL A 4200 KG/CM2 PARA UTILIZARSE EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, PUESTO EN OBRA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	kg	178,000.00	280,000.00 ✓	249,690.74 ✓	30,309.26 \$ 15.02	\$ 455,245.09 ✓

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. HUGO ALFREDO VARGAS DUINN

Pag 1 de 2

ING. VÍCTOR MIRELES VILLEGAS

OBRA: CONSTRUCCION DE GAZAS PARA IMPLEMENTAR EL TREBOL EN LA INTERSECCION DE LA AV. COLÓN Y LA AV. HOMERO

UBICACIÓN AV. HOMERO Y # No. CONTRATO: 096/2017


CONTRATISTA:

Urbanizadora y Edificadora de Mexico S.A. De C.V.


ESTIMACIÓN No. 9 (Nueve)
PERIODO: 24 al 29 Noviembre 2017

No.	CONCEPTOS DESCRIPCION	PROYECTO		ACUM. TOTAL	VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN		ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
23	HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY= 4200KG/CM2 A BASE DE VARILLAS CORUGADAS DE CONUN RANGO DE 1" A 3/8", P.U.O.T. A UTILIZARSE EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ALAMBRE RECOCIDO, SILETAS, AMARES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACAREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	kg	178,000.00	280,000.00 ✓	233,255.58 ✓	46,744.42 ✓	\$ 7.40	\$ 345,908.71 ✓
INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN								
MODIFICACIONES AL ALUMBRADO EXISTENTE								
71	RETIRO DE POSTES, LUMINARIOS Y CABLEADOS EXISTENTES; ENTREGA DE MATERIALES EN ALMACEN DE ALUMBRADO, INCLUYE LIMPIEZA DEL AREA.	pza	12.00	15.00 ✓	27.00 ✓	-12.00 ✓	\$ 1,344.32	\$ (16,131.84)
EXTRAORDINARIOS								
EXT-02	CONCRETO HIDRAULICO A TRES DIAS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA: SIMPLE COLADO EN SECO. DE FC=250 KG/CM2, UTILIZADO EN LOSA SUPERIOR. INCLUYE: SUMINISTRO Y APARENTE OBRA FALSA MATERIALES, BOMBEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CURADO, VIBRADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3		483.67 ✓	274.54 ✓	209.13	\$ 3,558.80	\$ 744,251.84 ✓
EXT-15	DISEÑO ESTRUCTURAL DE PUENTES EN TREBOL DE AV. HOMERO Y AV. TECNOLÓGICO. INCLUYE: ANTEPROYECTO, PROYECTO, MEMORIA DE CALCULO, PLANOS ESTRUCTURALES EN DIGITAL, CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES.	PZA		1.00	0.00	1.00	\$ 271,985.02	\$ 271,985.02 ✓
				TOTAL ESTIMACION		9 (Nueve)	\$ 2,101,457.44	

POR EL CONTRATISTA


HUGO ALFREDO VARGAS DUNN

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN


VÍCTOR MIRELES VILLEGAS

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCION DE GAZAS PARA IMPLEMENTAR EL TEBOL EN LA INTERSECCION DE LA AV. COLON Y LA AV. HOMERO

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

UBICACION AV. HOMERO Y TECNOLÓGICO.


CONTRATISTA

URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MEXICO S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 9 PERIODO 24/1/17-29/1/17


DESCRIPCION	OPERACIONES					
	UBICACION	AREA	ALTO	SUBTOTAL	Nº VECES	TOTAL
16 TERRAPLENES MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL HUMECTADO CALIDAD SUBRASANTE DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA: DE LA ELEVACION DE LA SUBRASANTE EN CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES PARA NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %), INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SORIANA	1035.30	0.200	207.06	1	207.06
	TUNEL	176.05	0.20	35.21	1	35.21
					TOTAL	242.27

REPORTE FOTOGRAFICO

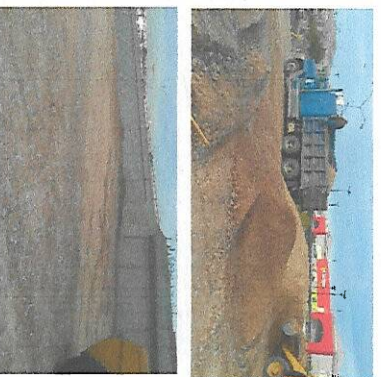

Vol. A
ESTIMAR

242.27
M3

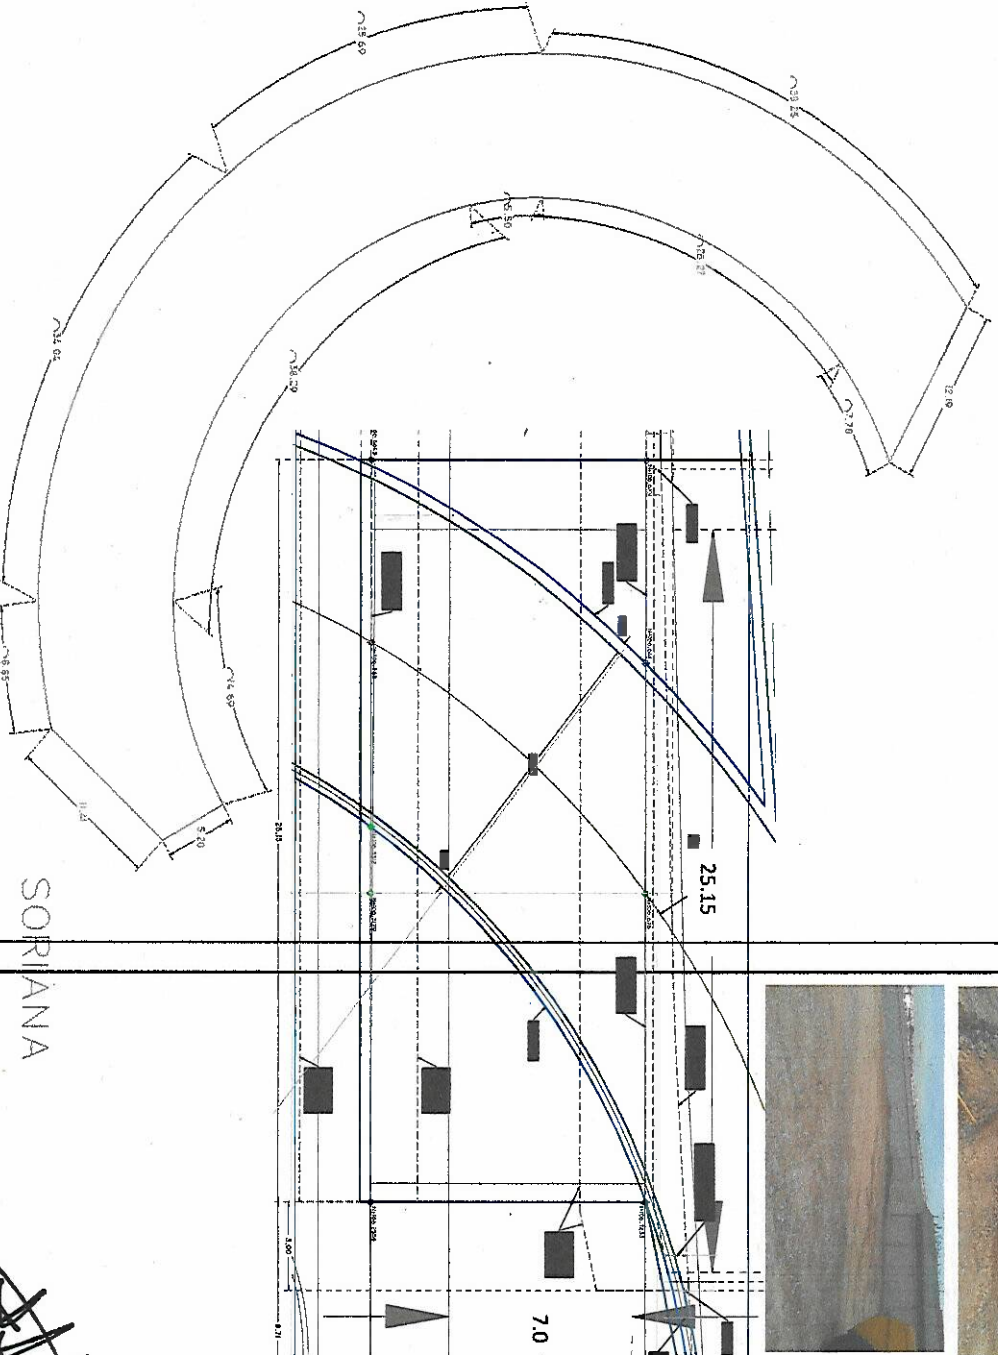

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR DE DOPM

ING. MANUEL VALDEZ
URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MEXICO S.A. DE C.V.

GENERADOR

OBRA

CONSTRUCCION DE GAZAS PARA IMPLEMENTAR EL TEBOL EN LA INTERSECCION DE LA AV. COLON Y LA AV. HOMERO

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

UBICACION AV. HOMERO Y TECNOLÓGICO.

CONTRATISTA

URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MEXICO S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION 9 PERIODO 24/1/17-29/1/17

DESCRIPCION

OPERACIONES

FORD

LOSA

SMART

LOSA

13659.13397

2.134.79


22

SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO CON LIMITE ELASTICO MAYOR O IGUAL A 4200 KG/CM2 PARA UTILIZARSE EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, PUESTO EN OBRA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

Vol. A ESTIMAR

30308.26 KG

REPORTE FOTOGRAFICO

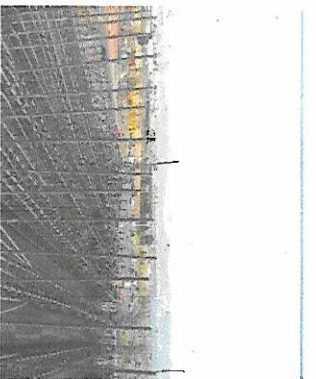

30308.26 KG

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR DE OPM

ING. MANUEL VALDEZ
URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MEXICO S.A. DE C.V.


GENERADOR

OBRA CONSTRUCCION DE GAZAS PARA IMPLEMENTAR EL TEBOL EN LA INTERSECCION DE LA AV. COLON Y LA AV. HOMERO
UBICACIÓN AV. HOMERO Y TECNOLÓGICO
CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CONTRATISTA URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MEXICO S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACIÓN 9 PERIODO 24/1/17-28/1/17

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES		SMART		LOSA	
	FORD	LOSA	16383.68	SMART	LOSA	13659.11387
ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY= 4200KG/CM2 A BASE DE VARILLAS CORUGADAS DE CONUN RANGO DE 1" A 3/8", P.U.O.T. A UTILIZARSE EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ALAMBRE RECOCIDO, SILETAS, AMARRES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, POR		MURO E1	8038.66747	MURO E1	6244.632178	
		ZAPATA E1	3941.560825	ZAPATA E1	2056.80946	
		MURO E2	14634.69226	MURO E2	11367.79922	
		ZAPATA E2	6054.600599	ZAPATA E2	4261.146192	
		ALERO	1673.539962	ALERO	2.134.19	
		Z ALERO	465.259384	Z ALERO	673.917561	
		ALERO 1 A	366.2849819	ALERO 1 A	432.771006	
		Z ALERO 1 A	164.8270272	Z ALERO 1 A	222.086628	
		ALERO 1 B	177.1686992	ALERO 1 B	173.8491628	
		Z ALERO 1 B	79.6250912	Z ALERO 1 B	66.662406	
		PARAPETO	128.9	CANAL	16236.10922	
		PARAPETO II	10007.74	PARAPETO II	1261.62	
		LOSA DE ACCESO	1805.04	PARAPETO II	7656.68	
		SECCION		LOSA DE ACCES	1605.04	
	UBICACION	SECCION		UBICACION	SECCION	
	VINEBUS	LOSA	26915.9448	SONRANA	LOSA	24140.2608
		MURO E1	7314.731677		MURO E1	11061.78226
		ZAPATA E1	2461.360009		ZAPATA E1	2342.80282
		MURO E2	30683.10085		MURO E2	16590.65346
		ZAPATA E2	11177.239693		ZAPATA E2	6591.098253
		ALERO	1803.74583		ALERO	1730.280142
		Z ALERO	437.7504684		Z ALERO	451.653867
		ALERO 1 A	110.87023		ALERO 1 A	1928.38145
		Z ALERO 1 A	64.62409		Z ALERO 1 A	996.216
		ALERO 2 B	1767.8698		ALERO 2 B	1242.1803
		Z ALERO 2 B	740.8995		Z ALERO 2 B	1072.436
		ALERO 2 C	1043.5076		ALERO 2 C	348.42428
		Z ALERO 2 C	620.675		Z ALERO 2 C	295.643
		ALERO 2 D	491.441325		PARAPETO	1261.62
		Z ALERO 2 D	240.6286		PARAPETO II	7766.62
		CANAL	15705.6394		LOSA DE ACCES	1605.04
		PARAPETO	1261.62			
		PARAPETO II	10406.86			
		LOSA DE ACCESO	1895.04			
				TOTAL		220000
				COBRADO		233255.58
				A ESTIMAR		46744.42

REPORTE FOTOGRAFICO

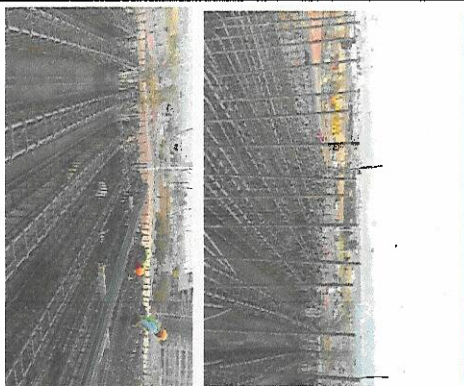

Vol. A
ESTIMAR

46,744.42
M3

ING. VICTOR MANUEL VILLEGAS
SUPERVISOR DE DOPM

ING. MANUEL VALDEZ
URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MEXICO S.A. DE C.V.

CULTURE AND COMMUNITY

FORD

[illegible]

STYLAK

[illegible]

SORIANA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

VIVEBUS

[illegible]

GENERADOR

OBRA

CONSTRUCCION DE GAZAS PARA IMPLEMENTAR EL TREBOL EN LA INTERSECCION DE LA AV. COLON Y LA AV. HOMERO

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

UBICACION

AV. HOMERO Y TECNOLÓGICO

CONTRATISTA

URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MEXICO S.A. DE C.V.

No: DE ESTIMACIÓN

9

PERIODO


24/11/17-29/11/17

DESCRIPCION

31 PARAPETO METÁLICO PARA CALZADA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA: TIPO T-34.3.1. A BASE DE TUBO DE 3" CED. 40 Y PLACAS DE ACERO DE 1/2" Y 3/8" DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, PINTURA, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA

OPERACIONES	UNIDAD	UBICACION	LONG.	SUB. TOTAL	NO. VECES	TOTAL
	M	SMART	85.8	85.8	1.0	85.8
						85.8

SMART

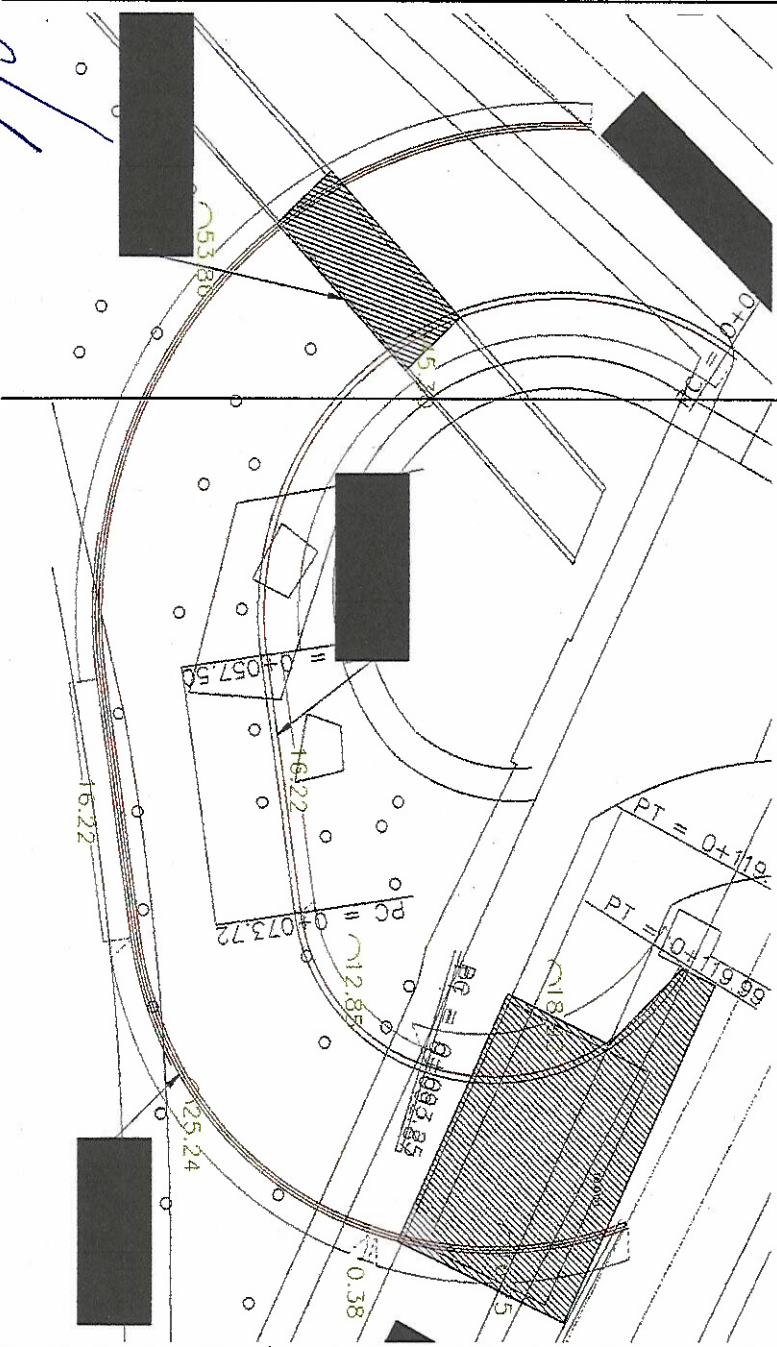

REPORTE FOTOGRAFICO



Vol. A
ESTIMAR

85.8
M

ING. JUAN MANUEL VILLEGAS
SUPERVISOR DE DOPM

ING. MANUEL VALDEZ
URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MEXICO S.A. DE C.V.

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCION DE GAZAS PARA IMPLEMENTAR EL TREPOL EN LA INTERSECCION DE LA AV. COLON Y LA AV. HOMERO


UBICACIÓN AV. HOMERO Y TECNOLÓGICO

No. DE ESTIMACIÓN 9 PERIODO 24/11/17-29/11/17

CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONTRATISTA URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MEXICO S.A. DE C.V.

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES					TOTAL
	UBICACIÓN	LONGITUD	ANCHO	LTM2	NO VECES	
37 MATERIALES ASFALTICOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA: ASFALTOS REBAJADOS, EMPLEADOS EN RIEGOS, EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO MEDIO O SUPERESTABLE EN RIEGO DE IMPREGNACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MAÑO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA						
	SORIANA	25.15	7.00	1.50	1	264.08
	TUNEL					
	SMART					
	RAMPA	85.70	10.00	1.50	1	1285.50
					TOTAL	1549.58

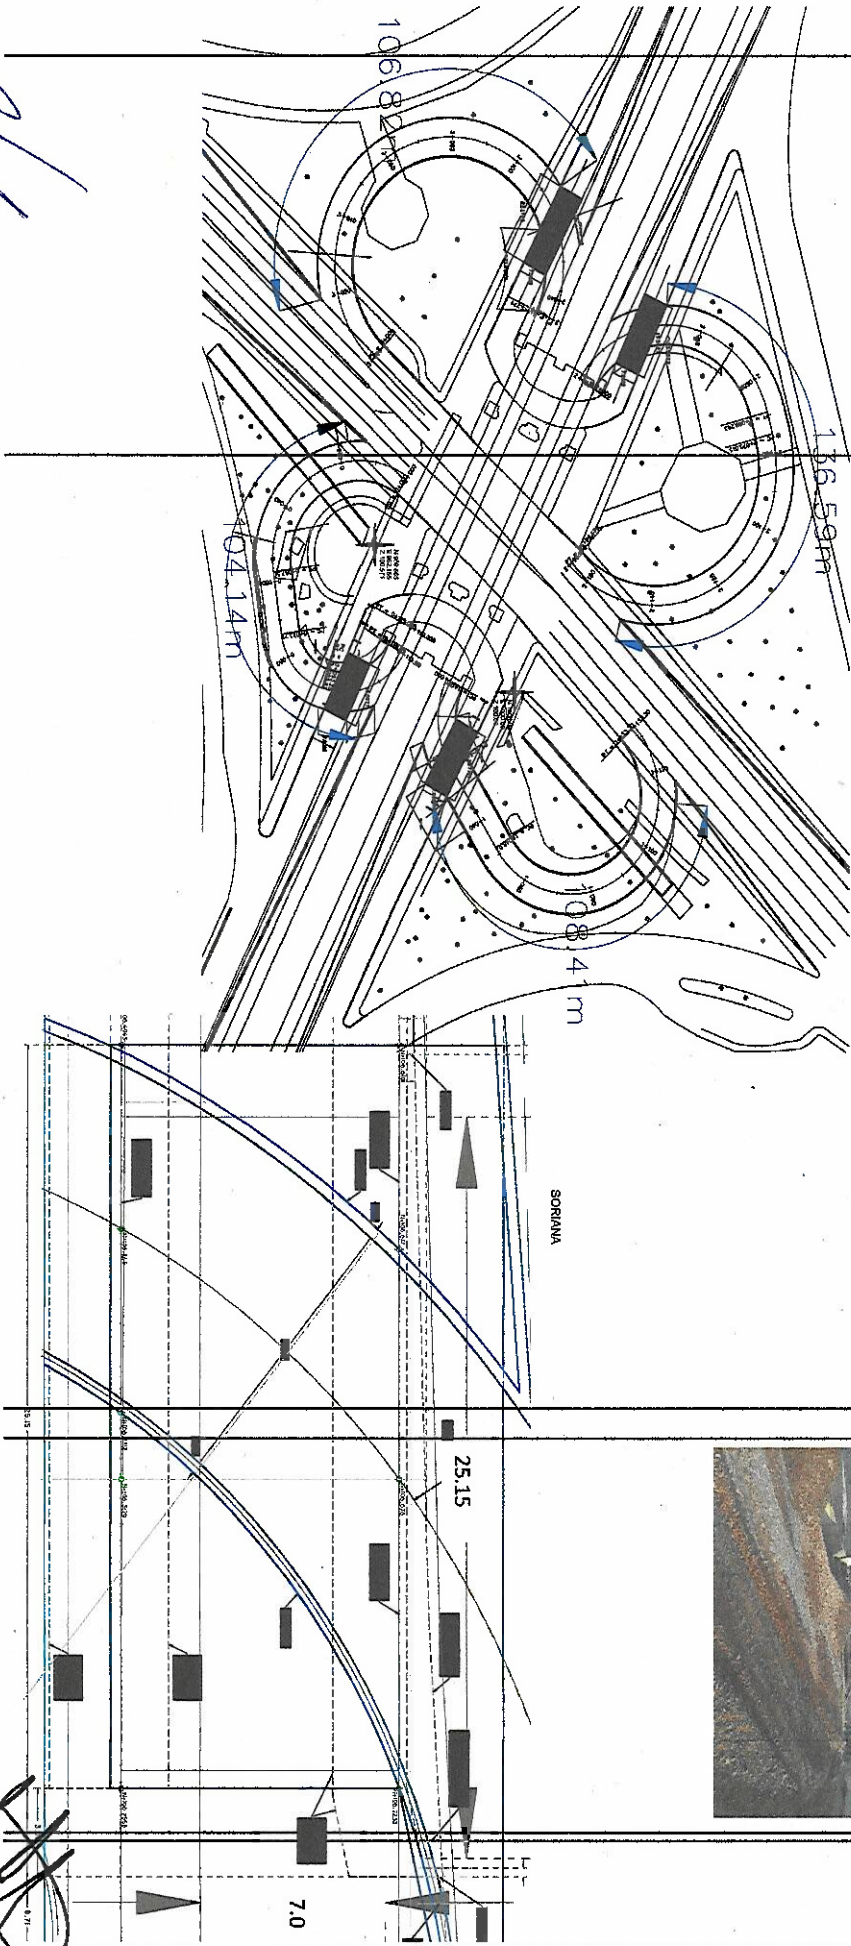

ING. VICTOR MIRRELES VILLEGAS
SUPERVISOR DE DOPM

URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MEXICO S.A. DE C.V.

GENERADOR


OBRA CONSTRUCCION DE GAZAS PARA IMPLEMENTAR EL TEBOL EN LA INTERSECCION DE LA AV. COLON Y LA AV. HOMERO CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

UBICACION AV. HOMERO Y TECNOLÓGICO.


CONTRATISTA URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MEXICO S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACIÓN 9 PERIODO 24/1/17-29/1/17

DESCRIPCIÓN	OPERACIONES				NO. VECES	TOTAL
	UBICACIÓN	PZAS				
71 RETIRO DE POSTES, LUMINARIOS Y CABLEADOS EXISTENTES; ENTREGA DE MATERIALES EN ALMACEN DE ALUMBRADO, INCLUYE LIMPIEZA DEL AREA.	FORD	2.00			-1.00	-2.00
	VIVEBUS	4.00			-1.00	-4.00
	SORIANA	2.00			-1.00	-2.00
	SMART	4.00			-1.00	-4.00
	TOTAL					-12.00

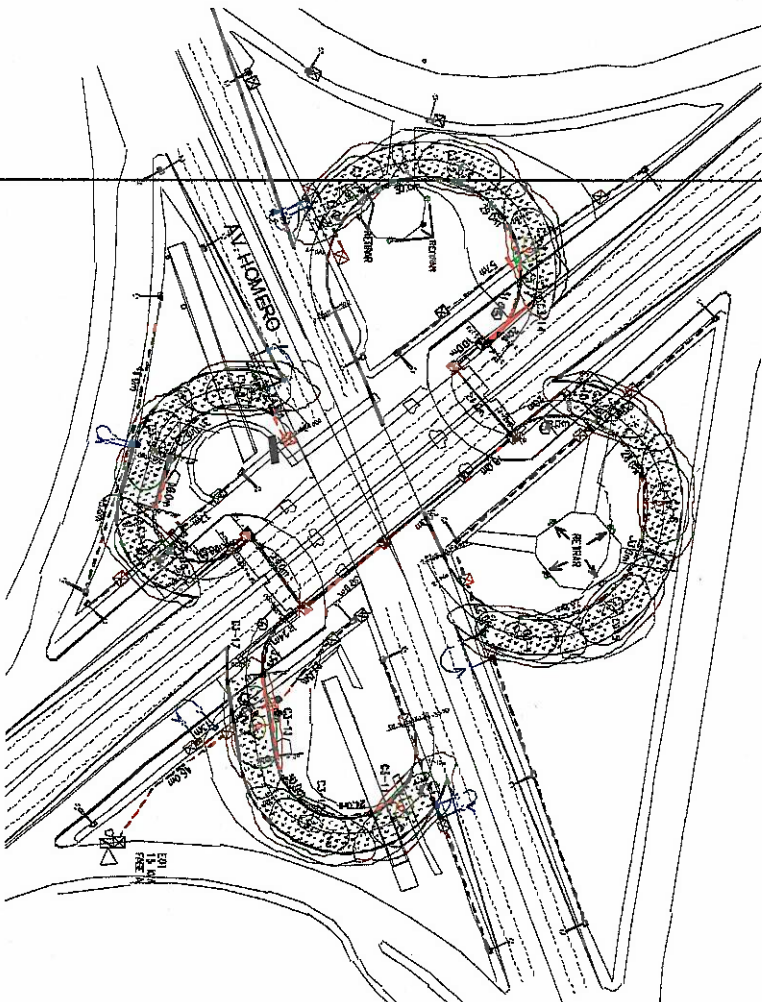

REPORTE FOTOGRÁFICO

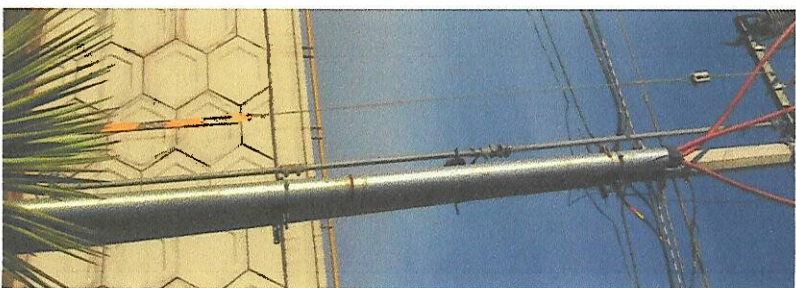

Vol. A
ESTIMAR
-12.00
PZAS

ING. VÍCTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR DE DOPM

ING. MANUEL VALDEZ
URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MEXICO S.A. DE C.V.

GENERADOR

OBRA

CONSTRUCCION DE GAZAS PARA IMPLEMENTAR EL TREFOL EN LA INTERSECCION DE LA AV. COLON Y LA AV. HOMERO

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

UBICACION

AV. HOMERO Y TECNOLÓGICO.

CONTRATISTA

URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MEXICO S.A. DE C.V.

No. DE ESTIMACION

9

PERIODO

24/1/17-29/1/17


DESCRIPCION

OPERACIONES

EXT-002

CONCRETO HIDRÁULICO POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA, SIMPLE COLADO EN SECO ULTRAPIRRO
RESISTENCIA A 3 DIAS, DE ACUERDO A LA NORMA
MEXICANA NMX-HS-001-2004, DE PG-230
KILGMS UTILIZADO EN LOSA SUPERIOR, INCLUIVE:
SUMINISTRO Y COLOCACION, DESPERDICIOS, CUBRA
DE CONTACTO APARENTE, OBRA FALSA
MATERIALES, BOMBO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, CURADO, VIBRADO, DESPERDICIOS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

UBICACION	LONGITUD	LADO	ALTURA	SUBTOTAL	NO. VECES	TOTAL
SORIANA				37.00	1.00	37.00
VIVERUS						
1	22.94	10.7	0.75	184.094	1	184.0935
2	7.42	1.97	0.35	5.1609	0.5	2.58045
3	7.42	2.43	0.35	6.31071	1	6.31071
4	22.94	4.11	0.35	32.9992	1	32.99919
DEDUCTIVA SONOTUBO	0.47		10.7	0.1734949	29	-63.83645506
TOTAL						209.13

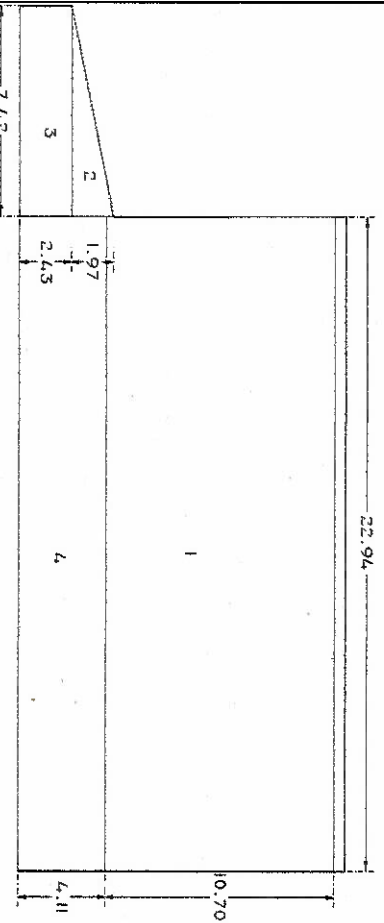

REPORTE FOTOGRAFICO



Vol.

A
ESTIMAR

208.1289889

M3

ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS
SUPERVISOR DE DOPM

URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MEXICO S.A. DE C.V.

GENERADOR

OBRA CONSTRUCCION DE GAZAS PARA IMPLEMENTAR EL TREBOL EN LA INTERSECCION DE LA AV. COLON Y LA AV. HOMERO

UBICACION AV. HOMERO Y TECNOLÓGICO. CLIENTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

No. DE ESTIMACION 9 PERIODO 24/1/17-29/1/17 CONTRATISTA URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MEXICO S.A. DE C.V.

DESCRIPCION	OPERACIONES									
	UBICACION	PIEZA					NO. VECES	TOTAL		
EXT-15 EXTRAORDINARIOS DISEÑO ESTRUCTURAL DE Puentes EN TREBOL DE AV. HOMERO Y AV. TECNOLÓGICO. INCLUYE: ANTERPROYECTO, PROYECTO, MEMORIA DE CALCULO, PLANOS ESTRUCTURALES EN DIGITAL, CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES.	TREBOL	1					1.0	1.0		



REPORTE FOTOGRAFICO

Vol. A
ESTIMAR
1.0
PZA

ING. VICTOR MIRIELES VILLEGAS
SUPERVISOR DE DOPM

ING. MANUEL VALDEZ
URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MEXICO S.A. DE C.V.

PH

DISEÑO ESTRUCTURAL

PEDRO IGNACIO HERNANDEZ ESCOBEDO

HEEP530903EL1

CALLE 3a. No. 3204 TEL. 410-17-73

COL. SANTA ROSA CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31030

Rég. Fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

FACTURA

Lugar y Fecha de certificación

México Distrito Federal, 2017-08-14T13:03:43

Proveedor de Certificación de CFDI

AURORIAN S.A. DE C.V.

www.konesh.com.mx

Número Certificado del SAT: 00001000000404624465

Folio Fiscal

22b964c-e612-4614-90b5-63c9a1dacd44

Serie: B

Folio: 398

Número de Certificado del Emisor

00001000000301544580

Lugar y Fecha de Emisión

CHIHUAHUA, CHIH., 2017-08-14T12:03:45

Nombre del Cliente

Urbanizadora y Editora de México, S.A. DE C.V.

RFC del Cliente

UEM030404J72

CLAVE

CONCEPTO

P. UNITARIO

IMPORTE

1.00 No Aplica

Revisión y modificación al proyecto estructural en la obra Gazas-Tribo en la intersección de la Av. Homero y Av. Colón.

\$ 65,807.25

\$ 65,807.25

IMPORTE EN LETRAS

SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Vy7/gcmAlXq2IOXJ8ecGxc4RSP7m/B00cRMuHxmv9p7MbK8v16UaVgK45DcB0/ZH49ME9rJUhL2QILbYmsYkYgbNbND/ZAU4xkKJQ/GTs

SELLO DIGITAL DEL SAT

W0M0CB2LgmJRyGIVx5J0k0f65pJDRI2w9zSDm3YV0ydtLX9gcb+Y5b9uagZdZ5b0vrd7n0TOxISZ657ipI7xYc00QZxKWwEITTEwSbeqX

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

11.0122b964c-e612-4614-90b5-63c9a1dacd442017-08-14T13:03:43Vy7/gcmAlXq2IOXJ8ecGxc4RSP7m/B00cRMuHxmv9p7MbK8v16UaVgK45DcB0/ZH49ME9rJUhL2QILbYmsYkYgbNbND/ZAU4xkKJQ/GTs

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: 03 Transferencia

Número Cuenta Pago: 0012



Este documento es una representación impresa de un CFDI

SUB-TOTAL	\$ 65,807.25
Total de Impuestos	\$ 10,529.16
Retenidos	\$ 0.00
IVA 16.00 %	\$ 10,529.16
TOTAL	\$ 76,336.40
